Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июнь 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	2	3 300 000,00	353 571,43

ВСЕГО: 3 300 000,00 353 571,43

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	21 192 466,00
Лимит финансирования на 2018 г.	20 938 155,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	10 062 000,00
б) за отчетный месяц	3 300 000,00

СПРАВКА ФЗ
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июнь месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	6 762 000,00	3 300 000,00	2 946 428,57	353 571,43	10 062 000,00	8 983 928,57	1 078 071,43

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Дукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
31	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции *м3 изоляции*	9,2433	6338,36	261,86	58587	2420	6804	3,44	32
				499,5	99	4617	915	123	0,48	4
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
	4.0 Подраздел без наименования									
73	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
				3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
74	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *т*	0,01403	69800		979				
75	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно *т*	0,1073	50800		5451				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
	81 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка) *м3*	1,1125	10687		11889				
	82 1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес) *м3*	1,2	8707		10448				
	83 1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта *м3*	0,45	12325		5546				
	91 1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	5,8	396		2297				
	Раздел 5 Окна									
	94 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,08	4884		5275				
	95 6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 *м2*	18,15	6389		115960				
	96 1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)К=-1,000; *м2*	-19,23	2320		-44614				
	97 1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001) *м2*	19,23	4963		95438				
	99 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей *м*	11,4	2030		23142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Двери									
101	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
102	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
103	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
104	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
110	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
111	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	9239,68	–	3881	–	293	3,66	2
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	238	–	123	–	–
112	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	5,21	325,45	13,43	1696	70	459	0,45	2
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	347	26	123	0,0246	–
113	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
114	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–
	7.2 П-2									
117	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	9239,68	–	58025	–	4380	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		567	–	3561	–	123	–	–
119	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	78,5	325,45	13,43	25548	1054	6918	0,45	35
		м2 стяжки		66,6	5,04	5228	396	123	0,0246	2
120	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	785	51,94	0,67	40773	526	850	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
	7.3 П-3									
125	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
126	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	9239,68	–	2957	–	223	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	181	–	123	–	–
127	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
		м2 стяжки		66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
128	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
	7.4 П-4									
137	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,208	9239,68	–	1922	–	145	3,66	1
		м3 подстилающего слоя		567	–	118	–	123	–	–
138	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–
139	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Внутреняя отделка								
140	E15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	292,53	272,8	4,07	79802	1191	41973	0,74	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
		Раздел 9 Фасад								
		9.1 Стены								
147	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
150	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором	13,888	216,7	1,96	3010	27	1594	0,611	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	1512	6	105	0,0262	–
		Всего прямые затраты				**875345**	**8985**			**750**
						123694	**3207**			**29**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				742664				
		Накладные расходы, тенге				145776				
		- заработная плата, тенге				21866				
		- трудоемкость, чел-ч				73				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61267				
		Всего				**1082388**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				11906				
		- сметная заработная плата, тенге				1679				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				20091				
		- сметная заработная плата, тенге				9242				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				56				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4377				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1129705**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2888656**				
		- материалы, тенге				1898992				
		- сметная заработная плата, тенге				447495				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				918				
		Налог (2 %)				57773				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2946429**				
		НДС (12 %)				353571				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 300 000**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
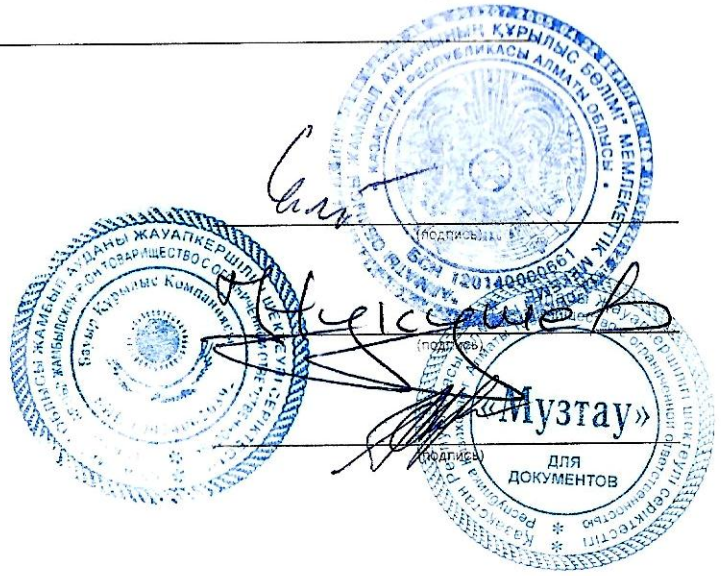
Технический надзор:
