Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	16	1 516 775,00	162 511,61
	ВСЕГО:		1 516 775,00	162 511,61

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "Батыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	21 192 466,00
Лимит финансирования на 2018 г.	20 938 155,84
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	19 468 775,00
б) за отчетный месяц	1 516 775,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	17 952 000,00	1 516 775,00	1 354 263,39	162 511,61	19 468 775,00	17 382 834,82	2 085 940,18

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акегулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Казыбек бек, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №16
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
32	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,1508	2530,27	100,89	10503	419	794	0,85	4
		м3 основания		123,75	38,25	514	159	118	0,18	1
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
69	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	6	–	90	–	–
71	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим.	60,91	208,17	4,51	12680	275	10403	1,04	63
		м2 поверхности		167,4	1,71	10196	104	101	0,0084	1
76	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
				5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
77	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	11	–	90	–	–
78	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
79	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
84	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396		15840				
		м								
85	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
86	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
		м2 покрытий								
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
87	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
88	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
89	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
90	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 6 Двери									
100	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов		151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
105	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления		134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
106	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов		272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
115	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
		м2 покрытия		173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
116	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
		м плинтусов		41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
	7.2 П-2									
123	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
		м2 покрытия		58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
124	Е11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
		м плинтусов		16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
	7.3 П-3									
129	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
131	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	4	0,63 323,65	0,25 18,42	-5 1295	-2 74	123 458	0,0012 0,416	– 2
132	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	4	85,95 201,7	6,91 9,95	344 807	28 40	123 276	0,0337 0,356	– 1
133	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000; *м2 стяжки*	-8	52,2 25,47	3,74 0,67	209 -204	15 -5	123 -9	0,0182 0,0044	– –
134	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе *м2 покрытия*	4	0,63 921,4	0,25 11,72	-5 3686	-2 47	123 867	0,0012 1,06	– 4
135	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических *м плинтусов*	4,28	171,68 137,4	4,39 0,32	687 588	18 1	123 219	0,0214 0,236	– 1
				41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
Раздел 8 Внутреняя отделка										
	8									
142	Е15-169-6	Левкас потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
145	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	4,19	26,55 173,11	0,02 1,88	2424 725	2 8	105 348	0,0001 0,468	– 2
				78,3	0,72	328	3	105	0,0035	–
Раздел 9 Фасад										
9.1 Стены										
148	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
				30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
149	Е12-8-2									
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
151	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
		м2 окрашиваемой поверхности								
				10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
		Раздел 10 Крыльцо Кр1								
153	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
		м3								
				146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
154	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм	2,4	869		2086				
		м								
155	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
		т								
156	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,836	6197,72	316,57	5181	265	3619	22,5	19
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	2916	100	120	0,58	–
157	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,836	12700		10617				
		м3								
158	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4	0,0388	50800		1971				
		т								
159	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				
		т								
160	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	161 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
		м2	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
	162 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		4,16	–	9	–	90	–	–
		м2 кровли	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
	166 1-1-564	Панели декоративные сайдинг		272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
		м2	3,6	1300		4680				
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
	167 Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15		8531,63	100,65	55456	654	1258	0,97	6
		м3	6,5							
	168 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм		146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
		т	0,06804	41200		2803				
	169 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
		т		7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
	170 2-1-41	Конструкции стальные стоек	0,1794	147100		26390				
		т								
	171 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
		м2	5,13							
	172 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
		м2	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
	174 99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб		4,16	–	21	–	90	–	–
		м	14,03	3910,83		54869				
	177 1-1-564	Панели декоративные сайдинг								
			5,97	1300		7761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
178	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8531,63	100,65	15357	181	348	0,97	2
		м3								
				146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
179	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801				
		т								
		Всего прямые затраты				**415207**	**7901**			**276**
						44794	**2941**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				362514				
		Накладные расходы, тенге				54129				
		- заработная плата, тенге				8119				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28160				
		Всего				**497496**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5472				
		- сметная заработная плата, тенге				772				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				9235				
		- сметная заработная плата, тенге				4248				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5030				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2012				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**519245**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1327709**				
		- материалы, тенге				926948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				173661				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				344				
		Налог (2 %)				26554				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1354263**				
		НДС (12 %)				162512				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 516 775**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
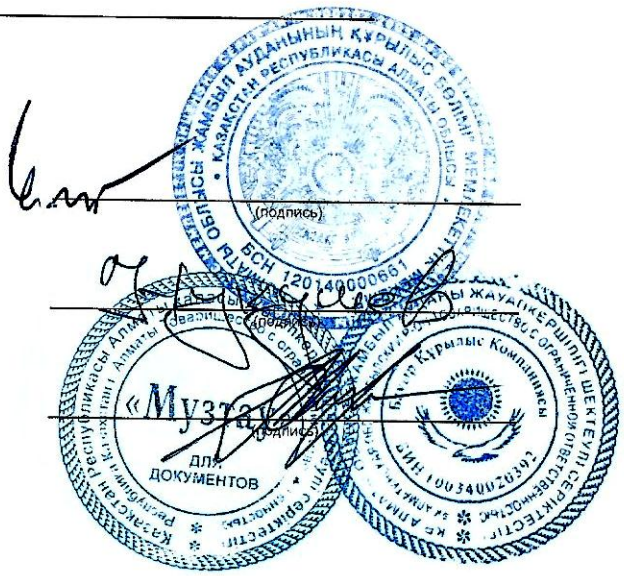
Технический надзор: ТОО "Мұзтау"
