Источник: Информационная система «ПАРАГРАФ»
Документ: ПРИКАЗ МИНИСТРА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РК ОТ 24.04.2017 № 234
Статус документа: Действующий 30.07.2021 10: 47:23

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июля 2021 года

Заказчик ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай)
050021, Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 85А, корпус 1, БИН 090840006023

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации
- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) 23 июля, БИН 180340032360ТОО "Industrial Construction Group (Индастриал Констракшн Групп) - Лицензия:18009589, 14.05.2018, I, Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Жаркентская г.а., г.Жаркент, ул. Чокана Валиханова 159, +7 (727) 330 45 52 31. ЖИЕНБАЕВ БАУРЖАН ЕРСАЙЫНОВИЧ
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
,
дата подписания заключения,
24 июля, ТОО Engineering Supervision Service, от 02.05.2018 год, БИН 170240005754, Жекенов Жумабай Тлеубергенович, KZ50VJE00048961 от 29.08.2019 г., KZ57VJE00041269 от 26.09.2018г., KZ49VJE00053150 от 28.02.2020г.
24 июля, ТОО Engineering Supervision Service, от 02.05.2018 год, БИН 170240005754, Айтжан Ақат Нұрмашұлы, KZ51VJE00029834 от 23.08.2017 г
24 июля, ТОО Engineering Supervision Service, от 02.05.2018 год, БИН 170240005754, Акпанов Акылкан, KZ11VJE00055289 от 12.06.2020 г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
24 июля, БИН 031240000986, ТОО «Проектная академия KAZGOR,", руководитель группы авторского надзора Москаленко Денис Николаевич и главный инженер проекта Шепель Вячеслав Станиславович.

,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Новое, второй нормальный уровень ответственности, технический не сложный объект, «Расширение Актогайского ГОК. Вахтовый поселок» (без наружных сетей электроснабжения и сметной документации)

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Аягозский район, Актогайский сельский округ, поселок Актогай»,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «22» июля 20 21 года, дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «7» августа 2018 года № 2513931, кадастр номер № 05-239-026-246; Постановление Акимата Аягозского района ВКО «30» июля 20 18года № 572;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «___» _____20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточной – Казахстанской области" 02.07.2019, KZ35REA00136718
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектная Академия «KAZGOR», № 3207/7853-1
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай), № 23-2019 от 26.04.2019 г.
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «12 » июля 20 19 года;
окончание работ «23» июля 20 21 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 месяцев;
фактически, месяц: 24, 5 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	52233,12 кв.м	
Число этажей	этаж	2-3	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	260005,28	
В том числе подземной части	кв.м	0	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	кв.м.	6033,72	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1588	52233,12 кв.м	47288,68 кв.м	1588	52233,12 кв.м	47288,68 кв.м

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Административное здание – 1шт, Столовая № 1-1шт, Столовая № 2-1шт, Врачебный здравпункт-1шт, Прачечная-1шт, Помещение для молитв-1шт, Жилой модуль 1-4шт, Жилой Модуль 2-4шт, Жилой Модуль 3-9шт, Жилой модуль 4-3шт, Автобусная остановка-1шт, Канализационная насосная станция-1шт, Хозяйственный питьевой водопровод, Противопожарный водопровод, Канализация

характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

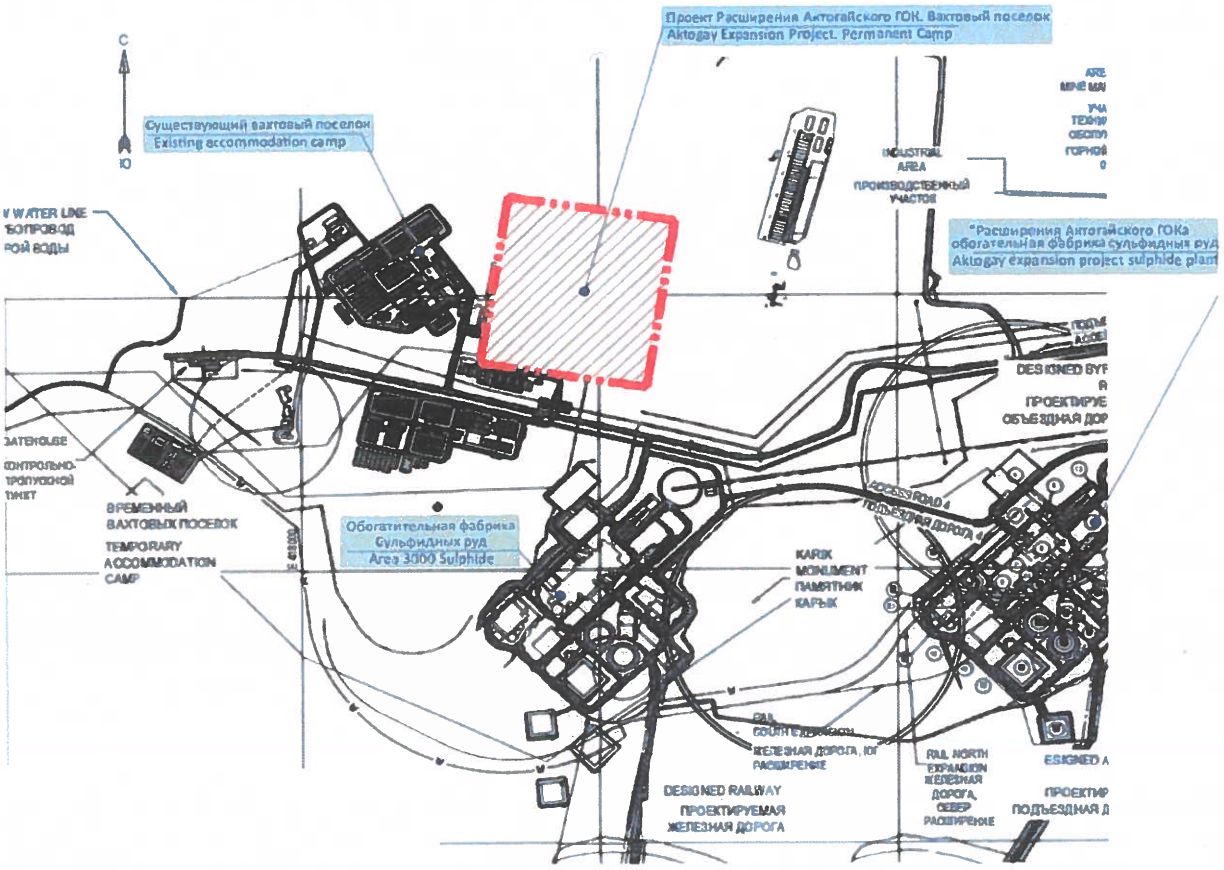
Проект Расширения Актогайского ГОК. Вахтовый поселок
Aktogay Expansion Project. Permanent Camp
С
Ю
Существующий вахтовый поселок
Existing accommodation camp
INDUSTRIAL AREA
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК
"Расширения Актогайского ГОКа
обогательная фабрика сульфидных руд
Aktogay expansion project sulphide plant
ВРЕМЕННЫЙ ВАХТОВЫХ ПОСЕЛОК
TEMPORARY ACCOMMODATION CAMP
Обогатительная фабрика
Сульфидных руд
Area 3000 Sulphide
KARIK MONUMENT
ПАМЯТНИК КАРЫК
ACCESS ROAD 4
ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА 4
DESIGNED RAILWAY
ПРОЕКТИРУЕМАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
RAIL NORTH EXPANSION
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, СЕВЕР РАСШИРЕНИЕ

Архитектурно планировочные решения

Центральное здание состоит из 3 блоков:

Административный блок, в котором размещены помещения рекреационного центра, офисы администрации, помещения для проведения тренингов и инструктажа.

Два блока – столовые по 800 мест с кухнями и необходимыми производственными, загрузочными и складскими помещениями;

Два блока столовых размещены зеркально, по отношению к административному блоку.

Административный блок

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 435,90 м по генплану.

Здание двухэтажное прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 46,0хх56,0 м.

Высота помещений 1 этажа составляет – 3,3 м; второго этажа – 3,1 м. Высота здания до верха конька – 12,900 м.

Центральный Вестибюль в здании имеет высоту в два света.

Административный блок включает в себя 3 функциональные зоны – рекреационный центр, офис администрации и помещение для проведения тренингов и инструктажа.

Рекреационный центр размещён на 1 этаже. Офис администрации и помещение для проведения тренингов и инструктажа размещены на 2 этаже.

Кровля двускатная, с покрытием из сборных сэндвич-панелей по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается – через тамбур непосредственно наружу, со второго этажа по лестничной клетке через тамбур наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминиевые.

наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения,

санитарно-

гигиенических и противопожарных требований.

Стены - акриловая окраска и керамические плитки.

Полы – линолеум, шлифованный бетонн и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка из тротуарной плитки шириной1000 мм.

Шум изоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 2;

площадь застройки - 2679,13 м2;

общая площадь - 4567,18 м2;

полезная площадь - 4312,42 м2;

расчетная площадь - 3276,91 м2;

строительный объем здания - 26662,86 м3.

Столовая на 800 мест (пятна 2, 3 по ГП)

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 433,55 м. по генеральному плану.

Здание одноэтажное прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 124,35х42,0 м.

Высота этажа здания до верха конька составляет – 11,215 м.

Здание состоит из трёх блоков: входной блок, блок столовой (зал) и блок кухни.

Входной блок включает зоны большого обеденного зала и вспомогательные помещения.

Блок столовой включает зал столовой с 800 посадочными местами.

Блок кухни включает главную кухню поселка, который обслуживает 2636 человек;

также включает складские помещения, зоны готовки, морозильные камеры, офисы, помещения для персонала и служебные помещения, а также помещения для инженерного обеспечения.

Кровля двускатная, с покрытием из сборных сэндвич-панелей по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур, непосредственно наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминевые.

наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Стены - акриловая окраска и керамические плитки.

Полы – линолеум, шлифованный бетонн, виниловое покрытие и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка из тротуарной плитки шириной 1000 мм.

Шум изоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 1;

площадь застройки - 5922,08 м2;

общая площадь - 6263,65 м2;

полезная площадь - 5960,17 м2;

расчетная площадь - 3755,13 м2;

строительный объем здания - 44627,80 м3.

Врачебный здравпункт

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 433,55 м по генплану.

Здание одноэтажное сложной формы с осевыми размерами в плане 619,4х35,46 м.

Высота этажа здания до верха конька составляет- 5,88 м.

В состав здания входят - служебно-медицинские, вспомогательные и инженерно-технические помещения.

Кровля двускатная, с покрытием из сборных сэндвич-панелей по

металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур, непосредственно наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминиевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-

гигиенических и противопожарных требований:

Стены- акриловая, водоэмульсионная окраска и керамические плитки.

Полы – линолеум, шлифованный бетон, антистатический линолеум и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка из тротуарной плитки шириной 1000 мм.

Шум изоляция помещений достигается посредством планировочных мероприятий, применением металлопластиковых окон со стеклопакетом и эффективных шумоизолирующих материалов в конструкциях стен и перекрытий.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 1;

площадь застройки - 1643,16 м2;

общая площадь - 1388,75 м2;

полезная площадь - 1306,11 м2;

расчетная площадь - 949,11 м2;

строительный объем здания - 8450,56 м3.

Прачечная

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 435,70 м по генплану.

Здание одноэтажное сложной формы с осевыми размерами в плане 54,0х27,1 м.

Высота этажа здания до верха конька составляет- 6,47 м.

Здание спроектировано как отдельное от других зданий и связывается крытым проходом с центральным зданием для обеспечения минимального

расстояния перемещения. Здание предназначено для стирки белья, обслуживания кухонных принадлежностей и стирки белья из жилых блоков.

Кровля двускатная, с покрытием из сборных сэндвич-панелей по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур непосредственно наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминиевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Стены- акриловая окраска и керамические плитки.

Полы – линолеум, шлифованный бетон и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1000 мм.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 1;

площадь застройки - 1516,8 м2;

общая площадь - 1395,22 м2;

полезная площадь - 1341,88 м2;

расчетная площадь - 1010,95 м2;

строительный объем здания - 8723,47 м3.

Помещение для молитв

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 435,70 м по генплану.

Здание одноэтажное сложной формы с осевыми размерами в плане 42,0х14,0 м.

Высота этажа здания до верха конька составляет - 5,23 м.

Здание спроектировано как отдельное от других зданий и связывается крытым проходом с центральным зданием для обеспечения минимального расстояния перемещения.

В состав здания входят следующие помещения: молитвенный зал мужской и зал для женщин, гардеробные, помещение омовения и мойки ног; вспомогательные и инженерно-технические помещения, санузлы и кладовая

уборочного инвентаря.

Кровля двускатная, с покрытием из сборных сэндвич-панелей по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур, непосредственно наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминиевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований:

Стены - акриловая окраска и керамические плитки.

Полы – линолеум, шлифованный бетон и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1000 мм.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 1;

площадь застройки - 674,35 м2;

общая площадь - 600,25 м2;

полезная площадь - 584,55 м2;

расчетная площадь - 446,10 м2;

строительный объем здания - 3356,88 м3.

Жилой модуль 1

Степень огнестойкости – III.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 435,90 м по генплану.

Здание двухэтажное прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 81,0х х12,15 м. Высота этажа здания до верха конька составляет - 6,847 м.

В жилом модуле предусмотрены одноместные номера с душевой и сан/узлом, а также комнаты для хранения чистого/грязного белья, кухни, комнаты отдыха, комната для багажа и технические помещения.

Кровля двускатная, с покрытием из оцинкованного профлиста по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур непосредственно наружу, со второго этажа по лестничной клетке через

тамбур наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Стены - водоэмульсионная окраска и керамические плитки.

Поля – ПВХ настил и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1000 мм.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 2;

площадь застройки - 1063,5 м2;

общая площадь - 1898,4 м2;

полезная площадь - 1691,11 м2;

расчетная площадь - 1316,41 м2;

строительный объем здания - 8087,90 м3.

Жилой модуль 2

Степень огнестойкости – III.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 435,90 м по генплану.

Здание двухэтажное прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 84,0х х12,15 м. Высота этажа здания до верха конька составляет - 6,847 м.

В жилом модуле предусмотрены одноместные комнаты с душевыми и сан/узлами общего пользования, а также комнаты для хранения чистого/грязного белья, кухни, комнаты отдыха, комната для багажа и технические помещения.

Кровля двускатная, с покрытием из оцинкованного профлиста по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур,

непосредственно наружу, со второго этажа по лестничной клетке через тамбур наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминиевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Стены - водоэмульсионная окраска и керамические плитки.

Поля – ПВХ настил и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1000 мм.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 2;

площадь застройки - 1129,92 м2;

общая площадь - 2044,68 м2;

полезная площадь - 1832,82 м2;

расчетная площадь - 1409,49 м2;

строительный объем здания - 8634,38 м3.

Жилой модуль 3 и 4

Степень огнестойкости – III.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 435,45 м и 435,90 м. соответственно по генплану.

Здание двухэтажное прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 86,0х х12,15 м. Высота этажа здания до верха конька составляет - 9,817 м.

В жилом модуле предусмотрены двухместные номера с душевыми и туалетами общего пользования, а также комнаты для хранения чистого/грязного белья, кухни, комнаты отдыха, комната для багажа и технические помещения.

Кровля двускатная, с покрытием из оцинкованного профлиста по металлическим конструкциям.

Эвакуация людей из помещений предусматривается через тамбур непосредственно наружу, со второго и третьего этажа по лестничной клетке через тамбур наружу.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Стены - водоэмульсионная окраска и керамические плитки.

Полы – ПВХ настил и керамические плитки.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1000 мм.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:

этажность - 3;

площадь застройки - 1129,92 м2;

общая площадь - 3038,40 м2;

полезная площадь - 2766,08 м2;

расчетная площадь - 2479,54 м2;

строительный объем здания - 11893,51 м3.

Автобусная остановка

Степень огнестойкости – II.

Уровень ответственности здания – II.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 434,50 м по генплану.

Здание одноэтажное прямоугольной формы с осевыми размерами в плане 18,0хх12,0 м.

Высота этажа здания до верха конька составляет - 4,82 м.

Здание размещено возле автобусной остановки вахтового посёлка, способное разместить 140 человек.

Кровля двускатная, с покрытием из сборных сэндвич-панелей по металлическим конструкциям.

Наружная отделка

Стены - «Сэндвич» панели.

Оконные блоки – алюминевые.

Наружные двери стальные.

Внутренняя отделка помещений

Внутренняя отделка помещений выполняется с учетом назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований.

Стены - акриловая и водоэмульсионная окраска.

Полы – стальной лист с «чечевичным» рифлением.

По периметру здания предусмотрена отмостка шириной 1000 мм.

Естественное освещение помещений осуществляется посредством окон

с открывающими створками.

Основные технические показатели по зданию:
этажность - 1;
площадь застройки - 251,10 м2;
общая площадь - 209,51 м2;
полезная площадь - 208,09 м2;
расчетная площадь - 199,48 м2;
строительный объем здания - 1126,33 м3.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке

после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования,

инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически

применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэ ффективности здания Б;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и

строительства.

РЕШИЛ:

«Расширение Актогайского ГОК. Вахтовый поселок» (без наружных сетей электроснабжения и сметной документации)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Эндрю Баттесон, Руководитель Проекта Филиала компании «KAZ Minerals Projects B.V.» в РК, являющийся поверенным ТОО «KAZ Minerals Aktogay» (КАЗ Минералз Актогай)

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) ----------

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии

1) аккредитованная организация ТОО «Engineering Supervision Service» директор Сулейменов Серик Абдулатович

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Жекенов Жумабай, KZ[illegible]00048961 (Объекты первого уровня ответственности в части инженерных сетей, KZ[illegible]041269 (Объекты первого уровня ответственности в части технологического оборудования), KZ49VJE00053150 (Объекты первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкции)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Айтжан Акат Нұрмаңұлы, KZ51VJE00029834 (Объекты первого уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкции)

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Акпанов Акылкан, KZ11VJE00053289 (Объекты первого уровня ответственности в части инженерных сетей)

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

2) 1) разработчик проекта ТОО «Проектная академия KAZGOR,". Шепель Вячеслав Станиславович. главный инженер проекта

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) организация

_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии

4) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ЖИЕНБАЕВ БАУРЖАН ЕРСАЙЫНОВИЧ

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)
