Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Декларация о соответствии

"20" 03 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шауенов Расул Рахматуллаулы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания Жанакорганского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, пос. Жанакорган, ул Хорасан ата, 8А»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Кызылординской области, 120008, Кызылорда, Хасан Бектурганова, 10А, 8-7242-23-81-73, Директор Калиева Фарида Идрисовна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности ;

2. Субподрядные организации:

а) **ТОО «Gas Neft Service» лицензия III категория, №21014836 от 08.04.2021года**

(«наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице **директора Ералиев Нұрдәулет Нурмаханбетуллаулы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КазГосПроект» Рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **Филиал РГП на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области №391-0 от 30.12.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

ъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=200 кВт	комп		1		1
Горелка жидкотопливая мощностью Q=0,073-0,19 MAX 15	шт	MAX 15	2	MAX 15	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Модульная котельная - контейнер заводского изготовления, устанавливается на монолитную железобетонную плиту ПФм1.

Дымовая труба - металлическая Ø426х5, высотой 10м, устанавливается на отдельно стоящий столбчатый монолитный железобетонный фундамент.

Котлы работают на газе, от проектируемых сетей. Фундамент под модульную котельную - монолитная железобетонная плита из бетона кл. С12/15 (В15), размером 9,0х3,4м, толщиной 300мм, армированная двойной сеткой.

Теплоснабжение объекта предусматривается от блочно-модульной котельной (БМК - 0,232 МВт Г/Ж) с двумя котлами ВВ 1035. Прокладка магистральных тепловых сетей подземная в непроходных железобетонных каналах 700х510.

Диаметр тепловой сети - 76х3,0 мм.

Протяженность теплового сети - 30,0 пм.

Компенсация удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота трассы.
Спуск воды в нижних точках тепловых сетей осуществляется в дренажной колодец.
Трасса газопровода низкого давления PN-0,002 МПа проходит:
1. от подземного газопровода низкого давления PN-0,002 МПа Д63мм проложенного по ул. Хорасан ата в направлении проектируемой БМК в северо-западном направлении.
Подземный газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011, СТ РК ИСО 4437-2004 типа ПЭ 100 ГАЗ SDR17 Ø63х3.8 мм с коэффициентом запаса прочности не менее С-2,5. Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно МСН 4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011 с заглублением до верха трубы не менее 1,2 м.
Надземный газопровод низкого давления запроектирован из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,0 мм, на опорах. Газопровод проложен на опорах высотой 2,2м с соблюдением следующих требовании: разъемные соединения размещать на Н=+0,5м от уровня верха дверей и +0,2м от окон.
Сварка подземного полиэтиленового газопровода осуществляется встык и муфтами с закладными нагревателями. *(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 11.10.2023 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 20.03. 2024 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 75 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Нач пу Шерхамбетов Е.
Нач-к ОЭ

Техникалық құжаттар үшін Жыланорган АЭТ Для технической документации

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания Жанакорганского районного отделения филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Кызылординской области по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, пос. Жанакорган, ул Хорасан ата, 8А»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ» _____

Директор Шауенов Расул Рахматуллаулы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Сводный план инженерных сетей.
М 1:500

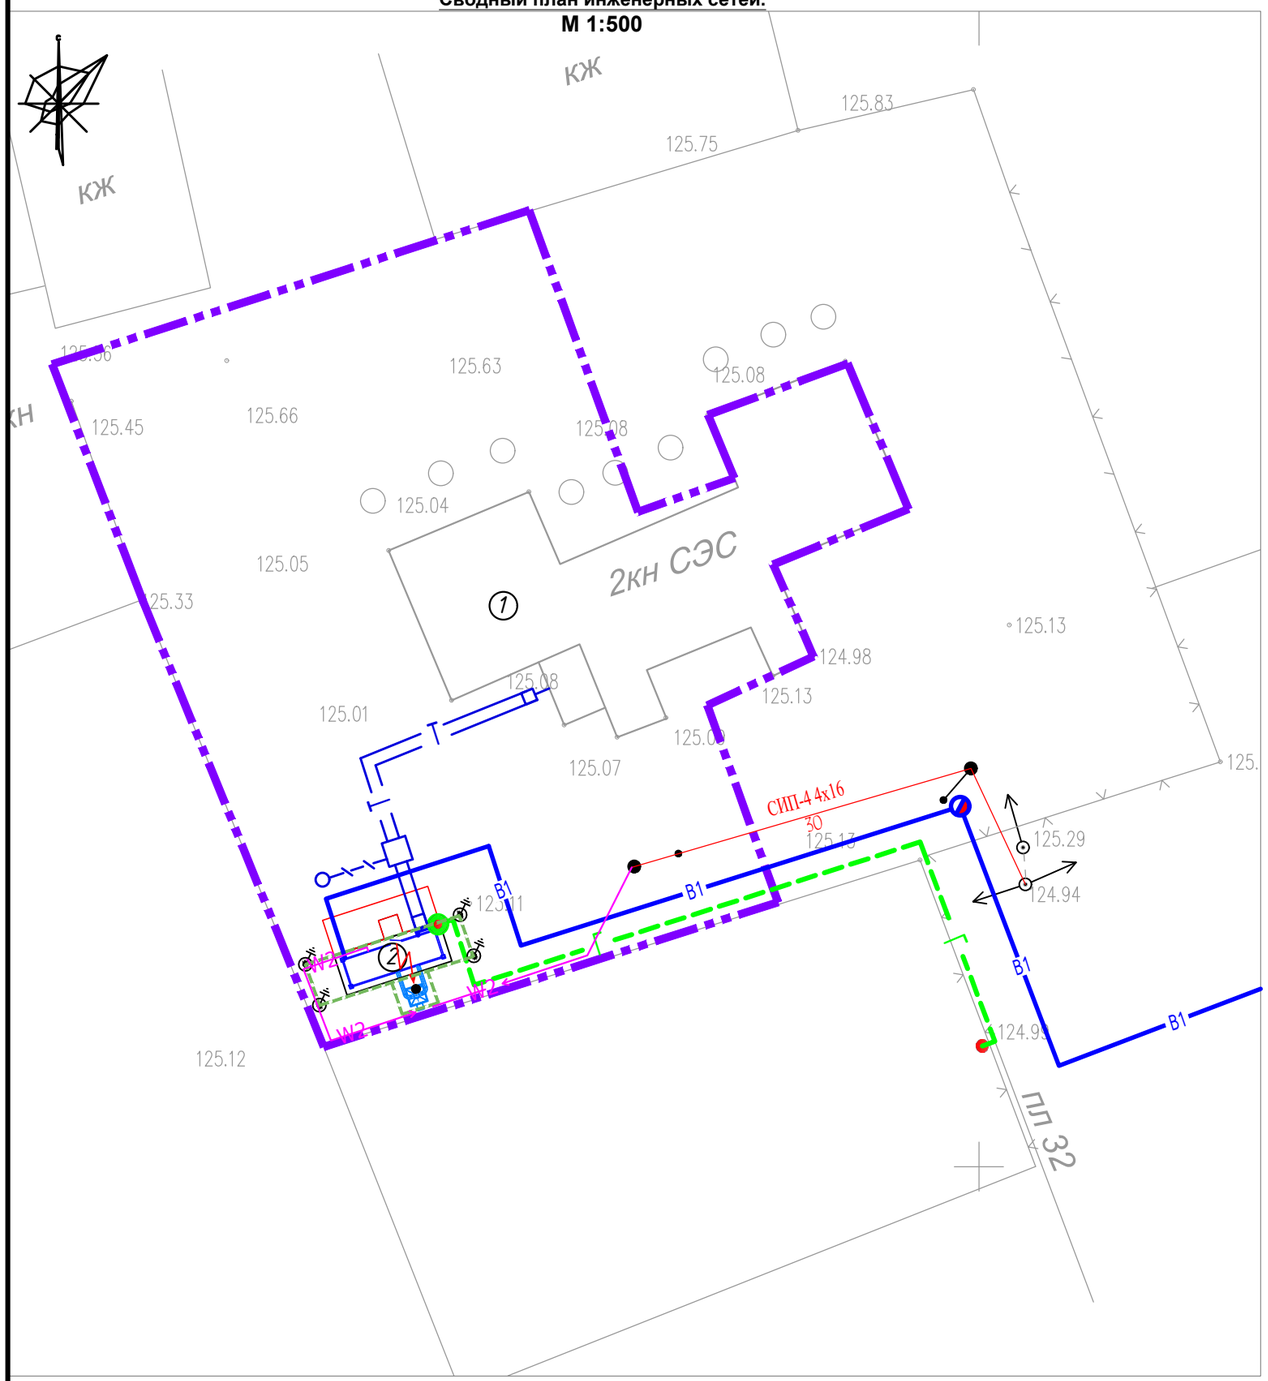

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь, м²				Строительный объем, м³	
			Зданий	Квартир		Застройки		Общая норм.		Зданий	Всего
				Здания	Всего	Здания	Всего	Здания	Всего		
1	Административный здание	2	1	--	--	541,10	541,10	--	--	--	
2	БМК (проектируемая)	1	1	--	--	35.20	35.20	--	--	--	
	Итого: (зданий и сооруж.)						576.30				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- ① — Здание (сооружение) проектируемое
- Граница участка
- Г — Проектируемый подземный полиэтиленовый ГНД 0,003 МПа
- Т — Терлотрасса проектируемая
- В1 — Водопровод проектируемый
- К1 — Канализация проектируемая
- ВК1 — Водопроводный колодец проектируемый
- 125.37 / 124.06 — Водопроводный колодец существующий
- Существующая ВЛ-0,4 кВ
- W2 — Проектируемая КЛ-0,4 кВ
- Мачта молниеприемника
- СИП-4 4х16 / 31 — Проектируемая ВЛИ-0,4 кВ
- Проектируемая опора ВЛ-0,4кВ

				Заказчик: Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской облости	ГП
				«Строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания Жанакорганского районного отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Кызылординской области по адресу: Кызылординская область, Жанакорганский район, пос. Жанакорган, ул Хорасан ата, 8А »	
					стадия / лист / листов
Испол.	Байменов Е		25.07.21		РП / 6 / 6
Проверил	Исабекова Г		25.07.21		
ГИП	Базарбайулы Т		25.07.21	Сводный план инженерных сетей.	ТОО "КазГосПроект" №ГСЛ-Ф 002713 г.Кызылорда 2019г.
