Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
(с изменениями от 09.08.2019 г. от 08.02.2021 г)

Декларация о соответствии

« 27 » 01 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Асанас-Дар»,
город Кызылорда, ул. Кашаубаева 13 БИН 030640005245 , тел: 8-708-833-21-31
наименование организации, юридический адрес

в лице: Карабаевой Рыскуль Абушаметовны – Директор ТОО «Асанас-Дар»
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
- Электроснабжение скважины №46 на м/р Майбулак.
По адресу: Карагандинская область, Улытауский район, месторождение Майбулак,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз».
Чжао Сяомин – председатель правления,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана отделом проектов АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»:
- проект 21-03/02. Электроснабжение скважины №46 на м/р Майбулак,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз». приказ № 129-П от 17.08..2021г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса
Протяженность воздушной линии ВЛ-6кВ до скважины №46	метр	15		15	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Проектом предусмотрено строительство воздушной линии ВЛ-6кВ до скважины №46. Источником электроснабжения является существующие ВЛ-6 кВ м/р Майбулак, протяженность воздушной линии ВЛ-6кВ скважины №46 - 0,015 км. Проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН, которые устанавливаются на два фундаментных блока ФМ-1. Глубина заложения фундаментов 0,5 м. Для питания КТПН предусмотрено строительство ВЛ-6 кВ сталеалюминиевыми проводами марки АС 50, проложенными по железобетонным опорам. Опоры выполнены с применением стоек СВ105-5 и траверс ТМ-24 на промежуточных опорах с одинарным креплением проводов. При этом свободные изоляторы предохраняют птиц от поражения электрическим током. На промежуточных опорах используются штыревые изоляторы ШФ20-В. На опорах анкерного типа провода крепятся при помощи натяжных изолирующих подвесок, содержащих два подвесных изолятора типа ПФ 70В (ПС-70Д). Закрепление опор выполняется без ригеля, в сверленые котлованы на глубину 2,5 м. диаметром 350-450 мм. После установки опоры обратная засыпка котлованов производится вынутым при бурении грунтом. При засыпке котлованов выполнено уплотнение грунта слоями не более 20 см.Для подключения КТПН на отпаечной опоре установлено устройство ответвления и разъединитель РЛНД10 с приводом КР1. На концевой опоре перед подстанцией также установлен разъединитель РЛНД-10. Заземление подстанций выполнено согласно ПУЭ РК. В КТПН установлен электронный счетчики с долговременной памятью в запирающемся ящике. Материал железобетонных конструкций - бетон на сульфатостойком портландцементе. Боковые поверхности железобетонных конструкций соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом в два раза. Сварка металлоконструкций выполнена электродами Э-42. Металлические конструкции окрашены и огрунтованы согласно проекта.Величина сопротивления конечной системы заземления не более 10Ом. Сопротивление контура заземления трансформаторной подстанции току промышленной частоты не менее 4 Ом, Заземляющие устройства выполнено в виде замкнутого контура вокруг технологических установок. Вертикальные электроды диаметром 16мм длиной 5 метров, соединены круглой сталью диаметром 16мм (стальная полоса 40х4мм). Все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, заземлены, используя нулевые жилы питающих кабелей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

- КТПН 6/0,4кВ - 1 комплект.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: **01 ноября 2021 года;**

месяц, год

Окончание работ: **23 декабря 2021 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;

фактически, месяц: **1,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __--__ и фактически применено __--__ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
- Прилагается

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным Заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
- Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
- Не требуется
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
- Электроснабжение скважины №46 на м/р Майбулак,
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Карабаева Рыскуль Абушаметовна – Директор ТОО «Асанас-Дар»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,
Место печати (при наличии)

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ТРАССЫ ВЛ-6 на МЕСТОРОЖДЕНИИ МАЙБУЛАК СКВАЖИНА №46

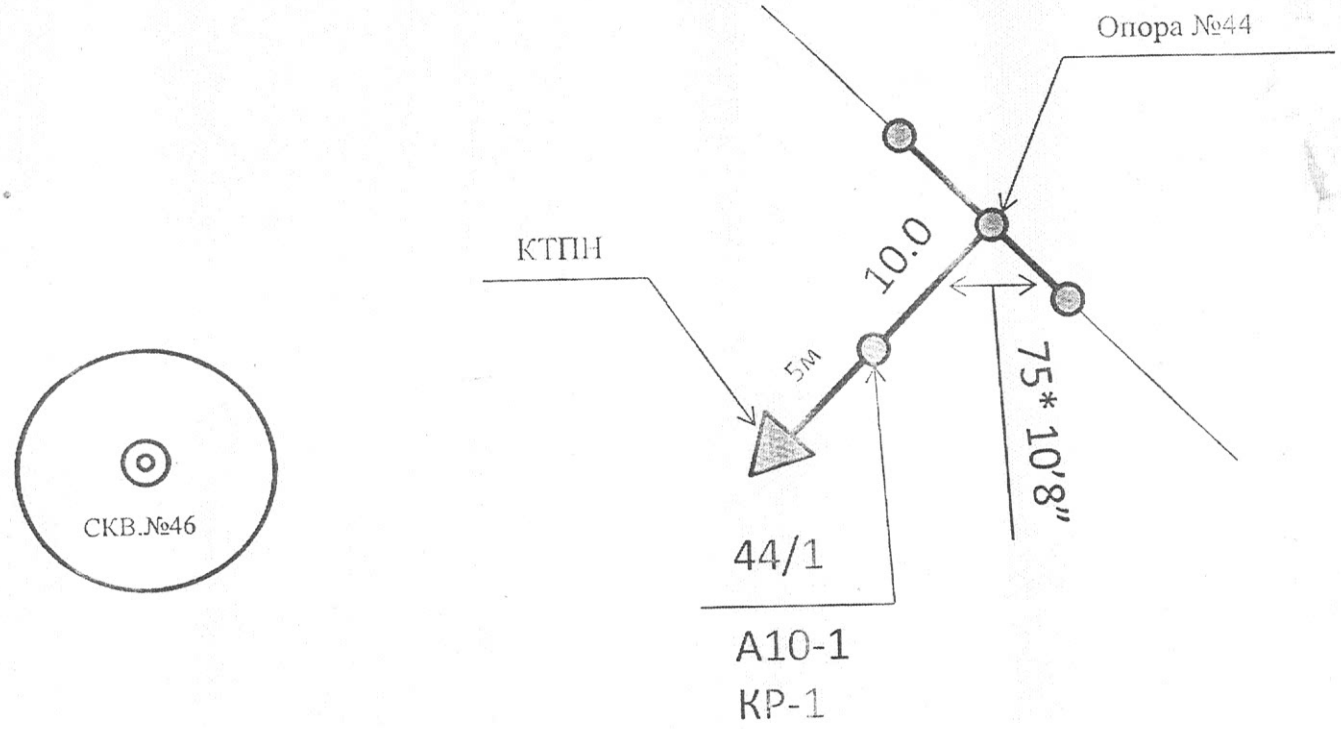

При строительстве ВЛ-6кВ применены:

1) ЖБ стойки СВ 105-5 в кол-ве 2 шт
2) Провод АС – 50/8 в кол-ве 45 м
3) Протяженность ВЛ-6кВ L-15м

Авторский надзор: Нач.отдела ПГ АО "ПККР" _____ Оразбахов Н

Генеральный подрядчик: Прораб ТОО"Асанас-Дар" _____ Абушаметов Б

Технический надзор: Вед.инженер ОКС АО "ПККР" _____ Байдуйсенов С./Тлеубергенов Р

Вед.инженер ОКС АО "ПККР" _____ Абдыкалыков К.

Проект МВ-21-03/02	ПГ АО "ПККР"
Электроснабжение скважины №46 на мр. Майбулак	Заказчик АО «ПККР»
Исполн.схема электроснабжения скв.№46	Подрядчик ТОО «Асанас-Дар»

69
