РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г. I-КАТЕГОРИЯ

Заказ: 10-2022
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство котельной в поселке Шашубай Актогайский район, Карагандинская область»

ТОМ 4

ПАСПОРТ ПРОЕКТ

Шымкент – 2023 г.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Товарищество с ограниченной ответственностью
«КОРПОРАЦИЯ «АСЫЛ-СТРОЙ»
Лицензия: 17 ГСЛ №14013440 от 30.05.2019г. I-КАТЕГОРИЯ

Заказ: 10-2022
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Актогайского района"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

«Строительство котельной в поселке Шашубай Актогайский район, Карагандинская область»

ТОМ 4

ПАСПОРТ ПРОЕКТ

Директор **Ш.Доспаева**

ГИП **Атамбаев И.**

Шымкент – 2023 г.

Заказчик: КГП на ПХВ""Отдел строительства Актогайского района" **Генпроектировщик:** ТОО «Корпорация Асыл-Строй». **Источник финансирования:** Бюджетные средства **Место расположения:** поселке Шашубай Актогайский район, Карагандинская область	**Наименование объекта:** Строительство котельной в поселке Шашубай Актогайский район, Карагандинская область	**Исходные данные:** -задание на проектирование;

Эскизные графические материалы здания

План

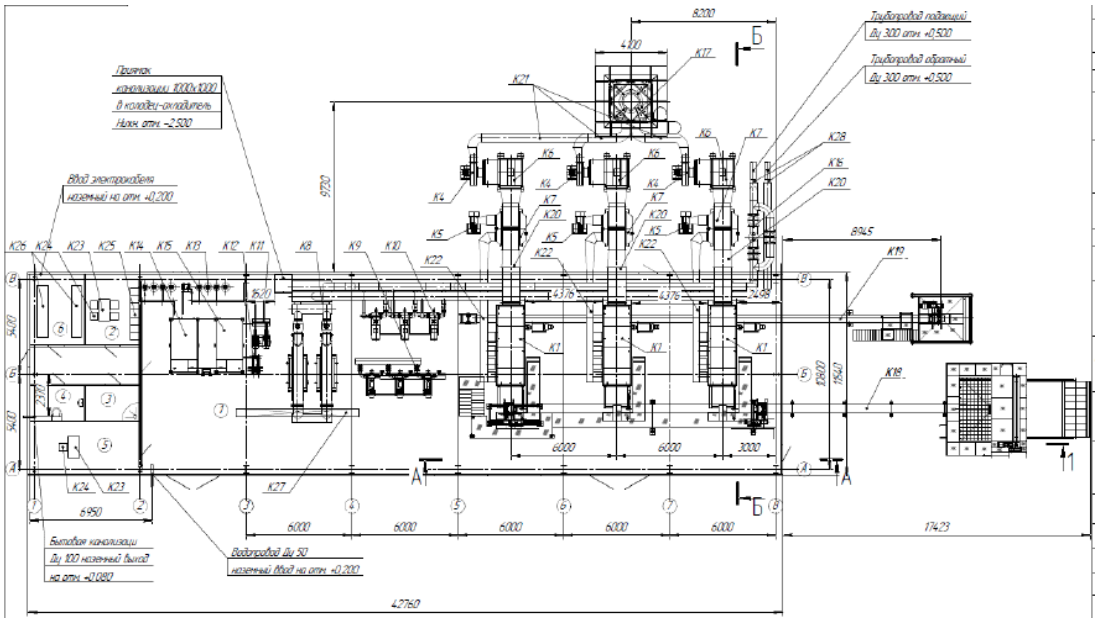

Общий вид котельной

Технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений)

Общая площадь Котельная - 493,5 м2. Площадка для угля – 96,0 м2.	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2023 года - 795545,597 тыс. тенге; в том числе: - СМР - 111206,738 тыс. тенге; - Продолжительность строительства – 3,0 месяцев

Общие указания

Данная часть проекта разработана на основании :

- задания на проектирование;
- топографической съемки территории;

Плита под блочно-модульную котельную запроектирована прямоугольной формы из бетона С12/15 W4 F50, с размерами в осях 42,00х10,80 м. Армирование плиты под блочно-модульную котельную предусмотрено сетками С1, С2 из арматуры 10А-400.

Фундамент под дымовую трубу запроектирована из бетона С12/15., с размерами 3,0х3,0 м.

Плита под топливоподачу запроектирована прямоугольной формы из бетона С12/15 W4 F50, с размерами 4,50х4,70 м. Плита из бетона С12/15 W4 F50. Армирование плиты под блочно-модульную котельную предусмотрено сетки С1, С2 из арматуры 10А-400.

Объемно-планировочные решения

Навес размерами в осях 12,0х8,0 м. Выполнен на металлических стойках из трубы диаметром 193,7х3,0 мм и перекрыт профнастилом по металлическим балкам и прогонам.

Конструктивные решения

Фундаменты под колонны - столбчатые железобетонные монолитные, выполнены из бетона С12/15 W6 F150 на сульфатостойком цементе.

Колонны - из труб диаметром Ø193,7мм по ГОСТ 10704-91.

Балки и прогоны - из металлических швеллеров по ГОСТ 8240-89.

Покрытие - из профнастила Н57-750-0,7 ГОСТ24045-94.

Площадка для золы

Площадка для золы размерами 10,0х10,0 м запроектирована прямоугольной формы из бетона С12/15 по щебеночному основанию толщиной 100 мм. Армирование площадки предусмотрено сеткой С-1 из арматуры 10А-400.

Директор ТОО «Корпорация Асыл-Строй»_____Доспаева Ш.

М.П.

ГИП ТОО «Корпорация Асыл-Строй»_____Атамбаев И.

Паспорт проекта (рабочего проекта) на строительство общественных зданий Форма Ф-3
