Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **041140003314 - АО "Астана-Теплотранзит"**

Подрядчик: **020140003447 - ТОО Куандык - К**

Стройка: **Реконструкция тепловых сетей УТ-9(18) мкр. 9, от ул. Кудайбердыулы, 46 до ул. Мусрепова6/4**

Договор подряда (контракт) №: **416/28-24 от 05.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июнь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Демонтаж существующей теплотрассы				
1	1	6123-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0.687	3 927 550	2 698 226
2	4	1216-0101-2404 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	23 496	46 992
3	5	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	6	8 547	51 282
4	6	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	9	5 096	45 864
5	7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж	т конструкций	42.5	291 714	12 397 845
6	8	1216-0101-2201 РСНБ РК 2022	Изоляция тепловая плит, сегментов и скорлуп. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	62	806	49 972
7	11	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Демонтаж блоков ФБС	м3	9.68	144 825	1 401 906
			Итого по локальной смете: Демонтаж существующей теплотрассы				**16 692 087**
			Локальная смета: Теплотехническая часть				
			Раздел: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				
			Подраздел: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				
8	1	6123-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0.13852	7 203 196	997 786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	2	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	132.52	49 907	6 613 675
10	4	6123-0104-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	10	149 452	1 494 520
11	9	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	10	122 507	1 225 070
			Итого по подразделу: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				**10 331 052**
			Итого по разделу: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				**10 331 052**
			Раздел: Изоляционное покрытие				
12	56	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Полиэтиленовый мат 2000х1200х45	шт.	20	12 378	247 567
			Итого по разделу: Изоляционное покрытие				**247 567**
			Итого по локальной смете: Теплотехническая часть				**10 578 620**
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: РВыемка грунта				
13	1	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2	м3	404.31	387	156 467
14	4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5660.34	59	333 960
			Итого по подразделу: РВыемка грунта				**490 428**
			Подраздел: РОбратная засыпка				
15	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2(песка)	м3	47.43	5 220	247 584
16	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	47.43	4 180	198 257
			Итого по подразделу: РОбратная засыпка				**445 842**
			Итого по разделу: Земляные работы				**936 270**
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: РНепроходной канал, л.КЖ.ТС-5				
17	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	17.27868	12 528	216 467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	12	212-101-0409 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	17.27868	20 511	354 403
19	13	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	28.23	43 834	1 237 433
20	15	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	10	104 893	1 048 930
21	16	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	17.4	125 712	2 187 388
22	17	225-203-0203 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0.83	112 401	93 292
			Итого по подразделу: РНепроходной канал, л.КЖ.ТС-5				**5 137 915**
			Итого по разделу: Строительные работы				**5 137 915**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**6 074 185**
			ИТОГО по акту:				**33 344 893**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	33344893.788 + 0.000	33 344 893
	Сметная прибыль, 5.00%	33344893.788 x 5.00%	1 667 244
	Непредвиденные расходы, 3.000%	33344893.788 x 3.000%	1 000 346
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		36 012 485
	Коэффициент на 2024 - 100%, К-1,075, к = 1.0750 , к = 1.0750	36012485.292 x 1.0750	38 713 421
	НДС (12%)	38713421.688 x 12%	4 645 610
	Итого с НДС	38713421.688 + 4645610.603	43 359 032

Лист согласования
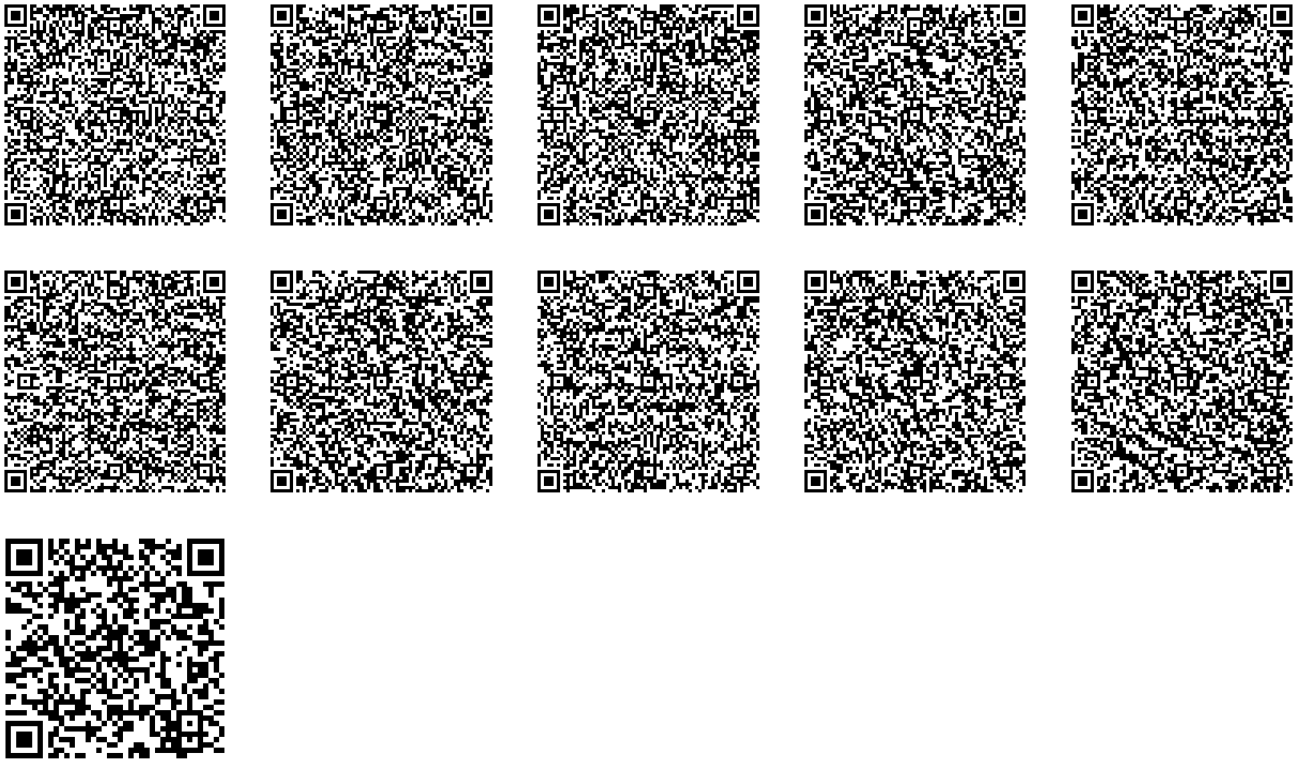
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
551004350262 - ЖАМАНШАЛОВ БАКЫТКЕРЕЙ ШАЙКЕМЕЛОВИЧ	Директор	20.06.2024 07:14:56
Представители технического надзора		
551011300165 - МУСТАФИН ЕРИК ЗАРЛЫКОВИЧ	Эксперт технического Надзора	20.06.2024 07:15:25
Представители авторского надзора		
941012300569 - АЛИШЕВ САНАТ ТАЛГАТОВИЧ	ГИП	20.06.2024 08:37:56
Представители заказчика		
711114301663 - СЕИТКАЗИЕВ МАРАТ ЕРМАХАНБЕТОВИЧ	Заместитель Председателя Правления по производству	28.06.2024 03:47:52
