Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **041140003314 - АО "Астана-Теплотранзит"**

Подрядчик: **020140003447 - ТОО Куандык - К**

Стройка: **Реконструкция тепловых сетей УТ-9(18) мкр. 9, от ул. Кудайбердыулы, 46 до ул. Мусрепова6/4**

Договор подряда (контракт) №: **416/28-24 от 05.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Теплотехническая часть				
			Раздел: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				
			Подраздел: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				
1	1	6123-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0.20814	7 203 196	1 499 273
2	2	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	214.14	49 907	10 687 084
3	4	6123-0104-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	14	149 452	2 092 328
4	7	СТРСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление Ст219х9-108х4-2-ППУ-ПЭ, сталь 20,Ру 2.5МПа	шт.	2	124 323	248 647
5	9	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	12	122 507	1 470 084
			Итого по подразделу: Рпрокладка в непроходном канале, бесканальная				**15 997 418**
			Итого по разделу: Прокладка предизолированных трубопроводов с арматурой				**15 997 418**
			Итого по локальной смете: Теплотехническая часть				**15 997 418**
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: РВыемка грунта				
6	2	6101-0102-0220 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2.	м3	235.64	426	100 382

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	21.166	11 999	253 970
8	4	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7588.7	59	447 733
			Итого по подразделу: РВыемка грунта				**802 086**
			Подраздел: РОбратная засыпка				
9	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2(песка)	м3	21.16	5 220	110 455
10	7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	28.019	4 180	117 119
11	10	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	21.16	816	17 266
			Итого по подразделу: РОбратная засыпка				**244 841**
			Итого по разделу: Земляные работы				**1 046 927**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**1 046 927**
			ИТОГО по акту:				**17 044 346**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	17044346.089 + 0.000	17 044 346
	Сметная прибыль, 5.00%	17044346.089 x 5.00%	852 217
	Непредвиденные расходы, 3.000%	17044346.089 x 3.000%	511 330
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		18 407 893
	К -2024, к = 1.0750	18407893.777 x 1.0750	19 788 485
	НДС (12%)	19788485.810 x 12%	2 374 618
	Итого с НДС	19788485.810 + 2374618.297	22 163 104

Лист согласования
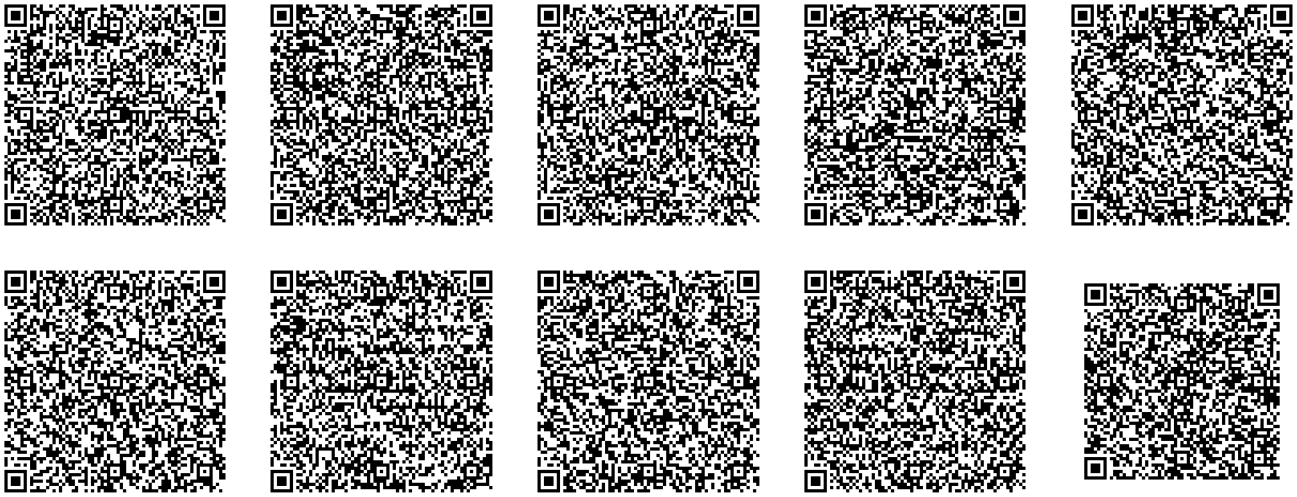
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
551004350262 - ЖАМАНШАЛОВ БАКЫТКЕРЕЙ ШАЙКЕМЕЛОВИЧ	Директор	11.07.2024 11:25:33
Представители технического надзора		
551011300165 - МУСТАФИН ЕРИК ЗАРЛЫКОВИЧ	Эксперт технического Надзора	11.07.2024 11:26:07
Представители авторского надзора		
941012300569 - АЛИШЕВ САНАТ ТАЛГАТОВИЧ	ГИП	11.07.2024 11:38:57
Представители заказчика		
711114301663 - СЕИТКАЗИЕВ МАРАТ ЕРМАХАНБЕТОВИЧ	Заместитель Председателя Правления по производству	19.07.2024 05:01:51
