Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **041140003314 - АО "Астана-Теплотранзит"**

Подрядчик: **020140003447 - ТОО Куандык - К**

Стройка: **Реконструкция существующих тепловых сетей в мкр. 5,теплотрасса от ул. Жирентаева, 16 до д. 14 в г. Астане**

Договор подряда (контракт) №: **414/28-24 от 05.03.2024 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				
1	1	6123-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 300 мм	км	0.39858	8 424 902	3 357 997
2	2	6123-0104-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 200 мм	км	0.07754	6 278 643	486 846
3	14	241-402-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	398.58	85 827	34 208 925
4	15	241-402-0213 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	77.54	49 907	3 869 788
5	50	6123-0104-0218 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 300 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка	шт.	40	74 685	2 987 400
6	51	6123-0104-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 200 мм	шт.	8	130 312	1 042 496
7	58	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тройник параллельный с накладкой S±6мм, b±50мм, L±1000мм, L1±600мм, Нв±500мм, (отвод 90° 159х5), р-р 325х13/159х5-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	4	344 812	1 379 251
8	60	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тройник параллельный с накладкой S±4мм, b±50мм, L±900мм, L1±500мм, Нв±465мм, (отвод 90° 89х4), р-р 325х13/89х4-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	4	275 095	1 100 384
9	64	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тройниковое ответвление с накладкой S±4мм, b±46мм, L±920мм, L1±865мм, Нв±425мм, (отвод 45° 108х4), р-р 325х13/108х4-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	4	282 370	1 129 482
10	65	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тройниковое ответвление с накладкой S±4мм, b±46мм, L±920мм, L1±1565мм, Нв±425мм, (отвод 45° 108х4), р-р 325х13/108х4-1/2-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732-2020	шт.	2	305 430	610 861

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	87	241-405-0112 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм /L±1050х1050мм, R±450мм Ст325х8-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	26	142 021	3 692 546
12	91	241-405-0207 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /L±1000х1000мм, R±300мм Ст219х6-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	8	122 507	980 056
13	250	241-408-0112 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 450 мм/Муфта термоусаживаемая Тумар 450-650ВК, Пенопакет 325/450-ППУ-ПЭ/	комплект	138	27 318	3 769 884
14	251	241-408-0110 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм/Муфта термоусаживаемая Тумар 355-650ВК, Пенопакет 219/355-ППУ-ПЭ/	комплект	96	17 897	1 718 112
			Итого по локальной смете: ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ				**60 334 029**
			ИТОГО по акту:				**60 334 029**

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	60334029.809 + 0.000	60 334 029
	Сметная прибыль, 5.00%	60334029.809 x 5.00%	3 016 701
	Непредвиденные расходы, 0.840%	60334029.809 x 0.840%	506 805
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		63 857 537
	Коэфициент на 2024 год - 100%, к=1,075, к = 1.0750	63857537.134 x 1.0750	68 646 852
	НДС (12%)	68646852.419 x 12%	8 237 622
	Итого с НДС	68646852.419 + 8237622.290	76 884 474

Лист согласования
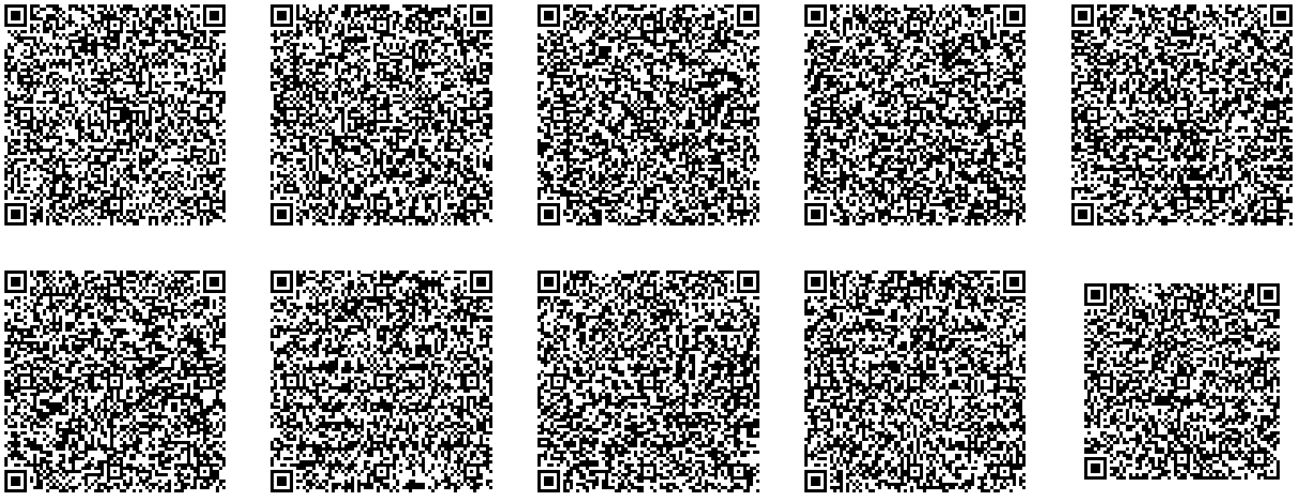
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
551004350262 - ЖАМАНШАЛОВ БАКЫТКЕРЕЙ ШАЙКЕМЕЛОВИЧ	Директор	04.07.2024 04:22:01
Представители технического надзора		
551011300165 - МУСТАФИН ЕРИК ЗАРЛЫКОВИЧ	Эксперт Технического Надзора	04.07.2024 09:45:55
Представители авторского надзора		
810420301000 - ШЕСТАКОВ ПАВЕЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ	Эксперт Авторского надзора	04.07.2024 09:40:08
Представители заказчика		
711114301663 - СЕИТКАЗИЕВ МАРАТ ЕРМАХАНБЕТОВИЧ	Заместитель Председателя Правления по производству
