Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

АКТ ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

"25" декабря 2023 года

№ 215

Заказчик:

ТОО «СП «Камкор-Сарыарка»; БИН 120640015413; тел. 8-701-544-13-25;
100000, г. Караганда, район имени Казыбек би, 137 учетный квартал, строение 288

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «14» декабря 2023 года, ТОО «ЭкоПромАстана-NS», директор Жумагалиев Ермек Конысбекович; 050000, Республика Казахстан, город Алматы, Ауэзовский район, микрорайон 5, дом 21, кв.116 БИН 110340000934; тел. +7-747-333-70-46

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «14» декабря» 2023 года, ТОО «Нұрай эксперт», эксперт Рысбек Еркінбай Қарымсақұлы, аттестат № KZ21VJE00081881 от 18.07.2023; аттестат № KZ68VJE00081617 от 30.06.2023; аттестат № KZ09VJE00081418 от 22.06.2023; БИН 220340037946; тел. 8-701-244-49-79

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «14» декабря 2023 года, ТОО «Строй Бизнес Консалтинг» ГИП Дудко Антон Михайлович; приказ Д-10 от 18.09.2023; БИН 080440023017; тел. 8-777-048-12-13

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство обогатительной фабрики по переработке руды месторождения Камкор производительностью 500 000 тонн в год в Каркаралинском районе», новое строительство, первый повышенный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, Бесобинский сельский округ, село Камкор

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "14" декабря 2023 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок: Акт на земельный участок от "30" марта 2022 года № 220330182040256 4, изготовленный отделом Каркаралинского района по регистрации и земельному кадастру – филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"____20___года №_____; наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»; № KZ22REA00365193 от 30.11.2023 года; № KZ34REA00360515 от 05.11.2023 года; № KZ16REA00355116 от 04.10.2023 года; № KZ89REA00354287 от 29.09.2023 года;

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»; 318-РП
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(ой) ТОО «СП «Камкор-Сарыарка» от 18.09.2023
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "29" сентября 2023 года; окончание работ "11" декабря 2023 года; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев; фактически, месяц: 4 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового

			комплекса или очереди		комплекса или очереди
Готовая переработка руды	тонн/год	500 000	500 000	500 000	500 000
Общая площадь участка по земельному акту	га	700	700	700	700
Общая площадь участка в пределах подсчета объемов работ	$м^2$	44 921	44 921	44 921	44 921
Общая площадь зданий, в том числе:	$м^2$	2 254,74	2 254,74	2 254,74	2 254,74
- здание главного корпуса обогатительной фабрики;	$м^2$	2 200,74	2 200,74	2 200,74	2 200,74
- здание насосной станции пожаротушения и водоснабжения	$м^2$	54	54	54	54
Общая численность работающих	чел	124	124	124	124

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
в том числе, подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
- однокомнатных						
- двухкомнатных						
- трехкомнатных						
- четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Главный корпус обогатительной фабрики одноэтажный, прямоугольный в плане с размерами в осях 85,0 х 39,3 м.;

состоит из цеха флотации, административного блока, склада реагентов, трансформаторной, венткамеры;

высота цеха флотации до потолочных ограждающих конструкций 12,30 м;

высота склада реагентов и венткамеры 6,1 м;
высота трансформаторной 4,8 м;
высота административного корпуса до ограждающих конструкций потолка 3,0 м.
Конструктивная схема – несущий металлический каркас, состоящий ил «П»-образных рам пролетами 18,0 м, 11,4 м и 9,0 м. Шаг рам 6 м.
Соединение колонн с фундаментами и колонн с балками покрытия в плоскости рам – жесткое. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечиваются установкой вертикальных и горизонтальных связей, прогонов и распорок.
Фундаменты стаканного типа, монолитные, железобетонные.
Наружные стены двух типов, выполненные из сэндвич-панелей:
- трёхслойные стеновые панели, облицованные, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 120 мм;
- трёхслойные стеновые панели, облицованные, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 150 мм
Внутренние стены двух типов, выполнены из кирпича:
- стены толщиной 120 мм, из кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100;
- стены толщиной 380 мм, из кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100.
Утеплитель наружных стен плита пенополистирольная ППС-20, толщиной 100 мм, ГОСТ 15588-2014.
Кровля двух типов: мягкая кровля выполнена ТН КРОВЛЯ Стандарт КВ согласно норм СТО 72746455-4.1.1-2020 и скатная, выполнена из трёхслойных сэндвич-панелей, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 150 мм.
Оконные блоки и витражи выполнены двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30674-99, с толщиной профиля 60 мм. Наружные и внутренние дверные блоки металлические (ГОСТ 31173-2003) и деревянные (ГОСТ 6629-88). Ворота металлические распашные, размеры в плане 4,0 х 4,0 м, ГОСТ 31174-2017.
Полы в производственных помещениях бетонные, в административно-бытовых помещениях из керамической плитки.
Отделка помещений: стены – окраска водоэмульсионными составами по штукатурке на цементно-песчаном растворе М75; керамическая плитка: потолки – подвесные марки ARMSTRONG, из минерального волокна, с размерами плиток 600 х 600 мм, толщиной 12 мм.
Монтажные площадки выполнены в соответствии с требованиями СП РК EN 1993.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:
Дробильно-сортировочный комплекс, (ДСК);
Насос 3XRm/28-1.5 (с пультом управления) 20 м – 1 шт;
Насос 4XR12/30-7.5 (с пультом управления) – 1 шт;
Насос XST 50-160/55 380 В 5,5 кВт – 1 шт;
Насос К 200-150-315-СД с – 2 шт;

Дробилки: конусные, мелкого и среднего дробления (в комплекте), предназначены для дробления рудных и нерудных ископаемых – 2 шт;
Дробилка щековая – 1 шт;
Механическая флотомашина (BF-10) – 18 шт;
Механическая флотомашина (BF-4) – 3 шт;
Шаровая мельница (в комплекте) MQY2745-A – 2 шт;
Шаровая мельница (в комплекте) MQY2745-B – 1 шт;
Шаровая мельница (в комплекте) MQY2745-C – 1 шт;
Балка концевая подвесная грузоподъемностью 2 т, под пролет Lnp = 6 – 1 шт;
Кран мостовой электрический однобалочный опорный, грузоподъемностью Q = 2,0 тн, Lnp = 7,5 м, H = 6 м; 1 шт;
Кран мостовой электрический однобалочный опорный, грузоподъемностью Q = 5,0 тн, Lnp = 16,5 м, (12 м + 4,5 м) H = 9 м; 1 шт;
Кран мостовой электрический однобалочный опорный, грузоподъемностью Q = 16,0 тн, Lnp = 16,5 м, (12 м + 4,5 м) H = 9 м; ОПИ; 1 шт;
Электродвигатель JS 127-8, 130 KW; 1 шт;
Электродвигатель JS 128-8, 155KW; 1 шт;
Электродвигатель YRT 500 L6-8, 480 KW; 1 шт
Укладчик радиальный с шириной ленты B = 800 мм, длиной L = 18 500 мм, мощностью электродвигателя N = 18,5 кВт; 1 шт

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): Всего без сметы тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 495 581,576 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 873 453,552 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 622 128,024 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство обогатительной фабрики по переработке руды месторождения Камкор производительностью 500 000 тонн в год в Каркаралинском районе»

по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинский район, Бесобинский сельский округ, село Камкор принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ТОО «СП «Камкор-Сарыарка» _____ **Жунусов Шалкар Алматаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Нұрай эксперт»**

(наименование организации)

Директор Дюсенбекова Мейрамгул Бариевна _____

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Рысбек Еркінбай Қарымсақұлы _____

аттестат № KZ21VJE00081881; 18.07.2023; несущие и ограждающие конструкции

аттестат № KZ68VJE00081617; 30.06.2023; инженерные сети

аттестат № KZ09VJE00081418; 22.06.2023; технологическое оборудование

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1) разработчик проекта

ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»

Директор Хен Евгений Владимирович _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ЭкоПромАстана-NS» _____ **Жумагалиев Ермек Конысбекович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство обогатительной фабрики по переработке руды месторождения Камкор, производительностью 00 000 тонн в год в Каркаралинском районе	1	-	30	2895,86	24078,15	2204,41	-	2204,41	13504	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство – брусчатка, тротуары				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
монолитный железобетонный	сэндвич-панели	сэндвич-панели	местное	централизованное	местное	-	септик	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная			2204,41				
Вспомогательная			-				

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	**Всего**
9	10	11	12	13	14	15	16	17
								2204,41
								-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы
2. Экспликация к поэтажным планам
3. Экспликация (ТЭП) и план земельного участка ($м^2$)

1. План на отм. 0,000

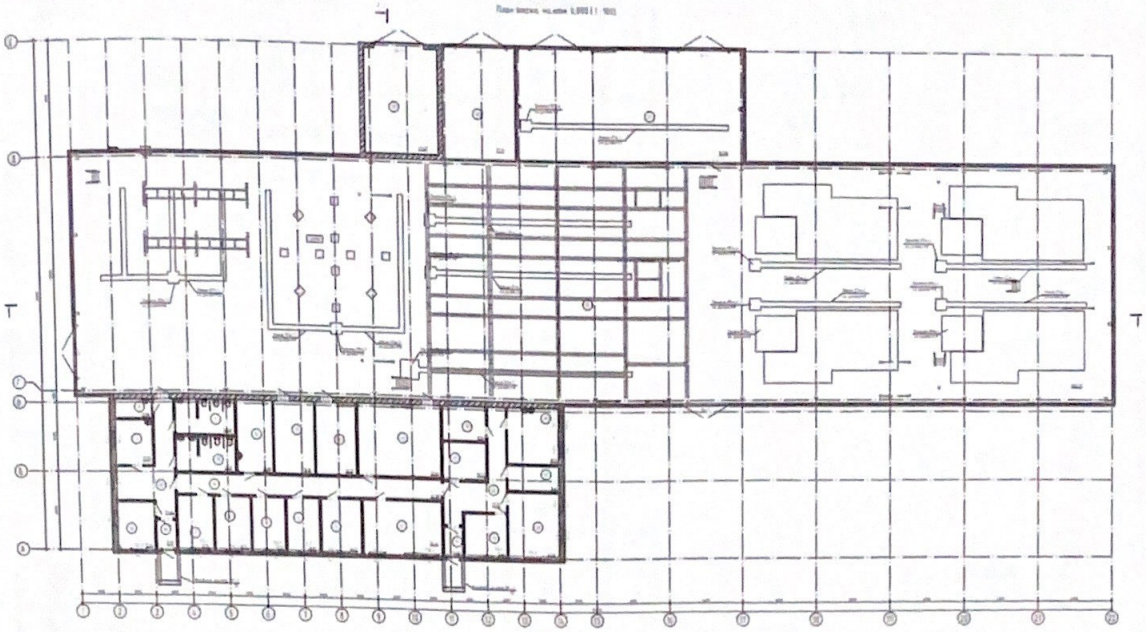

1.1. План на отм. +6.300

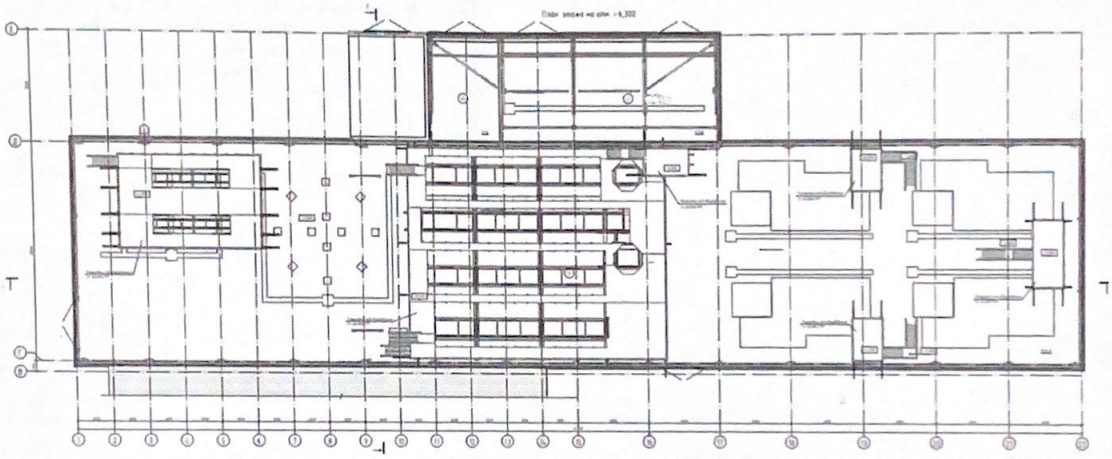

2. Экспликация помещений к поэтажным планам

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Кабинет инженера ОТ И ТБ	11,74	
2	Кабинет технолога	11,74	
3	Кабинет гл. инженера	10,91	
4	Кабинет энергетика	10,91	
5	Кабинет гл. механика	13,43	
6	Кабинет начальника фабрики	26,62	
7	Мед. кабинет	11,00	
8	КУИ	4,66	
9	Сан. узел (жен)	12,40	
10	Сан. узел (муж)	12,31	
11	Комната выдачи нарядов мех. службы	37,62	
12	Комната выдачи наряда технологам	18,12	
13	Комната выдачи наряда энергослужбы	18,12	
14	Чайная	15,88	
15	Диспетчерская	11,57	
16	Коридор	32,98	
17	Гардероб	10,27	Д
18	Склад реагентов	9,39	Д
19	Комната начальника лаборатории	11,41	Д
20	Отделение хим. анализа	21,93	Д
21	Отделение экспресс-анализа	8,41	Д
22	Отделение пробоподготовки	18,92	Д
23	Коридор	21,50	Д
24	Тамбур	3,48	Д
25	Производственный цех	1553,21	
26	Тамбур	3,50	
27	Склад реагентов	161,08	
28	Вен. камера	51,16	
29	Трасформаторная	47,49	
30	Коридор	22,65	

3. Экспликация земельного участка (м^2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
700 га	2895,86	2204,41	691,45	379	13504	6983221,14

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м^2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				6983221,14					

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	**Промышленно-производственных зданий и сооружений**	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2007,69				

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м^2), в том числе							
редприятий щественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		монолитный железобетонный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные стены двух типов, выполненные из сэндвич-панелей: - трёхслойные стеновые панели, облицованные, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 120 мм; - трёхслойные стеновые панели, облицованные, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 150 мм Внутренние стены двух типов, выполнены из кирпича: - стены толщиной 120 мм, из кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100; - стены толщиной 380 мм, из кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/150/2,0/50 ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе М100. Утеплитель наружных стен плита пенополистирольная ППС-20, толщиной 100 мм, ГОСТ 15588-2014.
	2) перегородки		
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	
4	Крыша		Кровля двух типов: мягкая кровля выполнена ТН КРОВЛЯ Стандарт КВ согласно норм СТО 72746455-4.1.1-2020

				и скатная, выполнена из трёхслойных сэндвич-панелей, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 150 мм.
5	Полы	1-го этажа		бетонные, из керамической плитки
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		ПВХ
		двери		металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние		штукатурка, шпаклевка, окраска водоэмульсионными составами, керамическая плитка
		наружные		Наружные стены двух типов, выполненные из сэндвич-панелей: - трёхслойные стеновые панели, облицованные, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 120 мм; - трёхслойные стеновые панели, облицованные, с минераловатным утеплителем по ГОСТ 32606-2012, толщиной 150 мм
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			местный
10	Канализация			местный (септик)
11	Электроосвещение			централизованное
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-

9			на твердом топливе	-
10	Разные работы			отмостка бетонная

Заказчик: **ТОО «СП «Камкор-Сарыарка»**
директор Жунусов Шалкар Алматаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «Строй Бизнес Консалтинг»**
директор Хен Евгений Владимирович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
Марат Д. М.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2023 ж.« 19 » 12

Пронумеровано
Прошнуровано
на 14 листах
Генеральный директор
Жунусов Ш.А.

ҚАРАМ... ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛ...
№ 0022515030 53
ТІРКЕЛГЕН УАҚ... 26.12.23
ТІРКЕЛГЕН УАҚ...
№
09:133:004:158:В
...ЙТЫН МҮЛІК Бегова а/о, Бегова о,
...ЕКТІҢІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ 2 кв. кв. 3, д/а, 41В
...ШІ (МАМА... Кошимшаева Г.Т.
...ОШЫСЫ
Бугетова Д.

ТІРКЕУ / ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
№ 215
2023 ж. « 25 » 12
