Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«09» 01 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар», г. Павлодар, Промышленная зона Северная, стр.332,**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **генерального директора Календарева Тимура Ахатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности»** 2 очередь – осветлитель №1
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Генеральный директор Щемель Олег Анатольевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **АО «ТРЕСТ Средазэнергомонтаж»**
(наименование организаций)
3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ», проект №36-18**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» № П-372 от 09.03.2023г.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность осветлителя номинальная	$м^3$/час	500	-	500	-
Производительность осветлителя максимальная	$м^3$/час	600	-	600	-

Нагрузочный вес осветлителя с водой, изоляцией и шатром	т	1100	-	1100	-
Полный водяной объем	$м^3$	900	-	900	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-$м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Производительность осветлителя максимальная – 600$м^3$/ч, полный водяной объем – 900$м^3$, время пребывания воды в осветлителе – 2,25ч, нагрузочный вес осветлителя с водой, изоляцией и шатром – 1100т, скорость восходящего движения воды в центральной зоне – 2,0мм/сек, скорость восходящего движения воды в выходной зоне – 1,0мм/сек**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 год;**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 год;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10** ;

фактически, месяц: **8** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Генеральный директор Щемель О.А. _____ 09.01.2025

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция водоподготовительной установки (ВПУ) ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» с увеличением производительности»**, 2 очередь – осветлитель №1

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Календарев Тимур Ахатович _____ 09.01.2025

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша
Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2025 жылғы «09» 01

Мердігер (бас мердігер) **«Средазэнергомонтаж Павлодар» ЖШС, Павлодар қ., Солтүстік өнеркәсіптік аймақ, 332-құрылым,**
(ұйым атауы, заңды мекенжайы)
атынан **бас директоры Календарев Тимур Ахатович**
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))
тапсырыс берушісі **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ, Бас директоры Щемель Олег Анатольевич** болып табылатын
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО су дайындау қондырғысының (СДҚ) өнімділігін арттыра отырып, қайта құрылымдау», 2 кезек - №1 тұндырғышты
(объект атауы, орналасқан жері)
объектісі бойынша төмендегіні растайды:

1. Объектідегі құрылыс-монтаждау жұмыстары бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйымдар **«ТРЕСТ Средазэнергомонтаж» АҚ**
(ұйым атауы)

3. **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ-ның 09.03.2023ж. № П-372 бұйрығымен** бекітілген
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекіткен күні)

«СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» ҒӨФ ЖШС, №36-18 жобасы (жобалық-сметалық құжаттамасы)
(жобалық ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізгіштік қабілеті, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылдан ғандарды есепке алғанда)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылдан ғандарды есепке алғанда)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Тұндырғыштың кесімді өнімділігі	$м^3$/сағ	500	-	500	-

Тұндырғыштың максималды өнімділігі	$м^3$/сағ	600	-	600	-
Тұндырғыштың су, оқшаулау және шатырмен жүктеме салмағы	т	1100	-	1100	-
Толық су көлемі	$м^3$	900	-	900	-

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы ауданы	шаршы метр (бұдан әрі-$м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі-$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтерлер саны	пәтерлер ауданы, $м^2$		пәтерлер саны	пәтерлер ауданы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **Тұндырғыштың максималды өнімділігі– 600м3 / сағ, толық су көлемі - 900м3, тұндырғышта судың болу уақыты - 2,25 сағ, тұндырғыштың су, оқшаулау және шатырмен жүктеме салмағы - 1100т, орталық аймақтағы судың өрлеу жылдамдығы - 2,0 мм/сек, шығыс аймақтағы судың өрлеу жылдамдығы - 1,0 мм/сек**

(орналасу ерекшеліктері, негізгі материалдары мен конструкциялары, инженерлік және технологиялық жабдықтары бойынша техникалық сипаттамалары)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылу қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2024 жылғы мамыр;**

(жылы, айы)

жұмыстардың аяқталуы **2024 жылғы желтоқсан;**

(жылы, айы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша, ай: **10** ;

нақты, ай: **8** ;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдықтар мен бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
9-1. Жобалық-сметалық құжаттамада жергілікті қамту үлесі _____% көзделген және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттардың (құрылыстардың) атқарушылық геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты жұмысын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер:
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ Бас директоры Щемель О.А. 09.01.25
(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)
12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес және жүргізілген зертханалық өлшеулер нәтижелері бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптамалық қорытындымен расталады (сараптамалық қорытынды қоса беріледі);
13. Тұрғындардың қозғалысы шектеулі тобы үшін қолжетімділік қамтамасыз етілген, оны тұрғындарды әлеуметтік қорғау органдары растайды
_____;
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)
Мердігер (бас мердігер) **«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» АҚ 3-ЖЭО су дайындау қондырғысының (СДҚ) өнімділігін арттыра отырып, қайта құрылымдау».** 2 кезек - №1 тұндырғышты _____ объектісін
(объект (кешен) атауы)
пайдалануға қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстары мен арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзіміне сәйкес объектінің құрылысы кезінде өзінің кінәсінен пайда болған ақауларды жоюға міндеттенеді.

Мердігер (бас мердігер)
Календарев Тимур Ахатович 09.01.2025.
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні)
Мөр орны (болған жағдайда)

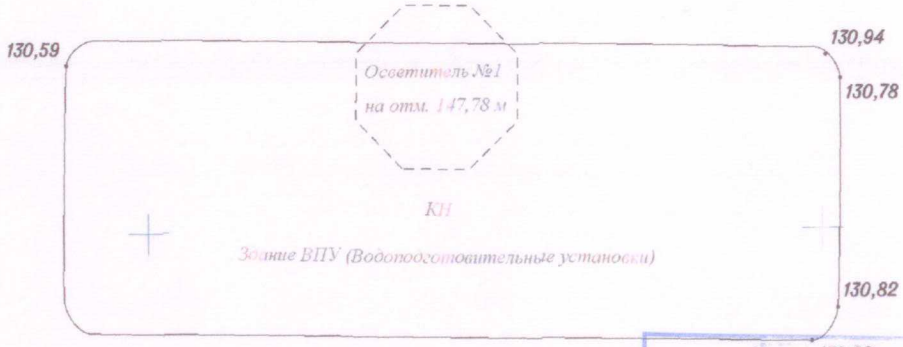

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ДЕРЕКТЕР КОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 08-06-01-12/1576
2024 ж. «23» 12

Примечание:

1. Система высот: Балтийская
2. Система координат: Городская
3. При необходимости точного определения местоположения подземных коммуникаций (проектировании и производстве земляных работ) вызвать на место представителей эксплуатирующих организаций
4. Перед выполнением строительных работ дополнительно согласовать местонахождение подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями

РГП "Госградкадастр"						
Объект	Промышленная зона Северная, строение 332, (Здание ВПУ и Осветитель №1)					
Заказчик	ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"					
Кадастровый план территории (Исполнительная съемка)						
Директор		Семилова Л.К.	Дата	Масштаб	Лист	Листов
Гл. спец.		Коржумбаев Р.Т.	2024г.	1:500	1	1
