"Степногорск қаласының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Кіріс № 01-32/14
26 11 2020 ж.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Сатиков Б.Б.
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2020 ж. «24» 12

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Степногорск. **«25» ноября 2020 года.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Степногорска" руководитель - Жумабаев К.К. Акмолинская область, г.Степногорск, микрорайон 4, здание 1.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) **от 25.11.2020 года консорциум: ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» президент Лян Анатолий Николаевич г.Алматы ул.Айтеке Би, 202 и ТОО «М.М.Снабсервис» г.Нур-Султан пр.Аль-Фараби, 37 директор Накенов Марат Сарсенович**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **от 25.11.2020 года ТОО «Мерей - Тайынша» директор - Кульчманов Алексей Кайнуллаевич, эксперт - Дубинка Валерий Николаевич KZ20VJE00033787, KZ46VJE00036326, KZ47VJE00033786, от 04.02.2013 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **от 25.11.2020 года ТОО «SANСтройСервис» директор - Клёсов Андрей Анатольевич, эксперт - Максимов Максим Владимирович аттестат №KZ32VJE00020767, от 01.11.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство сорока пяти квартирного жилого дома в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 4)»- новое строительство
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. №9 участок №96**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«12» декабря 2017 года № 2342 договор временного безвозмездного землепользования**

(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от **«12» декабря 2017 года №а-12/578 Постановление акимата города Степногорска**

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного- архитектурно строительного контроля Акмолинской области», № KZ06REA00196507 от 21.10.2020 года.

(наименование органа, принявшего уведосмление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «SANСтройСервис» Заказ: № 104/17 2017г.

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) **Государственным учреждением «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Степногорска» приказом № 52Б от 10 июля 2018 г. на основании Заключения №ЭЦКос-0071/18 от 10.07.2018 года ТОО «SANСтройСервис»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **06.11.2019 г;**

месяц, год

окончание работ **28.10.2020 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, **6,1** месяца;

фактически, **11,7** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м²)	3111,54	3111,54
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м³)	12533,86	12533,86
В том числе подземной части	м³	1740,27	1740,27
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	нет	нет

Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая	жилая	общая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	45	2381,45	1386,7	45	2381,45

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

- Уровень ответственности здания - II
- Класс конструктивной пожарной опасности здания - С1
- Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф13
- Класс пожарной опасности строительных конструкций - К1
- Степень огнестойкости - III
- Класс комфортности - IV
- Класс энергоэффективности здания «В» - высокий
- Требования к обеспечению доступа для инвалидов и маломобильных групп населения - входные группы с устройством пандуса для МГН с наклонными лестничными подъемниками «PTU-2» для подъема на 1 этаж.
- Наружные стены - облегченная многослойная кирпичная кладка по серии 2.130-8 вып.0 и вып.1, типВ толщиной 640мм.
- Перегородки - межкомнатные и в санузле из плит ПлГ-667х500х80 межквартирные из плит двойных ПлГ-667х500х80 со слоем звукоизоляции минеральной плиты толщиной 40мм
- Внутренние стены подъездов - кирпичные толщиной 380 мм с вентиляционными каналами, армированные
- Перекрытия - сборные железобетонные по серии 1.141-1, вып 60,64, СТ РК 949-2002
- Крыша - чердачная (с холодным чердаком), сборная, вентилируемая, из деревянных конструкций, с водостоком
- Кровля - металлочерепица МП с покрытием Norman MP 25 мкм
- Утеплитель кровли - плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты «ТЕХНОРУФ Н 30 и 60» марки П100 толщиной 140мм и марки П200 толщиной 50мм
- Водосток - наружный, организованный, пластиковые трубы тип ВК, отвод на поверхность грунта.
- Лестницы - сборные железобетонные на косоурах
- Полы: лестничные площадки, санузлы, лоджии - керамическая плитка ГОСТ 6787-2001 (в санузлах с гидроизоляцией), комнаты - линолеум ПВХ ГОСТ 7251-77 3 мм
- Окна - металлопластиковые из ПВХ профилей ГОСТ 30674-99 с тройным остеклением, в тамбуре и подвале - с двойным остеклением
- Двери - входные стальные ГОСТ 31173-2003, межкомнатные - деревянные ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88 противопожарные по серии 1,236-5 вып.2
- Внутренняя отделка: потолки-натяжные, стены санузлов - керамическая плитка ГОСТ 6141-91, стены комнат - простая штукатурка с затиркой и окраска водоэмульсионной краской ВА-27, стены подъездов: панель - окраска масляной краской, верх - водоэмульсионная краска ВА-27, ВА-17, известковая побелка
- Отмостка - бетонная (бетон В7,5 толщиной 100мм, бортовой камень БР100.20.08) плитами, шириной 1 м по серии 2.110-1, с деформационными швами
- Входные группы - покрытие крылец и пандусов - тротуарная плитка 1.К5В22.5 F200 ГОСТ 17608-91

- Теплоснабжение - от существующей теплосети, с автоматическим регулированием температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, с системой проквартирого отопления, с установкой индивидуальных притборов учета тепла для каждой квартиры, узлы управления на этажах, установлен общедомовой прибор учета тепла.Разводка двухтрубная из полипропиленовых армированных труб, проложеных в полу, радиаторы чугунные МС-90-108 оснащены терморегукляторами RA-N и кранами Маевского. Контроль за потреблением тепла через GSM/GPRS модем, установленный в тепловом пункте.
- Вентиляция - приточно-вытяжная, естественная через вентканалы, в оконных переплетах - приточные клапана
- Водоснабжение - от существующей сети из труб ПЭ 100 SDR17 dn75x4,5 с обводной линией с универсальным многоструйным домовым счетчиком воды «Пульсар» Ду 40. Предусмотрено дистанционная передача данных учета посредством GSMмодема и установленной автоматизированной системы коммерческого учета водоснабжения (АСКУВ). Сеть из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* по подвалу и полипропиленовых труб PPR 80 SDR11 класс1/1,0МПа «Питьевая» по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (стояки и поквартирная разводка).
- Горячее водоснабжение - от теплообменника, расположенного в тепловом пункте. Сеть из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75* по подвалу и чердаку, из полипропиленовых труб PPR 80 SDR11 класс1/1,0МПа «Питьевая» PN20 по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (стояки и поквартирная разводка). В каждой квартире на системах холодной и горячей воды установлены поквартирные счетчики диаметром 15мм
- Канализация - сброс стоков в существующую наружную городскую сеть, внутридомовая сеть из полиэтиленовых труб ø50-110мм по ГОСТ 22689-89 соединения с резиновыми уплотнительными кольцами
- Пожаротушение - внутренне пожаротушение не предусмотрено. Степень огнестойкости ограждающих конструкций - II
- Газоснабжение - не предусмотрено. Установлены электрические плиты.
- Электроснабжение - от ТП существующих общегородских сетей.
- Внутреннее электрооборудование - в соответствии с СН РК 4.04-23-2004
- Молниезащита - в соответствии с СН РК 2.04-29-2005 проектом предусмотрена молниезащита 3-й категории.
- Слаботочные средства связи - установлены на кровле телевизионные антенны тип АТКГ с усилителем. Телефонизация не предусматривается. Установлены домофоны типа «VIZIT». Установлены системы видеонаблюдения: по две камеры на каждый подъезд: в подъездах на вход и на улице перед входом. Установлена автоматизированная система коммерческого учета водоснабжения (АСКУВ).
- Для сбора и временного хранения твердо-бытовых отходов, возле дома в 10м установлены отдельные металлические контейнеры для каждого вида отходов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **454 820** тыс.тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **358 605** тыс.тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **13 929** тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **375 527,934** тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **361 598,934** тыс.тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **13 929,000** тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **объект Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске Акмолинской области (позиция 4)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: руководитель - **Жумабаев К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: эксперт – **Дубинка В. Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: эксперт - **Максимов М.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

МАКСИМОВ М.В.
АТ. № KZ32VJE00020767
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Подрядчик: (генеральный подрядчик) :

Президент ТОО «Корпорация «Астана-Стройинвест» - Лян А.Н.

Директор ТОО «М.М.Снабсервис» - Накенов М. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта: «Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 4)»

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45-ти квартирный жилой дом (позиция 3)	5 (также подвал + чердак)	45		761	12533,86; (1740,27 ниже 0,000)	3111,54 (2311,4)	1386,7		-	139,9

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов				Вид отопления	Благоустройство				
					Не предусмотрено				
фундамент	стены	кровля			электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15		16	17	18	19	20
ленточный из сборных плит и блоков ФБС	керамический кирпич	металлочерепица	Централизов.		Централизов.	Централизов.	Автономное	Централизов.	-

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	45	-	-	-

2	Количество жилых комнат	90	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	2381,45	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	1386,7	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади			Распределение квартир по числу комнат					
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	15	15	15	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-

Заказчик

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Шумабаев К.К

Авторский надзор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

МАКСИМОВ М.В.
АТ. № KZ32VJE00020767
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

«Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 4)»

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

«Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 4)»
Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	ПВ1, сечение 1х10	км	0,01
	ПВ, сечение 1х6,0	км	0,60
	ТРП, сечение 1х2х0,5	км	0,055
	ПВС, сечение 1х2,5	км	0,188
	2) алюминиевые, 1х185мм	км	0,01
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:	-	-
	1) светильники светодиодные	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-

	поливинилхлоридная Ø20мм	км	1,34
	поливинилхлоридная Ø25мм	км	0,194
	поливинилхлоридная Ø40мм	км	0,01
	поливинилхлоридная Ø63мм	км	0,028
23	Заземление (уравнивание потенциалов) и молниезащита		
	Сталь круглая Ø8мм, ГОСТ 2590-2006	км	0,17
	Сталь круглая Ø10мм, ГОСТ 2590-2006	км	0,143
	Сталь круглая Ø16мм, ГОСТ 2590-2006	км	0,036
	Зажим для присоединения круглого проводника	шт	116
	Держатель проводника на кровле	шт	170

Заказчик Шумабаев КК

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Максимов Максим Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

МАКСИМОВ М.В.
АТ. № KZ32VJE00020767
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта «Строительство 45-ти квартирного жилого дома в городе Степногорске (позиция 4)»

(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	-	-
	1) из стальных труб	м	-	-
	2) из чугунных труб	м	-	-
	3) из асбестоцементных труб	м	-	-
	4) из полиэтилена	м	-	-
	5) из железобетонных труб	м	-	-
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	420	-
	1) из стальных труб	м	90	
	ВГП оцинкованные Ø50х3,5	м	14	система В1
	ВГП оцинкованные Ø32х3,2	м	8	В1
	ВГП оцинкованные Ø25х3,2	м	25	В1
	ВГП оцинкованные Ø20х2,8	м	27	В1
	ВГП оцинкованные Ø15х2,8	м	16	В1
	электросварная Ø76х2,8	м	4,5	
	ВГП Ø40х3,0	м	0,5	Водомерный узел
	ВГП Ø32х2,8	м	0,1	Водомерный узел
	ВГП Ø15х2,5	м	0,2	Водомерный узел
	ВГП оцинкованные Ø50х3,5	м	5,0	системы Т3, Т4
	ВГП оцинкованные Ø40х3,5	м	2,5	системы Т3, Т4

Приложение 2.1

№п.п.	Этаж	Блок-секция	№ квартиры	Общая площадь	Жилая площадь
1.	1	1	Квартира №1 – 3х	67,65	45,37
2.	1	1	Квартира №2 – 1но	35,81	16,26
3.	1	1	Квартира №3 – 2х	55,26	30,78
4.	2	1	Квартира №4 – 3х	67,65	45,37
5.	2	1	Квартира №5 – 1но	35,81	16,26
6.	2	1	Квартира №6 – 2х	55,26	30,78
7.	3	1	Квартира №7 – 3х	67,65	45,37
8.	3	1	Квартира №8 – 1но	35,81	16,26
9.	3	1	Квартира №9 – 2х	55,26	30,78
10.	4	1	Квартира №10 – 3х	67,65	45,37
11.	4	1	Квартира №11 – 1но	35,81	16,26
12.	4	1	Квартира №12 – 2х	55,26	30,78
13.	5	1	Квартира №13 – 3х	67,65	45,37
14.	5	1	Квартира №14 – 1но	35,81	16,26
15.	5	1	Квартира №15 – 2х	55,26	30,78
16.	1	2	Квартира №16 – 3х	67,78	45,48
17.	1	2	Квартира №17 – 1но	35,81	16,26
18.	1	2	Квартира №18 – 2х	55,26	30,78
19.	2	2	Квартира №19 – 3х	67,78	45,48
20.	2	2	Квартира №20 – 1но	35,81	16,26
21.	2	2	Квартира №21 – 2х	55,26	30,78
22.	3	2	Квартира №22 – 3х	67,78	45,48
23.	3	2	Квартира №23 – 1но	35,81	16,26
24.	3	2	Квартира №24 – 2х	55,26	30,78
25.	4	2	Квартира №25 – 3х	67,78	45,48
26.	4	2	Квартира №26 – 1но	35,81	16,26
27.	4	2	Квартира №27 – 2х	55,26	30,78
28.	5	2	Квартира №28 – 3х	67,78	45,48
29.	5	2	Квартира №29 – 1но	35,81	16,26
30.	5	2	Квартира №30 – 2х	55,26	30,78
31.	1	3	Квартира №31 – 2х	55,26	30,78
32.	1	3	Квартира №32 – 1но	35,81	16,26
33.	1	3	Квартира №33 – 3х	67,65	45,37
34.	2	3	Квартира №34 – 2х	55,26	30,78
35.	2	3	Квартира №35 – 1но	35,81	16,26
36.	2	3	Квартира №36 – 3х	67,65	45,37
37.	3	3	Квартира №37 – 2х	55,26	30,78
38.	3	3	Квартира №38 – 1но	35,81	16,26
39.	3	3	Квартира №39 – 3х	67,65	45,37
40.	4	3	Квартира №40 – 2х	55,26	30,78
41.	4	3	Квартира №41 – 1но	35,81	16,26
42.	4	3	Квартира №42 – 3х	67,65	45,37
43.	5	3	Квартира №43 – 2х	55,26	30,78
44.	5	3	Квартира №44 – 1но	35,81	16,26
45.	5	3	Квартира №45 – 3х	67,65	45,37

Заказчик _____ К.К.Жумабаев

Авторский надзор _____

МАКСИМОВ М.В.
АТ. № KZ32VJE00020767
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Строительство 45 квартирного жилого дома в г. Степногорске (площадка 4)

План первого этажа

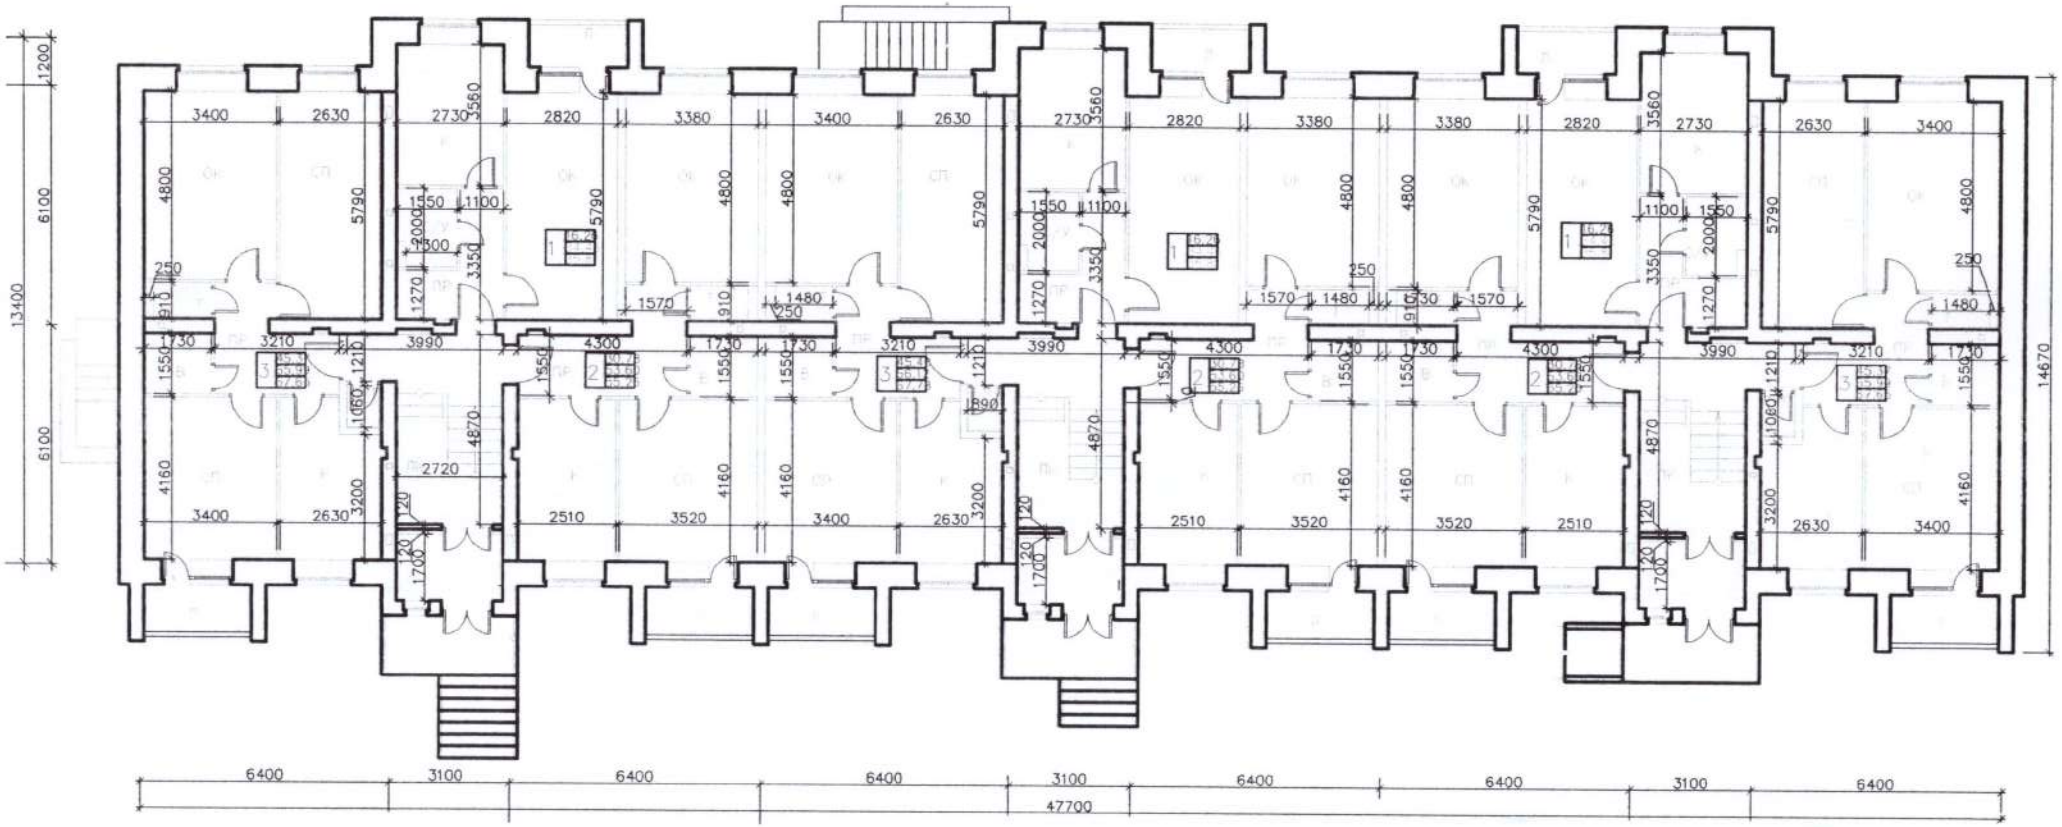

МАКСИМОВ М.В.
АТ. № KZ32VJE00020767
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Строительство 45 квартирного жилого дома 5 в. Отеннозорске (позиция 4)

План второго этажа

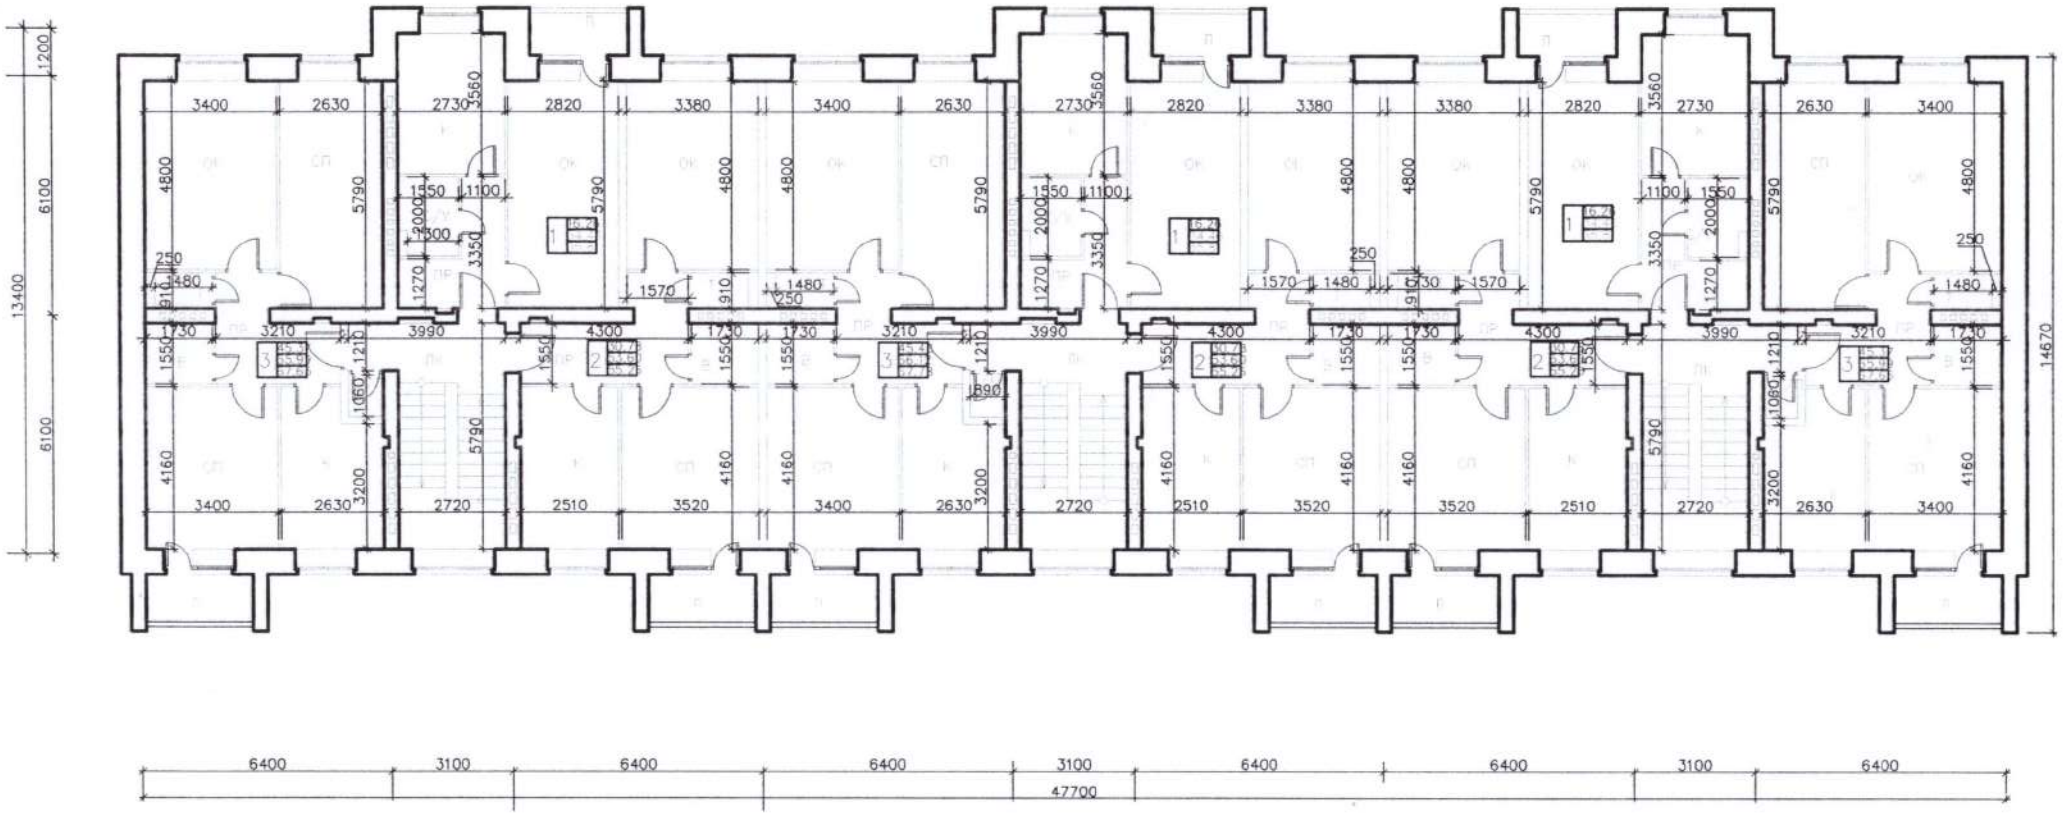

МАКСИМОВ М.В.
АТ. № KZ32VJE00020767
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
