«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2024 ж.« 10 » 06

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 06 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектруы и градостроительства ВКО», 060140003830, 8(7232)262730, 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «10» 06 **2024 г. ТОО «ЭЛХОН», Казанов Ж.Б., ВКО, Глубоковский район, с. Прапорщиково, Учетный квартал 064,1, БИН 040540002030, 87232263282,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) работ **от «11» 06 2024 г. ТОО «Темерканов и КО», эксперт Айтказин Т. KZ67VJE00052729 от 12.02.2020 г.; KZ63VJE00052219 от 16.01.2020г., БИН 171140009825**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «11» 06 2024 г. ТОО «ГРАДОПРОЕКТ» , руководитель группы авторского надзора по приказу №11-23/3 от 24.11.2023 г. Зенкова А.В., БИН 080840008993, +77051488890;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену и дневным стационаром на 4 койки в селе Прапорщиково Глубоковского района ВКО», уровень ответственности–II, нормальный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **ВКО, Глубоковский район, Иртышский с.о., с.Прапорщиково**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » 2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа **право временного безвозмездного землепользования, площадью 0,48 га (кадастровый номер 05-068-064-663), Распоряжение акима Иртышского сельского округа от 12.08.2021 года № 52;**

Scanned with CamScanner

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20 __ года № _____ наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО» KZ25REA00348261 от 23.08.2023 г.**
наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ПК «СемейПроект», 83**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», №15 от 02.03.2022 г.**
дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2023 года**;
месяц, год
окончание работ **май 2024 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: 10;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Мощность (количество посетителей)	чел-смену	25	25	25	25
Площадь застройки	кв.м	658,10	658,10	658,10	658,10
Общая площадь зданий	кв.м.	558,57	558,57	558,57	558,57
Строительный объем зданий	куб.м	2456,20	2456,20	2456,20	2456,20
Продолжительность строительства	мес.	4,0	4,0	10	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема;

Жилой дом имеется следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		

Число этажей,	этаж				
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м³)				
В том числе подземной части	м³				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²				
Показатели	По проекту			Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м²
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных, четырехкомнатных и более					

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, размерами в осях 46,40х13,00 м. Высота этажа – 3,0 м. Конструктивная схема здания – перекрестно-стеновая, с продольными и поперечными несущими кирпичными стенами. Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой стен и плиты перекрытия, рассматриваемых как жесткие неизменяемые диски.

Фундаменты под стены – ленточные железобетонные.

Наружные и внутренние стены здания и перегородки – из керамического кирпича на смешанных цементных растворах. Толщина наружных и внутренних стен – 380 мм, перегородок – 120 и 250 мм.

Перемычки – монолитные железобетонные из бетона, армированы пространственным каркасом из стержневой арматуры.

Плита перекрытия – монолитная железобетонная, из бетона, армированы сетками из стержневой арматуры в нижней и верхней зоне.

Крыша – чердачная, с несущими деревянными стропильными элементами. Кровля –, скатная, чердачная, с покрытием из металлочерепицы по деревянной обрешетке, утеплитель – плиты толщиной 170 мм. Выход на чердак – через люк, на кровлю через слуховые окна.

По периметру наружных стен выполняется отмостка шириной 1,50 м. Крыльца – из бетона. На входах предусмотрены вертикальные подъемные платформы.

Отделка фасада – декоративная штукатурка, сплитерная плитка, утепление – плиты теплоизоляционные толщиной 100 мм.

Внутренняя отделка. Потолок – подвесной потолок, армстронг, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска. Стены – штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, акриловая, масляная краска, керамическая плитка. Покрытие пола – керамическая плитка, линолеум.

Витражи - индивидуального изготовления из ПВХ профиля.

Окна – металлопластиковые с заполнением двухкамерными стеклопакетами.

Двери – деревянные и металлические индивидуального изготовления, противопожарные.

Внутренние сети водопровода и канализации выполнена на основании: технических условий, выданных б/н от 24.05.2021 года; дополнения к техническим условиям б/н от 28.12.2021 года.

В здании предусмотрены следующие системы водоснабжения и канализации:

– система хозяйственно-питьевого водопровода;

– трубопровод горячего водопровода;
– система бытовой канализации.

Система водоснабжения запроектирована для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды работников здания и технологические нужды.

Система горячего водоснабжения - закрытая. Сети системы горячего водоснабжения запроектированы от электрокотельной, расположенной на территории амбулатории.

Наружные сети водопровода и канализации. Водоснабжение объекта предусмотрено от существующей водопроводной сети диаметром 150 мм по ул. Мира.

Электротехнические решения запроектирован на основании – технических документов и технических условий №02-20/2954 от 13.07.2021 года на электроснабжение. Типовым проектом предусматриваются следующие виды связи и сигнализации: охранно-пожарная сигнализация; телефонизация; структурированная кабельная сеть; радиофикация; система оповещения пациентов об освобождении кабинетов. Телефонизация предусматривается от городской телефонной сети, согласно ТУ № 4-14/01-21/Л от 26.01.2021 года.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **564,677 млн. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **357,048 млн. тенге**, оборудование **116,645 млн. тенге**; прочие **90,984 млн. тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **511 636 087,62** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **357 048 000** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **116 645 000** тенге, прочие **90 984 00** тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену и дневным стационаром на 4 койки в селе Прапорщиково Глубоковского района ВКО», уровень ответственности–II, нормальный.

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик

Заместитель руководителя Тойкенов Саят Ерланович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати

Технический надзор

1) аккредитованная организация ТОО «Темерканов и КО» директор Темерканов Д.Т.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестационного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Айтказин Т. специализация – по объектам второго и третьего уровней ответственности в части инженерных сетей от 12.02.2020г., по объектам второго и третьего уровней ответственности в части несущих и ограждающих конструкций от 16.01.2020г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ГРАДОПРОЕКТ» директор Грохотов А.Н.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати

руководитель группы авторского надзора по приказу №11-23/3 от 24.11.2023 г. Зенкова А.В

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Казанов Ж.Б. директор ТОО «ЭЛХОН»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену и дневным стационаром на 4 койки в селе Прапорщиково Глубоковского района ВКО»	1		48	658,10		558,57	495,79			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электро-снабжение	водо-снабжение	горячее водо-снабжение	канали-зация	газо-снабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
ленточный	кирпич-ные	скатная, чердачная, с покрытием из металлочерепицы	электрическая система	ТУ №02-20/2954 от 13.07.2021 г.	ТУ от 24.05.2021 г.	от электро-котельной, располо-женной на территории амбулатории	сток	нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади			Распределение квартир по числу комнат					
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных,

							банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий сооружений	Здравоохранения, и лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			558,57					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: прилагается

2. Экспликация к поэтажным планам: прилагается

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под постройками и прочими сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
4800						

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
				в том числе					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		ленточные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпичные
	2) перегородки		Кирпичные
3	Перекрытия	чердачное	плита покрытия-монолитная железобетонная, с несущими деревянными стропильными элементами
		междуэтажное	
4	Крыша		Скатная, металлочерепица по деревянной обрешетке
5	Полы	1-го этажа	керамическая плитка, линолеум
		последующих этажей	
6	Проемы	окна	металлопластиковые с заполнением двухкамерными стеклопакетами
		двери	деревянные и металлические индивидуального изготовления, противопожарные
7	Отделочные работы	внутренние	Потолок – подвесной потолок, армстронг, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска. Стены – штукатурка, сплошное выравнивание сухими смесями, водоэмульсионная окраска, акриловая, масляная краска, керамическая плитка. Покрытие пола – керамическая плитка, линолеум
		наружные	декоративная штукатурка, сплитерная плитка, утепление – плиты теплоизоляционные
8	Горячее водоснабжение		закрытая система от электрокотельной, расположенной на территории амбулатории
9	Водопровод		технических условий, выданных б/н от 24.05.2021 года, КГП «Кировский»; дополнения к техническим условиям б/н от 28.12.2021 года, выданные КГП «Кировский».
10	Канализация		сток
11	Электроосвещение		рабочее и аварийно-эвакуационное
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	
16		от индивидуальной отопительной установки	модульная котельная
17			на твердом топливе
18			на газе

19	от	районной	на	твердом
	котельной		топливе	

20 Разные работы

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	
Высота строения (м)	
Объем строения (м 3)	
Фундамент	
Стены	
Перекрытия	
Крыша	
Полы	
Окна	
Двери	
Внутренняя отделка	
Наружная отделка	
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	
Полы	
Перекрытия	
Проемы	окна
	двери
Отделочные работы	внутренние
наружные	
Разные работы	
Итого:	
Фундамент	
Стены и перегородки	
Крыша	

Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя Тойкенов Саят Ерланович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

руководитель группы авторского надзора Зенков А.В. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

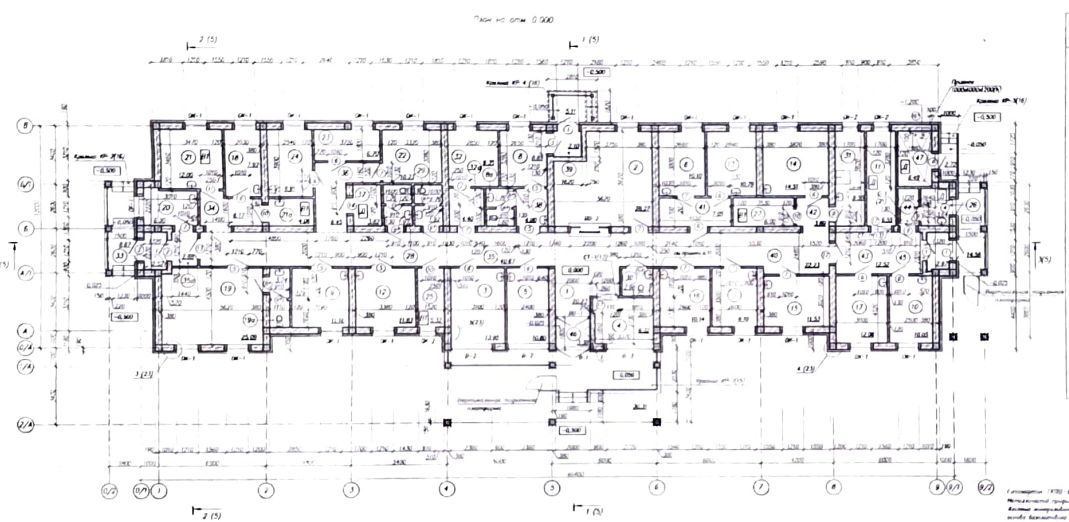
План на отм. 0.000
Кладовая №1-Х(16)
Кладовая №1-Х(16)
Кладовая №1-Х(16)
Кладовая №1-Х(16)
Помещение ПАНДУСА ТАКСИ
-0.300
-0.300
-0.300

Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ**	**километр (далее – км)**	**6,20364**
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	**Опоры:**	штук (далее – шт)	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы		
7	**Провода:**	км	
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые		
8	**Кронштейны для светильников:**	шт	
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические		
9	**Арматура уличного освещения:**	шт	
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами		
10	**Кабели:**		
	1 Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвббШв 1х1800	**км**	**6,03024**
	2. Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВббШв 4х185 (ок) – 1	**км**	**0,1734**
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя Тойкенов Саят Ерланович _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

руководитель группы авторского надзора Зенков А.В. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Подпись

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Глубокое аудандық бөлімі

Өтініш № 00225889210 Тіркелген күні 24.06.24

Кадастрлық нөмірі 05:068:064:668 Берілген уақыты 15.33

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы

Тіркеуші қызметкер

Бөлім басшысы

«МЕМЛЕКЕТТІК САУАЛНАМА ЖӘНЕ ГЕОДЕЗИЯ ОРТАЛЫҒЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ
Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы
МЕМЛЕКЕТТІК КӘРІПТЕСІ КАДАСТРЛЫҚ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫ
20 24 ж. «11» 05 20
№ 108031

Граница по идентификационному документу (условно) Система координат местная Балтийская система высот	ШКО, Глубокое ауданы ВКО, Глубоковский		
Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата	Топографическая съёмка участка с. Прапорщиково, ул. Мира, район Дома культуры (кад.ном.05-068-064-663)		
Директор Бердаулетов	Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" Ген.подрядчик - ТОО "ЭЛХОН"	кезеп стадия	парақ/парақтар лист/листов	масштаб
Проверил Бердаулетов				
	ТОО "КТН Проект" лицензия № 23028017 от 27.12.2023 г.			

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОД УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» «КТН-Проект»
