Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27 » декабря 2024 года

Заказчик КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич, БИН 030140002400, тел.:87152462231, 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: ***Договора №48 от «11» марта 2024 года***

Декларации о соответствии (прилагается) от «27» декабря 2024 года, ТОО «Clima Eng», Лицензия: №14001985 от 10.02.2014 г., директор Абдиев Марат Джазыбекович. Атырауская область, г. Атырау, микрорайон Самал, ул. Карабура, 16, БИН 130240008355, тел.: +77018882513

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «27» декабря 2024 года, ТОО "Alem Construction Group" , эксперт по техническому надзору Исаков Еркебулан Сериккалиевич, аттестат №KZ83VJE00024699 от 30.03.17 г., №KZ89VJE00023912 от 10.03.17 г., №KZ81VJE00081286 от 15.06.23 г., БИН 130440021578, тел.: +77073207299

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «27 » декабря 2024 года ТОО «Севгражданпроект», эксперт по авторскому надзору Каирбеков Алибек Тоганбекович, атестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.19 г., БИН 980340001576

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей), новое строительство, уровень ответственности II–нормальный уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, Акжаркынский с.о., с.Акжаркын

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «27» 12 2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение акима Акжарского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области от 21 февраля 2024 года года №01-р

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

архитектурно-планировочного задания (АПЗ) №KZ24VUA00851986 от 7 марта 2024 года, выданное КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»

наименование органа, вынесшего решение

2) талоны о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» №KZ05REA00395278 от 05.06.24 г., KZ23REA00416973 от 09.09.24 г., KZ54REA00423981 от 10.10.24 г., KZ75REA00433691 от 25.11.24 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО "КазНИИСА", 158.17

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

утвержденного(й) приказом №11 от 18.01.24 г. КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО» _____

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2024 года;

окончание работ: декабрь 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3

фактически, месяц: 7;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
мощность	Посещ. в смену	25		25	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период __ месяц;

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Медицинский пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	154,7	154,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	903,4	903,4
В том числе ниже ноля	м3	0	0
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурно - строительные решения:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении. В плане медицинский пункт имеет прямоугольную форму с размерами в осях 13,0х12,2м. Высота этажа принята 3,00 м в чистоте.

В здании запроектированы основные и вспомогательные помещения, следующие: вестибюль, тамбура, справочная, хозяйственно-бытовое помещение, коридоры, универсальный санузел, помещение уборочного инвентаря, техническое помещение, физиотерапевтический кабинет, процедурная, кабинет среднего медперсонала, помещение хранения дезинфицирующих средств, аптечный пункт.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусмотрен пандус.

Чердак перекрыт односкатной кровлей с неорганизованным водостоком. В наружной отделке фасадов применена декоративная штукатурка по утеплителю с окраской согласно утвержденному эскизному проекту ЭП.

Окна - из поливинилхлоридных профилей. Откосы оконных проемов выполнены из ПВХ пластика с утеплением минплитой.

Снаружи откосы выполнены улучшенной штукатуркой с выравниванием сухими смесями и покраской вододисперсионной влагостойкой краской. В качестве отливов применены отлив оцинкованный, индивидуального заводского изготовления. Двери - деревянные, металлические. Полы - с покрытием из линолеума, керамогранит неполированный, наливной пол «Алинекс». Полы выполнены по армированной бетонной подготовке. Отделка внутри помещений – потолок с выравниванием сухими смесями в 2 слоя и покраской вододисперсионной влагостойкой матовой покраской за 2 раза(белая); Стены – улучшенная штукатурка 10 мм выравниванием сухими смесями 5 мм покраской вододисперсионной влагостойкой матовой покраской за 2 раза.

В местах установки сан. приборов- облицовка керамической плиткой.

Отмостка - бетонная h-150 мм. на щебеночном основании h-70 мм, шириной 1000 мм. За относительную отметку 0,000 принят уровень пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 134,050.

Конструктивные особенности здания:

Фундаменты – ленточный высотой 300 мм, из бетона кл. С20/25, W6, F75 на сульфатостойком цементе, ФБС 3 ряда.

Наружные стены - кирпичные толщиной 510 мм из полнотелого керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50, на цементно-песчаном растворе марки М100.

Утеплитель стен - толщиной 130 мм плотностью 160 кг/м³

Внутренние несущие стены - кирпичные толщиной 380 мм из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе марки М75, армированные через каждые 4 рядов кладки сеткой с ячейками 50х50мм из проволоки Ø4Вр1.
Перегородки - кирпичные толщиной 250 мм и 120 мм из керамического кирпича Крр-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 на цементно-песчаном растворе марки М75, армированные через каждые 4 рядов кладки сеткой с ячейками 50х50мм из проволоки Ø4Вр1.
Перемычки - железобетонные брусковые.
Плиты покрытия - железобетонные многопустотные толщиной 220 мм.
Кровля - односкатная из профлиста НС 44-1000-0,8 устраиваемая по деревянному каркасу
Водосток - наружный, неорганизованный.

Инженерные сети: (ВК, ОВ и т.д.)

Отопление

Система отопления медицинского пункта - выполнена двухтрубная тупиковая с нижней разводкой. В качестве отопительных приборов установлены биметаллические радиаторы "РБС-500"(q=165 вт/секц.). Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется терморегуляторами типа RTR-N 15. Удаление воздуха из радиаторов системы отопления производится через краны Маевского, установленных в верхних пробках нагревательных приборов. Запорная и спускная арматура - шаровые краны. Трубопроводы медицинского пункта - металлополимерные трубы и из стальных водогазопроводных труб. Металлополимерные трубы проложены в конструкции пола в гофротрубе на расстоянии 200 мм от плинтусов стен. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок проложены в гильзах из негорючих материалов; края гильз на одном уровне с поверхностями стен.

Вентиляция

Вентиляция здания с естественным механическим побуждением. Количество вентиляционных систем принято с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных и противопожарных норм. Самостоятельные приточные системы вентиляции приняты для групп помещений, имеющих одинаковые параметры воздуха и режим работы. Самостоятельные вытяжные системы предусмотрены в соответствии с заданием ТХ и соблюдением санитарных норм по удалению воздуха. Для притока используются приточные клапаны с фильтрацией наружного воздуха и электроподогревом в физиотерапевтическом кабинете и аптеке. Вытяжка-естественная и механическая с установкой настенных и потолочных вентиляторов. Вентиляторы энергосберегающие, оборудованы регуляторами скорости для более точного регулирования параметров расхода и напора. Для воздухораспределения, приняты вытяжные регулируемые решетки типа РВ. Воздуховоды выполнены из ПВХ пластика заводского изготовления.

Водопровод

- Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена от существующего водопровода.

Подача воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена от существующих наружных водопроводных сетей питьевой воды. Источником горячей воды является накопительный водонагреватель 150 литров Ariston, мощностью 2,2 кВт. Средняя температура горячей воды равна 65 С. В процедурном кабинете предусмотрен электронагреватель непрерывного действия Ariston 30л, мощностью 1,5 кВт. Подводящие трубопроводы В1 и Т3 в коридорах выполнены в конструкции пола. Умывальники в процедурной и прививочных кабинетах оборудованы локтевым однорычажным смесителем, с длинным

изливом. В техническом помещении (узел ввода и теплового узла) предусмотрен приямок для опорожнения. Откачка воды из приямка в помещении ввода осуществляется погружным насосом марки ГНОМ 7-7, производительностью 7м3/час, напором 7м. Выпуск выполнен на отмостку.

Канализация

Система канализации - хозяйственно-бытовая.

- Вся сеть канализации выполнена из полиэтиленовых канализационных труб Ø110мм.
- Соединение труб в раструб на каучуковых уплотнительных кольцах. Система хозяйственно-бытовой канализации приняты пластмассовые канализационные ПВХ и проложена над полом и в конструкции пола.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 156,302 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ по 106,206 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 26,217 млн тенге, прочие затраты 23,879 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 145,346 млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 104,081 млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 25,692 млн. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания - В;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство медицинского пункта в селе Акжаркын Акжарского района Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей) принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: руководитель КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» Галеев Кайрола Тюлюевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аккредитованная организация ТОО «Alem Construction Group»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный эксперт: Исаков Еркебулан Сериккалиевич аттестат №KZ83VJE00024699 от 30.03.17 г., №KZ83VJE00023912 от 10.03.17 г., №KZ81VJE00081286 от 15.06.23 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) организация ТОО «Севгражданпроект»: Брагин К.Е

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

место печати (при наличии)

2) аттестованный эксперт Каирбеков Алибек Тоганбекович, атестат №KZ44VJE00046450 от 13.05.19 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Clima Eng» директор: Абдиев Марат Джазыбекович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленны, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство медицинского пункта в селе Акжарлын Акжарского района Северо-Казахстанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	1	-	15	223,15	903,4	154,7	-	154,7	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Фундамент - ленточный высотой 300 мм, из бетона кл. С20/25, W6, F75 на сульфатостойком цементе, ФБС 3 ряда	Наружные стены из керамического кирпича 510мм, утеплитель толщиной 130мм и декоративная штукатурка. Внутренние несущая стена - из керамического кирпича толщиной 380мм.	Кровля скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам.	Источником теплоснабжения служит автономная котельная с электрическими водогрейными котлами ЭВН-К-12-КОМБО, Q=12кВт, Tmax=85°C, Py=1.5бар. Теплоносителем для системы отопления здания является горячая вода с параметрами 85-65°C.	да	да	нет	да	нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	- -			
2	Количество жилых комнат	-			
3	Общая площадь (м 2)	154,7			

4	Жилая площадь (м 2)	-			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			154,7					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы:

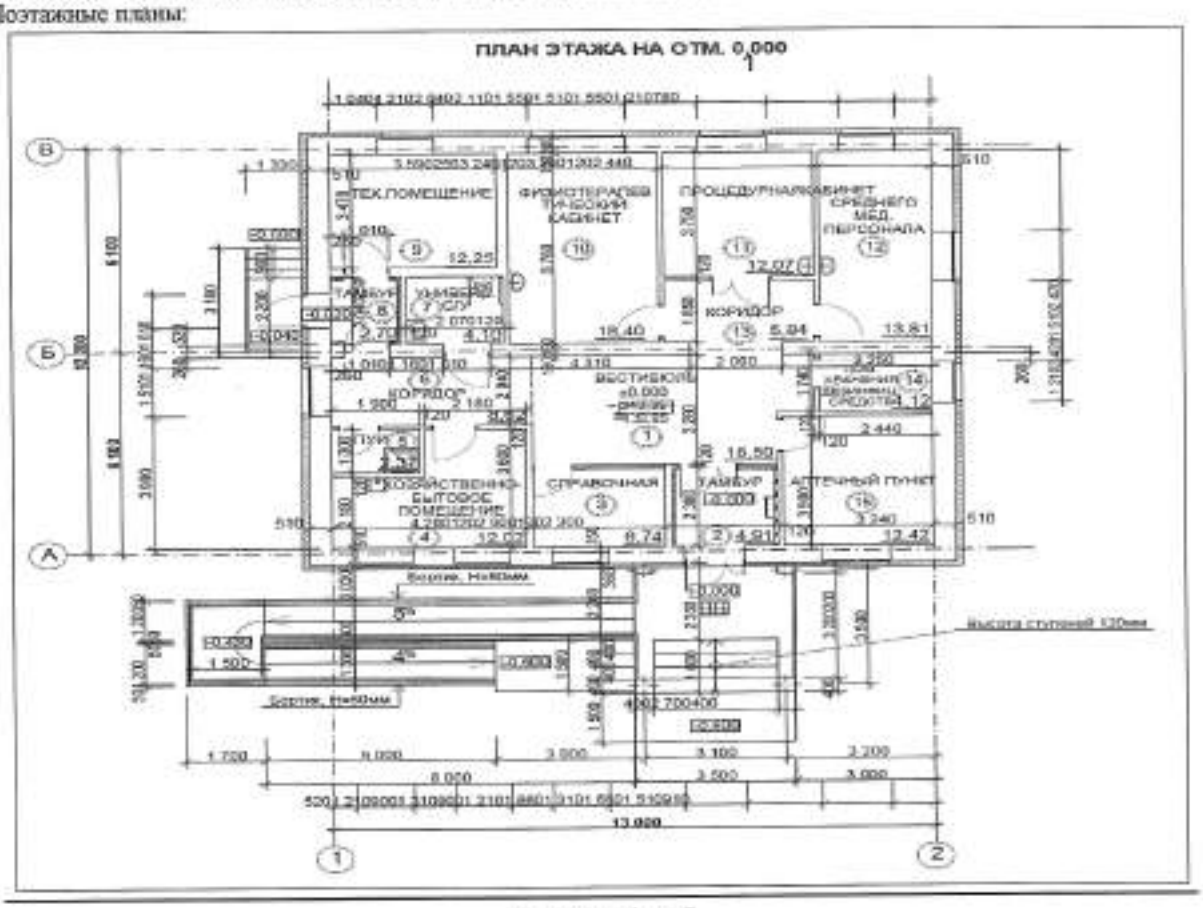

2. Экспликация к поэтажным планам:

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кат. помещения
1	Вестибюль	18,50	Д
2	Тамбур	4,91	Д
3	Справочная	6,74	Д
4	Хозяйственно-бытовое помещение	12,02	Д
5	Помещение уборочного инвентаря	2,37	Д
6	Коридор	8,62	Д
7	Универсальный санузел	4,10	Д
8	Тамбур	2,70	Д
9	Техническое помещение	12,25	Д
10	Физиотерапевтический кабинет	18,40	Д
11	Процедурная	12,07	Д
12	Кабинет среднего медперсонала	13,81	Д
13	Коридор	5,84	Д
14	Помещение хранения дезинфицирующих средств	4,12	Д
15	Аптечный пункт	12,42	Д

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
				асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
3000	**223,15**		-	**487**	**2289,85**	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные						
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Вестибюль	18,50	-	-	18,50
1	2		Тамбур	4,91	-	-	4,91
1	3		Справочная	6,74	-	-	6,74
1	4		Хозяйственно-бытовое помещение	12,02	-	-	12,02
1	5		Помещение уборочного инвентаря	2,37	-	-	2,37
1	6		Коридор	8,62	-	-	8,62
1	7		Универсальный санузел	4,10	-	-	4,10
1	8		Тамбур	2,70	-	-	2,70

1	9		Техническое помещение	12,25	-	-	12,25
1	10		Физиотерапевтический кабинет	18,40	-	-	18,40
1	11		Процедурная	12,07	-	-	12,07
1	12		Кабинет среднего медперсонала	13,81	-	-	13,81
1	13		Коридор	5,84	-	-	5,84
1	14		Помещение хранения дезинфицирующих средств	4,12	-	-	4,12
1	15		Аптечный пункт	12,42	-	-	12,42

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)

1	2		3
1	Фундамент		ленточный высотой 300 мм, из бетона кл. С20/25, W6, F75 на сульфатостойком цемен-те, ФБС 3 ряда.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		кирпич, минплита
	2) перегородки		кирпич
3	Перекрытия	Перекрытие чердачное	из сборных железобетонных многопустотных плит
		Перекрытие междуэтажное	-
4	Кровля		скатная, из профилированных листов по деревянным стропилам.
5	Полы	Полы 1-го этажа	бетонная стяжка
		Полы последующих этажей	-
6	Проемы	Проемы окна	из ПВХ профиля
		Проемы двери	деревянные, металлические.
7	Отделочные работы	Отделочные работы внутренние	ц/п штукатурка, вододисперсионная матовая влагостойкая покраска за 2 раза, керамическая плитка
		Отделочные работы наружные	Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке
8	Горячее водоснабжение		**нет**
9	Водопровод		**да**
10	Канализация		**да**
11	Электроосвещение		**да**
12	Отопление	печное	**нет**
13		печное газовое	**нет**
14		от ТЭЦ	**нет**
15		от АГВ	**нет**
16		от индивидуальной отопительной установки: на газе	**нет**
17		от индивидуальной отопительной установки: автономная котельная с электрическими водогрейными котлами	**да**
18		от районной котельной: на газе	**нет**
19		от районной котельной: на твердом топливе	**нет**
20	Разные работы		-

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»

руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич **Подпись**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Севгражданпроект»

Канрбеков Алибек Тотанбекович **Подпись**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	-	
2	В том числе озелененная часть	м2	-	
3	Средняя ширина проезда	м	-	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2	2000	
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	800	
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	487	
	щебеночное покрытие	м2	-	
	плитами	м2	140	брусчатка
	грунтовые улучшенные	м2	-	
	грунтовые	м2	-	
7	Под строениями	м2	223,15	
8	Под сооружениями	м2	5,8	Площадка ТБО
9	Под водоемами	м2	-	
10	Прочие	м2	-	
11	деревья	шт	11	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	92	Однорядная живая изгородь
14	цветники			
15	газоны	м2	800	
16	порода деревьев	Липа мелколистная	1	
17	возраст	год	7-8	

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Севгражданпроект», эксперт по авторскому надзору Кайрбеков Алибек Тогзанбекович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)
