Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060540003598 - ТОО Бабэк-Курылыс**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Акжар -2" г. Актобе Актюбинской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **166 от 17.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Покрытие				
			Раздел: Асфальтобетонное ТИП I				
			Подраздел: основание из песка толщ.12см				
1	1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	-48.6348	5 709	-277 657
			Итого по подразделу: основание из песка толщ.12см				**-277 657**
			Подраздел: щебеночное основание ,толщ.15см				
2	2	7101-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	-405.29	809	-327 880
3	3	211-201-0504РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	-6.07935	6 699	-40 726
4	4	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	-76.59981	5 169	-395 945
5	5	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	-0.324232	230 523	-74 743
			Итого по подразделу: щебеночное основание ,толщ.15см				**-839 293**
			Подраздел: покрытие асфальтобетонное				
6	6	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-405.29	2 502	-1 014 036
7	7	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	-405.29	1 024	-415 017
			Итого по подразделу: покрытие асфальтобетонное				**-1 429 053**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: покрытие асфальтобетонное				
8	8	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	-405.29	2 817	-1 141 702
			Итого по подразделу: покрытие асфальтобетонное				**-1 141 702**
			Итого по разделу: Асфальтобетонное ТИП I				**-3 687 703**
			Раздел: Покрытие из тротуарной плитки ТИП IIA				
			Подраздел: щебеночное основание ,толщ.12см				
9	18	212-601-0301РСНБ РК 2022	Смесь цементно-песчаная	м3	0.001	19 605	19
			Итого по подразделу: щебеночное основание ,толщ.12см				**19**
			Итого по разделу: Покрытие из тротуарной плитки ТИП IIA				**19**
			Раздел: Покрытие из резиновой крошки ТИП IV				
10	32	6113-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство спортивных покрытий на бетонное основание, толщина 12 мм	м2	179	16 354	2 927 366
			Итого по разделу: Покрытие из резиновой крошки ТИП IV				**2 927 366**
			Раздел: Разметка площадок				
11	46	7101-0803-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разметка краской	м2	236	2 154	508 344
			Итого по разделу: Разметка площадок				**508 344**
			Раздел: ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА				
12	47	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной /бетонная обойма	м3	9.2	21 332	196 254
13	48	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.384	27 782	260 706
14	49	7101-0301-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков	м	143.4	12 884	1 847 566
15	50	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.17-ПП пластиковый с решеткой ячеистой пластиковой кл.А 08000811-М	шт	143.4	6 396	917 272
16	51	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Заглушка глухая ЗГЛВ-10.16.17-ПП 63010-М для лотка 8000-М/80001-М	шт	2	638	1 278
17	52	6122-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка жироуловителя вертикального /Пескоуловитель	шт.	6	33 326	199 956
18	53	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП-40.40-ПП пластиковый 8472	шт	4	8 880	35 521
19	54	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Корзина для дождеприемника-пескоуловителя ДПП-31.33.18-ПП 6189	шт	2	10 748	21 498

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	55	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ-10.15.40-ПП пластиковый с решеткой	шт	2	10 732	21 466
21	56	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Заглушка ЗПУ-10.16.40-ПП 68018-М	шт	2	862	1 725
22	57	235-202-0105РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2.16	3 690	7 970
23	58	7101-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из песчано-цементных смесей, однослойных	м2	61	291	17 751
24	59	212-601-0301РСНБ РК 2022	Смесь цементно-песчаная	м3	6.1	19 605	119 590
25	60	7101-0403-1204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство.Пароизоляционная пленка	м2	61.4	182	11 175
26	61	261-107-0510РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	62.628	137	8 580
			Подраздел: ТРУБА ПЭ ДИАМ.160мм и ГОФР.ТРУБА ДИАМ.250/216мм				
27	62	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	7.7103744	499	3 847
28	63	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м3	0.2384652	6 738	1 607
29	64	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	6.7565137	53	358
30	65	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	6.7565137	610	4 121
31	66	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	1.1923259	3 481	4 150
32	67	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.0272	1 391 819	37 857
33	68	241-201-0613РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	27.472	2 175	59 752
34	69	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	1.5	2 879	4 319
35	70	241-204-0503РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	1.53	5 261	8 049
			Итого по подразделу: ТРУБА ПЭ ДИАМ.160мм и ГОФР.ТРУБА ДИАМ.250/216мм				**124 060**
			Итого по разделу: ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА				**3 792 368**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Покрытие				**3 540 394**
			ИТОГО по акту:				**3 540 394**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)				3540394.685 x 6.90%	244 287
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3540394.685 + 244287.237	3 784 681
		Сметная прибыль, (5.00%)				3784681.922 x 5.00%	189 234
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				3784681.922 x 5.000%	189 234
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 163 150
		в том числе на 3 квартал 2024 г. , к = 1.0557, к = 1.0557				4163150.114 x 1.0557	4 395 037
		НДС (12%)				4395037.576 x 12%	527 404
		Итого с НДС				4395037.576 + 527404.509	4 922 442

Лист согласования
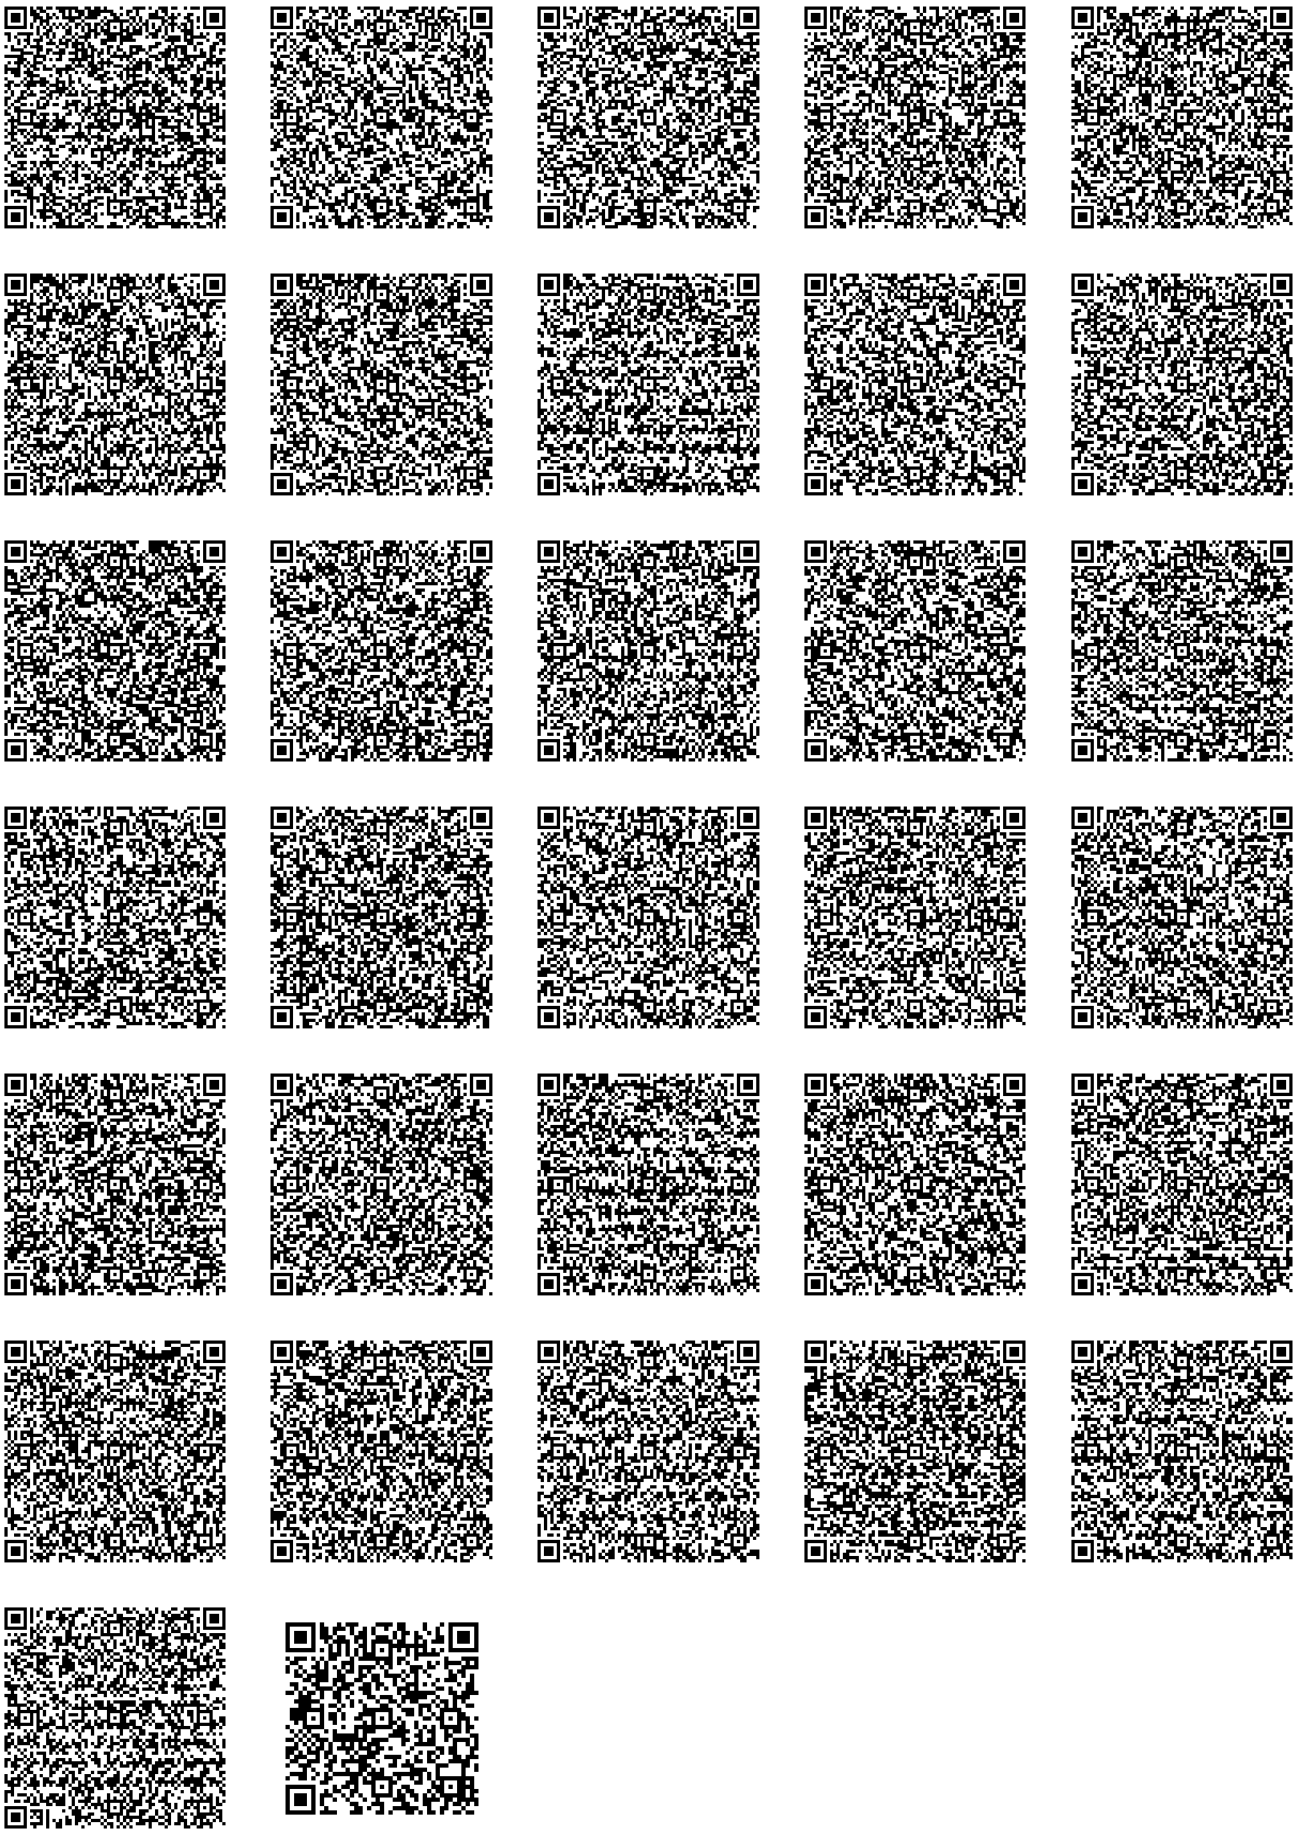
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650601300100 - АЗИЗОВ РАХИБ ХАЗАЙЫР ОГЛЫ	Директор	25.03.2025 15:31
Представители технического надзора		
850507300865 - САЛИКОВ ЖЕНИСБЕК МИРТАЕВИЧ	Технический надзор	25.03.2025 17:03
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	25.03.2025 15:37
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.03.2025 10:53
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 18:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	26.03.2025 19:07
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	26.03.2025 14:58
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 13:28 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
