Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060540003598 - ТОО Бабэк-Курылыс**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Акжар -2" г. Актобе Актюбинской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **166 от 17.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: МАФ Добавить				
			Раздел: Ограждение волейбольного поля				
1	1	6104-0801-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	95	11 642	1 105 990
2	2	6104-0801-0309ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 991	3 991
3	3	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2.29	439 147	1 005 647
4	4	214-205-0101РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	2.849	425 103	1 211 118
5	5	214-205-0102РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1.131	391 017	442 240
6	6	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.157	321 540	50 482
7	7	214-102-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.12636	382 528	48 336
8	8	1113-0301-0602РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	720.806	219	157 857
9	9	1113-0301-1406РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	720.806	197	141 999
			Итого по разделу: Ограждение волейбольного поля				**4 167 660**
			Раздел: Ограждение футбольного поля				
10	10	6104-0801-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	135	11 642	1 571 670
11	11	6104-0801-0309ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	3 991	3 991
12	12	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4.235	439 147	1 859 788

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	214-205-0101РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	5.118	425 103	2 175 677
14	14	214-205-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.298	392 332	116 915
15	15	214-210-0202РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.223	321 540	71 703
16	16	214-102-0102РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.17784	382 528	68 029
17	17	1113-0301-0602РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	257.948	219	56 491
18	18	1113-0301-1406РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	257.948	197	50 816
			Итого по разделу: Ограждение футбольного поля				**5 975 080**
			Итого по локальной смете: МАФ Добавить				**10 142 740**
			ИТОГО по акту:				**10 142 740**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.900%)	10142740.000 x 6.90%	699 849
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	10142740.000 + 699849.070	10 842 589
	Сметная прибыль, (5.00%)	10842589.070 x 5.00%	542 129
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	10842589.070 x 5.000%	542 129
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		11 926 847
	в том числе на 3 квартал 2024 г. , к = 1.0557, к = 1.0557	11926847.977 x 1.0557	12 591 173
	НДС (12%)	12591173.409 x 12%	1 510 940
	Итого с НДС	12591173.409 + 1510940.809	14 102 114

Лист согласования
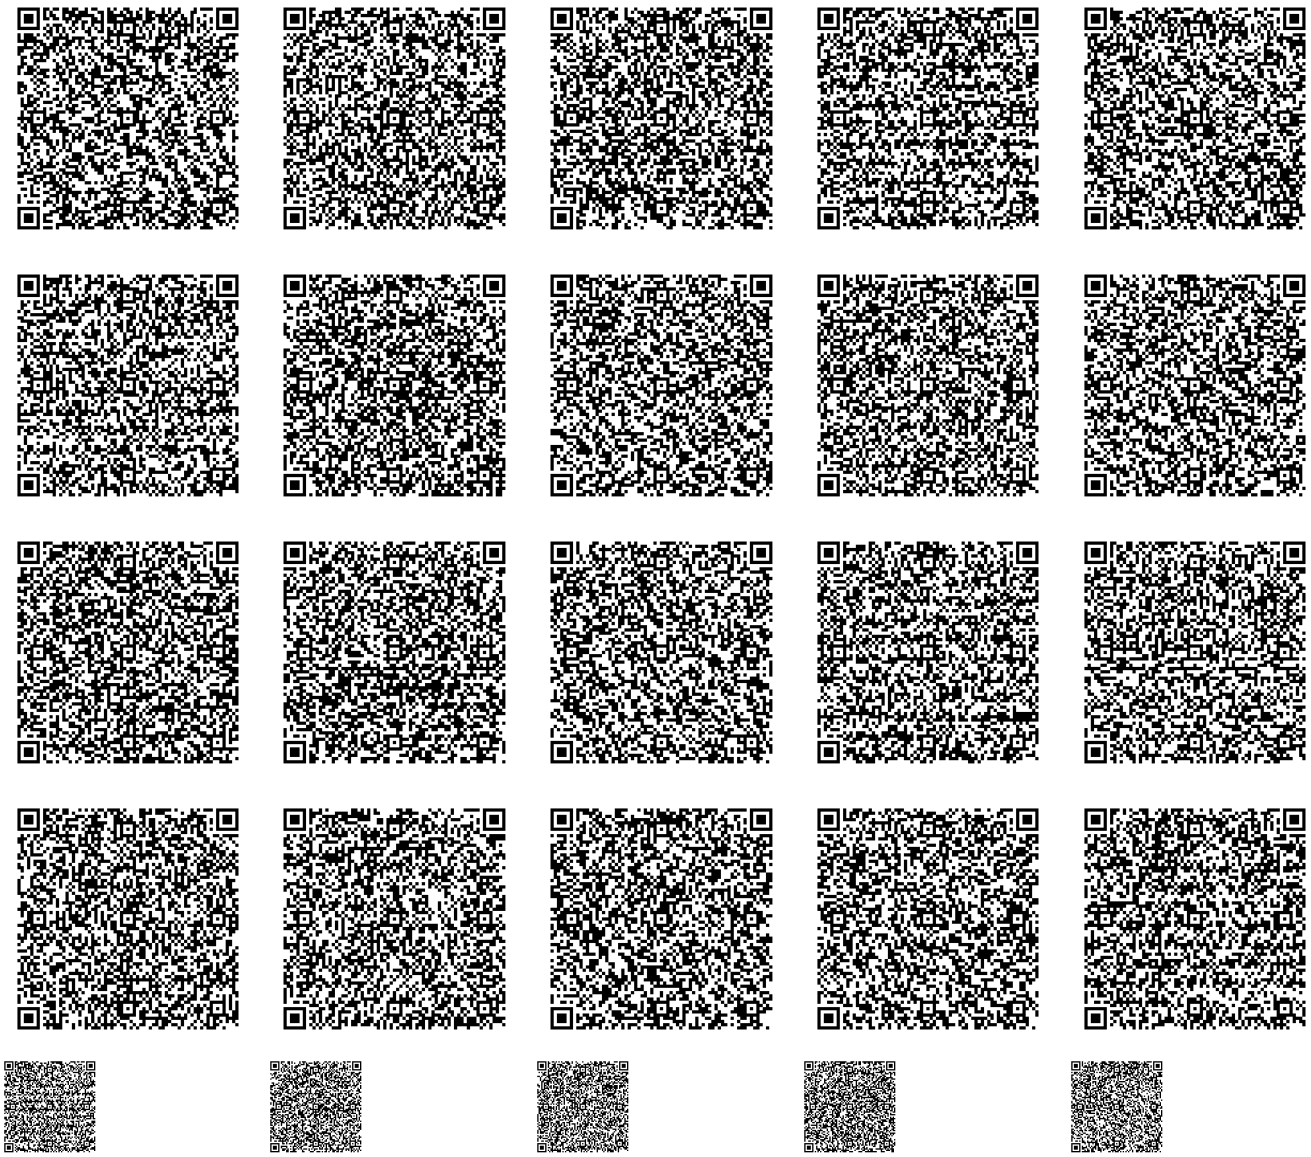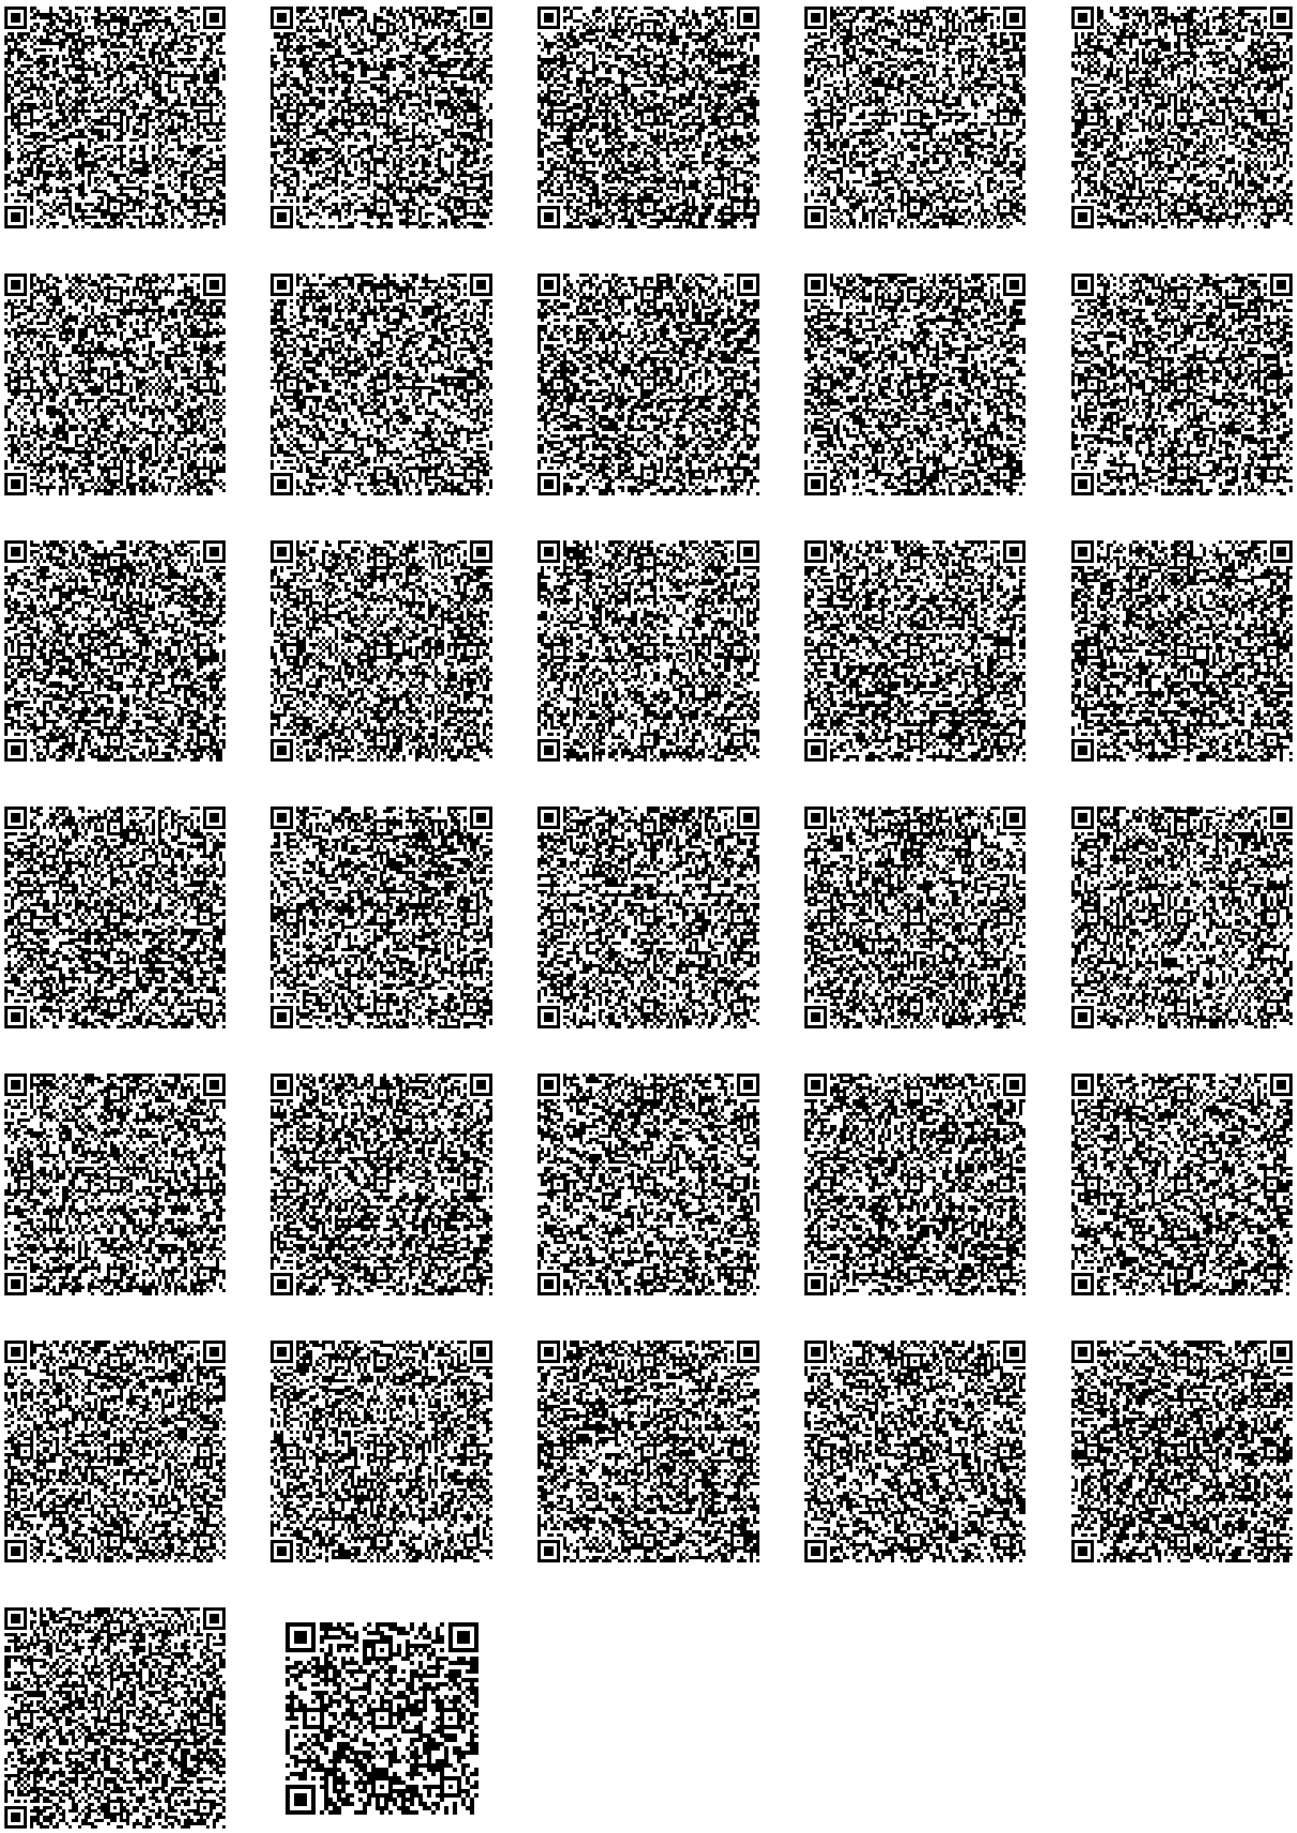
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650601300100 - АЗИЗОВ РАХИБ ХАЗАЙЫР ОГЛЫ	Директор	25.03.2025 15:35
Представители технического надзора		
850507300865 - САЛИКОВ ЖЕНИСБЕК МИРТАЕВИЧ	Технический надзор	25.03.2025 16:41
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	25.03.2025 15:36
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.03.2025 11:01
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 13:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	26.03.2025 14:55
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 18:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	26.03.2025 19:11
