Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060540003598 - ТОО Бабэк-Курылыс**

Стройка: **Строительство школы в жилом массиве "Акжар -2" г. Актобе Актюбинской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **166 от 17.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) Добавить				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Витражи				
1	1	6108-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка витража из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2	м2	6.4	6 685	42 784
2	2	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	6.4	110 393	706 515
			Итого по подразделу: Витражи				**749 299**
			Подраздел: Дверь				
3	3	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	1.89	6 263	11 837
4	4	223-201-0801 СпрСЦ 03.2024	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон	комплект	1	66 757	66 757
			Итого по подразделу: Дверь				**78 594**
			Подраздел: Двери металлические				
5	5	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	22.152	33 823	749 247
			Итого по подразделу: Двери металлические				**749 247**
			Итого по разделу: Проемы				**1 577 140**
			Раздел: Внутренние проемы/Витражи				
			Подраздел: Р 7.2 Однокамерный стеклопакет Вв-1,Вв-2,Вв-3,Вв-6,Вв-9,Вв-10,				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока витражного из ПВХ	м2	38.16	6 131	233 959
7	7	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	38.16	32 337	1 233 980
			Итого по подразделу: Р 7.2 Однокамерный стеклопакет Вв-1,Вв-2,Вв-3,Вв-6,Вв-9,Вв-10,				**1 467 939**
			Подраздел: Р 7.3 Одинарное стекло из аллюминиевого профиля Вв-4,Вв-5,Вв-7,Вв-12-Вв-15,Вв-17-Вв-21				
8	8	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66.8506	3 542	236 785
9	9	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	66.8506	110 393	7 379 838
10	10	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	13.461	3 221	43 358
11	11	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	13.461	123 298	1 659 714
			Итого по подразделу: Р 7.3 Одинарное стекло из аллюминиевого профиля Вв-4,Вв-5,Вв-7,Вв-12-Вв-15,Вв-17-Вв-21				**9 319 695**
			Итого по разделу: Внутренние проемы/Витражи				**10 787 634**
			Раздел: Отделочные работы				
12	12	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	191.35	197	37 696
13	13	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	191.35	5 716	1 093 757
14	14	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	191.35	8 194	1 567 922
			Подраздел: Потолок				
15	15	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	83	3 809	316 147
16	16	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0.85075	142 797	121 485
			Итого по подразделу: Потолок				**437 632**
			Подраздел: Шкаф под сантехнику				
17	17	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	3 919	3 919

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	0.09963	142 797	14 227
			Итого по подразделу: Шкаф под сантехнику				**18 146**
			Подраздел: Короба из ЛДСП				
19	19	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	120.68	3 809	459 670
20	20	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	1.23697	142 797	176 636
21	21	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	480.8	3 773	1 814 058
22	22	215-303-0101 РСНБ РК 2022	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 15-17 мм	100 м2	4.808	142 797	686 568
23	23	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	480.8	1 165	560 132
24	24	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.302904	199 032	60 288
			Итого по подразделу: Короба из ЛДСП				**3 757 352**
			Итого по разделу: Отделочные работы				**6 912 505**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип6				
25	25	СТРСНБ РК 2022	Спортивное покрытие НЕО Спорт толщ. 10,3 мм,(1,м х15м, толщина защитного слоя 1,5 мм) рулон 27 м2 RAL5014	м2	704.808	12 740	8 979 508
			Итого по подразделу: Тип6				**8 979 508**
			Подраздел: Тип6.1				
26	26	СТРСНБ РК 2022	Спортивное покрытие НЕО Спорт толщ. 10,3 мм,(1,м х15м, толщина защитного слоя 1,5 мм) рулон 27 м2 RAL5014	м2	43.056	12 740	548 549
			Итого по подразделу: Тип6.1				**548 549**
			Итого по разделу: Полы				**9 528 057**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть здания (сооружения) (АС, АР, АИ) Добавить				**28 805 336**
			ИТОГО по акту:				**28 805 336**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (6.900%)				28805336.000 x 6.90%	1 987 568
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				28805336.000 + 1987568.211	30 792 904
		Сметная прибыль, (5.00%)				30792904.211 x 5.00%	1 539 645

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				30792904.211 x 5.000%	1 539 645
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					33 872 195
		в том числе на 3 квартал 2024 г. , к = 1.0557, к = 1.0557				33872194.633 x 1.0557	35 758 876
		НДС (12%)				35758875.874 x 12%	4 291 065
		Итого с НДС				35758875.874 + 4291065.105	40 049 941

Лист согласования
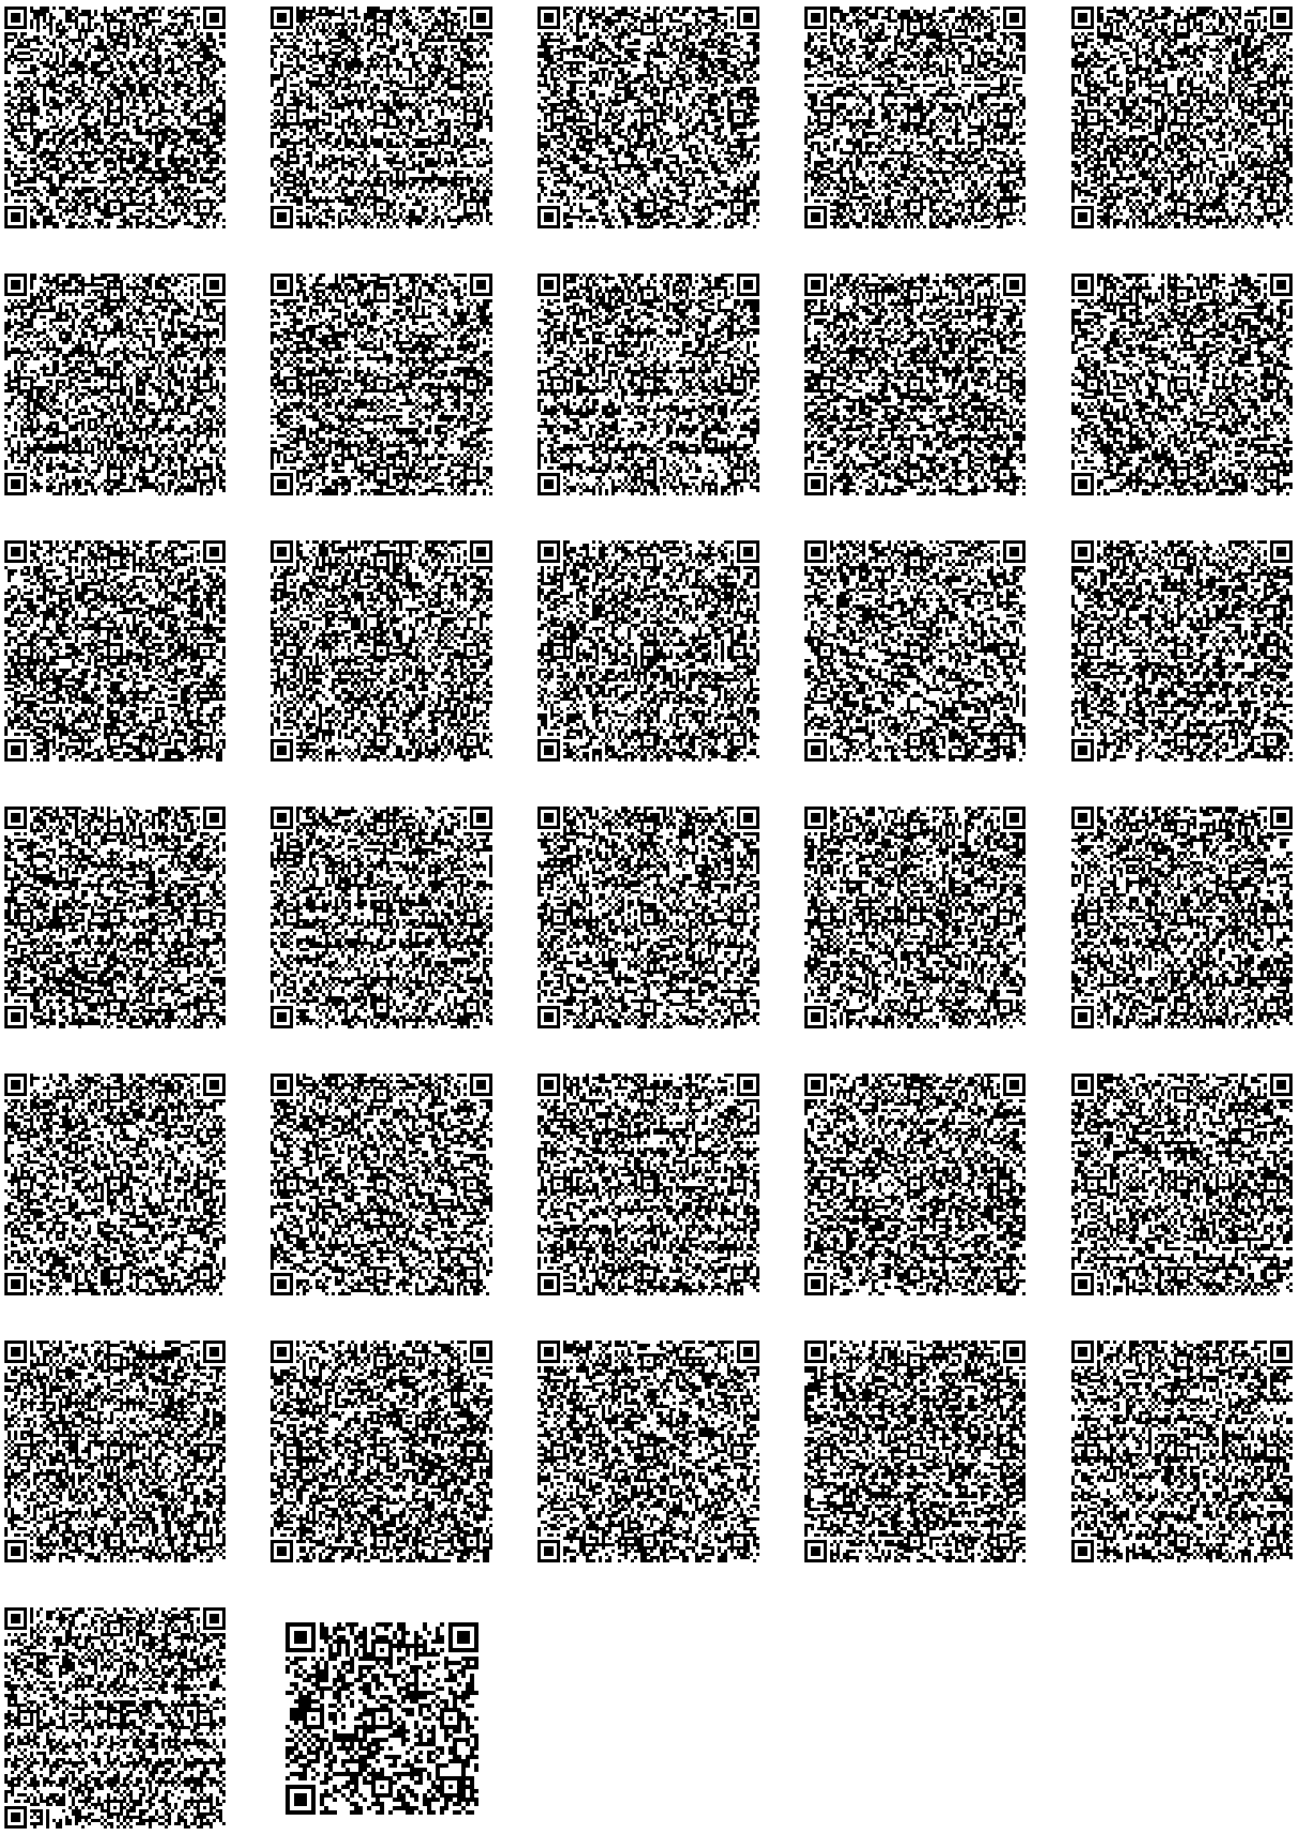
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650601300100 - АЗИЗОВ РАХИБ ХАЗАЙЫР ОГЛЫ	Директор	26.03.2025 10:02
Представители технического надзора		
850507300865 - САЛИКОВ ЖЕНИСБЕК МИРТАЕВИЧ	Технический надзор	26.03.2025 14:05
Представители авторского надзора		
590217301376 - ИМАГАМБЕТОВ ОЙЛЫБАЙ САНДИБАЕВИЧ	Авторский надзор	26.03.2025 10:05
Представители заказчика		
881030300315 - АЛИЕВ ДАУЛЕТ МУРАТОВИЧ	Ведущий специалист	26.03.2025 14:59
841215401080 - ИДРИСОВА АСИЯ АМАНГАЛИЕВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 15:09 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600110300905 - ИБРАЕВ АСАН САГИНГАЛИЕВИЧ	Региональный руководитель	26.03.2025 15:18
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	26.03.2025 18:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	26.03.2025 19:11
