ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу №41 «13» 12 2023 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"12" 12 2023 года

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, Исатай Абдикаримов, 11. БИН 020340003533 Руководитель Аман Д.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 11 » 12 2023г. ТОО «Гулнур-МК», Директор Миралиев Куандык Шыныбекович ГСЛ № 20009458 от 01.07.2020г. юридический адрес: КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ТУРЕКУЛОВА, 68 А. БИН 070640007952**
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **« 11 » 12 2023г. Технический надзор: ТОО «MSK Engineering», БИН 070440006322 директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич, Республика Казахстан г.Алматы ул Айтеке би 134/1, 28 эксперт технического надзора Арыстанов Омирсерик Акылбекович, №KZ19VJE00059898 от 26.11.2020год.**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **« 11 » 12 2023г. ТОО « Жана Құрылыс Групп », БИН 110140002418 директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, О.ТУРМАНЖАНОВ, 51/1, эксперт авторского надзора Эксперт Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),
уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
с.Енбекши, Енбекшинского аульного округа, Шиелийского района Кызылординской области»
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации
"___"_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок:

КГУ «Аппарат акима сельского округа Енбекши. №48 от 11.10.2021год.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» № 266 от 02.12.2020года.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

Коммунальное государственное учреждение «Управление контроля Кызылординской области» № KZ86REA00322913 от 17.03.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Жана Құрылыс Групп», № 07-2020

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» № 266 от 02.12.2020года.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **март 2023 года;**

окончание работ: **октября 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5месяцев;**

фактически, месяц: **5 месяцев.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Един. измер.	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	М3		
В т.ч. подземной части	М3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М3		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в т.ч.: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Объемы основных строительно-монтажных работ:

Трасса внутриквартальных газораспределительных сетей проектируется на территории села Енбекши аульного округа Енбекши Шиелинского района Кызылординской области. Село Енбекши находится в 8-12 км к северо-западу от районного центра- с.Шиели и в 78-83 км к юго-востоку от областного центра- г.Кызылорды. Газопроводы приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 3,954 км. Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб (надземная)- 0,057 км. Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 1,978 км. Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная)- 11,596 км. Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа ГРПШ-07-2У1 – 9 шт. Направление использования газа: - населению для приготовления пищи, горячей воды, - на отопление жилых домов, школы, детского сада, административных зданий Технические условия: - на газоснабжение №41-181 от 19.08.2020 года выданных Кызылординский производсвенный филиал АО "КазТрансГазАймак".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 307 025, 788 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 228 249,978 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12 253, 526 тысяч тенге. прочие затраты 66 522, 284 тысяч тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 307 025, 788 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 228 249,978 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 253,526** тысяч тенге; прочие затраты 66 522, 284 тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Руководитель Аман Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

(фамилия,имя,отчество (при его наличии)эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **Технический надзор: ТОО «MSK Engineering»**

(наименование организации)

Директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич,

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Арыстанов Омирсерик Акылбекович, №KZ19VJE00059898 от 26.11.2020 год.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта:

наименование организации, фамилия,имя,отчество (при его наличии),должность), подпись, дата

2) организация:

ТОО « Жана Құрылыс Групп », Абибуллаев Арман Нарзуллаевич
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

Эксперт Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Гулнур-МК» директор Миралиев Куандык Шыныбекович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	17 585	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	11 596	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	11 596	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	2420	
	Протяженность подземной прокладки:	м	5 932	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 80	шт	8	
	d=100	шт	1	
1	d = 65	шт	4	
	d = 57	шт	2	
6	Вентили (клапан)	шт		
7	Кран шаровой ст.	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники Ø89х108мм	шт	3	
	Ø89х76мм	шт	2	
	Ø76/57мм	шт	8	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка __)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли-чество	Примечание
1	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø63, Ø75, Ø90,	5 932	
2	Труба		металл	Ø57, Ø76, Ø89,	11596	
3	ГРПШ	07-2У1	металл		9	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района" Руководитель Аман Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор

ТОО « Жана Құрылыс Групп » Әліпбек Өркен Нуркенулы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС. СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу №41 «13» 12 2023 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"11" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Гулнур-МК», ГСЛ № 20009458 от 01.07.2020г. , юридический адрес: КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, УЛИЦА ТУРЕКУЛОВА, 68 А**

наименование организации, юридический адрес

в лице директор **Миралиев Куандык Шыныбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района", Кызылординская область, Чиилийский район, с.Шиели, Исатай Абдикаримов, 11. БИН 020340003533 Руководитель Аман Д.** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1. **ТОО «СК Сапа KZ»**

наименование организации

в лице директор **Жұмадулла Х.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2. **ТОО «ПАТСАЙЫ»**

наименование организации

в лице директор **Назаралиева Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» № 07-2020**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» № 266 от 02.12.2020года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Объемы основных строительно-монтажных работ Трасса внутриквартальных газораспределительных сетей проектируется на территории села Енбекши аульного округа Енбекши Шиелинского района Кызылординской области. Село Енбекши находится в 8-12 км к северо-западу от районного центра- с.Шиели и в 78-83 км к юго-востоку от областного центра-г.Кызылорды. Газопроводы приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 3,954 км. Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб (надземная)- 0,057 км. Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 1,978 км. Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная)- 11,596 км. Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005 МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа ГРПШ-07-2У1 – 9 шт. Направление использования газа: - населению для приготовления пищи, горячей воды, - на отопление жилых домов, школы, детского сада, административных зданий Технические условия: - на газоснабжение №41-181 от 19.08.2020 года выданных Кызылординский производсвенный филиал АО "КазТрансГазАймак".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **март 2023 года**.
месяц, год
окончание работ: **октября 2023 года**.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев**
фактически, месяц: **5 месяцев.**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области» наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Гулнур-МК» директор Миралиев Куандык Шыныбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Ситуационная схема среднего давления

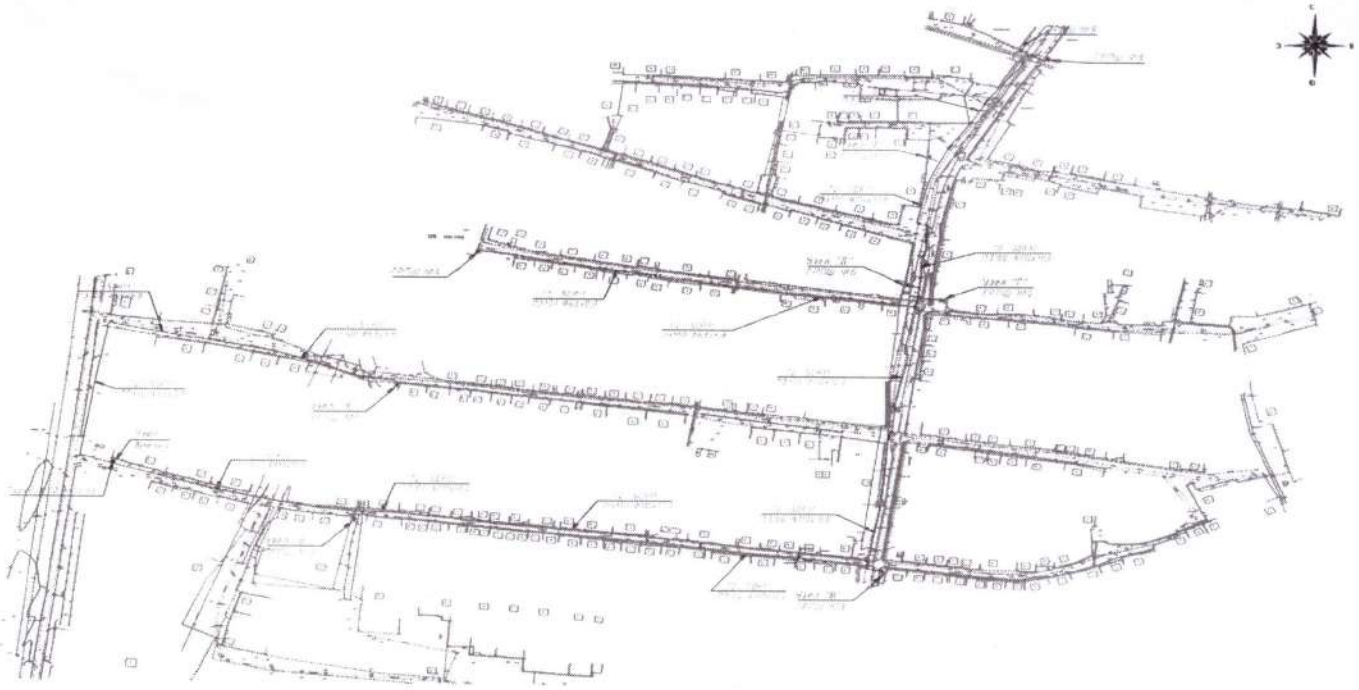

Ситуационная схема низкого давления

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу № 41 13 12 23 «__» 20__ ж.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"11" 12 2023 года

Технический надзор: **ТОО «MSK Engineering», директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич, Республика Казахстан г.Алматы ул Айтеке би 134/1, 28**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта **Арыстанов Омирсерик Акылбекович, №KZ19VJE00059898 от 26.11.2020 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№38 от 03.03.2023 год.**
№ договора и дата

по объекту:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является
КГУ «Отдел строительство архитектуры и градостроительства Шиелийского района»
Руководитель Аман Д.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «Гулнур-МК», ГСЛ № 20009458 от 01.07.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Миралиев Куандык Шыныбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядные организации:
1. **ТОО «СК Сапа KZ»**
наименование организации
в лице **директор Жумадулла Х.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
2. **ТОО «ПАТСАЙЫ»**
наименование организации
в лице **директор Назаралиева Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2023 года.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2023 года.**
месяц, год
при продолжительности строительства, **5 месяцев:**
по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев;**
фактически 5 месяцев
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **307 025, 788** тысяч тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ – **228 249, 978** тысяч тенге,
- Прочие затраты (оборудования, инструменты и инвентарь) **66 522,284** тысяч тенге;, прочие затраты **66 522, 284**
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **307 025, 788** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **228 249,978** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **12 253,526** тысяч тенге;. прочие затраты **66 522,284**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Жана Курылыс Групп» № 07-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой):

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» № 266 от 02.12.2020года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «MSK Engineering», Директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору:

Арыстанов Омирсерик Акылбекович, №KZ19VJE00059898 от 26.11.2020 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
"ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС. СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу №41 13 12 23
«__»_____20__ж.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"11" 12 2023 года

Авторский надзор_
ТОО « Жана Құрылыс Групп », директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, О.ТУРМАНЖАНОВ, 51/1
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Эксперт Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№ 11/2 от 03.03.2023 год**
№ договора и дата

по объекту:
«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Енбекши, аульного округа Енбекши, Шиелийского района, Кызылординской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **КГУ «Отдел строительство архитектуры и градостроительства Шиелийского района» Руководитель Аман Д.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком
ТОО «Гулнур-МК», ГСЛ № 20009458 от 01.07.2020г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Миралиев Куандык Шыныбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
1. **ТОО «СК Сапа KZ»**
наименование организации
в лице **директор Жумадулла Х.И.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
2. **ТОО «ПАТСАЙЫ»**
наименование организации
в лице **директор Назаралиева Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ года.
месяц, год
окончание работ _____ года.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **5 месяцев**
по норме или по проекту организации строительства **5 месяцев**
фактически ____ месяцев,
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Жана Курылыс Групп» № 07-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой):

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района» № 266 от 02.12.2020года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация:

ТОО « Жана Құрылыс Групп », директор Абибуллаев Арман Нарзуллаевич.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

ТОО « Жана Құрылыс Групп », Әліпбек Өркен Нұркенұлы KZ10VJE00068887 от 13.09.2021год.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)
