Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		
				Дополнительное соглашение №6	**31.07.2024**		
				Дополнительное соглашение №7	**15.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №8	**19.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №9	**29.08.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	1 695 891 297	1 695 891 297	1 514 188 658,04				181 702 638,96	1 695 891 297
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года	304 413 496	304 413 496	271 797 764,29				32 615 731,71	304 413 496

М.П.

Заказчик Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961
Аршамов А.Т. (Доверенность №280 от 21.10.2024г.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ceb18fbd-ea21-4559-b53d-3997dee55b1d)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №17	Блочно-модульная котельная	43 141 145
2	Акт №18	Электросила	58 950 931
3	Акт №19	Конструкции железобетонные	29 700 623
4	Акт №20	Благоустройство	14 759 694
5	Акт №21	Архитектурно-строительная часть	157 861 103
		ИТОГО	**304 413 496**

Заказчик: **Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Аршамов А.Т. (Доверенность №280 от 21.10.2024г.)**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ceb18fbd-ea21-4559-b53d-3997dee55b1d)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 12.11.2024 18:54
Заказчик: ИИН 601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ null	Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы	Подписано: 13.11.2024 09:02
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 11.11.2024 11:06
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН null	Заместитель директора	Подписано: 11.11.2024 13:18

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ceb18fbd-ea21-4559-b53d-3997dee55b1d)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ceb18fbd-ea21-4559-b53d-3997dee55b1d)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#ceb18fbd-ea21-4559-b53d-3997dee55b1d)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Блочно-модульная котельная				
			Раздел: Оборудование				
1	1	1125-0130-0102РСНБ РК 2022	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	6.25	93 536	584 600
2	2	РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами тепловая мощность 2х500±1000 кВт в комплекте	шт	1	35 954 368	35 954 368
			Итого по разделу: Оборудование				**36 538 968**
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: Земляные работы				
3	6	6101-0106-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46.4	89	4 130
4	7	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46.4	576	26 726
			Итого по подразделу: Земляные работы				**30 856**
			Итого по разделу: Строительные работы				**30 856**
			Итого по локальной смете: Блочно-модульная котельная				**36 569 824**
			ИТОГО по акту:				**36 569 824**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				615456.000 x 8.10%	49 851
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				36569824.000 + 49851.938	36 619 675
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				615456.000 x 0.05409035	33 290
		Сметная прибыль, 5.00%				665307.938 x 5.00%	33 265
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(36619675.938 + 33290.229) x 5.000%	1 832 648
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					38 518 879
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2023 год , к = 1.0000				38518879.872 x 1.0000	38 518 879
		НДС (12%)				38518879.872 x 12%	4 622 265

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				38518879.872 + 4622265.585	43 141 145

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	11.11.2024 08:39
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 09:16
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 09:20
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 12:15
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	11.11.2024 12:40
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	11.11.2024 08:41
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	12.11.2024 05:30 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	12.11.2024 05:26
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы	12.11.2024 11:57
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	12.11.2024 05:33
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.11.2024 11:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

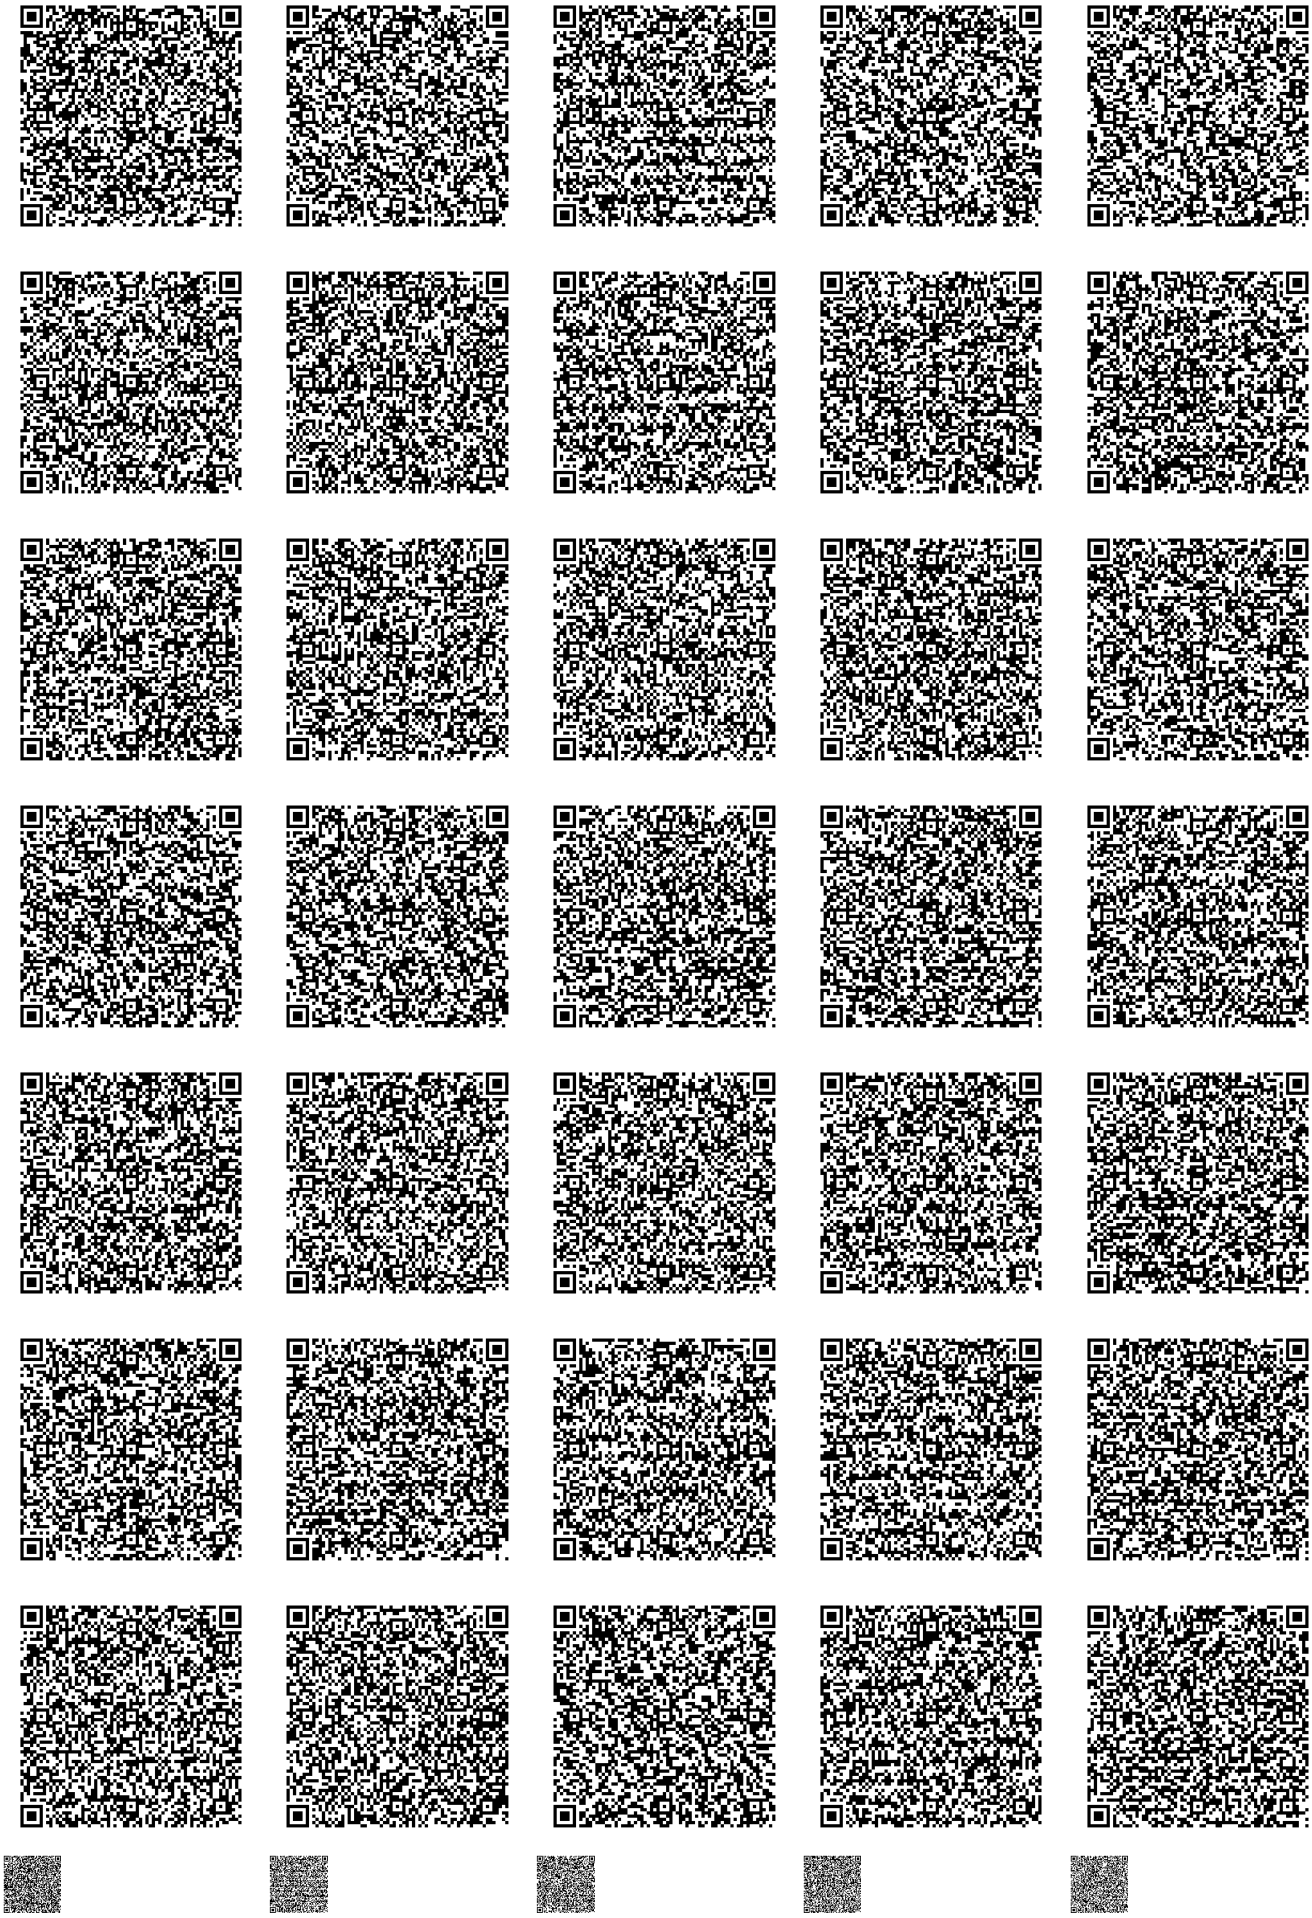

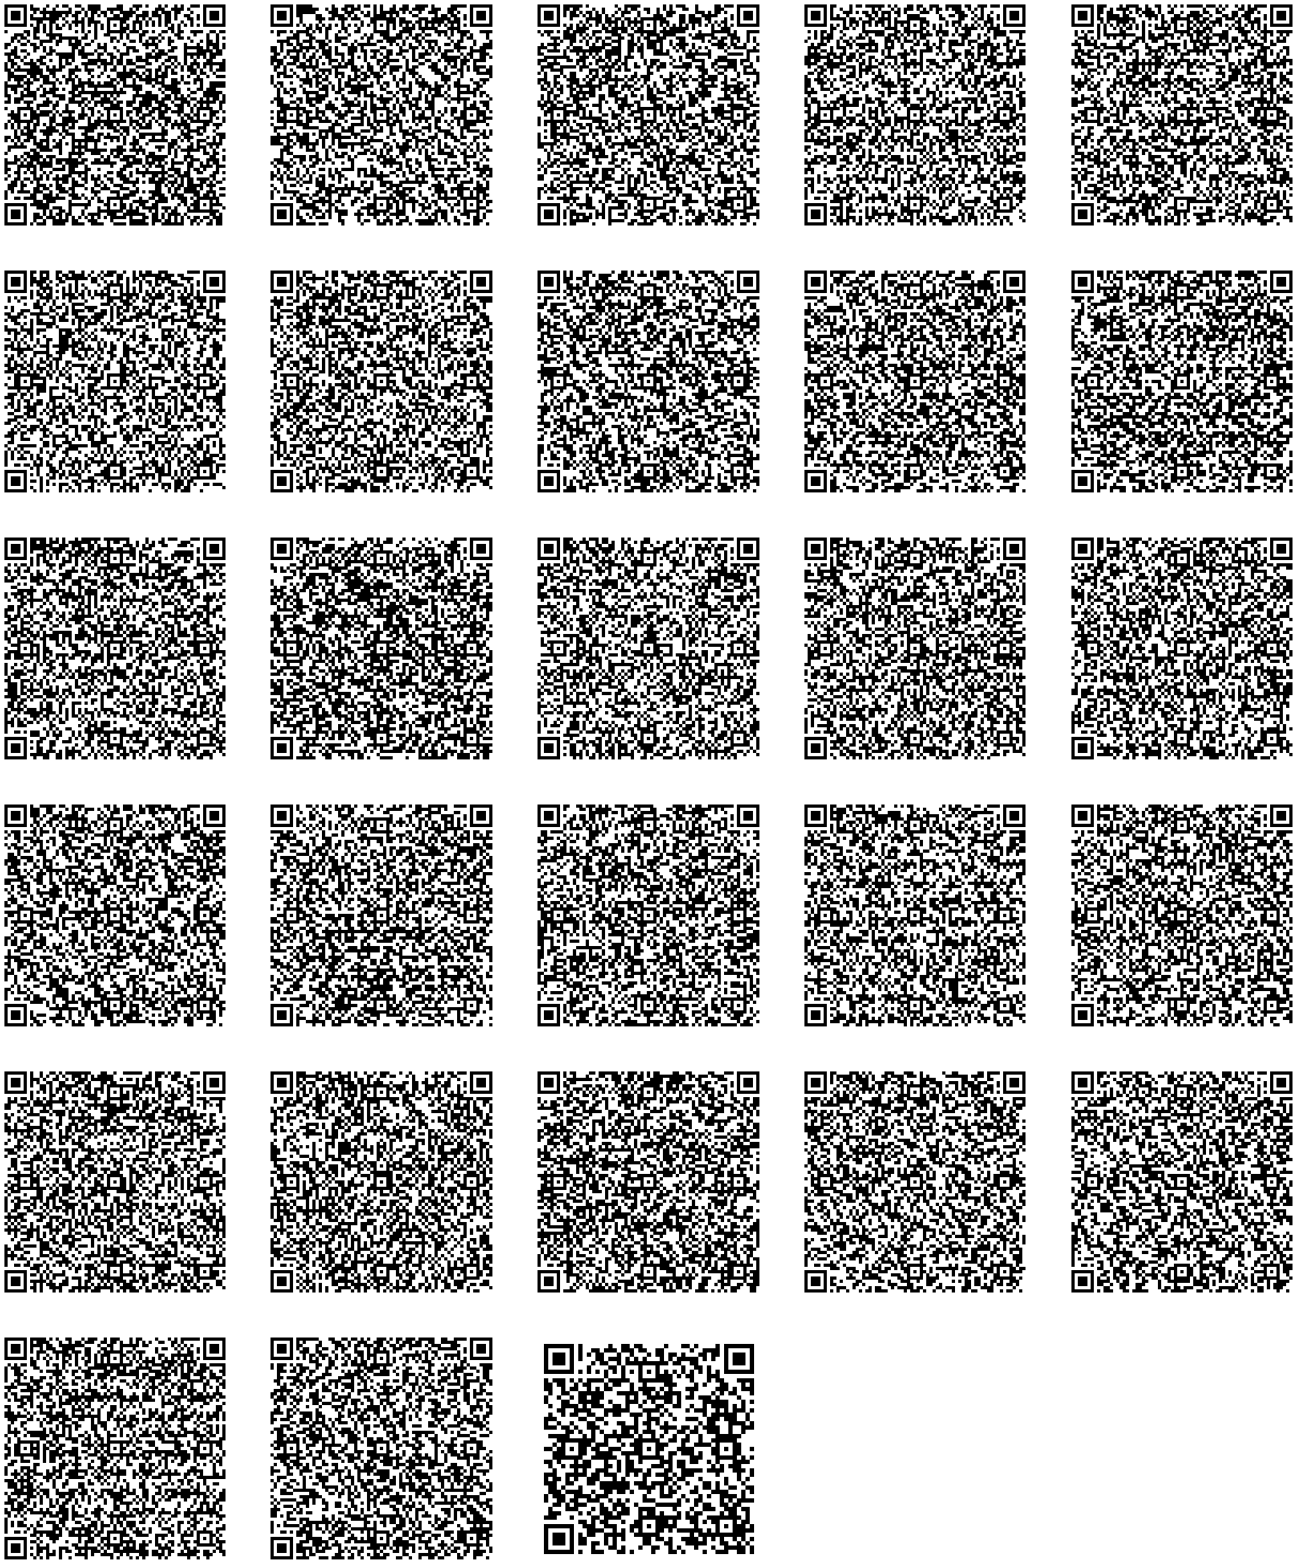

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электросила.				
			Раздел: КТПБ				
			Подраздел: 1.Оборудование				
1	1	6124-0101-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	256 046	256 046
2	2	ЕСЦ РСНБ РК 2024	БМКТП2х400кВА 10-0,4кв., тупикового типа в комплекте	шт	1	40 870 789	40 870 789
3	3	515-101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	2	3 062 362	6 124 724
			Итого по подразделу: 1.Оборудование				**47 251 559**
			Итого по разделу: КТПБ				**47 251 559**
			Раздел: Фундамент под 2КТПБ				
4	4	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	38.64	6 917	267 273
5	5	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	19.32	3 286	63 486
6	6	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основание под фундаменты песчаное-гравийное. Устройство	м3 основания	9.24	6 019	55 616
7	7	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10.164	2 346	23 845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	19	5 565	105 735
9	9	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	34	4 996	169 864
10	10	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	12.7	62 238	790 423
11	11	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной /монолитные заделки/	м3	0.8	20 275	16 220
12	12	212-101-1810 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	0.816	29 720	24 252
13	13	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	57.04	4 097	233 693
14	14	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	10	1 549	15 490
15	15	222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0.18	221 831	39 930
16	16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.2	60 065	252 273
17	17	212-101-2301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.263	34 576	147 397
18	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.16589	339 177	56 266
19	19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0493	387 658	19 112
20	20	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.07029	1 470 012	103 327
			Итого по разделу: Фундамент под 2КТПБ				**2 384 202**
			Итого по локальной смете: Электросила.				**49 635 761**
			ИТОГО по акту:				**49 635 761**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				2640248.000 x 8.10%	213 860
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				49635761.000 + 213860.098	49 849 621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				2640248.000 x 0.05409035	142 811
		Сметная прибыль, 5.00%				2854108.098 x 5.00%	142 705
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(49849621.098 + 142811.931) x 5.000%	2 499 621
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					52 634 760
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2023 год, к = 1.0000				52634760.085 x 1.0000	52 634 760
		НДС (12%)				52634760.085 x 12%	6 316 171
		Итого с НДС				52634760.085 + 6316171.210	58 950 931

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	11.11.2024 08:37
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 12:14
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	11.11.2024 12:38
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 09:16
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 09:20
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	11.11.2024 08:42
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	12.11.2024 05:25
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.11.2024 11:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы	12.11.2024 12:00
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	12.11.2024 05:28 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	12.11.2024 05:31

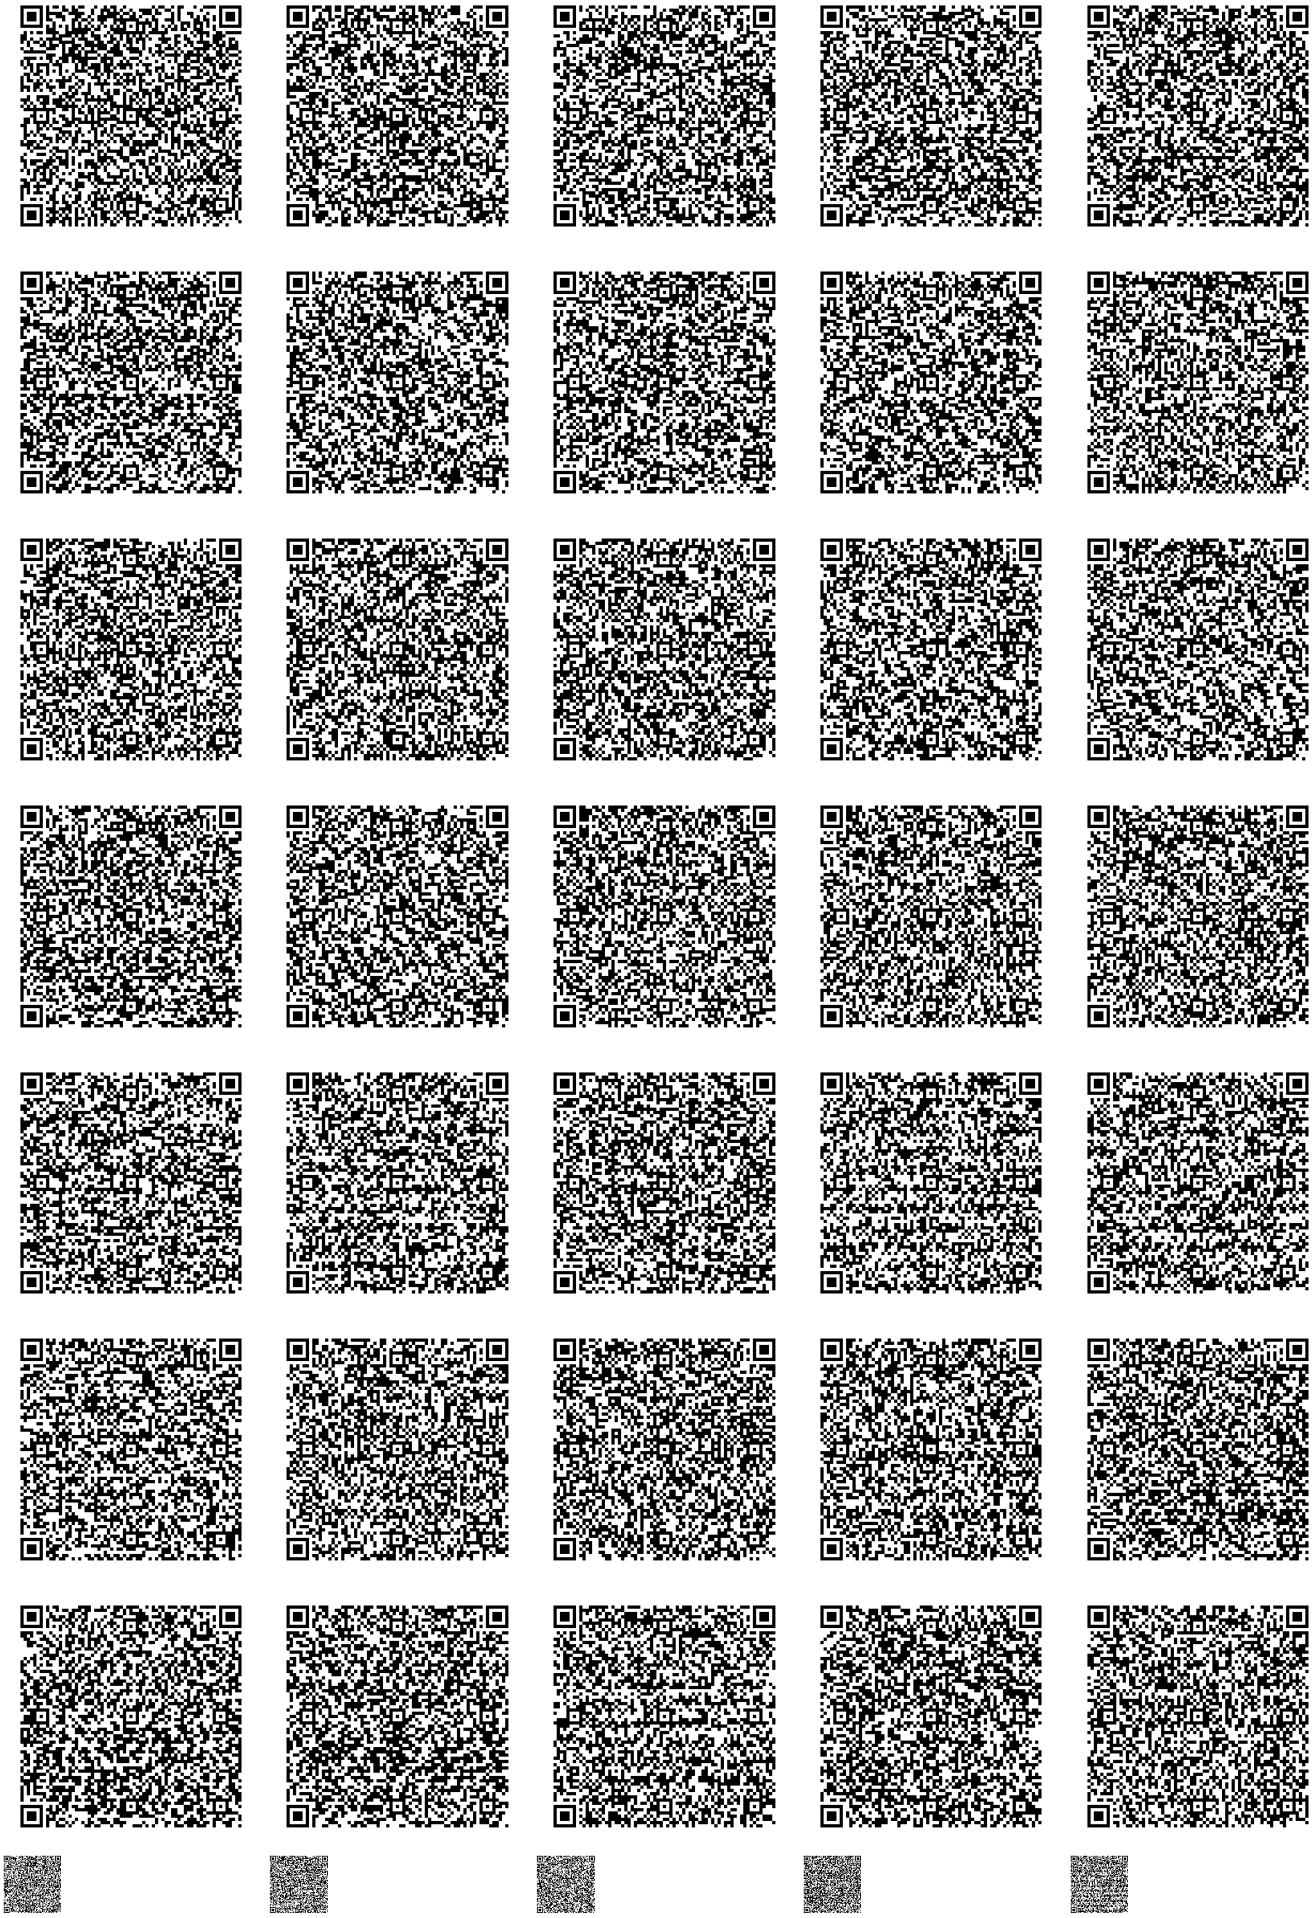

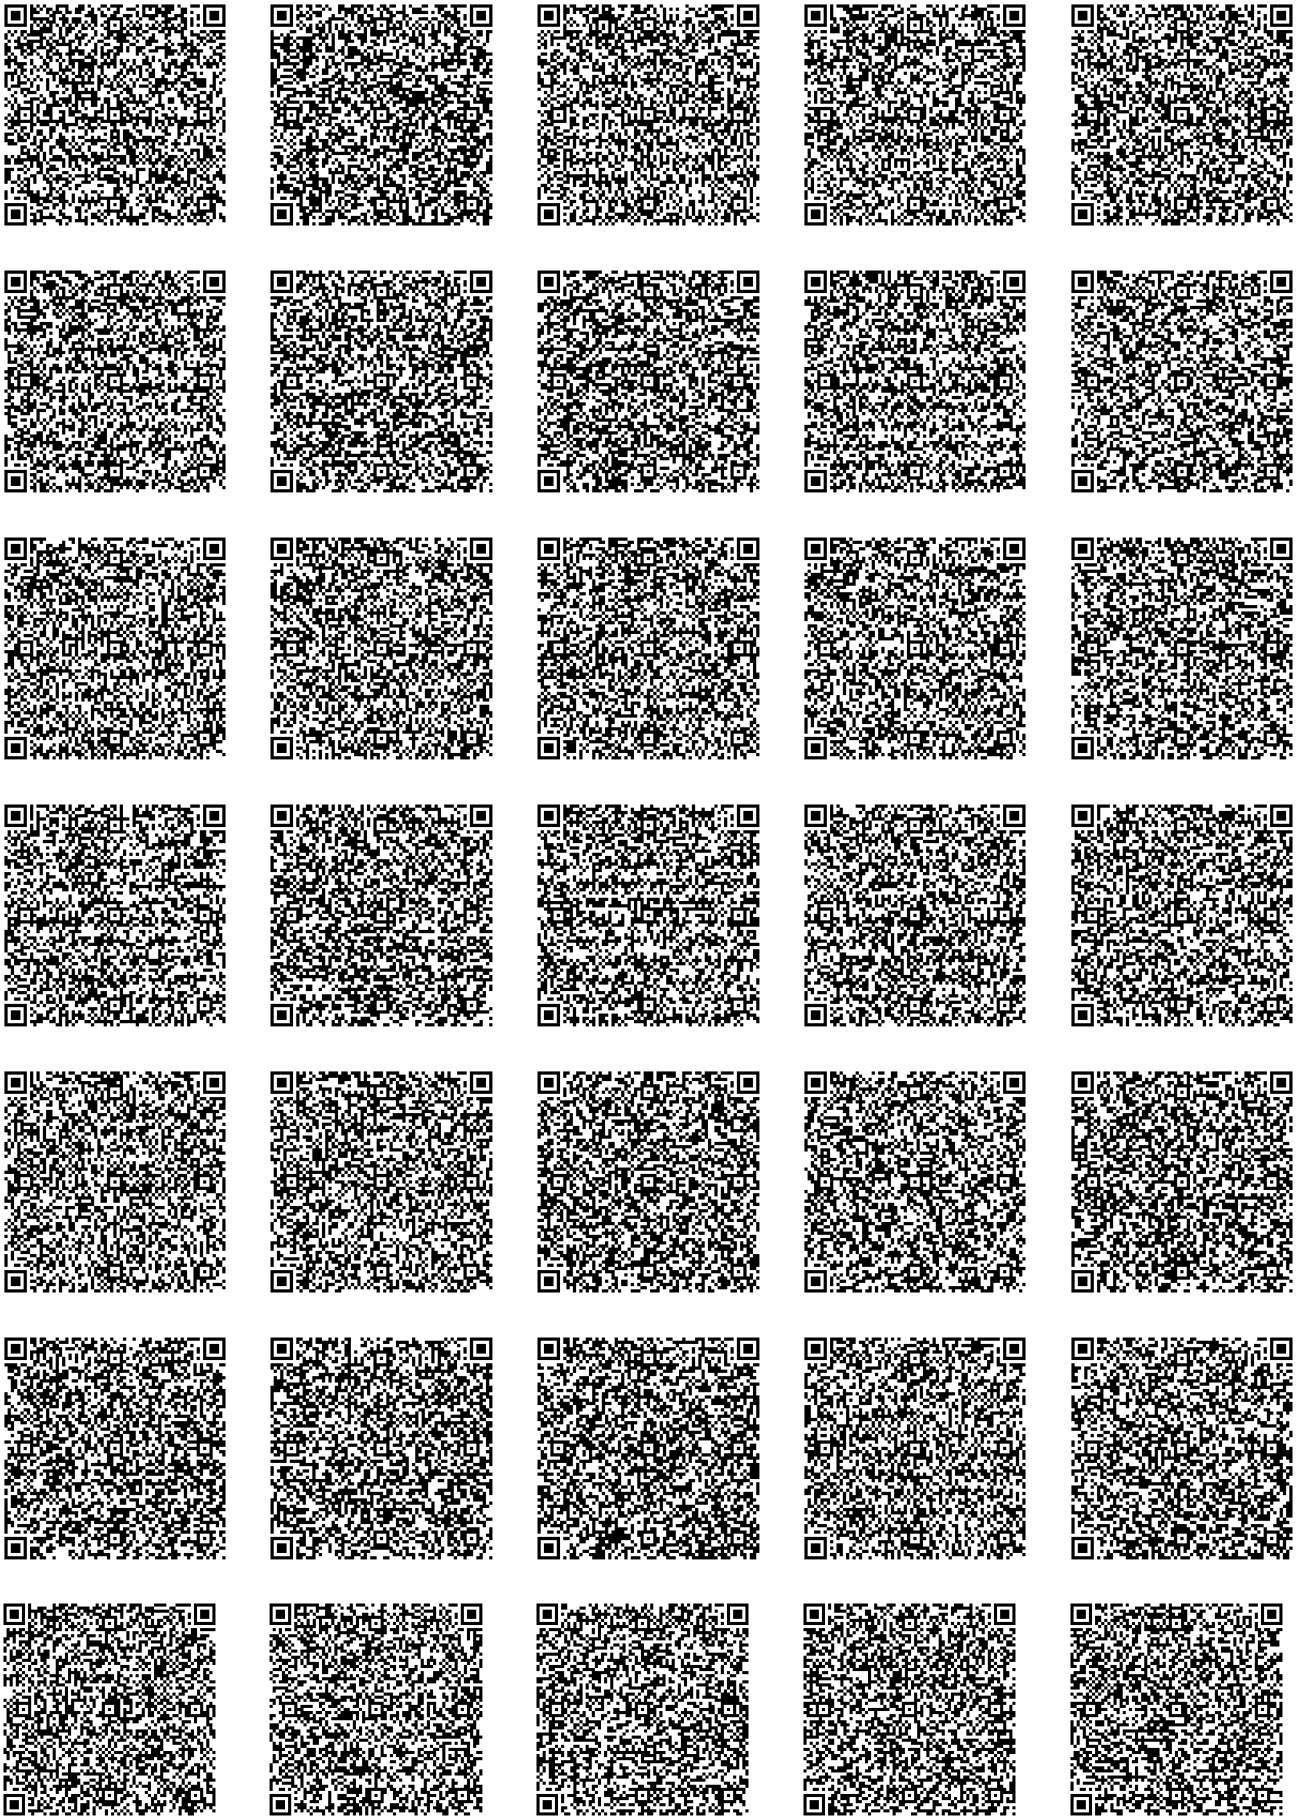

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Блок 4				
			Подраздел: Плиты ПМ4				
1	790	1106-0801-0112РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4.1	43 288	177 481
2	791	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.1615	34 212	142 373
3	792	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.053	387 658	20 546
4	793	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.526	339 177	178 407
			Итого по подразделу: Плиты ПМ4				**518 807**
			Итого по разделу: Блок 4				**518 807**
			Раздел: Блок 5				
			Подраздел: Фундамент ФМ-1 - 6шт.				
5	1078	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.1515792	8 436	1 279
6	1079	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.1743156	3 849	671
7	1080	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0.1515792	37 720	5 718
8	1081	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	1.44	74 039	106 616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	1082	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм /сетка С1/	т	0.08736	80 252	7 011
10	1083	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08736	338 778	29 596
11	1084	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.08472	1 467 786	124 351
12	1086	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12.6	4 097	51 622
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-1 - 6шт.				**326 864**
			Подраздел: Фундамент ФМ-2 - 1шт.				
13	1087	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.2631579	8 436	2 220
14	1088	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.3026316	3 849	1 165
15	1089	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0.2631579	37 720	9 926
16	1090	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	2.5	74 039	185 098
17	1091	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм /сетка С2/	т	0.0782	80 252	6 276
18	1092	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0782	338 778	26 492
19	1093	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0756	1 467 786	110 965
20	1095	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3.36	4 097	13 766
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-2 - 1шт.				**355 908**
			Подраздел: Навес лестницы Лм-1				
21	1096	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	24	1 925	46 200
22	1097	224-102-1007РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	24	4 033	96 792
23	1098	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В25/	м3	2.4	97 402	233 765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	1099	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.436	34 212	83 340
25	1100	1106-0301-0701РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /Кр-1/	т	0.19404	76 938	14 928
26	1101	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.27083	387 658	104 989
27	1102	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0594	339 177	20 147
			Итого по подразделу: Навес лестницы Лм-1				**600 162**
			Подраздел: Крыльцо Кр-4 и подпорная стена Пс-2				
28	1103	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.8834	37 720	33 322
29	1104	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	7.91	88 453	699 663
30	1105	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.0947	80 252	7 600
31	1106	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00441	387 658	1 710
32	1107	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.70742	339 177	239 941
33	1108	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	35.336	4 097	144 772
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-4 и подпорная стена Пс-2				**1 127 008**
			Подраздел: Фундамент ФМ-1				
34	1109	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.2	8 436	1 687
35	1110	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.23	3 849	885
36	1111	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.2	37 720	7 544
37	1112	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0.8	74 039	59 231
38	1113	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.014	80 252	1 124
39	1114	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.014	338 778	4 743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1115	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2.248	4 097	9 210
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-1				**84 424**
			Подраздел: Крыльцо Кр-5 и подпорная стена Пс-4				
41	1116	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.567	37 720	21 387
42	1117	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	6.7	102 698	688 077
43	1118	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.106	80 252	8 507
44	1119	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.012	387 658	4 652
45	1120	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.489	339 177	165 858
46	1121	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	24.3	4 097	99 557
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-5 и подпорная стена Пс-4				**988 038**
			Подраздел: Навес крыльца Кр-5				
47	1122	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.86224	63 710	54 933
48	1123	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.86224	421 739	363 640
49	1124	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.88069	100 375	88 399
50	1125	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.88069	421 739	371 421
51	1126	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.23628	1 485 776	351 059
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-5				**1 229 452**
			Подраздел: Плита Пм-2				
52	1129	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В20/	м3	3	97 402	292 206
53	1130	212-101-2101РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.045	30 673	93 399
54	1131	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.016	387 658	6 203

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	1132	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6141	339 177	208 289
			Итого по подразделу: Плита Пм-2				**600 097**
			Итого по разделу: Блок 5				**5 311 953**
			Раздел: Блок 6				
			Подраздел: Фундамент ФМ-1				
56	1277	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.2	8 436	1 687
57	1278	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.23	3 849	885
58	1279	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.2	37 720	7 544
59	1280	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	0.8	74 039	59 231
60	1281	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.014	80 252	1 124
61	1282	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.014	338 778	4 743
62	1283	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2.248	4 097	9 210
			Итого по подразделу: Фундамент ФМ-1				**84 424**
			Подраздел: Крыльцо Кр-3 и подп.стена ПС-3				
63	1284	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.567	37 720	21 387
64	1285	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	6.7	102 698	688 077
65	1286	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.106	80 252	8 507
66	1287	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.012	387 658	4 652
67	1288	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.489	339 177	165 858
68	1289	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	24.3	4 097	99 557
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-3 и подп.стена ПС-3				**988 038**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Навес крыльца Кр-3				
69	1290	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.86224	63 710	54 933
70	1291	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.86224	421 739	363 640
71	1292	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.88069	100 375	88 399
72	1293	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.88069	421 739	371 421
73	1294	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.23628	1 485 776	351 059
			Итого по подразделу: Навес крыльца Кр-3				**1 229 452**
			Подраздел: Плита Пм-1				
74	1297	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3	97 402	292 206
75	1298	212-101-2101РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.045	30 673	93 399
76	1299	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.016	387 658	6 203
77	1300	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6141	339 177	208 289
			Итого по подразделу: Плита Пм-1				**600 097**
			Подраздел: Плита Пм-1				
78	1310	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В25/	м3	0.6	97 402	58 441
79	1311	212-101-0903РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0.609	44 707	27 227
80	1312	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.027	80 252	2 167
81	1313	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.027	338 778	9 147
			Итого по подразделу: Плита Пм-1				**96 982**
			Подраздел: Подпорная стенка Пс-1				
82	1321	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.315	8 436	19 529
83	1322	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2.66225	3 849	10 247

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	1323	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	2.315	37 720	87 322
85	1324	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /Пс-1, бетон ссц В20/	м3	4.7	88 453	415 728
86	1325	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01475	387 658	5 718
87	1326	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.55041	339 177	186 686
88	1327	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	52.782	4 097	216 248
			Итого по подразделу: Подпорная стенка Пс-1				**941 479**
			Итого по разделу: Блок 6				**3 940 472**
			Раздел: Блок 7				
			Подраздел: Простенок				
89	1519	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм /бетон В25/. Устройство	м3	0.4	47 393	18 957
90	1520	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.406	34 212	13 890
91	1521	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.006	387 658	2 326
92	1522	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.043	339 177	14 584
			Итого по подразделу: Простенок				**49 758**
			Подраздел: Приямок ПР1 -1шт шт				
93	1547	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.64	8 436	5 399
94	1548	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0.736	3 849	2 833
95	1549	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.64	37 720	24 141
96	1550	1106-0201-0104РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 /бетон ссц В20/. Устройство	м3	1.28	24 101	30 849
97	1551	212-101-2101РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.2992	30 673	39 850
98	1552	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.06525	80 252	5 236

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	1553	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.06525	338 778	22 105
			Итого по подразделу: Приямок ПР1 -1шт пт				**130 413**
			Подраздел: Подпорная стенка Пс-1				
100	1554	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.1575	8 436	9 765
101	1555	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.331125	3 849	5 124
102	1556	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	1.1575	37 720	43 661
103	1557	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /Пс-1, бетон ссц В20/	м3	4.7	88 453	415 728
104	1558	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01475	387 658	5 718
105	1559	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.55041	339 177	186 686
106	1560	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	26.448	4 097	108 356
			Итого по подразделу: Подпорная стенка Пс-1				**775 040**
			Подраздел: Входная группа ВГ-2. Крыльцо				
107	1561	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	10.8	8 436	91 109
108	1562	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	12.42	3 849	47 805
109	1563	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	10.8	37 720	407 376
110	1564	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м /ФМЛ1, бетон ссц В20/	м3	11.72	58 858	689 816
111	1565	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /ПМ1,ПЛ1 бетон ссц В20/	м3	7.4	43 933	325 104
112	1566	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /ЛМ1 бетон В20/	м3	24	43 933	1 054 392
113	1567	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.406	387 658	157 389
114	1568	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.164	339 177	1 751 510

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	1569	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм /П1, П2, П3, П4, бетон ссц В20/	м3	26.72	88 453	2 363 464
116	1570	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09	387 658	34 889
117	1571	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.3	339 177	440 930
118	1573	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.10816	1 470 012	158 996
119	1574	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.70616	63 710	44 989
120	1575	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.70616	421 739	297 815
121	1576	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	2.51012	100 375	251 953
122	1577	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2.51012	421 739	1 058 615
123	1580	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	36	1 925	69 300
124	1581	224-102-1106РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	36	4 400	158 400
125	1582	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /бетон В25/	м3	3.6	97 402	350 647
126	1583	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.654	34 212	125 010
127	1584	1106-0301-0701РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.35456	76 938	27 279
128	1585	1106-0301-0601РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.35244	80 252	28 284
129	1586	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.059	387 658	22 872
130	1587	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.648	339 177	219 787
			Итого по подразделу: Входная группа ВГ-2. Крыльцо				**10 177 732**
			Итого по разделу: Блок 7				**11 132 943**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**20 904 175**
			ИТОГО по акту:				**20 904 175**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				20904175.855 x 8.10%	1 693 238
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				20904175.855 + 1693238.324	22 597 414

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				20904175.855 x 0.05409035	1 130 714
		Сметная прибыль, 5.00%				22597414.179 x 5.00%	1 129 870
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(22597414.179 + 1130714.129) x 5.000%	1 186 406
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					26 044 405
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				26044405.433 x 1.0182	26 518 413
		НДС (12%)				26518413.611 x 12%	3 182 209
		Итого с НДС				26518413.611 + 3182209.633	29 700 623

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	11.11.2024 04:40
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 06:34
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 06:48
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 06:56
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	11.11.2024 08:12
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	11.11.2024 06:41
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.11.2024 11:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	12.11.2024 05:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	12.11.2024 05:19
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	11.11.2024 05:21
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы	12.11.2024 12:03

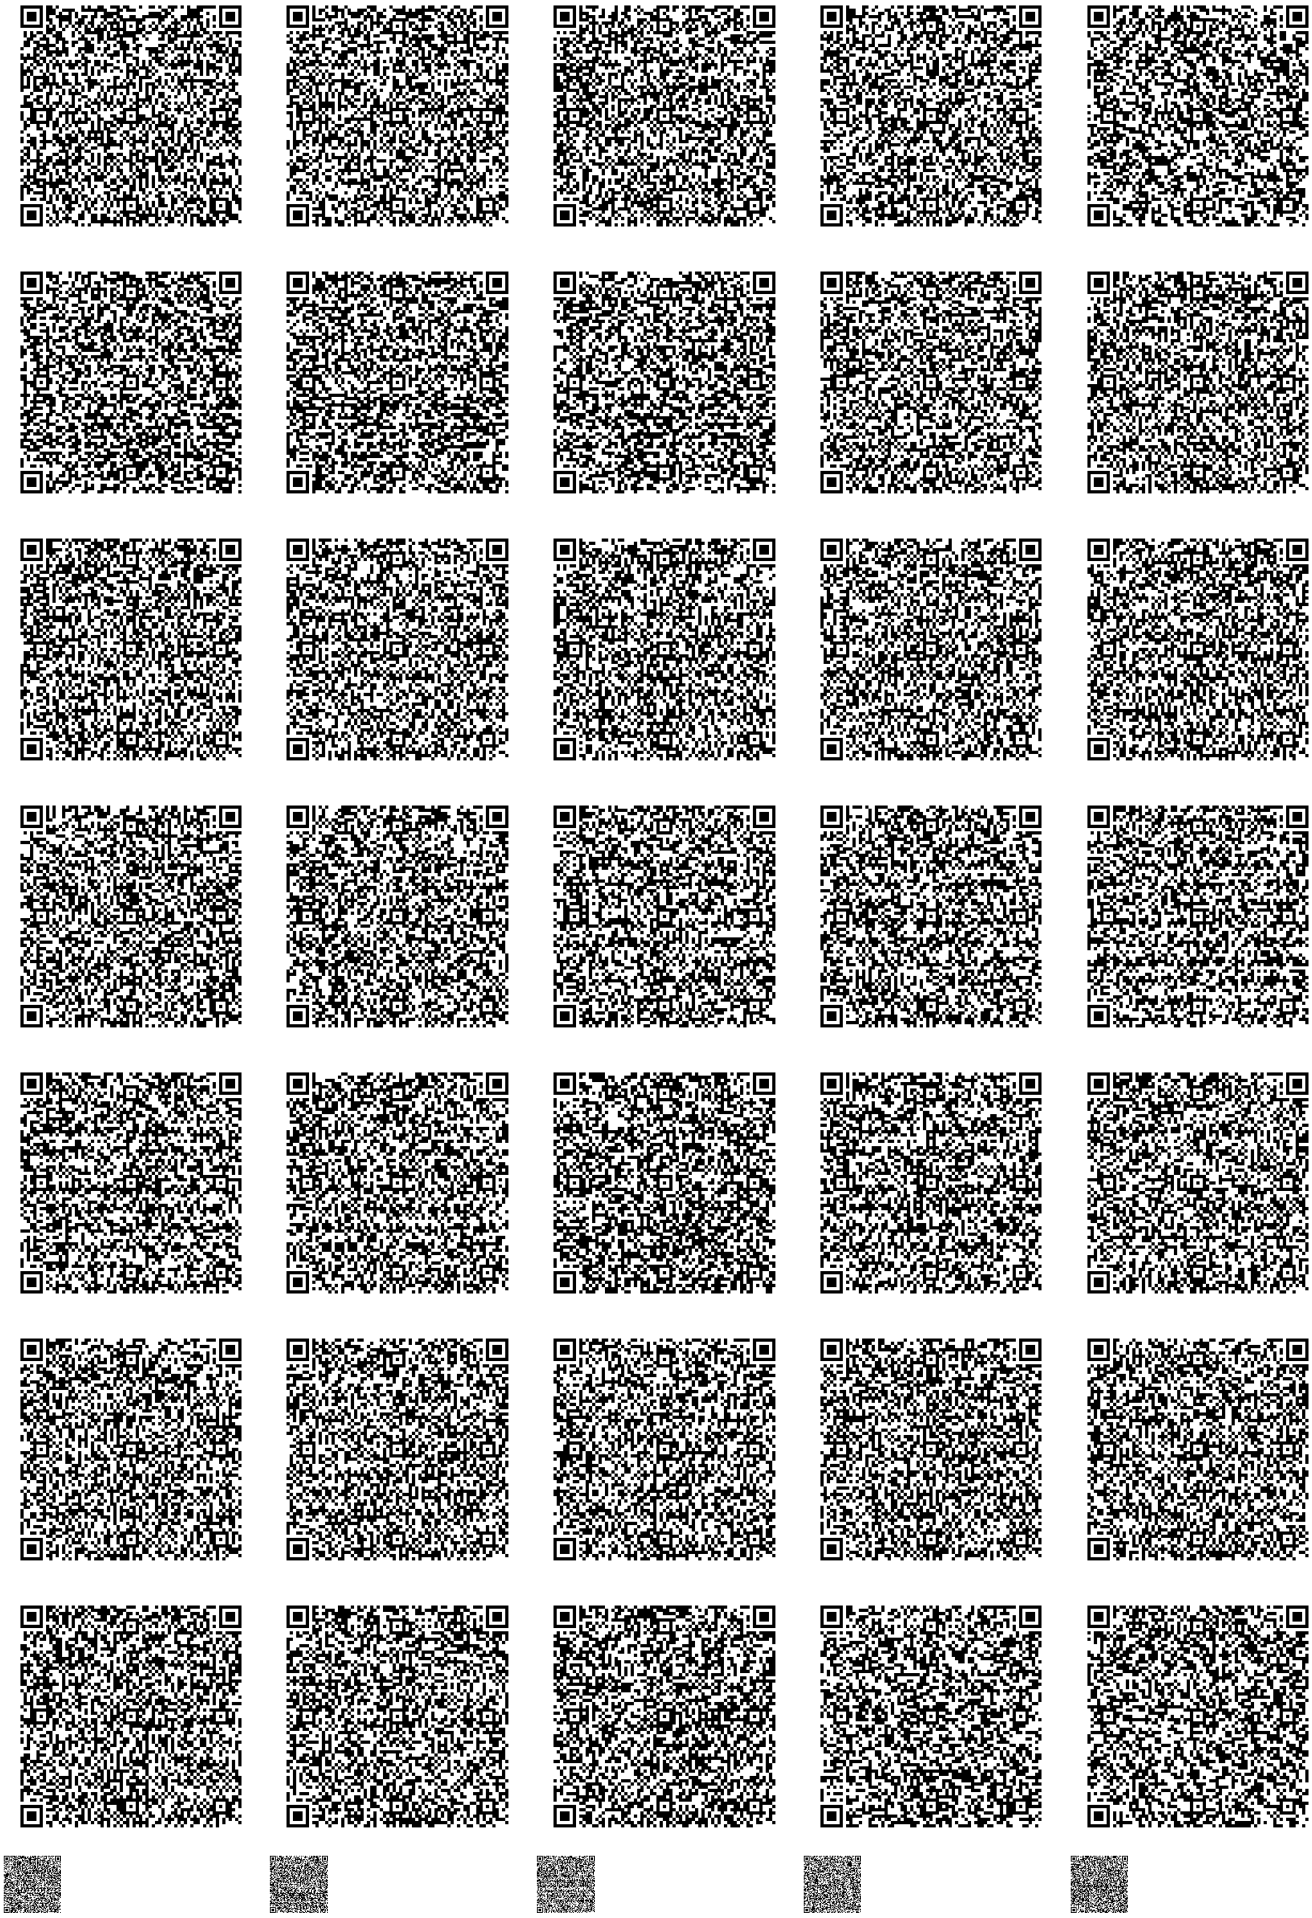

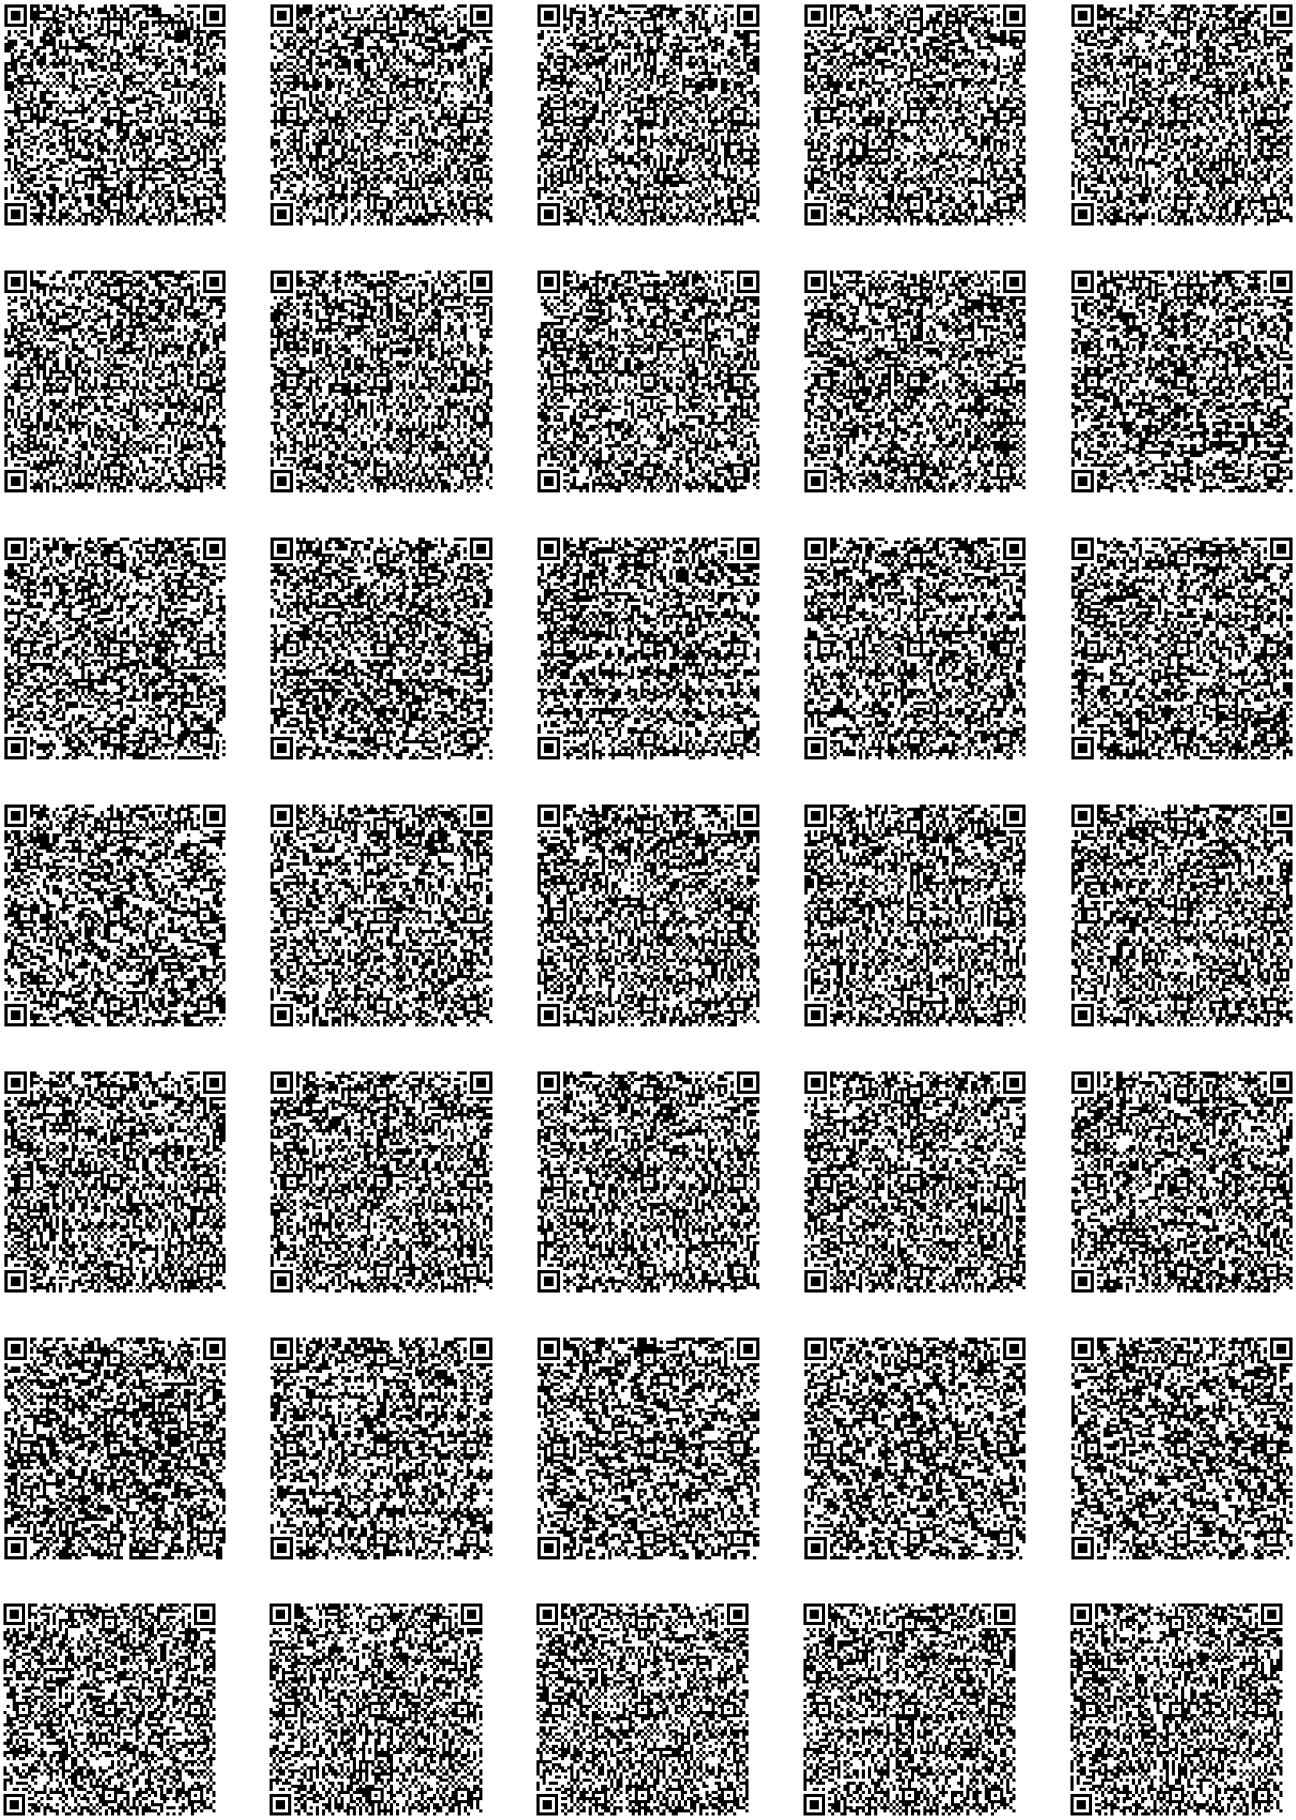

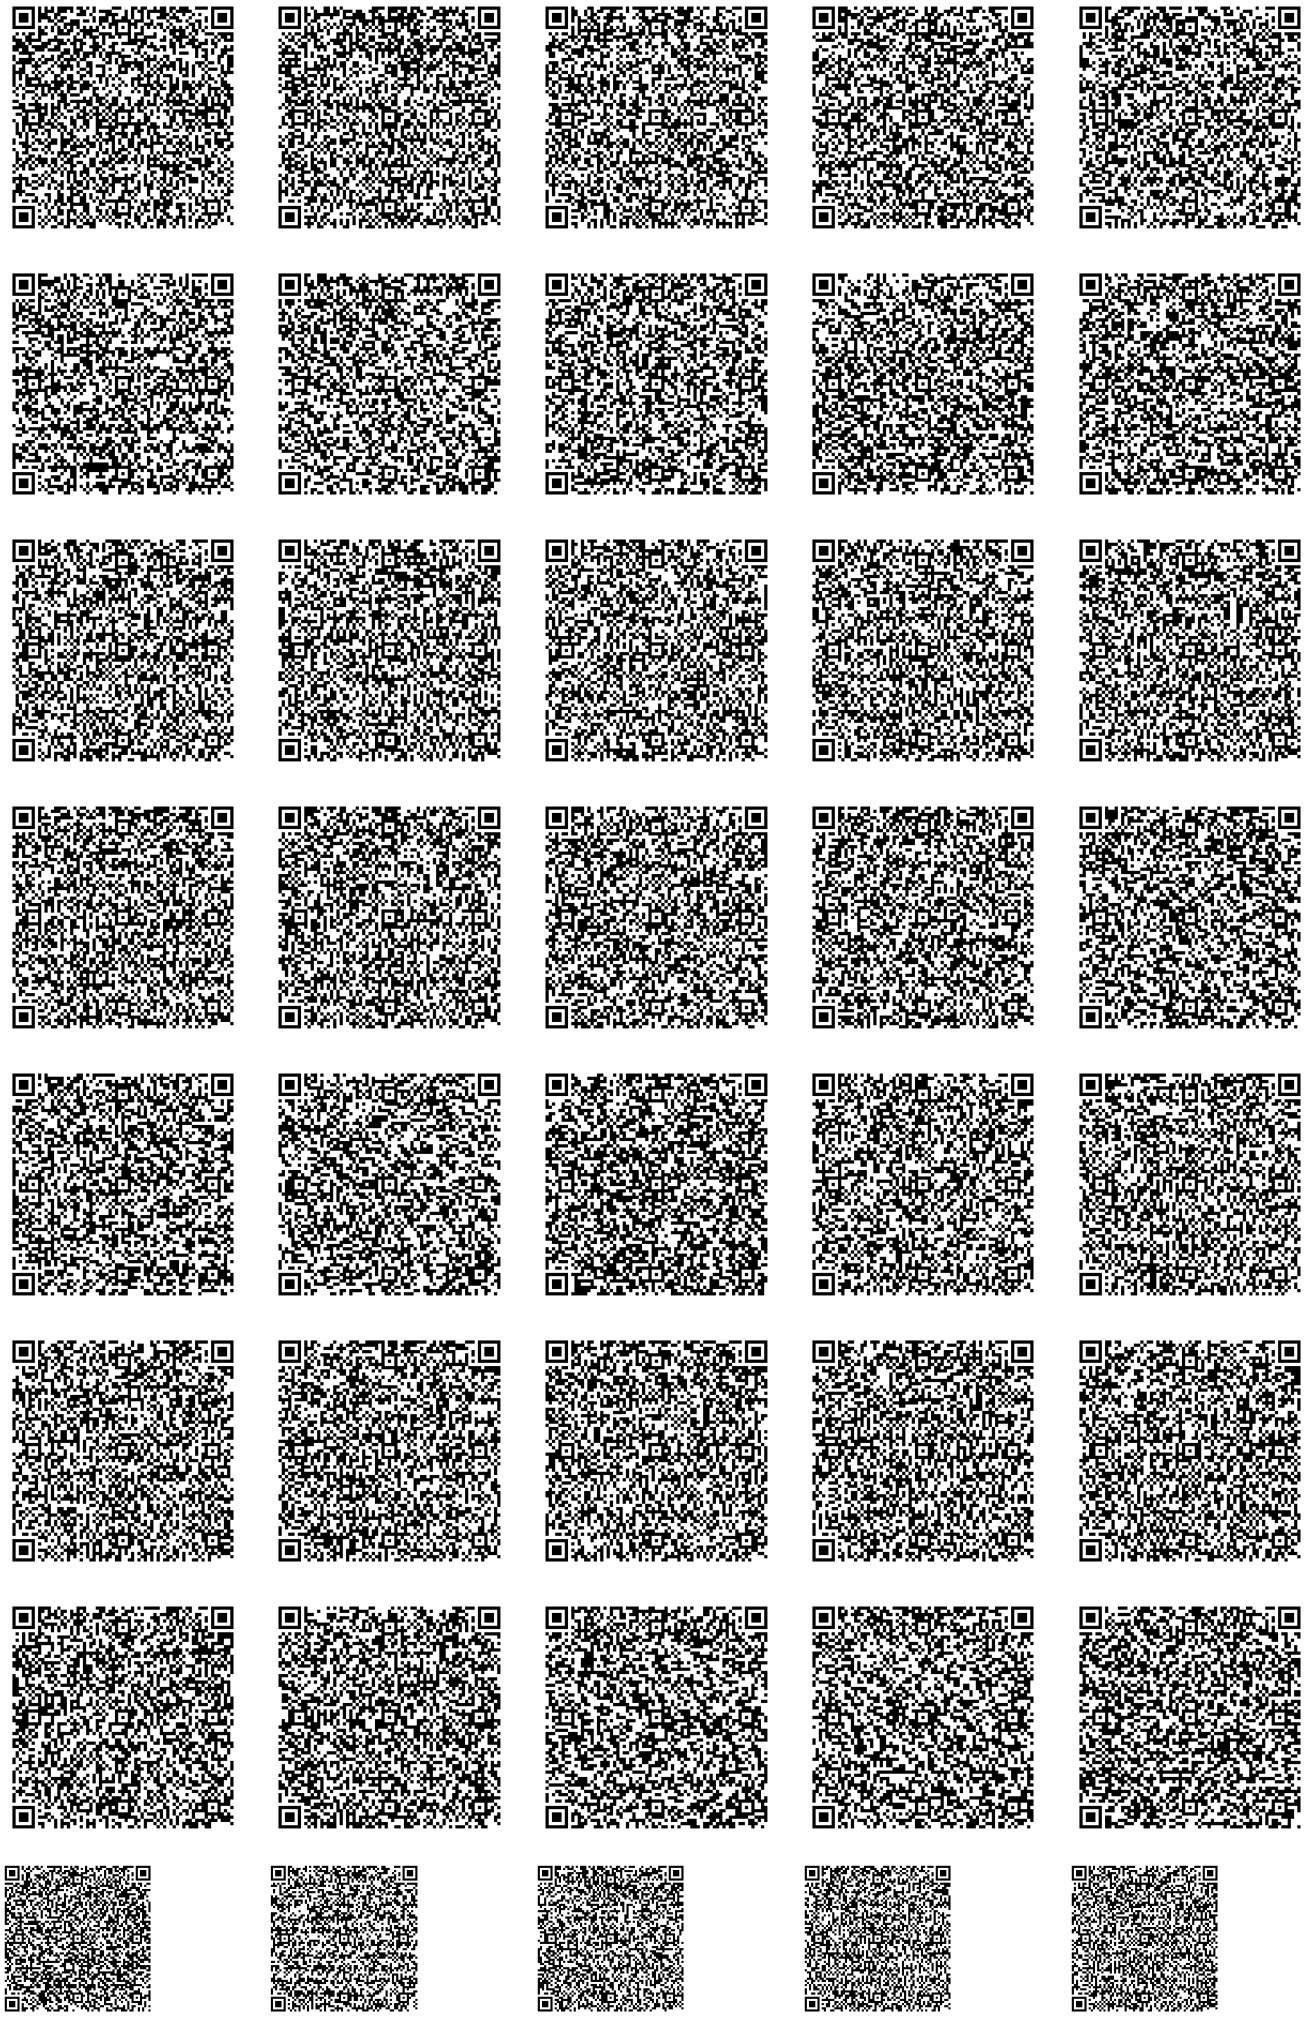

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство				
			Раздел: Вертикальная планировка				
			Подраздел: Планировка территории				
1	5	6101-0104-0106ЕСЦ РСНБ РК 2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	7411	109	807 799
2	6	6101-0104-0114ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106.	м3	7411	74	548 414
3	7	6101-0107-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /насыпь/	м3	7411	220	1 630 420
4	8	6101-0107-0108ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	7411	139	1 030 129
5	10	412-102-0202РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	40958.75	149	6 102 854
6	11	6101-0109-0106ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	14927.39	18	268 693
			Итого по подразделу: Планировка территории				**10 388 309**
			Итого по разделу: Вертикальная планировка				**10 388 309**
			Итого по локальной смете: Благоустройство				**10 388 309**
			ИТОГО по акту:				**10 388 309**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	10388309.000 x 8.10%	841 453
Итого с затратами на организацию и управление СМР	10388309.000 + 841453.069	11 229 762
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	10388309.000 x 0.05409035	561 907
Сметная прибыль, 5.00%	11229762.069 x 5.00%	561 488
Непредвиденные расходы, 5.000%	(11229762.069 + 561907.240) x 5.000%	589 583
Итого с непредвидемыми работами и затратами		12 942 740

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				12942740.878 x 1.0182	13 178 298
		НДС (12%)				13178298.761 x 12%	1 581 395
		Итого с НДС				13178298.761 + 1581395.851	14 759 694

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	11.11.2024 04:41
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 06:56
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 06:34
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	11.11.2024 06:49
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	11.11.2024 08:11
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	11.11.2024 06:42
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.11.2024 11:13 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	11.11.2024 05:20
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	12.11.2024 05:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	12.11.2024 05:20
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы	12.11.2024 12:02

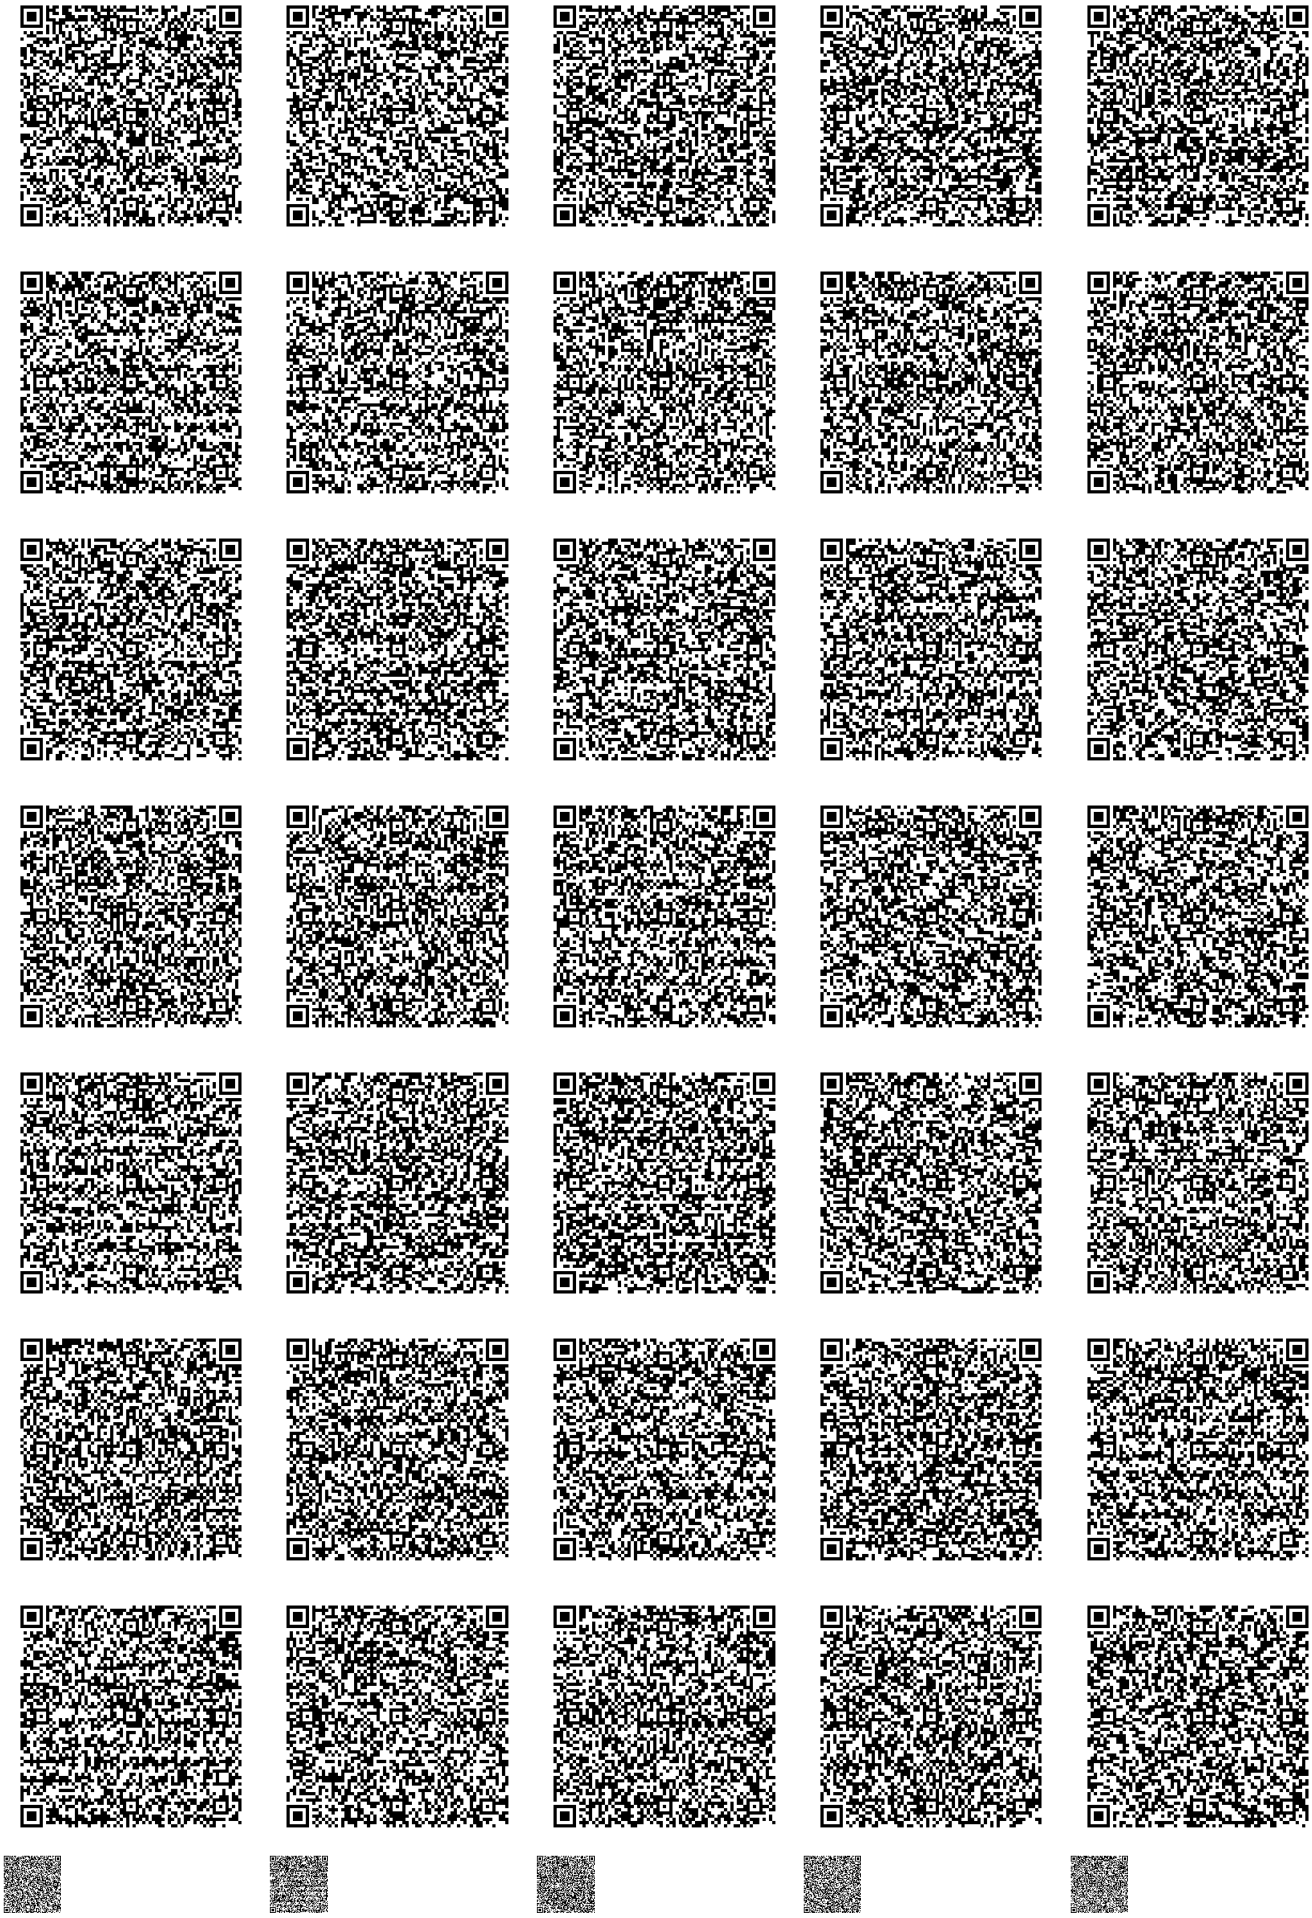

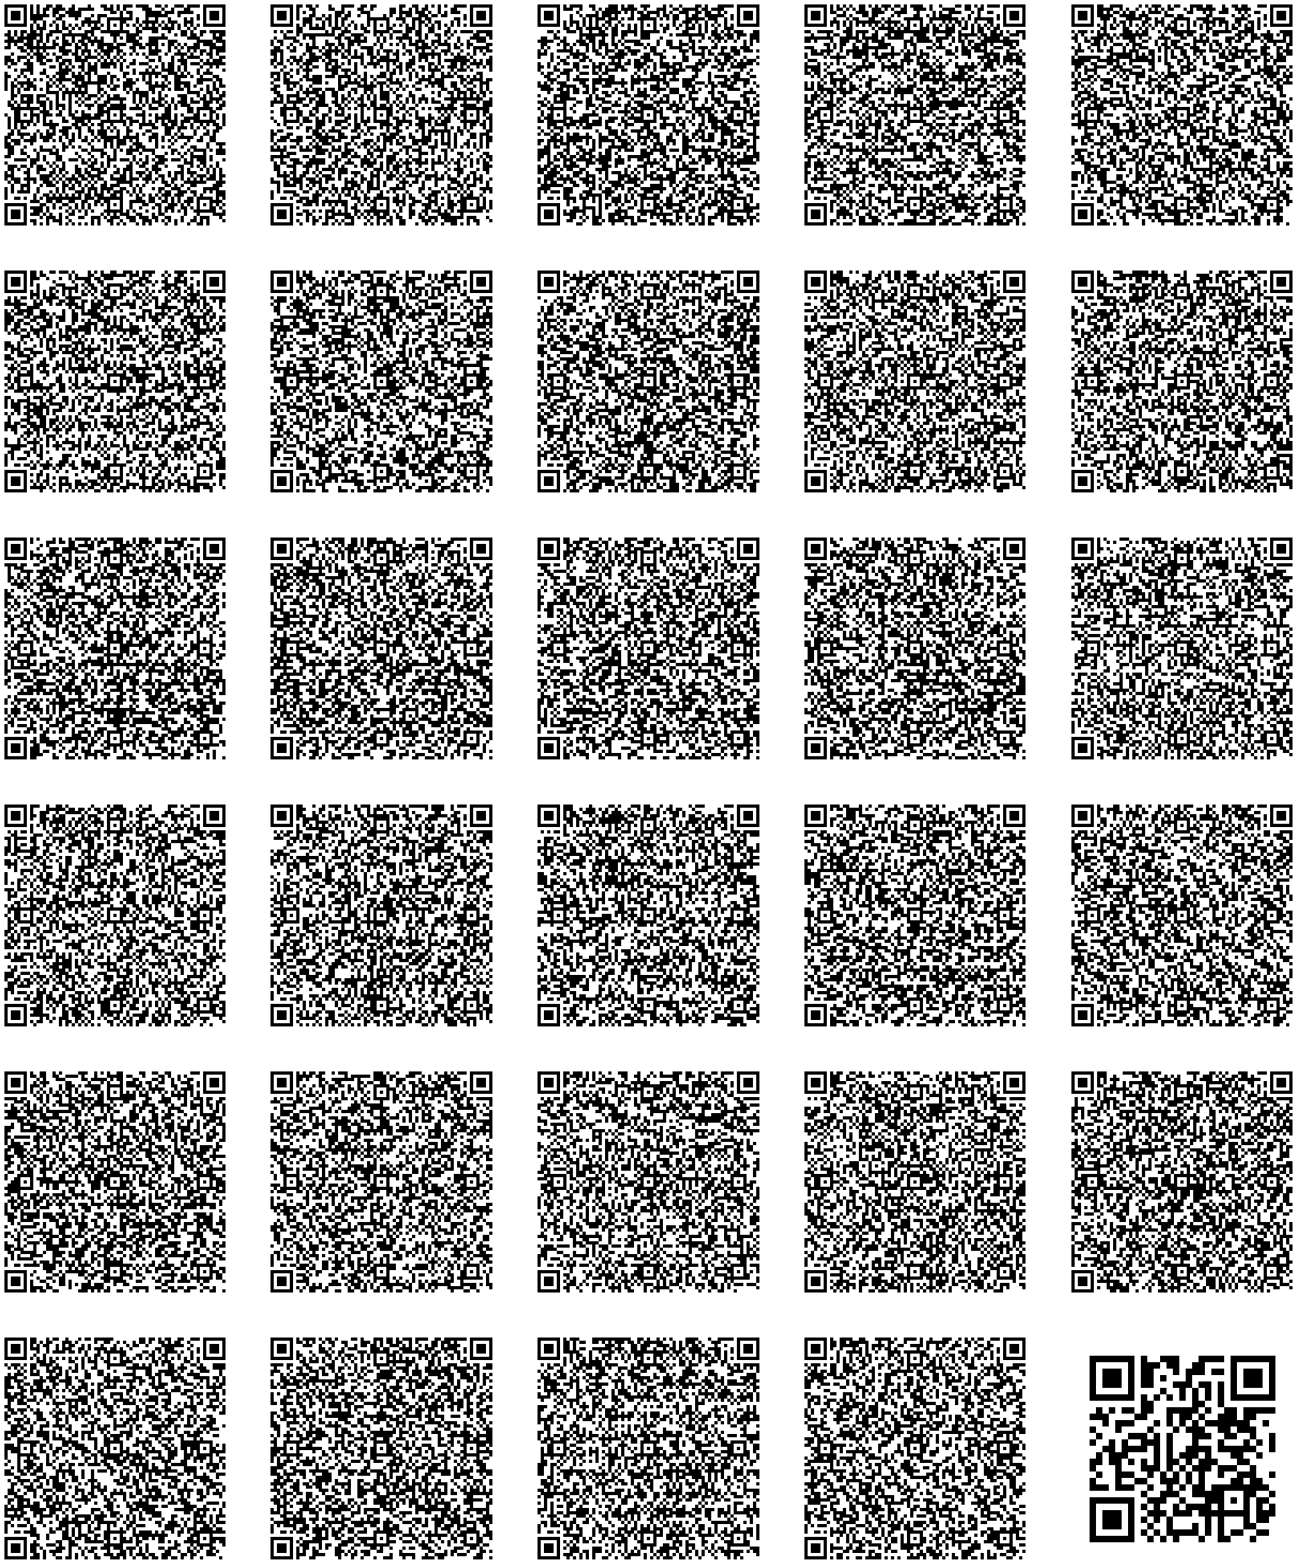

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 7				
1	85	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	610.74	1 406	858 700
2	86	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12.459096	28 485	354 897
3	87	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	610.74	174	106 269
4	88	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	18.688644	28 485	532 346
5	89	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.1677349	59 456	69 429
6	90	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.1677349	415 660	485 381
			Итого по подразделу: Тип 7				**2 407 022**
			Подраздел: Тип 12.1				
7	184	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	4.87	810	3 945
8	185	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	4.87	1 285	6 258

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	186	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	0.200644	57 335	11 504
10	187	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /0,59 м2 завести на стены/	м2	5.46	320	1 747
11	188	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /45 мм/	м2	4.87	1 406	6 846
12	189	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.099348	28 485	2 830
13	190	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4.87	145	706
14	191	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.124185	28 485	3 537
15	192	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0093114	59 456	554
16	193	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0093114	415 660	3 870
			Итого по подразделу: Тип 12.1				**41 798**
			Подраздел: Тип 13				
17	195	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	125.46	810	101 623
18	196	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	125.46	1 285	161 216
19	197	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	5.168952	57 335	296 362
20	198	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	125.46	320	40 147
21	199	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /45 мм/	м2	125.46	1 406	176 397
22	200	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.559384	28 485	72 904

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	201	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	125.46	145	18 192
24	202	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.19923	28 485	91 130
25	203	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2398795	59 456	14 262
26	204	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2398795	415 660	99 708
			Итого по подразделу: Тип 13				**1 071 941**
			Подраздел: Тип 14				
27	208	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	724.95	810	587 210
28	209	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	724.95	1 285	931 561
29	210	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	29.86794	57 335	1 712 478
30	211	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /28 м2 завести на стены/	м2	752.95	320	240 944
31	212	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	724.95	1 406	1 019 280
32	213	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14.78898	28 485	421 264
33	214	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	724.95	174	126 140
34	215	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22.18347	28 485	631 896
35	216	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.3861044	59 456	82 412
36	217	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.3861044	415 660	576 148
			Итого по подразделу: Тип 14				**6 329 334**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 15				
37	244	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	293.41	810	237 662
38	245	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	293.41	1 285	377 032
39	246	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	12.088492	57 335	693 094
40	247	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	358.32	320	114 662
41	248	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /40 мм/	м2	293.41	1 406	412 534
42	249	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.985564	28 485	170 499
43	250	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	293.41	117	34 329
44	251	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.985564	28 485	170 499
45	252	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.5609999	59 456	33 355
46	253	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.5609999	415 660	233 185
			Итого по подразделу: Тип 15				**2 476 851**
			Подраздел: Тип 16 (лист АР-2.3)				
47	260	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	70.35	810	56 983
48	261	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	70.35	1 285	90 400
49	262	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	2.89842	57 335	166 181
50	263	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /3,5 м2 завести на стены/	м2	73.85	320	23 632

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	264	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /60 мм/	м2	70.35	1 406	98 912
52	265	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.43514	28 485	40 880
53	266	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	70.35	232	16 321
54	267	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.87028	28 485	81 760
55	268	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1345092	59 456	7 997
56	269	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1345092	415 660	55 910
			Итого по подразделу: Тип 16 (лист АР-2.3)				**638 976**
			Подраздел: Тип 16.1				
57	278	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	20.42	810	16 540
58	279	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	20.42	1 285	26 240
59	280	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	0.841304	57 335	48 236
60	281	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /2,57 м2 завести на стены/	м2	22.99	320	7 357
61	282	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /60 мм/	м2	20.42	1 406	28 711
62	283	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.416568	28 485	11 866
63	284	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20.42	232	4 737
64	285	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.833136	28 485	23 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	286	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.039043	59 456	2 321
66	287	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.039043	415 660	16 229
			Итого по подразделу: Тип 16.1				**185 969**
			Подраздел: Тип 19				
67	321	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	39.61	810	32 084
68	322	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	39.61	1 285	50 899
69	323	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	1.631932	57 335	93 567
70	324	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /2,7 м2 завести на стены/	м2	42.31	320	13 538
71	325	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	39.61	1 406	55 691
72	326	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.808044	28 485	23 017
73	327	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	39.61	174	6 892
74	328	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.212066	28 485	34 526
75	329	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0757343	59 456	4 503
76	330	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0757343	415 660	31 480
			Итого по подразделу: Тип 19				**346 199**
			Подраздел: Тип 19.1				
77	339	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	16.97	810	13 746

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	340	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	16.97	1 285	21 806
79	341	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	0.699164	57 335	40 087
80	342	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /1,6 м2 завести на стены/	м2	18.57	320	5 941
81	343	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /45 мм/	м2	16.97	1 406	23 860
82	344	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.346188	28 485	9 861
83	345	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	16.97	145	2 461
84	346	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.432735	28 485	12 326
85	347	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0324466	59 456	1 929
86	348	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0324466	415 660	13 487
			Итого по подразделу: Тип 19.1				**145 505**
			Подраздел: Тип 20				
87	351	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	54.75	810	44 348
88	352	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	54.75	1 285	70 354
89	353	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	2.2557	57 335	129 331
90	354	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /3,8 м2 завести на стены/	м2	58.55	320	18 736
91	355	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /45 мм/	м2	54.75	1 406	76 978

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	356	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.1169	28 485	31 815
93	357	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	54.75	145	7 938
94	358	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.396125	28 485	39 769
95	359	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.104682	59 456	6 224
96	360	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.104682	415 660	43 512
			Итого по подразделу: Тип 20				**469 006**
			Подраздел: Тип 20.1				
97	363	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	405.8	810	328 698
98	364	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	405.8	1 285	521 453
99	365	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	16.71896	57 335	958 582
100	366	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	405.8	320	129 856
101	367	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /50 мм/	м2	405.8	1 406	570 555
102	368	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8.27832	28 485	235 808
103	369	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	405.8	174	70 609
104	370	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12.41748	28 485	353 712
105	371	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.7758896	59 456	46 131

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	372	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.7758896	415 660	322 506
			Итого по подразделу: Тип 20.1				**3 537 910**
			Подраздел: Тип 33				
107	393	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	35.72	810	28 933
108	394	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	35.72	1 285	45 900
109	395	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	1.471664	57 335	84 378
110	396	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /6,1 м2 завести на стены/	м2	41.82	320	13 382
111	397	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /45 мм/	м2	35.72	1 406	50 222
112	398	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.728688	28 485	20 757
113	399	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	35.72	145	5 179
114	400	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.91086	28 485	25 946
115	401	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0682966	59 456	4 061
116	402	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0682966	415 660	28 388
			Итого по подразделу: Тип 33				**307 146**
			Итого по разделу: Полы				**17 957 657**
			Раздел: Кровля (лист АР-10)				
			Подраздел: Тип 1				
117	701	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	1065.91	1 679	1 789 662
118	702	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	142.722349	57 335	8 182 985

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	703	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	54.899365	63 122	3 465 357
120	704	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	1065.91	150	159 886
121	705	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1897.3198	120	227 678
122	709	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	342	14 434	4 936 428
123	710	261-101-0104 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 /Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм/	м3	352.26	14 646	5 159 199
124	711	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40 мм/	м2	1135	1 281	1 453 935
125	712	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.694728	28 485	19 789
126	713	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	1135	170	192 950
127	714	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.15788	28 485	32 982
128	715	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2.170128	59 456	129 027
129	716	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.170128	415 660	902 035
130	717	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	1065.91	769	819 684
131	718	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1225.7965	1 210	1 483 213
132	719	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	1225.7965	2 858	3 503 326
133	720	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	255.8184	649	166 026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	721	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	1065.91	356	379 463
135	722	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1225.7965	1 210	1 483 213
			Итого по подразделу: Тип 1				**34 486 847**
			Подраздел: Тип 2				
136	727	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых /2 слоя/	м2	834.6	333	277 922
137	728	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	м2	1719.276	2 561	4 403 066
138	729	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	834.6	769	641 807
139	730	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	959.79	1 210	1 161 346
140	731	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	959.79	2 858	2 743 080
141	732	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	200.304	649	129 997
142	733	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	834.6	356	297 118
143	734	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	959.79	1 210	1 161 346
			Итого по подразделу: Тип 2				**10 815 682**
			Итого по разделу: Кровля (лист АР-10)				**45 302 529**
			Раздел: Фасад 1-21 (лист 20)				
144	781	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	1839.63	2 418	4 448 225
145	782	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов /линеарными панелями	м2	1839.63	7 744	14 246 094
146	783	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	183.963	31 847	5 858 669

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	784	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	9.81	37 936	372 152
148	785	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	1839.63	5 430	9 989 191
149	786	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	2023.593	4 956	10 028 927
150	787	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	1839.63	495	910 617
			Итого по разделу: Фасад 1-21 (лист 20)				**45 853 876**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**109 114 062**
			ИТОГО по акту:				**109 114 062**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	109114062.539 x 8.10%	8 838 239
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	109114062.539 + 8838239.482	117 952 302
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	109114062.539 x 0.05409035	5 902 017
	Сметная прибыль, 5.00%	117952302.021 x 5.00%	5 897 615
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(117952302.021 + 5902017.521) x 5.000%	6 192 715
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		135 944 650
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	135944650.620 x 1.0368	140 947 413
	НДС (12%)	140947413.763 x 12%	16 913 689
	Итого с НДС	140947413.763 + 16913689.652	157 861 103

Лист согласования
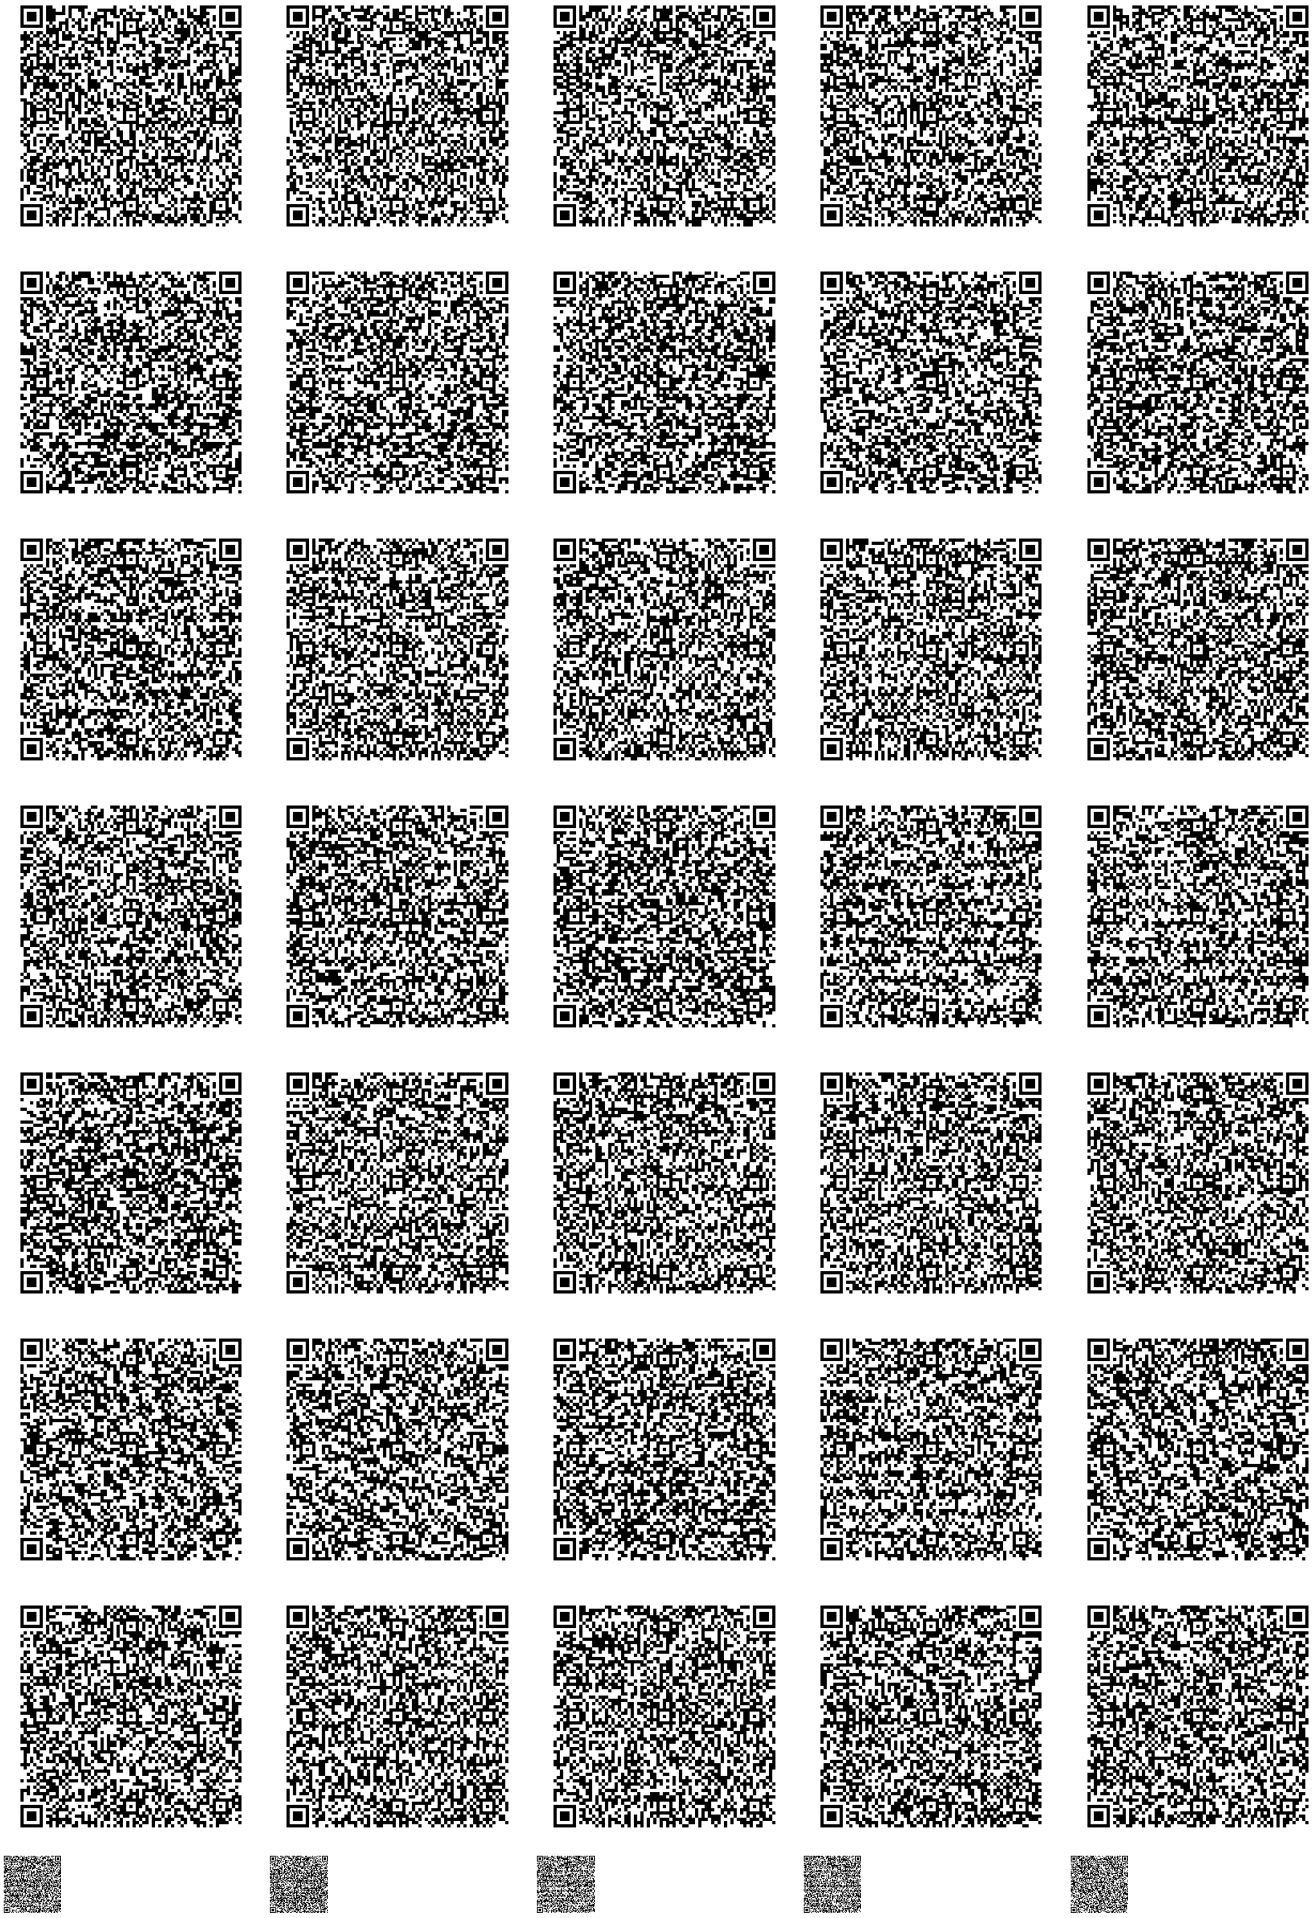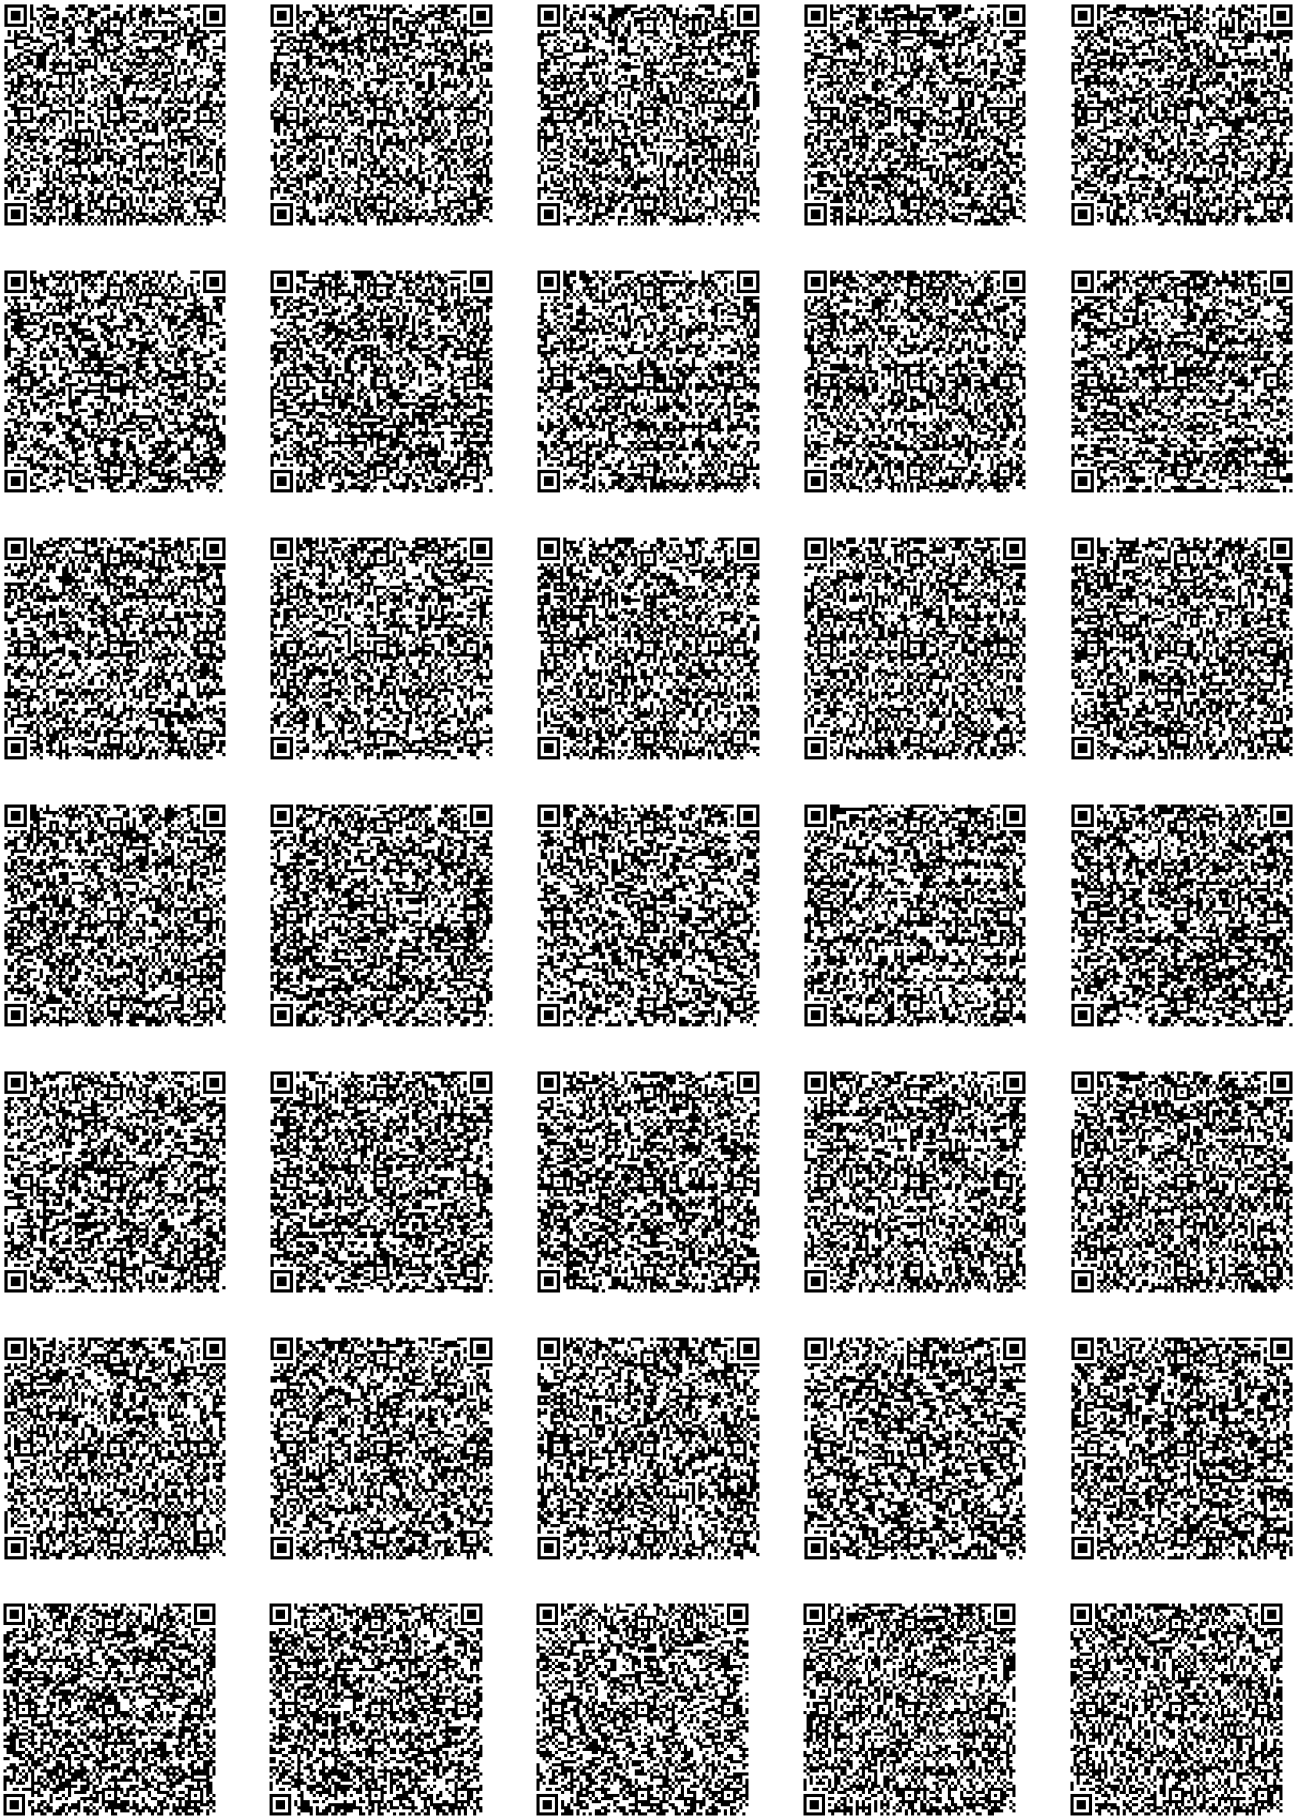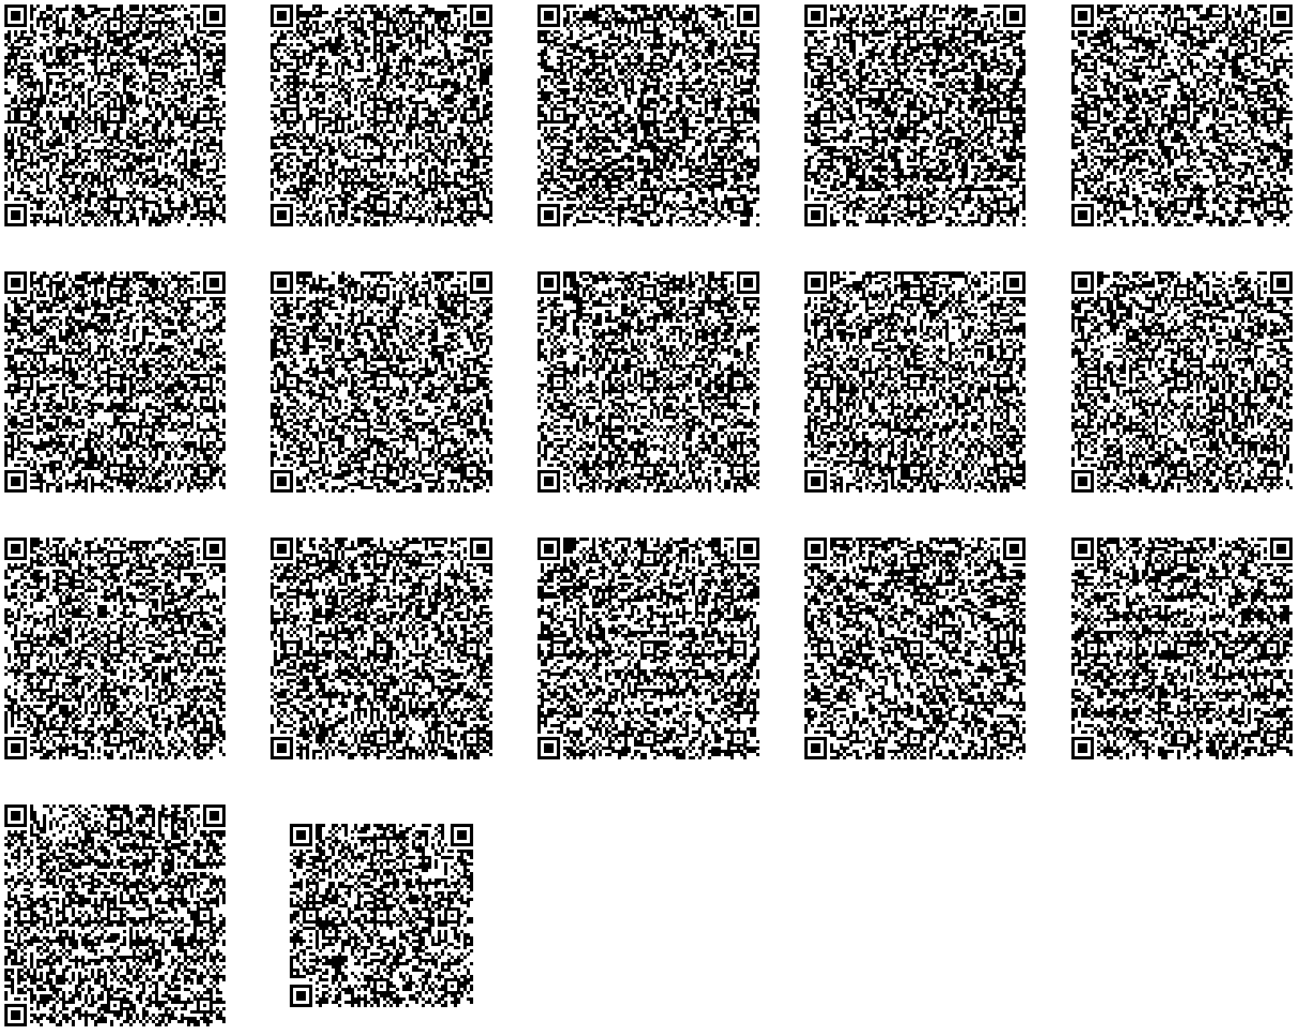
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	12.11.2024 04:56
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	12.11.2024 06:31
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	12.11.2024 06:52
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	12.11.2024 07:16
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	12.11.2024 07:03
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	12.11.2024 04:57
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	12.11.2024 11:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ ТУРСУНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Кызылординской, Жамбылской областям и городу Алматы	12.11.2024 11:51
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	12.11.2024 09:55
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	12.11.2024 10:02 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	12.11.2024 10:03
