Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		
				Дополнительное соглашение №6	**31.07.2024**		
				Дополнительное соглашение №7	**15.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №8	**19.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №9	**29.08.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 002 324 349	2 002 324 349	1 787 789 597,32				214 534 751,68	2 002 324 349
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года	306 433 052	306 433 052	273 600 939,29				32 832 112,71	306 433 052

М.П.

Заказчик Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7b9a1607-1e26-4f5a-b9fa-89b9dd985b71)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №22	Жижесборник	8 799 744
2	Акт №23	Силовое электрооборудование	56 194 188
3	Акт №24	Конструкции железобетонные	9 262 476
4	Акт №25	Благоустройство	51 691 509
5	Акт №26	Архитектурно-строительная часть	180 485 135
		ИТОГО	**306 433 052**

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7b9a1607-1e26-4f5a-b9fa-89b9dd985b71)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД null		Подписано: 28.11.2024 12:36
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 27.11.2024 17:57
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН null	Заместитель директора	Подписано: 27.11.2024 18:59
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 28.11.2024 12:24

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7b9a1607-1e26-4f5a-b9fa-89b9dd985b71)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7b9a1607-1e26-4f5a-b9fa-89b9dd985b71)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#7b9a1607-1e26-4f5a-b9fa-89b9dd985b71)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Жижесборник емкостью 50 м3				
			Раздел: null				
			Подраздел: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2.	м3	620	570	353 400
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	62	8 300	514 600
3	3	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	620	76	47 120
4	4	6101-0106-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101	м3	620	43	26 660
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	620	576	357 120
			Итого по подразделу: ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ				**1 298 900**
			Подраздел: ЖБ конструкции				
6	6	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.9	12 898	63 200
7	7	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	4.9	37 720	184 828
8	8	6110-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	м2	49	440	21 560

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	235-103-0118РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	56.35	797	44 911
10	10	1106-1001-0101 РСНБ РК 2022	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	37.4	24 297	908 708
11	11	212-101-2301РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	37.961	34 576	1 312 540
12	12	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.039	387 658	15 119
13	13	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.43	338 778	145 675
14	14	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.693	339 177	913 404
15	15	235-301-0801РСНБ РК 2022	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера /добавка для бетона, лист 2-1,п.5/	кг	120	2 435	292 200
			Итого по подразделу: ЖБ конструкции				**3 902 145**
			Подраздел: Гидроизоляция				
16	16	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /горловина/	м2	14.059664	4 097	57 602
17	17	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	60.28	3 683	222 011
18	18	6112-0304-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой, по листовым материалам	м2	60.28	4 856	292 720
19	19	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания /лист 2-1,п.6,7/	м	27	4 382	118 314
20	20	261-105-0653РСНБ РК 2022	Клей двухкомпонентный эпоксидный, тиксотропный, для структурного уплотнения и склеивания	кг	1.8	10 872	19 570
			Итого по подразделу: Гидроизоляция				**710 217**
			Подраздел: Гильза				
21	21	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг /гильза/	т	0.024741	102 559	2 537
22	22	241-102-0252РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	0.3	38 287	11 486
			Итого по подразделу: Гильза				**14 023**
			Подраздел: горловина -2шт. /лист 9-11/				
23	23	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	1.32	43 472	57 383

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	225-101-0104РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	6 789	13 578
25	25	225-101-0106РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	20 136	80 544
26	26	225-101-0605РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	26 537	53 074
27	27	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	2	8 789	17 578
28	28	244-202-0101РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46 078
			Итого по подразделу: горловина -2шт. /лист 9-11/				**268 235**
			Итого по разделу: null				**6 193 520**
			Итого по локальной смете: Жижесборник емкостью 50 м3				**6 193 520**
			ИТОГО по акту:				**6 193 520**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				6193520.000 x 8.10%	501 675
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				6193520.000 + 501675.144	6 695 195
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				6193520.000 x 0.05409035	335 009
		Сметная прибыль, 5.00%				6695195.144 x 5.00%	334 759
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(6695195.144 + 335009.647) x 5.000%	351 510
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					7 716 474
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				7716474.787 x 1.0182	7 856 914
		НДС (12%)				7856914.628 x 12%	942 829
		Итого с НДС				7856914.628 + 942829.755	8 799 744

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	27.11.2024 11:40
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:48
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 12:35
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:06
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	27.11.2024 13:54
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	28.11.2024 03:44
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	28.11.2024 04:21
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 04:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	28.11.2024 06:04 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 06:51

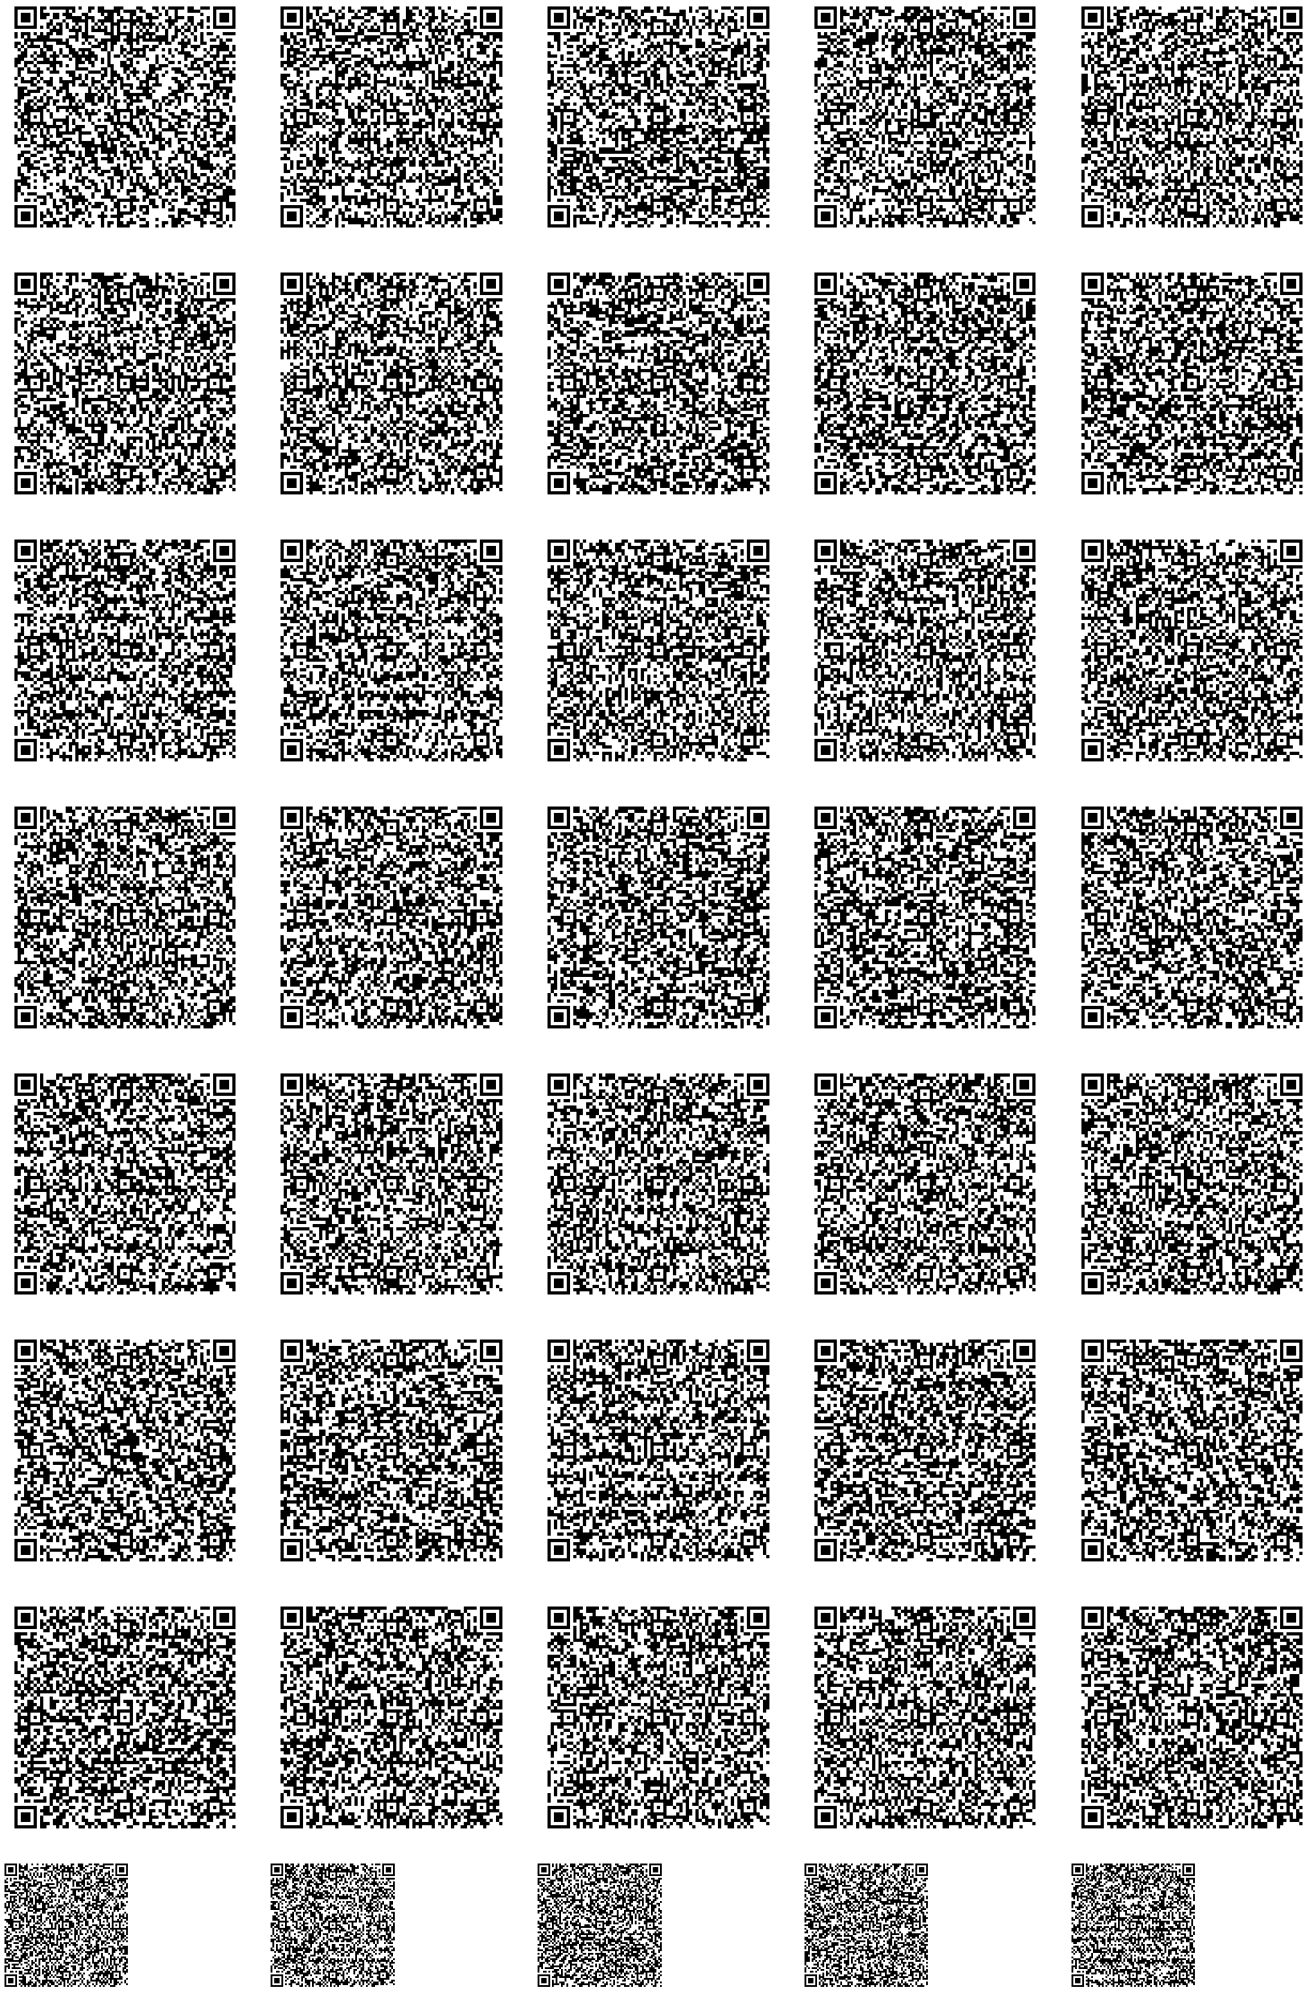

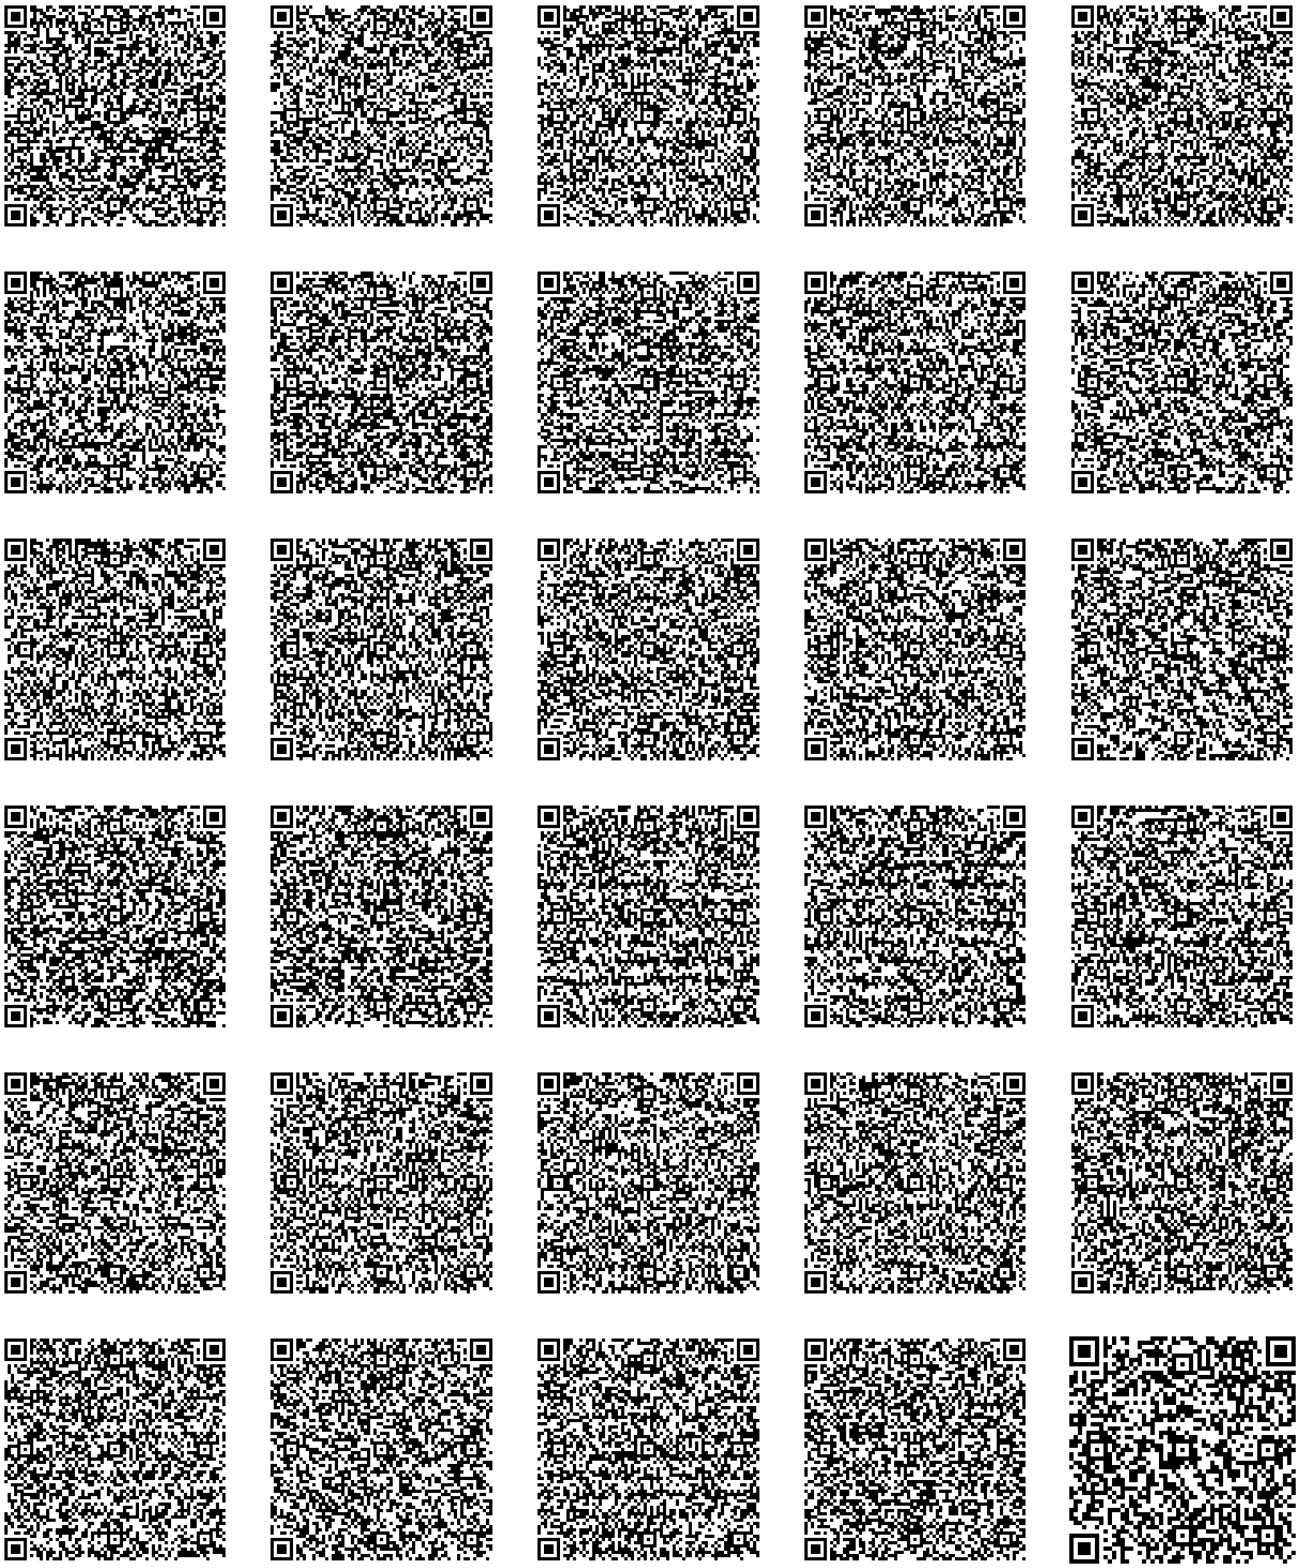

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Силовое электрооборудование				
			Раздел: null				
			Подраздел: ВРУ №1				
1	1	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 809	107 618
2	2	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377	1 718 377
3	3	515-301-0312 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	684 887	684 887
4	4	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 127	10 254
5	5	247-301-0354 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	2	56 700	113 400
			Итого по подразделу: ВРУ №1				**2 634 536**
			Подраздел: ШС 1				
6	6	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 809	53 809
7	7	515-301-0566 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7124-54У4	шт.	1	740 921	740 921
8	8	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	5 790	69 480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2 824
10	10	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	13	1 964	25 532
11	11	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: ШС 1				**941 555**
			Подраздел: АВР				
12	12	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 809	53 809
13	13	247-201-0843 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54 /вводная панельс АВР ВРУ-1-17-70УХЛ4/	шт.	1	140 815	140 815
14	14	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5 127
15	15	247-301-0354 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56 700	56 700
			Итого по подразделу: АВР				**256 451**
			Подраздел: ЩС1				
16	16	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
17	17	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
18	18	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5 790	28 950
19	19	247-204-2530 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А	шт.	1	3 458	3 458
20	20	247-204-1834 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	1	9 364	9 364
21	21	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
23	23	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
24	24	247-215-0219 РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	1	48 989	48 989
			Итого по подразделу: ЩС1				**124 948**
			Подраздел: ВРУ№2				
25	25	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	53 809	53 809
26	26	515-301-0307 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	1 568 425	1 568 425
27	27	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5 127
28	28	247-301-0354 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5	шт.	1	56 700	56 700
			Итого по подразделу: ВРУ№2				**1 684 061**
			Подраздел: Кабельная-трубная продукция				
29	29	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	6760	749	5 063 240
30	30	243-107-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	1239.3	1 877	2 326 166
31	31	243-108-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 (ок)-0,66	м	316.2	2 164	684 257
32	32	243-107-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	249.9	2 738	684 226
33	33	243-108-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6 (ок)-0,66	м	91.8	3 083	283 019
34	34	243-107-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0,66	м	153	4 531	693 243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	243-108-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	40.8	4 935	201 348
36	36	243-107-2906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-0,66	м	408	7 172	2 926 176
37	37	243-108-2906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x16 (ок)-0,66	м	10.2	7 557	77 081
38	38	243-107-2907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66	м	89.76	11 357	1 019 404
39	39	243-108-2907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x25 (ок)-0,66	м	15.3	11 785	180 310
40	40	243-107-2911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66	м	3.06	22 162	67 816
41	41	243-107-3012 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x70 (мк)-1	м	6.12	31 469	192 590
42	42	243-107-3013 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x95 (мк)-1	м	3.06	43 299	132 495
43	43	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x1,5 (ок)-0,66	м	51	398	20 298
44	44	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	2682.6	601	1 612 243
45	45	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x2,5 (ок)-0,66	м	1545.3	601	928 725
46	46	243-107-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x1,5 (ок)-0,66	м	51	519	26 469
47	47	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x6 (ок)-0,66	м	71.4	2 164	154 510
48	48	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	4100	88	360 800
49	49	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	1525	111	169 275

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	170	172	29 240
51	51	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	680	239	162 520
			Итого по подразделу: Кабельная-трубная продукция				**17 995 451**
			Подраздел: ЩС-1.1				
52	52	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
53	53	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
54	54	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	13	5 790	75 270
55	55	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
56	56	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	3 554	42 648
57	57	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-1.1				**158 888**
			Подраздел: ЩС-1.2				
58	58	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
59	59	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
60	60	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 790	46 320
61	61	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
62	62	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 554	24 878

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-1.2				**112 168**
			Подраздел: ЩС-1.3				
64	64	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	17 442	52 326
65	65	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	16 311	48 933
66	66	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	51	5 790	295 290
67	67	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	3	2 259	6 777
68	68	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	48	3 554	170 592
69	69	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-1.3				**584 719**
			Подраздел: ЩС-1.3.1				
70	70	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
71	71	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
72	72	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	5 790	40 530
73	73	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
74	74	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554	21 324
75	75	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
77	77	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-1.3.1				**116 589**
			Подраздел: КН-ЩС-1.3.1				
78	78	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
79	79	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-1.3.1				**10 968**
			Подраздел: ЩС-1.3.2				
80	80	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
81	81	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
82	82	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	5 790	40 530
83	83	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
84	84	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554	21 324
85	85	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
86	86	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
87	87	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-1.3.2				**116 589**
			Подраздел: КН-ЩС-1.3.2				
88	88	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-1.3.2				**10 968**
			Подраздел: ЩС-1.3.3				
90	90	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
91	91	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
92	92	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
93	93	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
94	94	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
95	95	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
96	96	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
97	97	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-1.3.3				**107 245**
			Подраздел: КН-ЩС-1.3.3				
98	98	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
99	99	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-1.3.3				**10 968**
			Подраздел: ЩС-1.3.4				
100	100	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
101	101	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
103	103	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
104	104	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
105	105	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
106	106	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
107	107	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-1.3.4				**107 245**
			Подраздел: КН-ЩС-1.3.2				
108	108	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
109	109	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-1.3.2				**10 968**
			Подраздел: ЩС-К1				
110	110	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	52 403	52 403
111	111	515-301-0566 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-7124-54У4	шт.	1	740 921	740 921
112	112	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	10	5 790	57 900
113	113	247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2 965	2 965
114	114	247-204-0853 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 6А 4,5 кА "D"	шт.	3	2 769	8 307

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	247-204-0857 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"	шт.	2	2 769	5 538
116	116	247-204-0859 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	3	2 769	8 307
117	117	247-204-0861 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	1	2 769	2 769
118	118	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-К1				**889 911**
			Подраздел: ЩС-К2				
119	119	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
120	120	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
121	121	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 790	46 320
122	122	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
123	123	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 554	24 878
124	124	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-К2				**115 342**
			Подраздел: ЩС-К3				
125	125	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
126	126	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
127	127	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	5 790	69 480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	128	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
129	129	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39 094
130	130	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-К3				**152 718**
			Подраздел: ЩС-Х				
131	131	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
132	132	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
133	133	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 790	46 320
134	134	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
135	135	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	2 016	14 112
136	136	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-Х				**104 576**
			Подраздел: ЩС-2.1				
137	137	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
138	138	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
139	139	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	14	5 790	81 060
140	140	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	13	3 554	46 202
142	142	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-2.1				**171 406**
			Подраздел: ЩС-2.2				
143	143	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
144	144	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
145	145	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	14	5 790	81 060
146	146	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
147	147	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	13	3 554	46 202
148	148	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-2.2				**171 406**
			Подраздел: ЩС-2.3				
149	149	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
150	150	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
151	151	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	11	5 790	63 690
152	152	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
153	153	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39 094

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	154	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩС-2.3				**147 634**
			Подраздел: ЩС-2.1.1				
155	155	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
156	156	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
157	157	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
158	158	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
159	159	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
160	160	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
161	161	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
162	162	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.1.1				**107 245**
			Подраздел: КН-ЩС-2.1.1				
163	163	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
164	164	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.1.1				**10 968**
			Подраздел: ЩС-2.2.1				
165	165	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
166	166	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	167	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
168	168	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
169	169	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
170	170	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
171	171	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
172	172	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.2.1				**107 245**
			Подраздел: КН-ЩС-2.2.1				
173	173	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
174	174	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.2.1				**10 968**
			Подраздел: ЩС-2.3.1				
175	175	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
176	176	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
177	177	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	7	5 790	40 530
178	178	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
179	179	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	6	3 554	21 324

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
180	180	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
181	181	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
182	182	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.3.1				**116 589**
			Подраздел: КН-ЩС-2.3.1				
183	183	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
184	184	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.3.1				**10 968**
			Подраздел: ЩС-2.3.2				
185	185	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
186	186	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
187	187	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
188	188	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
189	189	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17 770
190	190	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
191	191	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
192	192	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18A 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.3.2				**107 245**
			Подраздел: КН-ЩС-2.3.2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	193	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
194	194	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.3.2				**10 968**
			Подраздел: ЩС-2.3.3				
195	195	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
196	196	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
197	197	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5 790	28 950
198	198	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
199	199	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14 216
200	200	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
201	201	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
202	202	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.3.3				**97 901**
			Подраздел: КН-ЩС-2.3.3				
203	203	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
204	204	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.3.3				**10 968**
			Подраздел: ЩС-2.3.4				
205	205	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	206	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
207	207	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5 790	28 950
208	208	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
209	209	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14 216
210	210	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
211	211	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
212	212	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.3.4				**97 901**
			Подраздел: КН-ЩС-2.3.4				
213	213	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
214	214	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.3.4				**10 968**
			Подраздел: ЩС-2.3.5				
215	215	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
216	216	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
217	217	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5 790	28 950
218	218	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
219	219	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14 216
220	220	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
221	221	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
222	222	247-208-2927 СпрСЦ 05.2024	Контактор NXC-18 18А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт.	1	5 768	5 768
			Итого по подразделу: ЩС-2.3.5				**97 901**
			Подраздел: КН-ЩС-2.3.5				
223	223	6125-0104-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	1	7 997	7 997
224	224	247-209-0102 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2 971	2 971
			Итого по подразделу: КН-ЩС-2.3.5				**10 968**
			Подраздел: ЩСН				
225	225	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
226	226	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 534	7 534
227	227	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	8	5 790	46 320
228	228	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
229	229	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	866	2 598
230	230	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	782	782
231	231	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 398	2 398

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
232	232	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7 108
233	233	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ЩСН				**97 353**
			Подраздел: ШСВ				
234	234	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
235	235	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
236	236	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	14	5 790	81 060
237	237	247-204-0663 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 730	2 730
238	238	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
239	239	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	866	5 196
240	240	247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 611	2 611
241	241	247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 271	2 271
242	242	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 591	10 364
243	243	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ШСВ				**151 446**
			Подраздел: ШСВ				
244	244	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
245	245	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
246	246	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	12	5 790	69 480
247	247	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400	2 400
248	248	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
249	249	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	866	4 330
250	250	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 398	7 194
251	251	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 591	5 182
252	252	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ШСВ				**132 626**
			Подраздел: ШСВ				
253	253	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
254	254	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
255	255	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	9	5 790	52 110
256	256	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 444	2 444
257	257	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
258	258	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	866	1 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
259	259	247-204-0611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	782	1 564
260	260	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 398	4 796
261	261	247-204-0658 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 591	2 591
262	262	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ШСВ				**109 277**
			Подраздел: ШС-ДУ				
263	263	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
264	264	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10 468
265	265	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	11	5 790	63 690
266	266	247-205-0420 РСНБ РК 2022	Выключатель-разъединитель ВН-102 3Р 100А	шт.	1	2 495	2 495
267	267	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	866	3 464
268	268	247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	4	2 611	10 444
269	269	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 444	4 888
270	270	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ШС-ДУ				**123 692**
			Подраздел: ШСО				
271	271	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
272	272	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
273	273	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	5	5 790	28 950
274	274	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
275	275	247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	4	3 760	15 040
276	276	252-301-1485 РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	10 801	10 801
			Итого по подразделу: ШСО				**82 944**
			Подраздел: ШСНп				
277	277	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
278	278	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8 452	8 452
279	279	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	4	5 790	23 160
280	280	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
281	281	247-204-0653 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 611	5 222
282	282	247-204-0655 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 398	2 398
			Итого по подразделу: ШСНп				**59 044**
			Подраздел: ШС-СС				
283	283	6119-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	17 442	17 442
284	284	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 534	7 534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
285	285	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	24	5 790	138 960
286	286	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
287	287	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	11	866	9 526
288	288	247-204-5103 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	1	3 760	3 760
289	289	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	11	763	8 393
			Итого по подразделу: ШС-СС				**187 874**
			Подраздел: КМ-В13;В12;ЯУ-N1;ЯУ-N8;ЯУ-N2;ЯУ-N3				
290	290	6124-0103-2004 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж блок-контактора	шт.	3	7 879	23 637
291	291	247-208-0104 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	2 543	7 629
292	292	6124-0303-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	4	14 958	59 832
293	293	515-301-0128 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А	шт.	1	539 353	539 353
294	294	515-301-0122 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	1	665 141	665 141
295	295	515-301-0130 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	508 466	508 466
296	296	515-301-0132 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А	шт.	1	582 909	582 909
			Итого по подразделу: КМ-В13;В12;ЯУ-N1;ЯУ-N8;ЯУ-N2;ЯУ-N3				**2 386 967**
			Подраздел: Кабельно-трубная продукция				
297	305	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	4450	749	3 333 050

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
298	306	243-107-2503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	985	730	719 050
299	307	243-107-2504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x4 (ок)-0,66	м	410	1 164	477 240
300	308	243-107-2702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	45	609	27 405
301	309	243-107-2704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x4 (ок)-0,66	м	5	1 519	7 595
302	310	243-107-2901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	135	770	103 950
303	311	243-107-2903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-0,66	м	184	1 877	345 368
304	312	243-107-2904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-0,66	м	226	2 738	618 788
305	313	243-108-2501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	777	643	499 611
306	314	243-108-2701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	20	810	16 200
307	315	243-108-2502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	м	1115	922	1 028 030
308	316	243-108-2702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	м	270	1 177	317 790
309	317	243-108-2705 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x10 (ок)-0,66	м	140	3 974	556 360
310	318	243-108-2901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x1,5 (ок)-0,66	м	37	980	36 260
311	319	243-108-2902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x2,5 (ок)-0,66	м	41	1 436	58 876
312	320	243-108-2905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x10 (ок)-0,66	м	60	4 935	296 100

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
313	321	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм	м	2923	152	444 296
314	322	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	764	234	178 776
315	323	241-201-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	308	383	117 964
			Итого по подразделу: Кабельно-трубная продукция				**9 182 709**
			Итого по разделу: null				**40 060 045**
			Итого по локальной смете: Силовое электрооборудование				**40 060 045**
			ИТОГО по акту:				**40 060 045**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	32310645.000 x 8.10%	2 617 162
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	40060045.000 + 2617162.368	42 677 207
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	32310645.000 x 0.05409035	1 747 694
	Сметная прибыль, 5.00%	34927807.368 x 5.00%	1 746 390
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(42677207.368 + 1747694.004) x 5.000%	2 221 245
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		48 392 536
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	48392536.810 x 1.0368	50 173 382
	НДС (12%)	50173382.164 x 12%	6 020 805
	Итого с НДС	50173382.164 + 6020805.860	56 194 188

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	27.11.2024 11:15
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 12:37
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:40
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	27.11.2024 13:56
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:50
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	28.11.2024 03:45
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 06:57
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	28.11.2024 06:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	28.11.2024 04:26
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 05:02 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

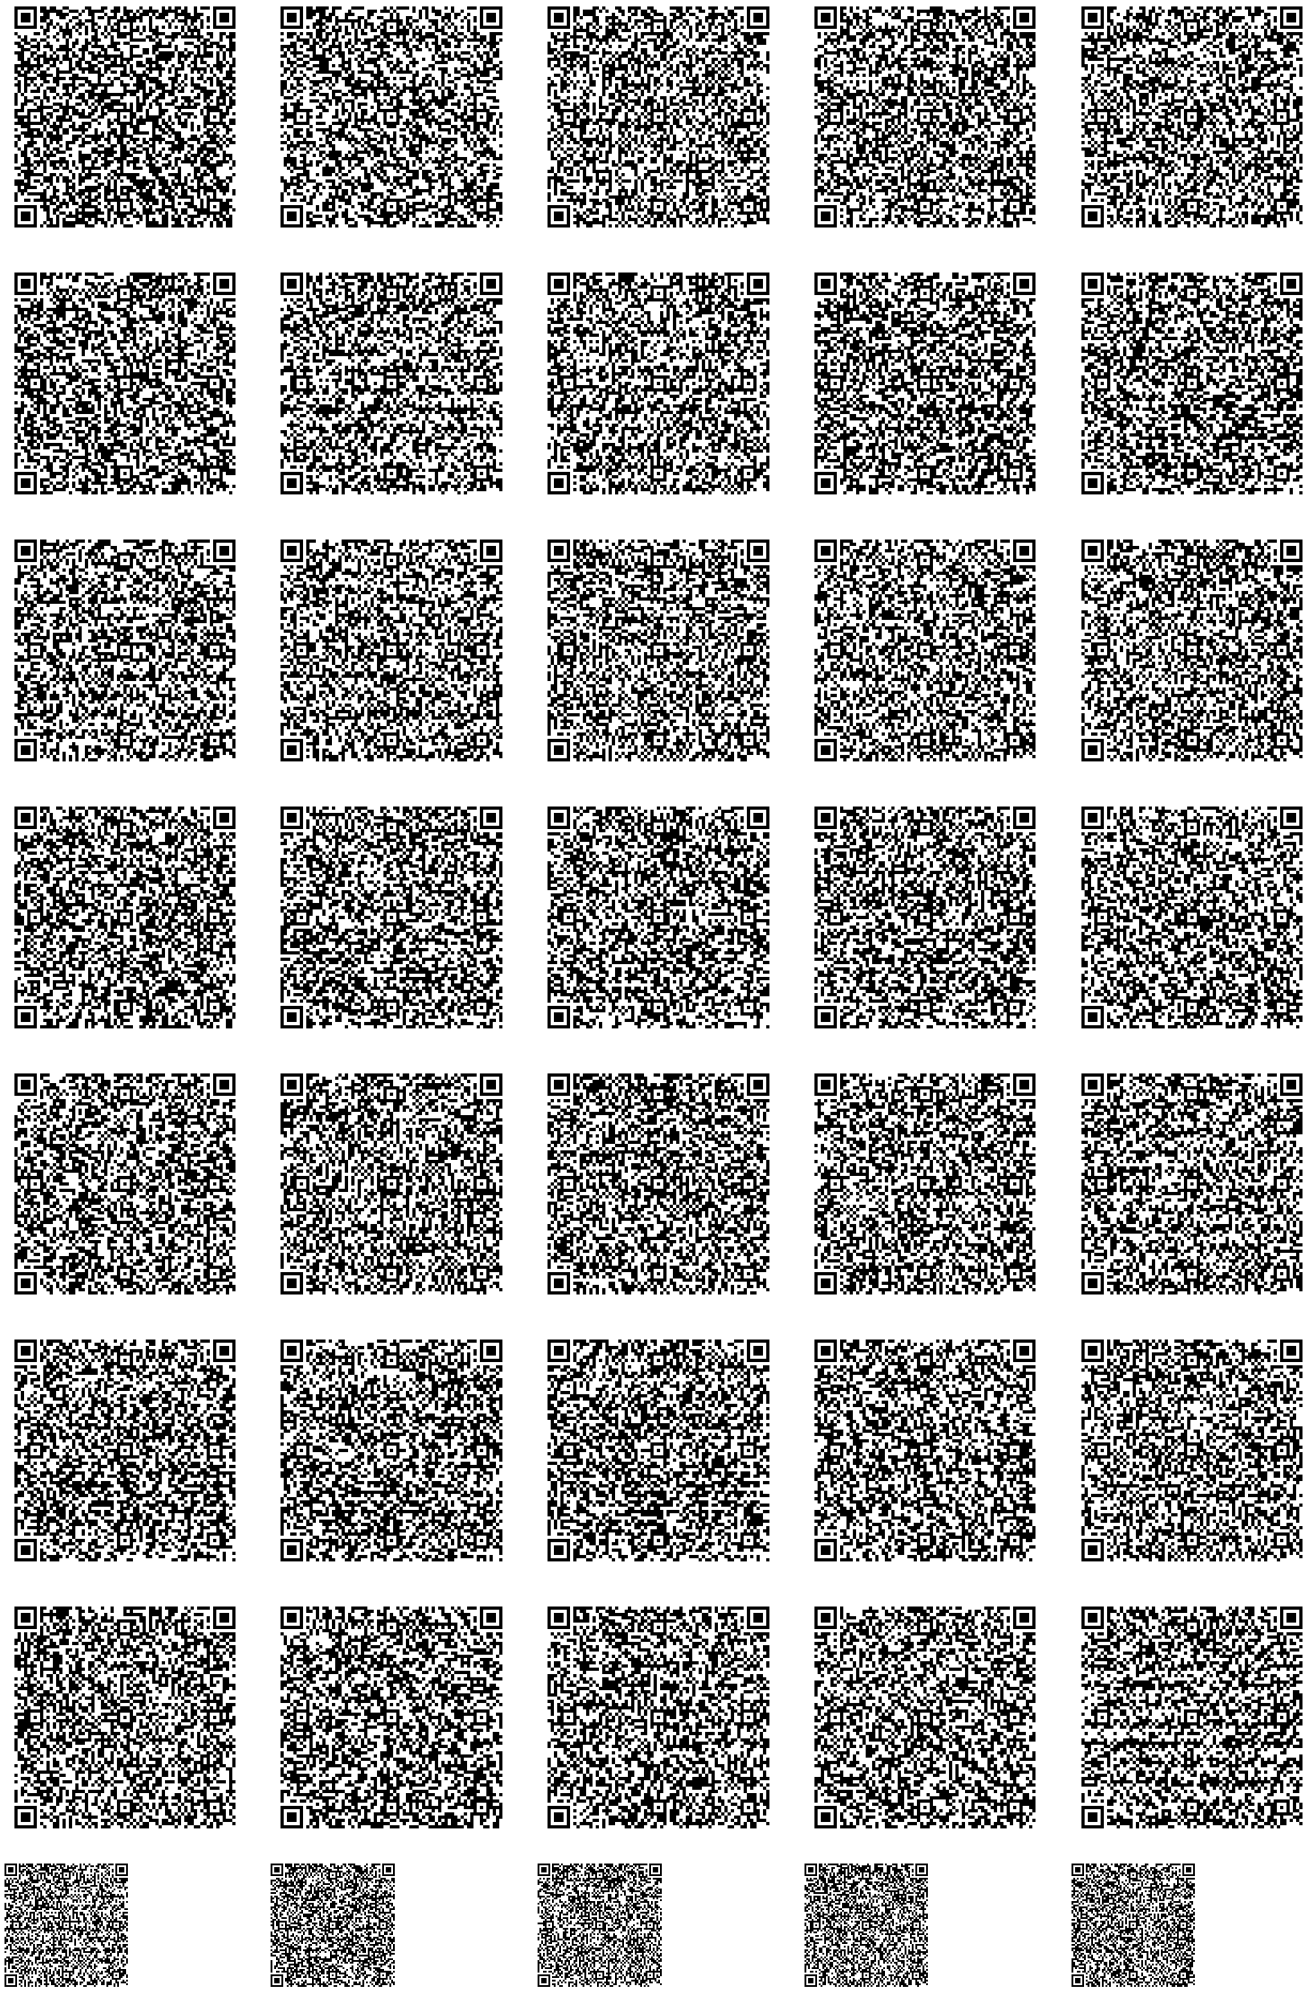

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные				
			Раздел: Блок 5				
			Подраздел: Металлическая лестница Лм-1 /лист 50.2/				
1	1075	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	4.83816	239 421	1 158 357
2	1076	222-525-0101РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.83816	1 132 558	5 479 497
			Итого по подразделу: Металлическая лестница Лм-1 /лист 50.2/				**6 637 854**
			Итого по разделу: Блок 5				**6 637 854**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные				**6 637 854**
			ИТОГО по акту:				**6 637 854**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	6637854.143 x 8.10%	537 666
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	6637854.143 + 537666.211	7 175 520
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	6637854.143 x 0.05409035	359 043
	Сметная прибыль, 5.00%	7175520.354 x 5.00%	358 776
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(7175520.354 + 359043.835) x 5.000%	376 728
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 270 068
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2023 год , к = 1.0000	8270068.416 x 1.0000	8 270 068
	НДС (12%)	8270068.416 x 12%	992 408
	Итого с НДС	8270068.416 + 992408.210	9 262 476

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	27.11.2024 11:28
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:09
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	27.11.2024 13:56
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 12:36
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:49
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	28.11.2024 03:45
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	28.11.2024 04:25
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	28.11.2024 05:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 06:55
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 05:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

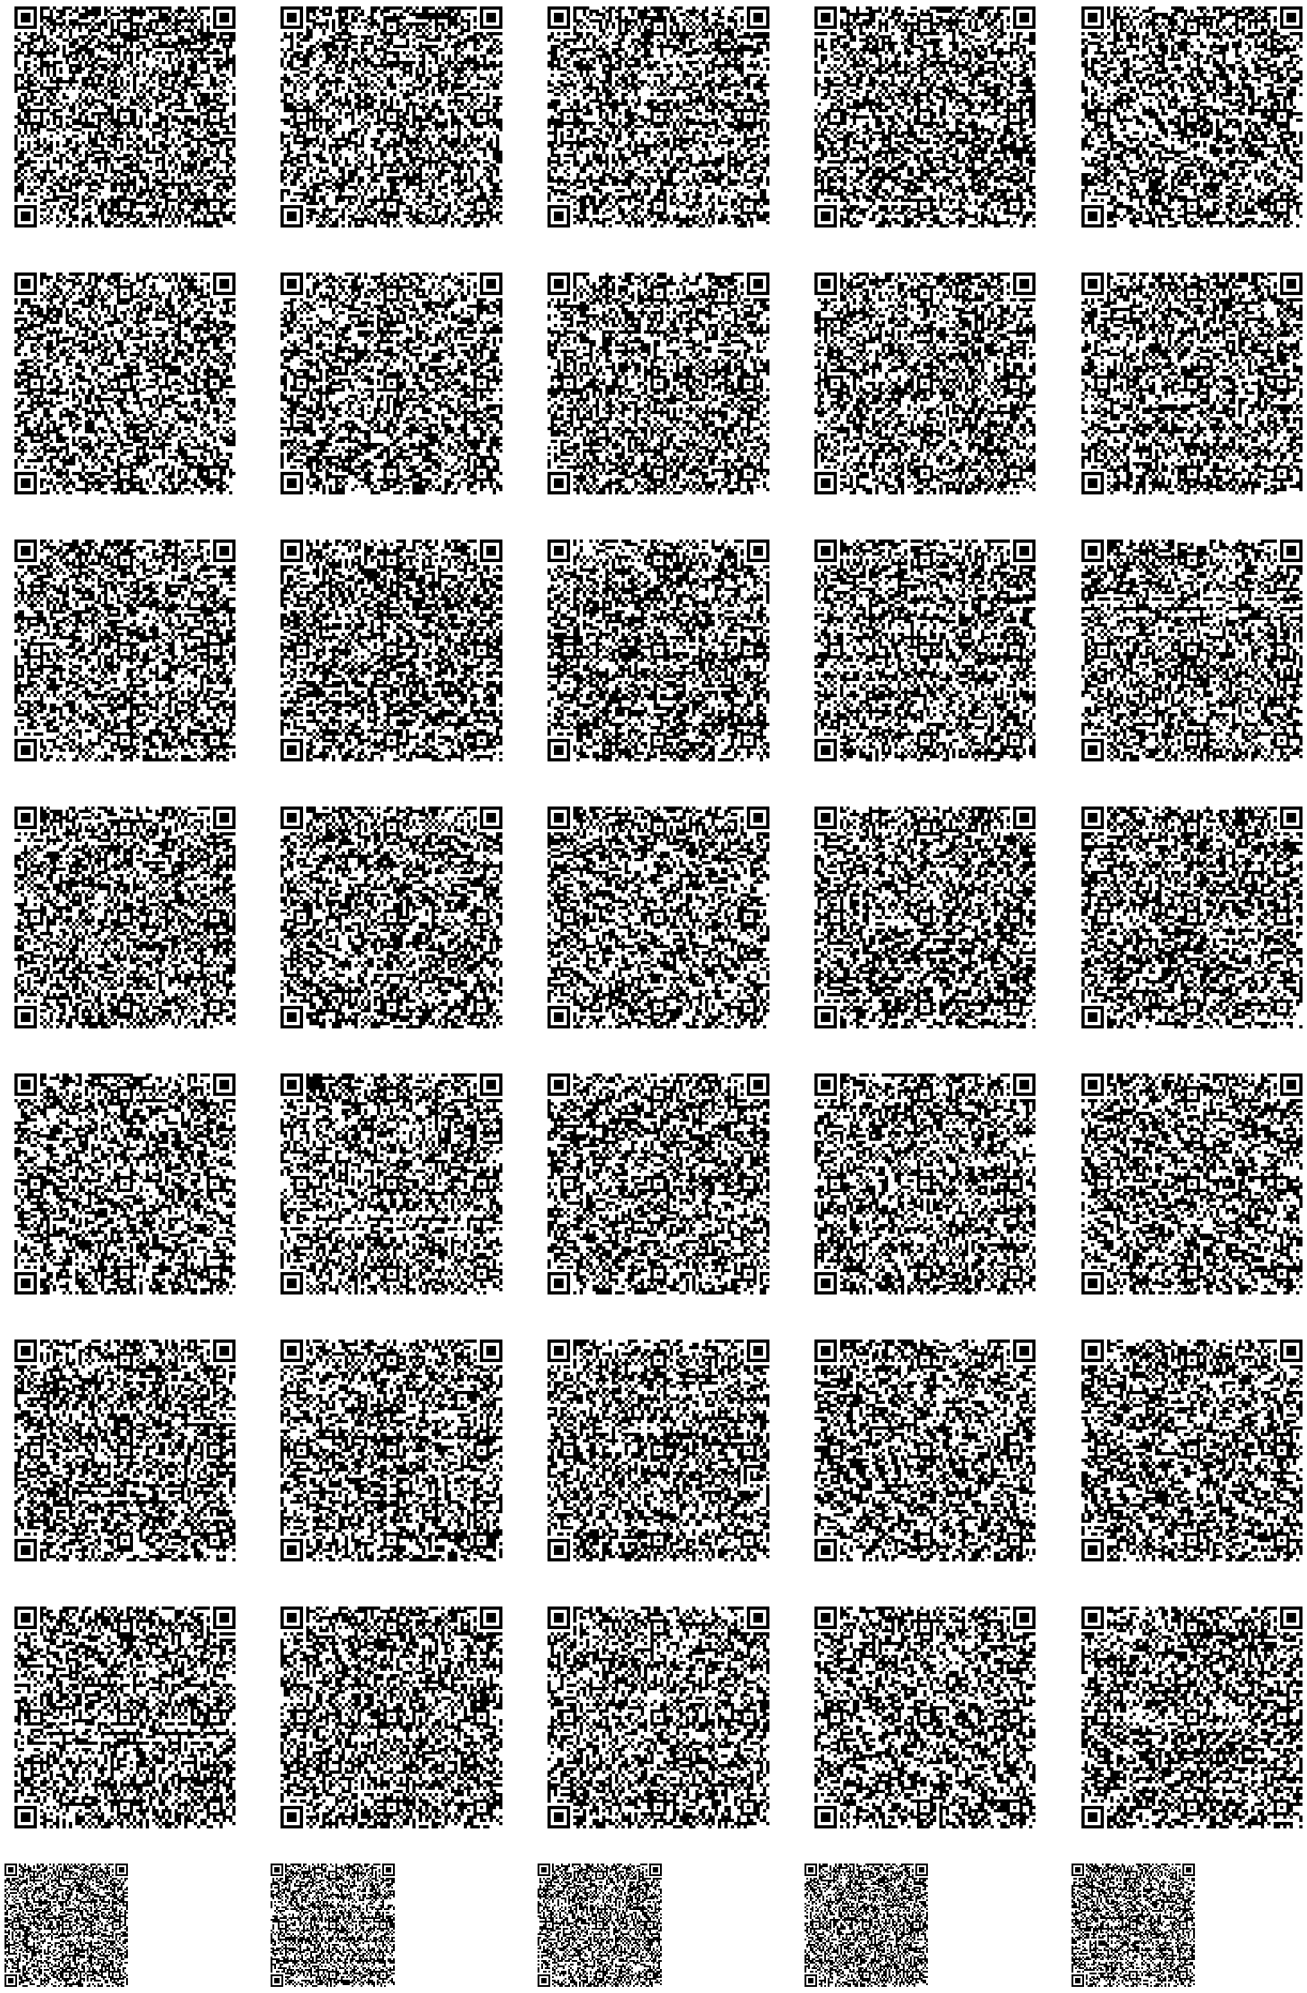

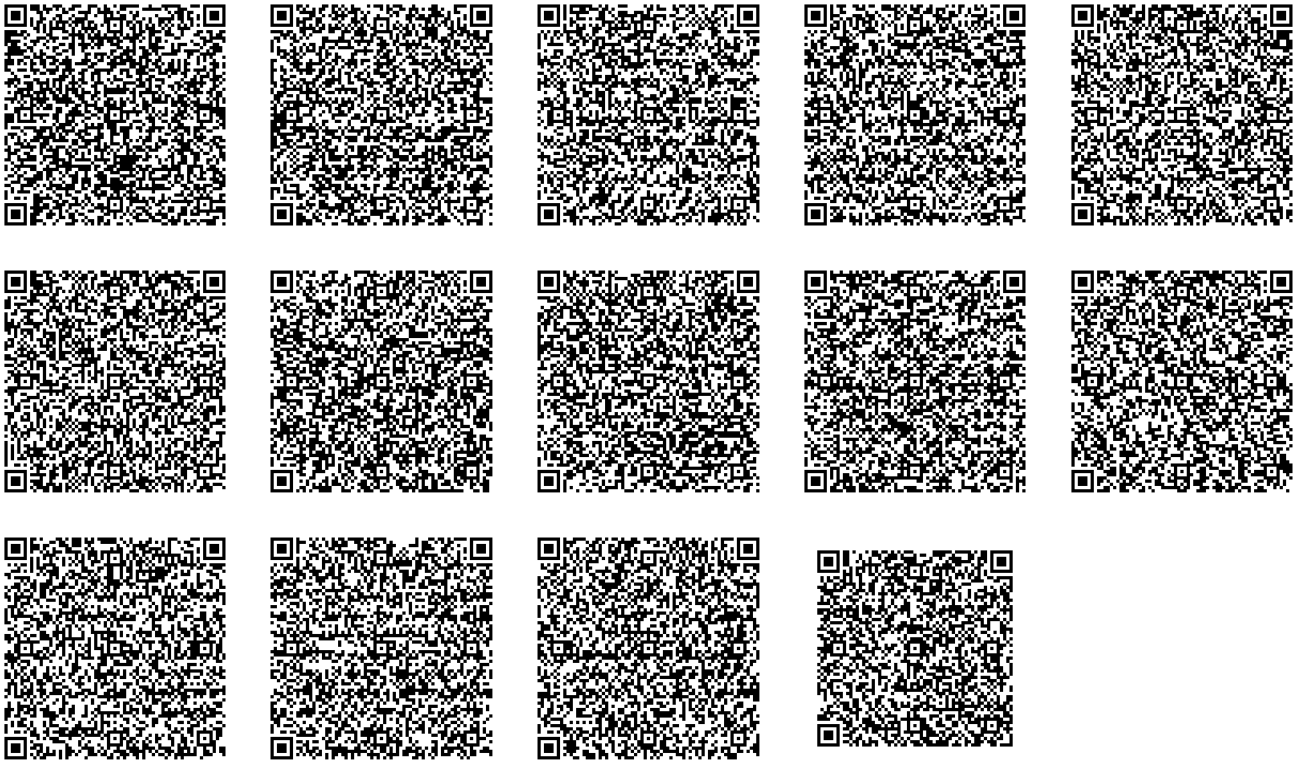

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство				
			Раздел: Малые архитектурные формы				
			Подраздел: МАФ				
1	90	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	175	149 813	26 217 275
2	91	8601-0605-0204 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	704 147	1 408 294
3	92	8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	4	212 643	850 572
			Итого по подразделу: МАФ				**28 476 141**
			Подраздел: МАФ хоз. зоны				
4	113	8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	секция	40.6666667	149 813	6 092 395
5	114	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	12.6666667	130 274	1 650 137
6	115	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	163 338	163 338
			Итого по подразделу: МАФ хоз. зоны				**7 905 870**
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы				**36 382 011**
			Итого по локальной смете: Благоустройство				**36 382 011**
			ИТОГО по акту:				**36 382 011**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				36382011.000 x 8.10%	2 946 943
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				36382011.000 + 2946943.030	39 328 954
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				36382011.000 x 0.05409035	1 967 915
		Сметная прибыль, 5.00%				39328954.030 x 5.00%	1 966 447
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(39328954.030 + 1967915.605) x 5.000%	2 064 843
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					45 328 160
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				45328160.818 x 1.0182	46 153 133
		НДС (12%)				46153133.345 x 12%	5 538 376
		Итого с НДС				46153133.345 + 5538376.001	51 691 509

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	27.11.2024 11:34
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 12:35
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:07
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	27.11.2024 13:55
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:49
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	28.11.2024 03:44
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	28.11.2024 04:21
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 04:56 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	28.11.2024 05:55 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 06:53

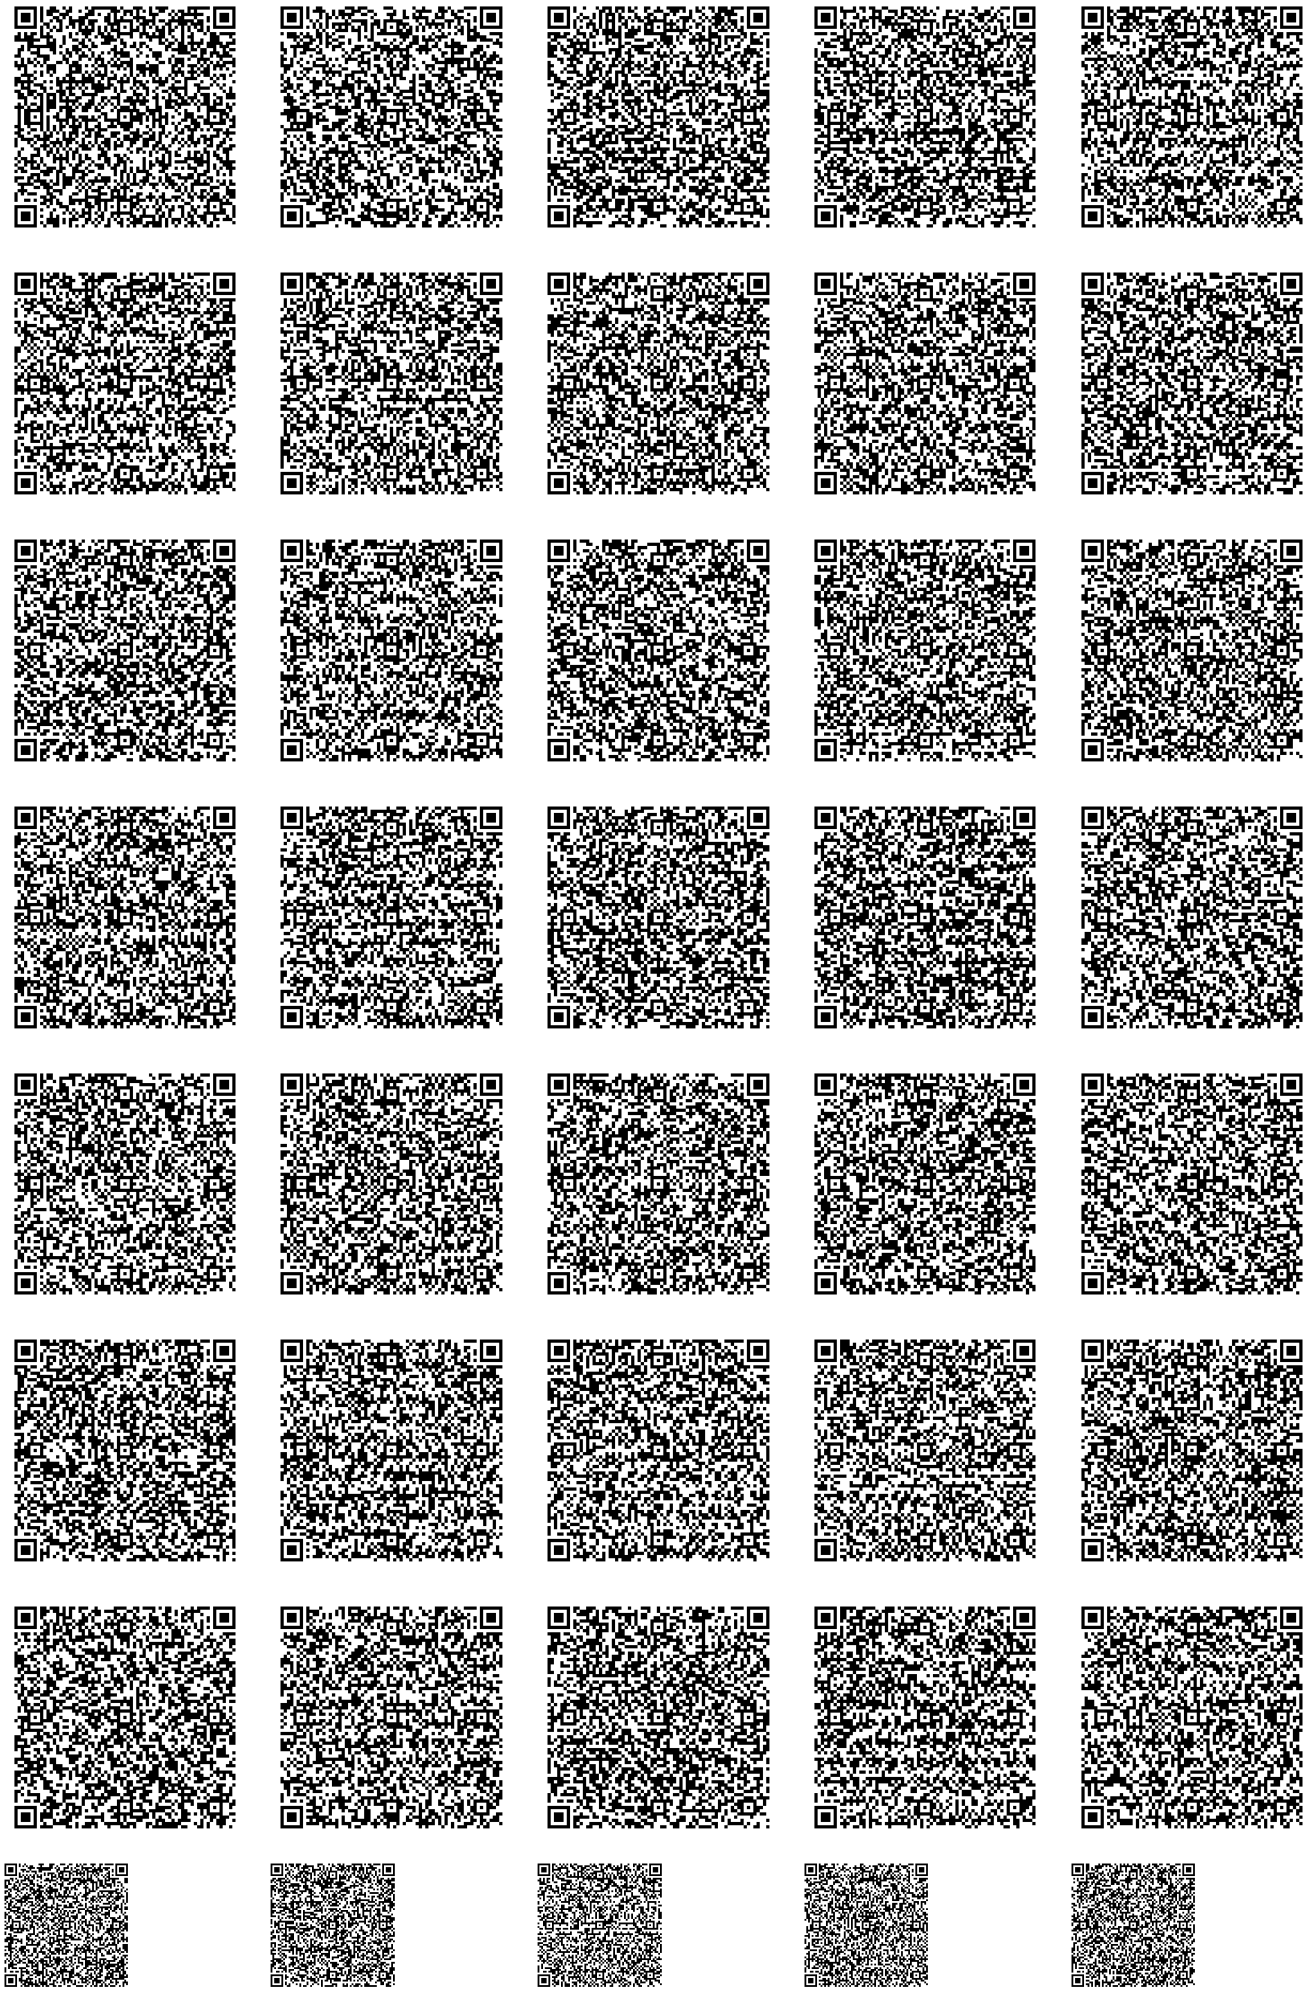

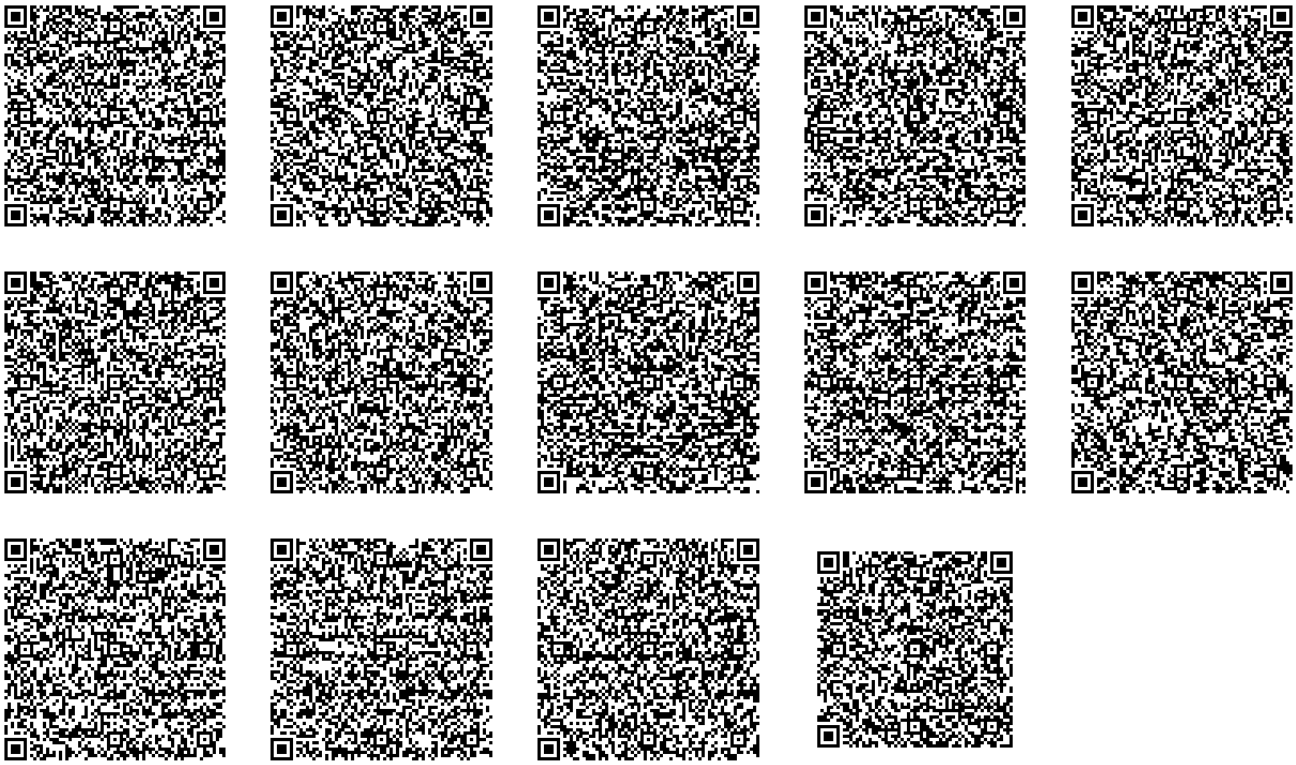

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна (листы АР-5.1...5.4)				
1	7	6108-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	7.2	7 166	51 595
2	8	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный /ОК-14,ОК-11/	м2	7.2	49 937	359 546
			Итого по подразделу: Окна (листы АР-5.1...5.4)				**411 141**
			Подраздел: Двери металлические				
3	38	1114-0303-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м2	64.218	5 296	340 099
4	39	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	32.182	14 992	482 472
5	40	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	64.218	52 373	3 363 289
6	41	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	32.182	58 080	1 869 130
7	43	6108-0204-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	33.516	10 040	336 500
8	45	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	33.516	42 023	1 408 442

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Двери металлические				**7 799 934**
			Подраздел: Двери внутренние деревянные				
9	50	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	250.677	5 583	1 399 529
10	51	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	135.792	12 298	1 669 970
11	52	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-12	м2	96.669	12 734	1 230 983
12	53	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	18.216	14 666	267 155
			Итого по подразделу: Двери внутренние деревянные				**4 567 638**
			Итого по разделу: Проемы				**12 778 714**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 1				
13	60	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /20-60 мм по уклону/	м2	110.27	1 406	155 040
14	61	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.249508	28 485	64 077
15	62	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	110.27	117	12 902
16	63	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.249508	28 485	64 077
17	64	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.2108362	59 456	12 535
18	65	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2108362	415 660	87 636
			Итого по подразделу: Тип 1				**396 267**
			Подраздел: Тип 6.1 (ступени и площадки)				
19	76	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	32.33	9 815	317 319
20	77	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	17.52	1 230	21 550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	78	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1.05	3 632	3 814
			Итого по подразделу: Тип 6.1 (ступени и площадки)				**342 683**
			Подраздел: Тип 7				
22	91	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/8/ мм	м2 стяжки	610.74	1 435	876 412
23	92	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	3420.144	110	376 216
24	93	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1954.368	110	214 980
25	94	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	610.74	900	549 666
			Итого по подразделу: Тип 7				**2 017 274**
			Подраздел: Тип 8				
26	111	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/8/ мм	м2 стяжки	24.02	1 435	34 469
27	112	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	134.512	110	14 796
28	113	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	76.864	110	8 455
29	114	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	24.02	900	21 618
			Итого по подразделу: Тип 8				**79 338**
			Подраздел: Тип 9 (лист АР-2.2)				
30	134	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	182.75	2 869	524 310
31	135	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	146.95	6 663	979 128
32	136	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	149.889	2 551	382 367
			Итого по подразделу: Тип 9 (лист АР-2.2)				**1 885 805**
			Подраздел: Тип 10				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	152	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	4	2 869	11 476
34	153	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	2.63	6 663	17 524
35	154	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2.6826	2 551	6 843
			Итого по подразделу: Тип 10				**35 843**
			Подраздел: Тип 11				
36	161	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	56.19	2 869	161 209
37	162	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	46.52	6 663	309 963
38	163	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	47.4504	2 551	121 046
			Итого по подразделу: Тип 11				**592 218**
			Подраздел: Тип 12				
39	174	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/7/ мм	м2 стяжки	107.29	1 435	153 961
40	175	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	600.824	110	66 091
41	176	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	343.328	110	37 766
42	177	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	107.29	599	64 267
			Итого по подразделу: Тип 12				**322 085**
			Подраздел: Тип 12.1				
43	194	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	4.87	9 815	47 799
			Итого по подразделу: Тип 12.1				**47 799**
			Подраздел: Тип 13				
44	205	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	147.69	5 134	758 239

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	206	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	165.4128	435	71 955
46	207	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	125.46	9 815	1 231 390
			Итого по подразделу: Тип 13				**2 061 585**
			Подраздел: Тип 14				
47	218	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	724.95	1 435	1 040 303
48	219	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	4059.72	110	446 569
49	220	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	2319.84	110	255 182
50	221	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	724.95	299	216 760
			Итого по подразделу: Тип 14				**1 958 814**
			Подраздел: Тип 14.1				
51	236	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	111.72	1 435	160 318
52	237	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	625.632	110	68 820
53	238	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	357.504	110	39 325
54	239	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	111.72	299	33 404
			Итого по подразделу: Тип 14.1				**301 867**
			Подраздел: Тип 16 (лист АР-2.3)				
55	270	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	70.35	1 435	100 952
56	271	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	393.96	110	43 336
57	272	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	225.12	110	24 763

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	273	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	70.35	299	21 035
			Итого по подразделу: Тип 16 (лист АР-2.3)				**190 086**
			Подраздел: Тип 16.1				
59	288	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	20.42	1 435	29 303
60	289	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	114.352	110	12 579
61	290	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	65.344	110	7 188
62	291	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	20.42	299	6 106
			Итого по подразделу: Тип 16.1				**55 176**
			Подраздел: Тип 19				
63	331	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	39.61	1 435	56 840
64	332	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	221.816	110	24 400
65	333	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	126.752	110	13 943
66	334	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	39.61	299	11 843
			Итого по подразделу: Тип 19				**107 026**
			Подраздел: Тип 21				
67	381	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /85 мм/	м2	68.76	1 406	96 677
68	382	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.402704	28 485	39 956
69	383	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	68.76	377	25 923
70	384	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.558788	28 485	129 857

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	385	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.1314691	59 456	7 817
72	386	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.1314691	415 660	54 646
			Итого по подразделу: Тип 21				**354 876**
			Подраздел: Тип 22 (лист АР-2.5)				
73	417	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/10/ мм	м2 стяжки	128.4	1 435	184 254
74	418	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	719.04	110	79 094
75	419	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	410.88	110	45 197
76	420	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	128.4	1 498	192 343
			Итого по подразделу: Тип 22 (лист АР-2.5)				**500 888**
			Подраздел: Тип 27				
77	479	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	11	9 815	107 965
78	480	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	12	1 230	14 760
79	481	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	0.72	3 632	2 615
			Итого по подразделу: Тип 27				**125 340**
			Подраздел: Тип 28				
80	490	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	888.26	1 435	1 274 653
81	491	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	4974.256	110	547 168
82	492	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	2842.432	110	312 668
83	493	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	888.26	299	265 590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 28				**2 400 079**
			Подраздел: Тип 28.1				
84	506	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 /6/ мм	м2 стяжки	185.2	1 435	265 762
85	507	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1037.12	110	114 083
86	508	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	592.64	110	65 189
87	509	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	185.2	299	55 375
			Итого по подразделу: Тип 28.1				**500 410**
			Подраздел: Тип 28.2 (лист АР-2.6)				
88	522	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	94.2	1 435	135 177
89	523	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	527.52	110	58 027
90	524	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	301.44	110	33 158
91	525	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	94.2	299	28 166
			Итого по подразделу: Тип 28.2 (лист АР-2.6)				**254 528**
			Подраздел: Тип 29.1				
92	538	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	69.25	1 435	99 374
93	539	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	387.8	110	42 658
94	540	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	221.6	110	24 376
95	541	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	69.25	299	20 706
			Итого по подразделу: Тип 29.1				**187 114**
			Подраздел: Тип 29.1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	552	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	35.25	1 435	50 584
97	553	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	197.4	110	21 714
98	554	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	112.8	110	12 408
99	555	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	35.25	299	10 540
			Итого по подразделу: Тип 29.1				**95 246**
			Подраздел: Тип 31				
100	580	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	18.02	1 435	25 859
101	581	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	100.912	110	11 100
102	582	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	57.664	110	6 343
103	583	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	18.02	299	5 388
			Итого по подразделу: Тип 31				**48 690**
			Подраздел: Тип 32				
104	597	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/7/ мм	м2 стяжки	60.45	1 435	86 746
105	598	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	338.52	110	37 237
106	599	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	193.44	110	21 278
107	600	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	60.45	599	36 210
			Итого по подразделу: Тип 32				**181 471**
			Итого по разделу: Полы				**15 042 508**
			Раздел: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				
			Подраздел: Потолки				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	607	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	422.58	2 095	885 305
109	608	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	580.62492	76	44 127
			Итого по подразделу: Потолки				**929 432**
			Подраздел: Утепление потолка				
110	611	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	103.64	1 679	174 012
111	612	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	3.202476	57 335	183 614
112	613	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	103.64	6 236	646 299
113	614	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	106.7492	764	81 556
			Итого по подразделу: Утепление потолка				**1 085 481**
			Подраздел: Потолки				
114	626	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1374.83	2 095	2 880 269
115	627	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3779.40767	76	287 235
116	628	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	55.67	2 060	114 680
117	629	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	76.49058	76	5 813
118	636	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	804.07	5 505	4 426 405
119	637	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	804.07	7 880	6 336 072
120	638	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	55.67	6 236	347 158

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	639	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	57.3401	925	53 040
122	640	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	55.67	1 679	93 470
123	641	234-101-0115 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	м3	1.720203	57 335	98 628
124	642	6107-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах /2 слоя/	м2 потолка	166.13	5 984	994 121
125	643	232-101-0801 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий толщиной 12,5 мм	м2	348.873	2 292	799 616
126	644	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	166.13	1 679	278 932
127	645	234-204-0109 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	342.2278	7 390	2 529 063
			Итого по подразделу: Потолки				**19 244 504**
			Подраздел: Стены и перегородки				
128	646	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	10.2	3 332	33 986
129	647	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.15402	25 496	3 927
130	648	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	0.28254	145	41
131	649	1114-0302-0104 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	3415.95	2 834	9 680 802
132	650	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	189.24363	145	27 440
133	651	1114-0302-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	149.38	6 309	942 438
134	652	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	161.3304	145	23 393

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	653	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1328.7	1 252	1 663 532
136	654	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3652.5963	76	277 597
137	655	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	330.4	1 529	505 182
138	656	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1362.2392	76	103 530
139	657	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	1862.11	1 185	2 206 600
140	658	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2558.53914	76	194 449
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**15 662 917**
			Подраздел: Потолки				
141	671	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1494.21	2 095	3 130 369
142	672	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4107.58329	76	312 176
143	675	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	690.83	5 505	3 803 019
144	676	232-401-0201 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на открытой подвесной системе	м2	690.83	7 880	5 443 740
145	677	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка (ГКЛО) на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	17.02	6 236	106 137
146	678	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	17.5306	1 080	18 933
147	679	6107-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах /2 слоя/	м2 потолка	224.82	5 984	1 345 323
148	680	232-101-0801 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий толщиной 12,5 мм	м2	472.122	2 292	1 082 104

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	681	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	224.82	1 679	377 473
150	682	234-204-0109 РСНБ РК 2022	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	463.1292	7 390	3 422 525
			Итого по подразделу: Потолки				**19 041 800**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
151	683	1114-0302-0104 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	1830.82	2 834	5 188 544
152	684	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	101.427428	145	14 707
153	685	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	257.63	1 252	322 553
154	686	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	708.22487	76	53 825
155	687	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	2306.93	1 185	2 733 712
156	688	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3169.72182	76	240 899
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**8 554 240**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				**64 518 374**
			Раздел: Фасад 1-21 (лист 20)				
157	781	6105-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	919.815	2 418	2 224 112
158	782	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов /линеарными панелями	м2	919.815	7 744	7 123 047
159	783	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	91.9815	31 847	2 929 334
160	784	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	4.905	37 936	186 076
161	785	231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	919.815	5 430	4 994 595

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	786	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	1011.8	4 956	5 014 480
163	787	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	919.815	495	455 308
			Итого по разделу: Фасад 1-21 (лист 20)				**22 926 955**
			Раздел: Подъемные устройства (лифты) /лист АР 1.7/				
164	1283	6120-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лифта грузопассажирского, скорость движения кабины 1,0 м/с, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	1	3 524 724	3 524 724
165	1284	6120-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта к норме 6120-0101-0103	шт.	1	-1 678 471	-1 678 471
166	1285	6120-0101-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, к норме 6120-0101-0103	м	35	-35 047	-1 226 645
167	1286	516-101-0359 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 2, скорость подъема 1 м/с, огнестойкость дверей Е-30, отделка кабины и дверей нержавеющая сталь, с диспетчерской связью	комплект	1	10 519 743	10 519 743
			Итого по разделу: Подъемные устройства (лифты) /лист АР 1.7/				**11 139 351**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**126 405 903**
			ИТОГО по акту:				**126 405 903**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	115886160.228 x 8.10%	9 386 779
Итого с затратами на организацию и управление СМР	126405903.228 + 9386779.421	135 792 682
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	115886160.228 x 0.05409035	6 268 322
Сметная прибыль, 5.00%	125272939.648 x 5.00%	6 263 646
Непредвиденные расходы, 5.000%	(135792682.648 + 6268322.636) x 5.000%	7 103 050
Итого с непредвидемыми работами и затратами		155 427 702
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	155427702.530 x 1.0368	161 147 441
НДС (12%)	161147441.983 x 12%	19 337 693
Итого с НДС	161147441.983 + 19337693.038	180 485 135

Лист согласования
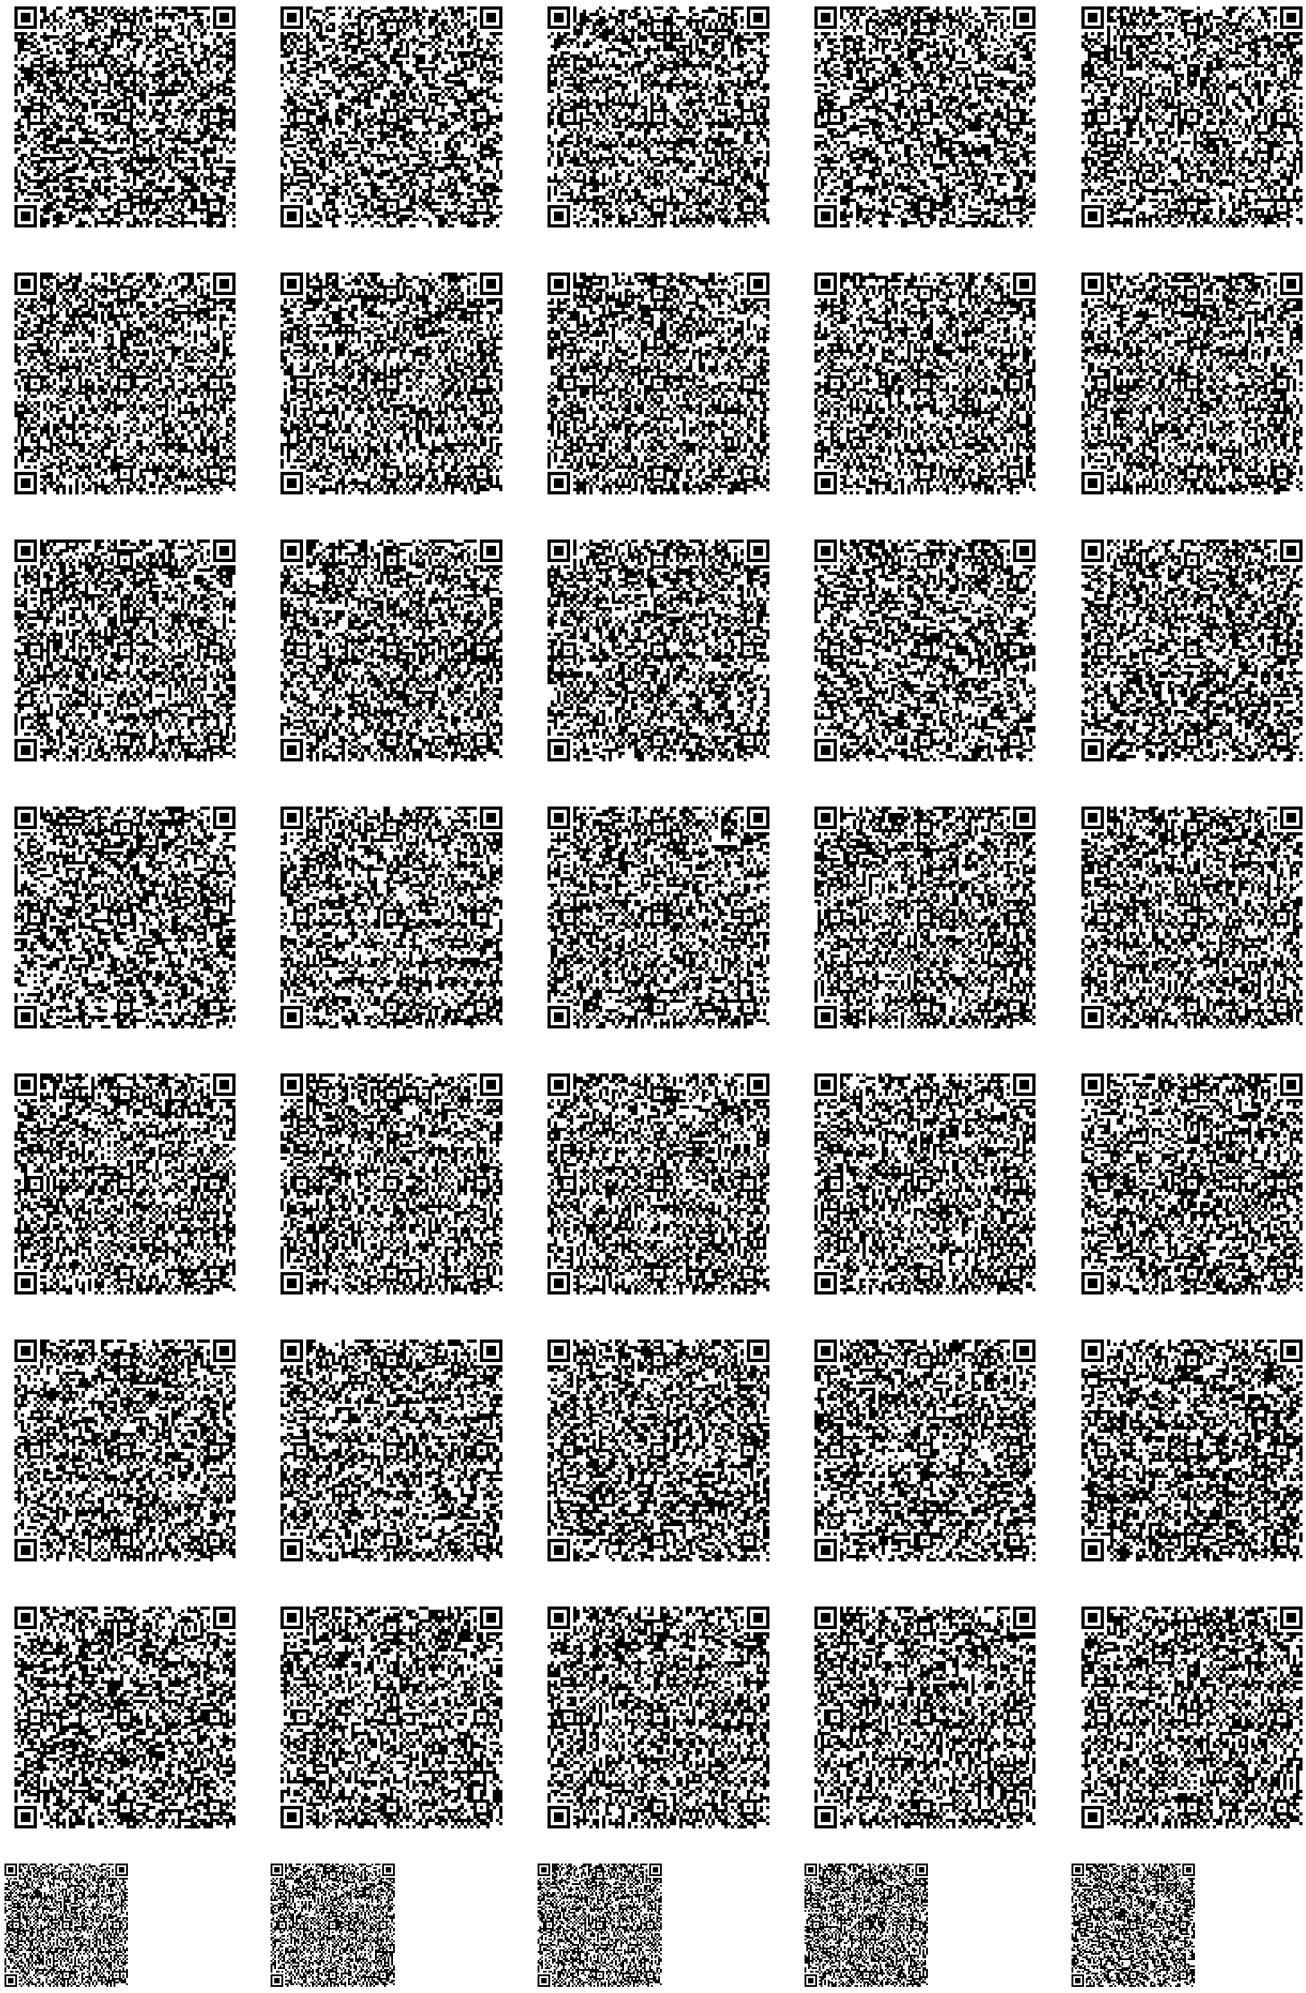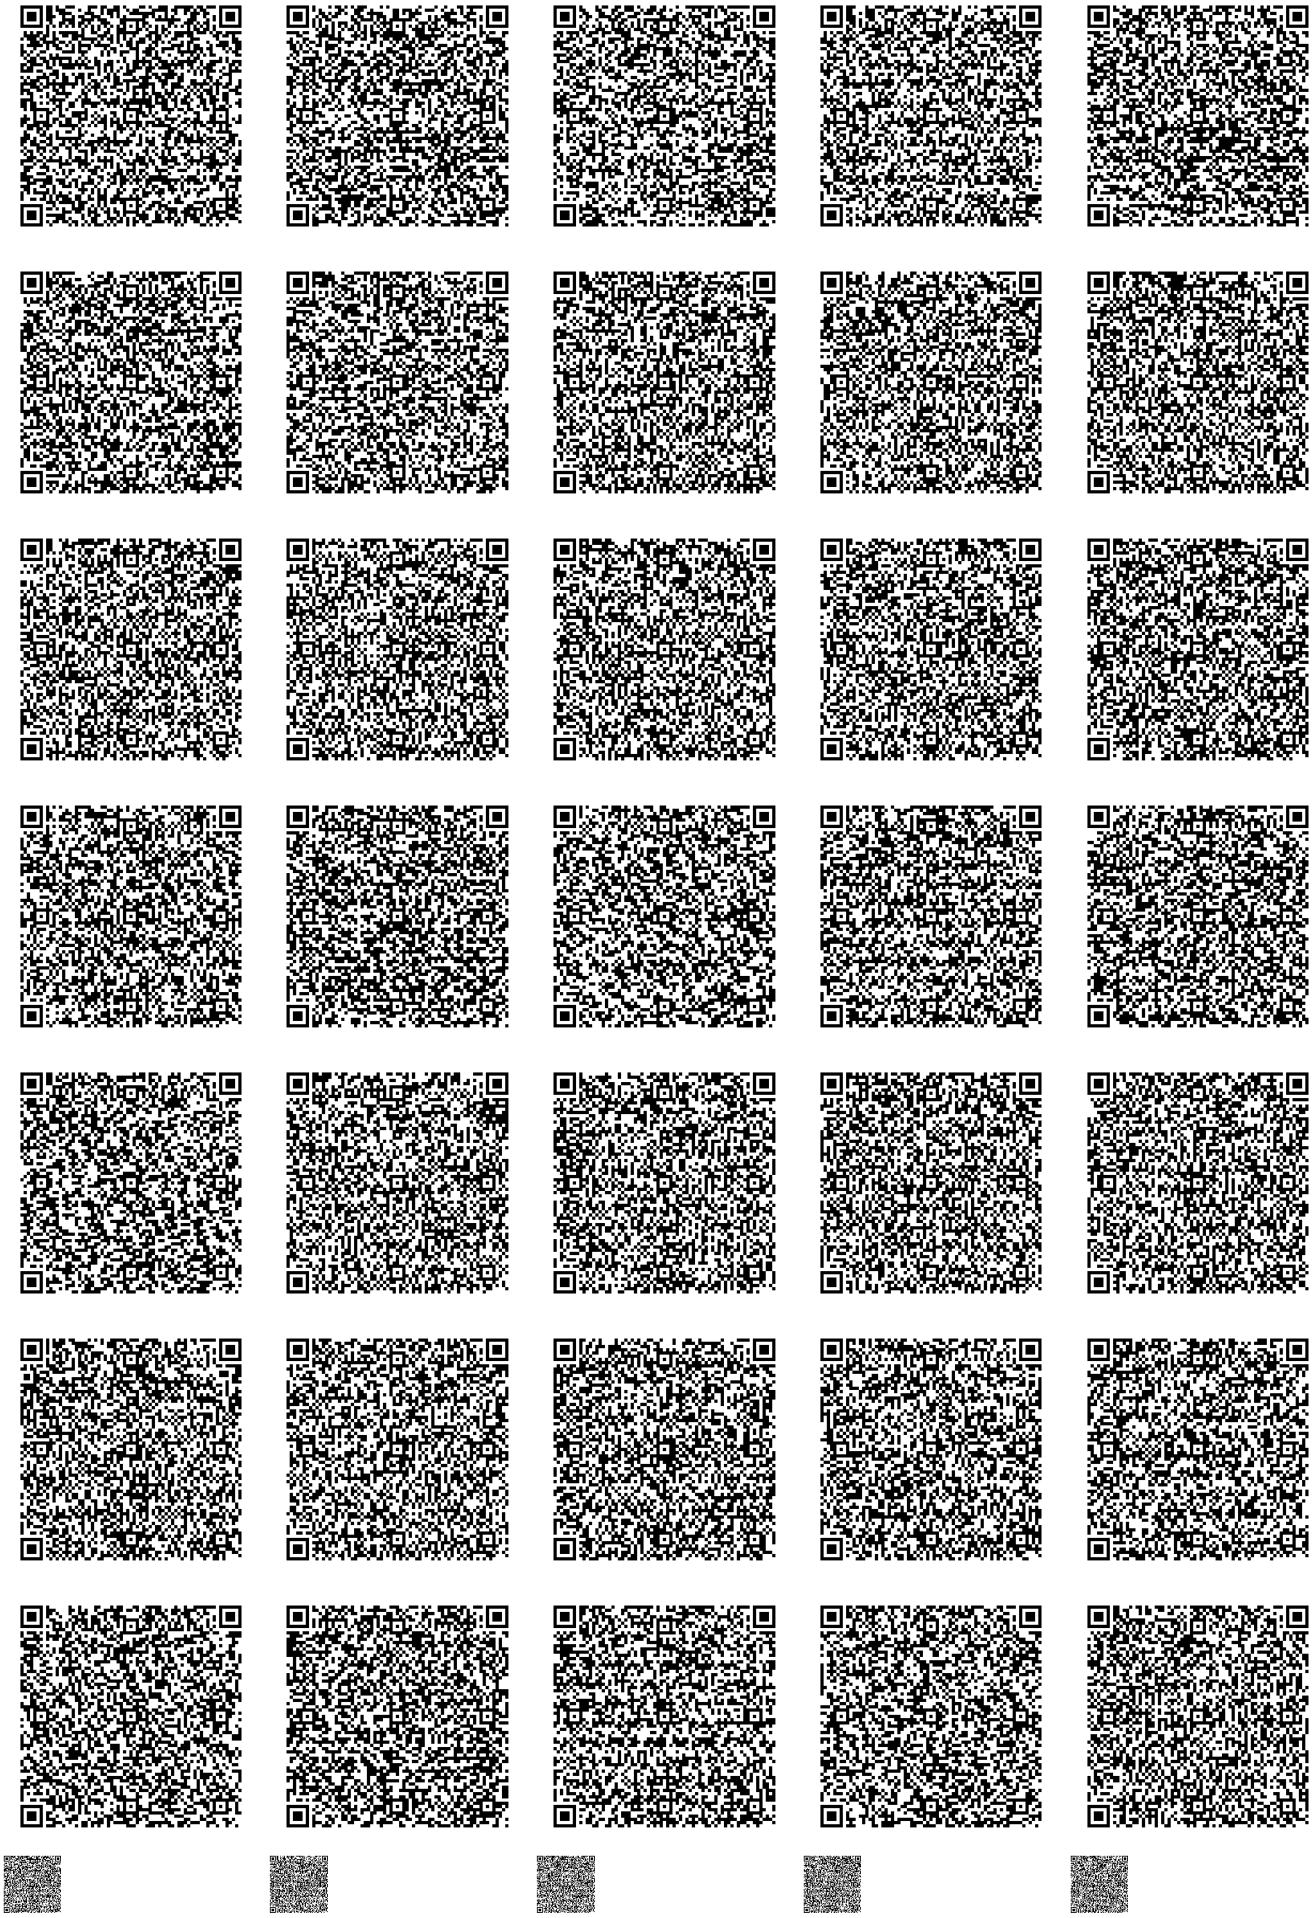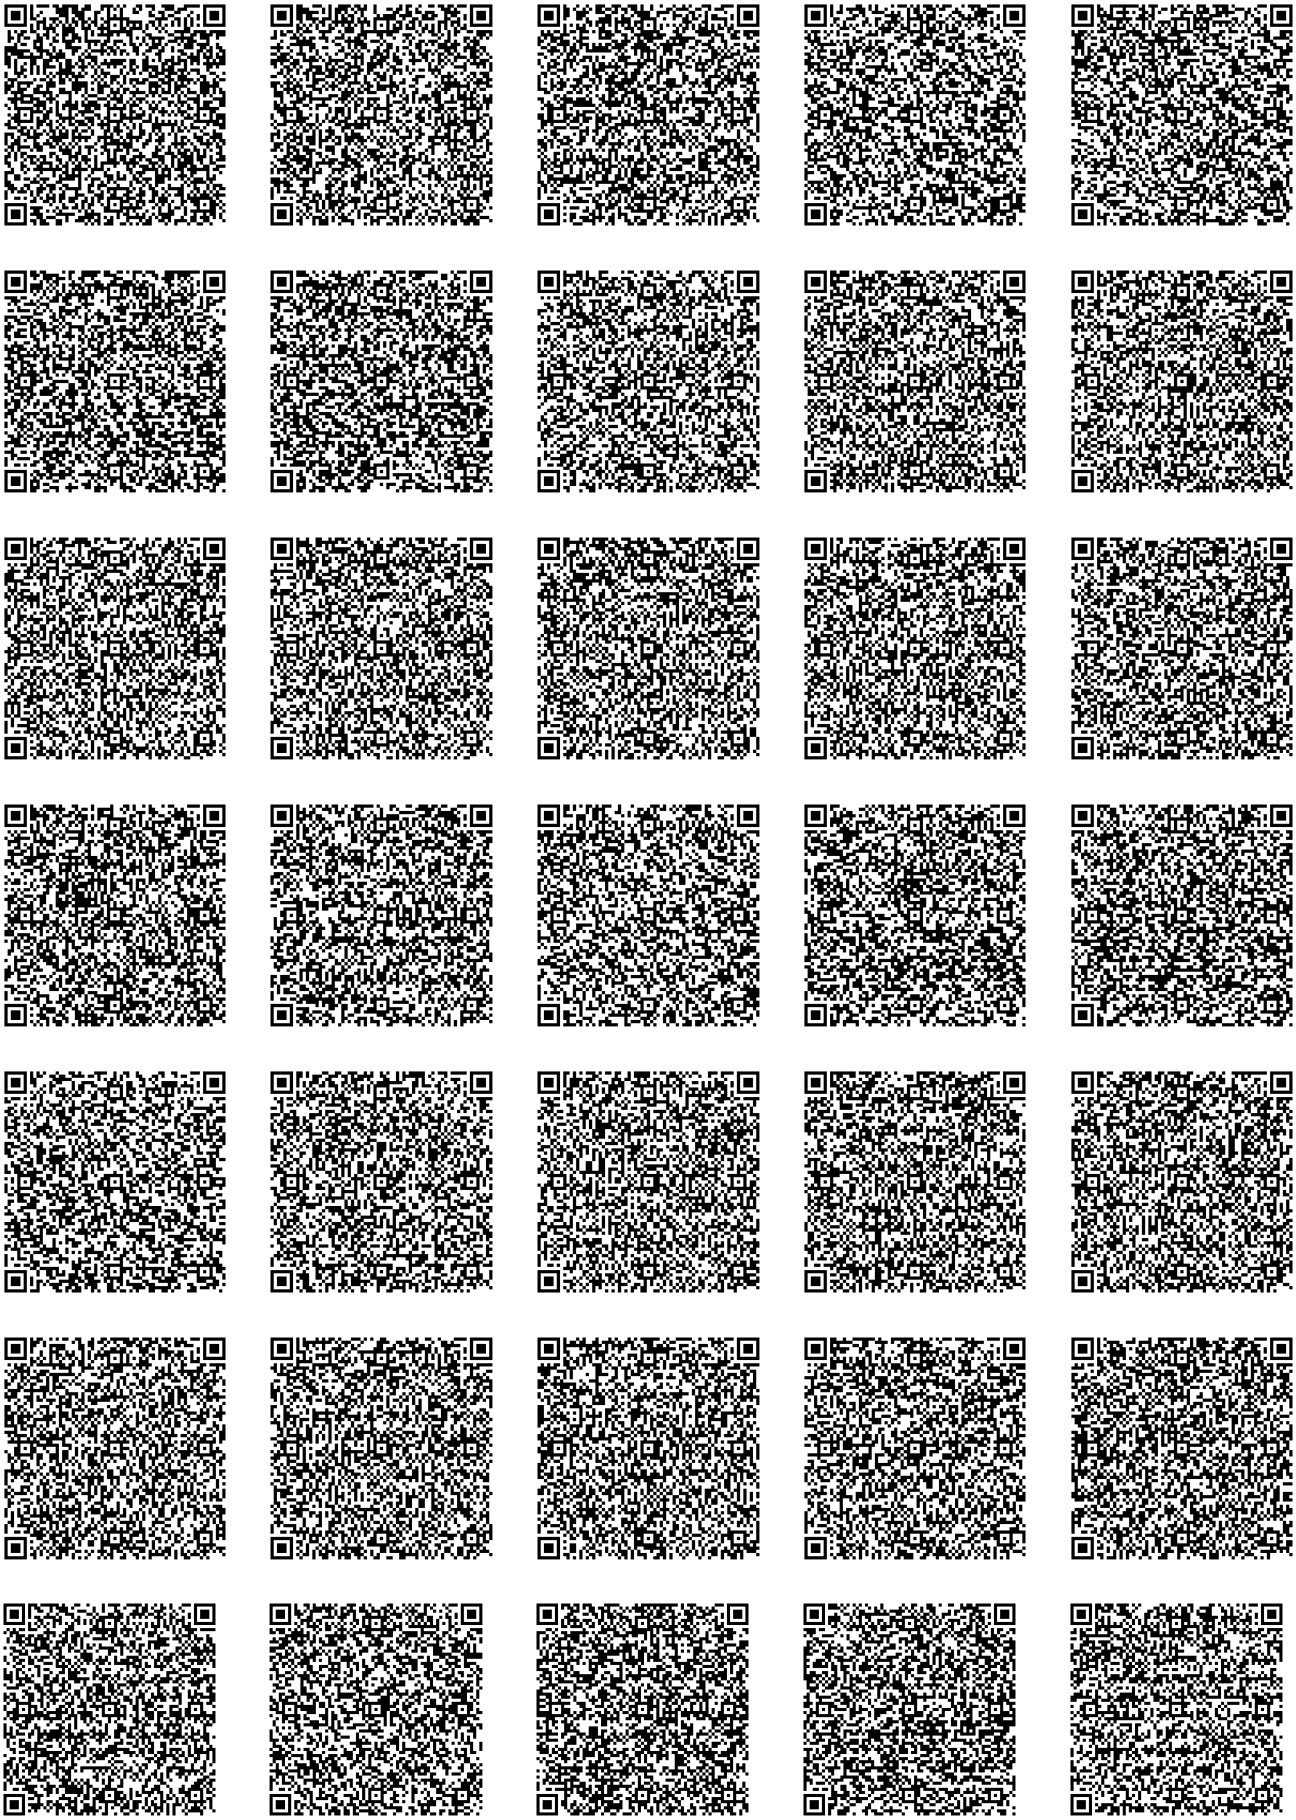
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	27.11.2024 12:27
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:03
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	27.11.2024 13:54
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 12:34
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	27.11.2024 13:47
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	28.11.2024 03:43
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	28.11.2024 04:20
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 04:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	28.11.2024 05:58 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 06:48
