Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		
				Дополнительное соглашение №6	**31.07.2024**		
				Дополнительное соглашение №7	**15.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №8	**19.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №9	**29.08.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 735 672 956	2 735 672 956	2 442 565 139,29				293 107 816,71	2 735 672 956
в том числе: за декабрь месяц 2024 года	516 881 935	516 881 935	461 501 727,68				55 380 207,32	516 881 935

М.П.

Заказчик Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#1b8fb5f6-43d0-41a1-8966-0ddc2c85762b)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №37	Благоустройство	75 854 876
2	Акт №38	Силовое электрооборудование	11 864 098
3	Акт №39	Фасадное освещение	1 859 320
4	Акт №40	Отопление. Вентиляция	13 462 895
5	Акт №41	Наружные газопроводы	9 942 881
6	Акт №42	Архитектурно-строительная часть	353 089 126
7	Акт №43	Внутриплощадочные тепловые сети	575 370
8	Акт №44	Блочно-модульная котельная	440 264
9	Акт №45	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	696 678
10	Акт №46	Система контроля и управления доступом	10 693 235
11	Акт №47	Видеонаблюдение	16 083 135
12	Акт №48	Автоматическая пожарная сигнализация	21 789 135
13	Акт №49	Электросила	530 922
		ИТОГО	**516 881 935**

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#1b8fb5f6-43d0-41a1-8966-0ddc2c85762b)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН null	Заместитель директора	Подписано: 20.12.2024 12:29
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 20.12.2024 11:09
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 22.12.2024 14:03
Заказчик: ИИН 830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД null		Подписано: 23.12.2024 08:31

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#1b8fb5f6-43d0-41a1-8966-0ddc2c85762b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#1b8fb5f6-43d0-41a1-8966-0ddc2c85762b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#1b8fb5f6-43d0-41a1-8966-0ddc2c85762b)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство				
			Раздел: Покрытие (участок школы)				
			Подраздел: Тип 1. Асфальтобетонное покрытие				
1	13	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	357.7248	4 579	1 638 021
2	14	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	450.733248	3 849	1 734 872
			Итого по подразделу: Тип 1. Асфальтобетонное покрытие				**3 372 894**
			Подраздел: Тип 2а. Покрытие тротуаров из плитки				
3	26	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	99.2	5 922	587 462
4	27	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	99.2	4 579	454 237
5	28	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	124.992	3 790	473 720
6	29	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	992	3 699	3 669 408
7	30	255-102-0607РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	976.128	3 912	3 818 613
			Итого по подразделу: Тип 2а. Покрытие тротуаров из плитки				**9 003 440**
			Подраздел: Тип 3. Покрытие тротуаров и площадок из асфальта				
8	32	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	76.98	4 579	352 491

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	33	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	88.527	3 790	335 517
			Итого по подразделу: Тип 3. Покрытие тротуаров и площадок из асфальта				**688 008**
			Подраздел: Тип 4. Покрытие футбольного поля				
10	36	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /фракцмм 5-20 мм, фракции 20-40 мм/	м3	560	4 579	2 564 240
11	37	211-201-0402РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	352.8	4 460	1 573 488
12	38	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	352.8	3 790	1 337 112
13	39	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева	м3	280	4 579	1 282 120
14	40	211-201-0401РСНБ РК 2022	Отсев щебеня из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 1-5 мм	м3	352.8	4 492	1 584 778
			Итого по подразделу: Тип 4. Покрытие футбольного поля				**8 341 738**
			Подраздел: Тип 5. Покрытие из плитки				
15	42	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	109.6	5 922	649 051
16	43	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	98.64	4 579	451 673
17	44	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	124.2864	3 849	478 378
18	45	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	548	3 699	2 027 052
19	46	255-102-0607РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	539.232	3 912	2 109 476
			Итого по подразделу: Тип 5. Покрытие из плитки				**5 715 630**
			Подраздел: Тип 6. Покрытие резиновое				
20	47	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	409.5	5 922	2 425 059
21	48	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /фракции 20-40 мм/	м3	273	4 579	1 250 067
22	49	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	343.98	3 790	1 303 684
23	50	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	273	44 298	12 093 354

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	51	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	3.9585	59 456	235 357
25	52	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3.9585	415 660	1 645 390
			Итого по подразделу: Тип 6. Покрытие резиновое				**18 952 911**
			Подраздел: Тип 7. Покрытие из песка				
26	54	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	38	6 774	257 412
27	55	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /фракции 20-40 мм/	м3	1.12	4 579	5 128
28	56	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1.4112	3 790	5 348
			Итого по подразделу: Тип 7. Покрытие из песка				**267 888**
			Итого по разделу: Покрытие (участок школы)				**46 342 509**
			Раздел: Покрытие (участок хоз. зоны)				
			Подраздел: Тип 1. Асфальтобетонное покрытие				
29	65	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	86.4	4 579	395 626
30	66	211-201-0506РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	99.36	3 849	382 437
			Итого по подразделу: Тип 1. Асфальтобетонное покрытие				**778 063**
			Подраздел: Тип 3. Покрытие тротуаров и площадок из асфальта				
31	77	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	1.8	6 774	12 193
32	78	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	2.7	4 579	12 363
33	79	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3.402	3 790	12 893
34	80	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0.0144	217 858	3 137
35	81	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18	2 848	51 264
36	82	216-201-0203РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0.0001944	181 652	35
			Итого по подразделу: Тип 3. Покрытие тротуаров и площадок из асфальта				**91 886**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Покрытие (участок хоз. зоны)				**869 949**
			Раздел: Озеленение				
			Подраздел: Деревья, кустарники				
37	119	6113-0102-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 100%	яма	5	19 253	96 265
38	120	6113-0102-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м, вручную, добавление растительной земли до 100%	яма	20	26 638	532 760
39	121	6113-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	25	19 004	475 100
40	122	254-102-0704РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	7	4 256	29 792
41	123	254-103-2502РСНБ РК 2022	Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	18	15 985	287 730
			Итого по подразделу: Деревья, кустарники				**1 421 647**
			Подраздел: Саженец				
42	124	6113-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места кустарника-саженца с оголенной корневой системой в группы механизированным способом, в естественном грунте	яма	45	896	40 320
43	125	6113-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка в ямы кустарника-саженца в группах, размер ям 0,5х0,5 м	шт.	45	952	42 840
44	126	254-104-1101РСНБ РК 2022	Лох серебристый с оголённой корневой системой	шт.	45	1 425	64 125
45	127	6113-0108-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для двухрядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте	м	338	1 252	423 176
46	128	6113-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди двухрядной	м	338	5 986	2 023 268
47	129	254-104-1001РСНБ РК 2022	Акация с оголённой корневой системой	шт.	1690	712	1 203 280
			Итого по подразделу: Саженец				**3 797 009**
			Итого по разделу: Озеленение				**5 218 656**
			Итого по локальной смете: Благоустройство				**52 431 115**
			ИТОГО по акту:				**52 431 115**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				52431115.424 x 8.10%	4 246 920
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				52431115.424 + 4246920.549	56 678 035
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				52431115.424 x 0.05409035	2 836 017
		Сметная прибыль, 5.00%				56678035.973 x 5.00%	2 833 901

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(56678035.973 + 2836017.234) x 5.000%	2 975 702
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					65 323 657
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				65323657.666 x 1.0368	67 727 568
		НДС (12%)				67727568.269 x 12%	8 127 308
		Итого с НДС				67727568.269 + 8127308.192	75 854 876

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	17.12.2024 14:30
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	19.12.2024 17:24
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:55
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	19.12.2024 17:15
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 07:01
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:47
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:30 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:03
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:11

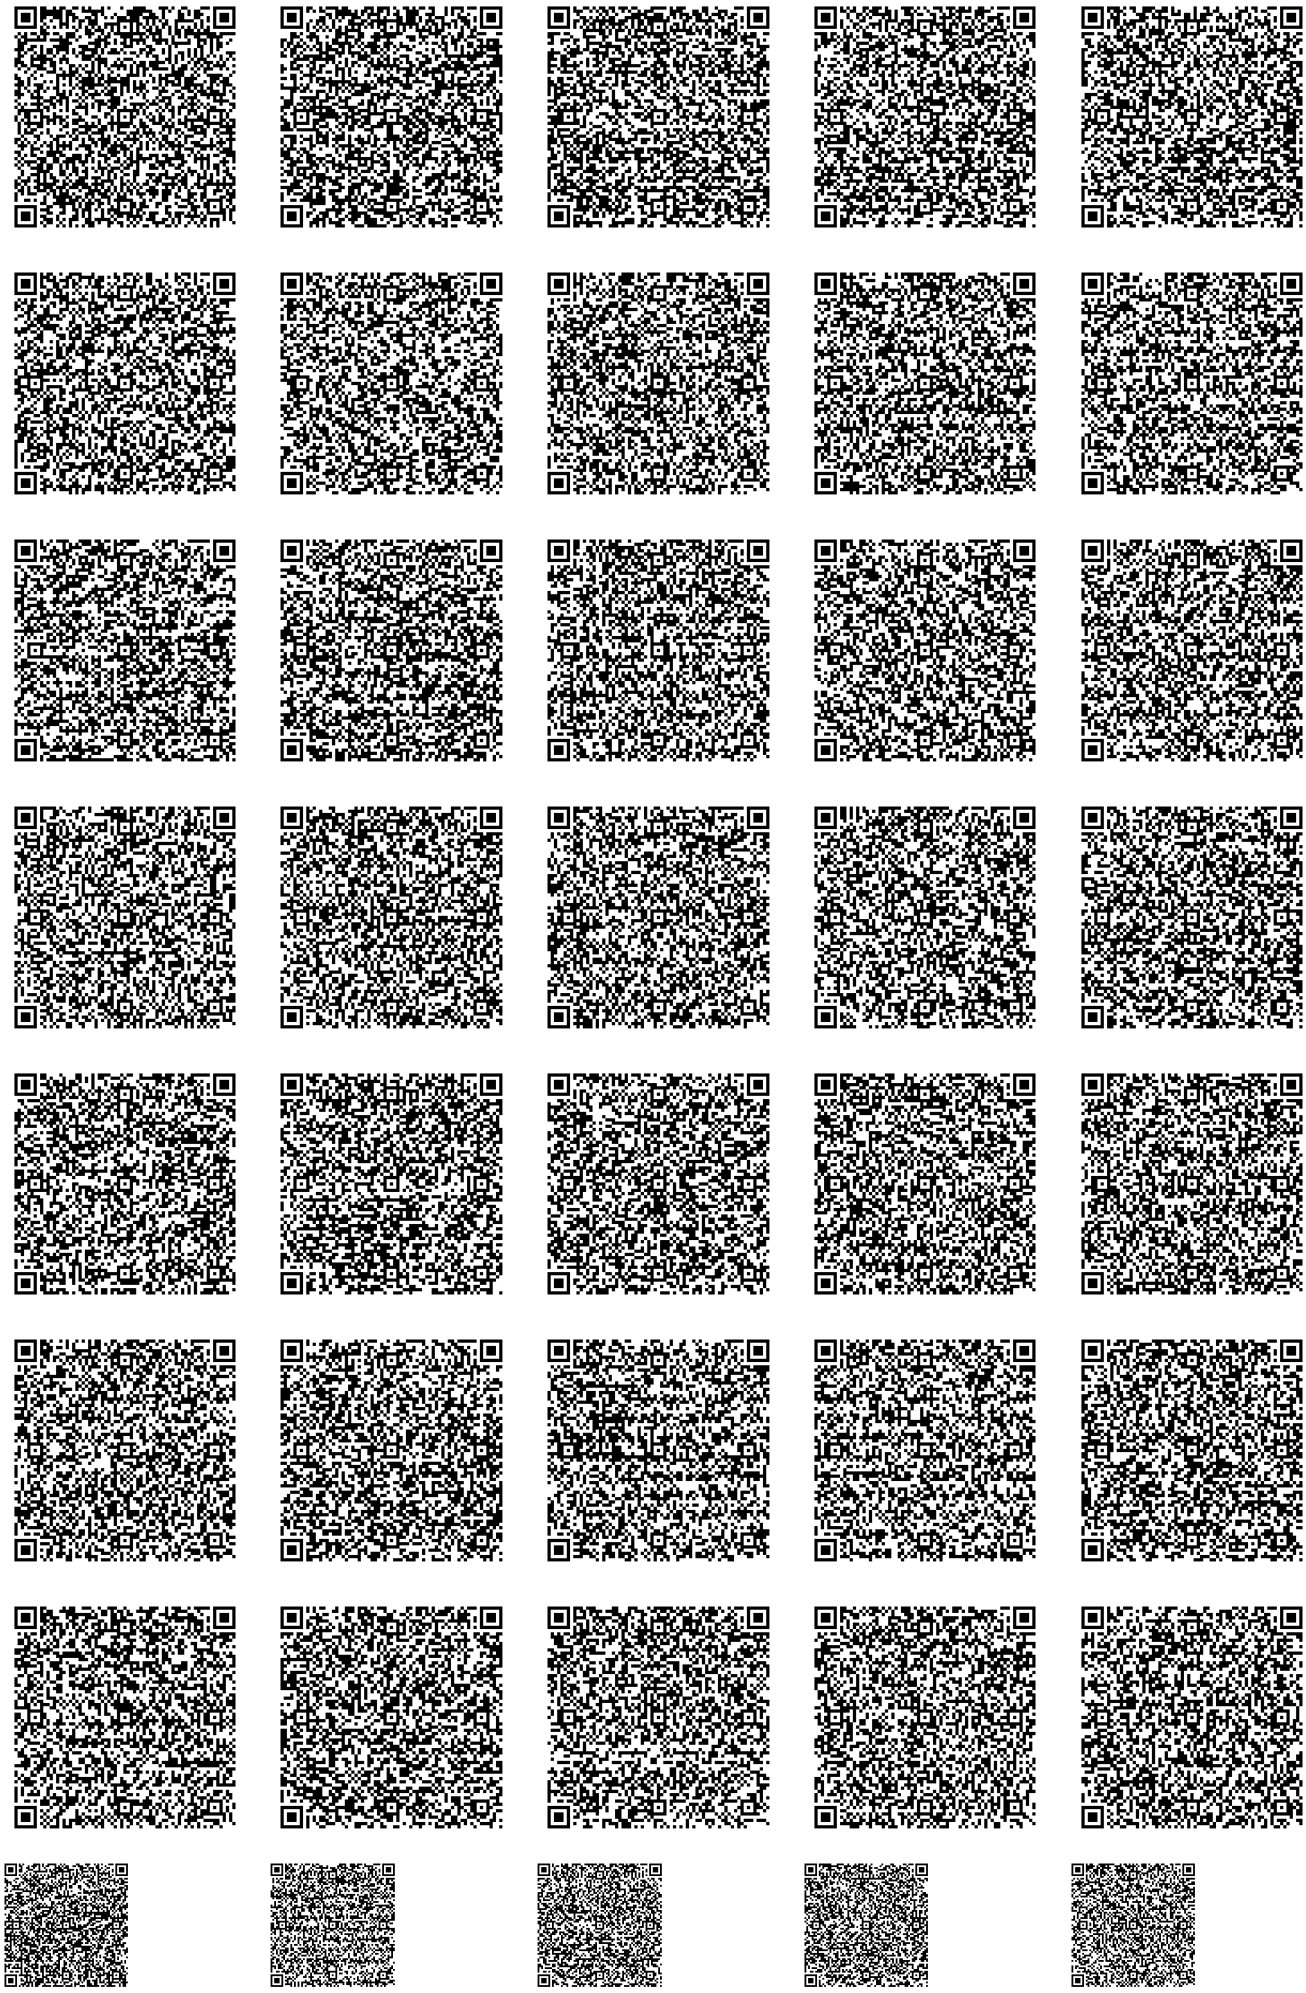

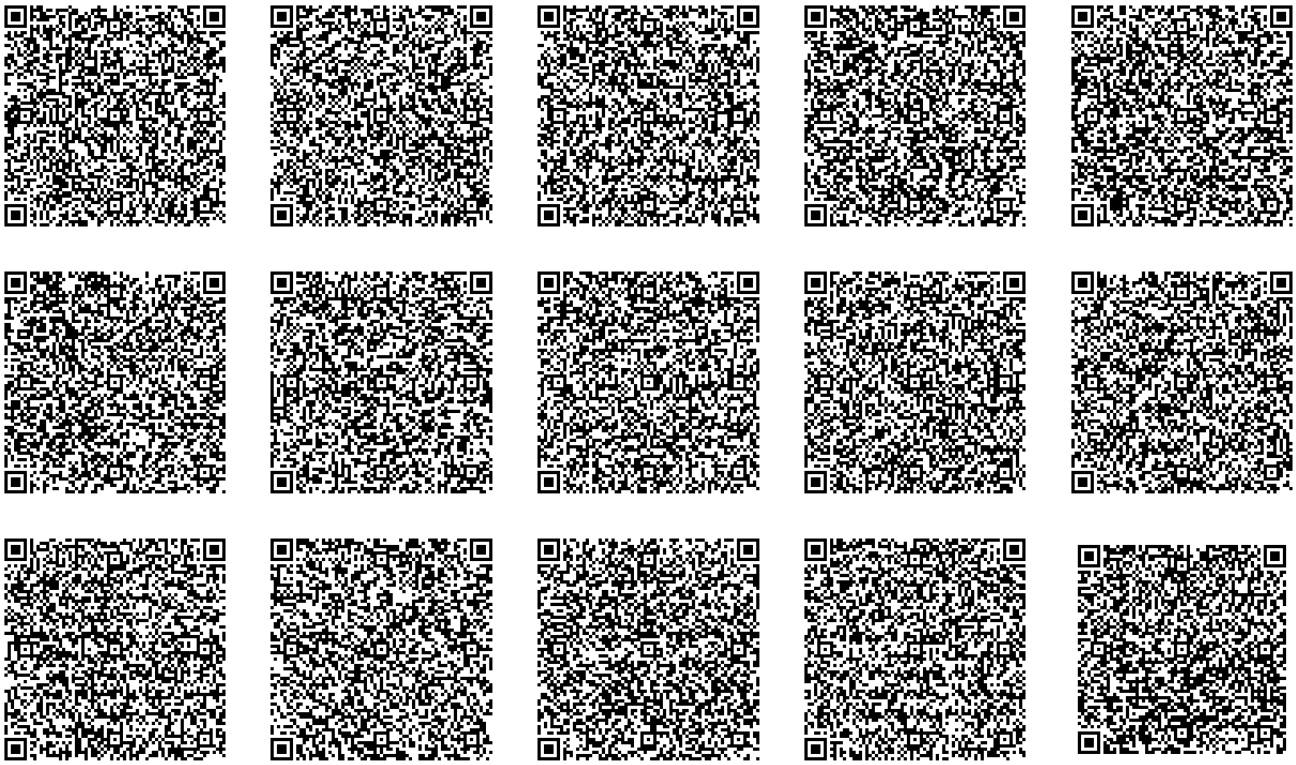

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Видеонаблюдение				
			Раздел: Видеонаблюдение				
			Подраздел: Оборудование				
1	4	6125-0801-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	55	14 988	824 340
2	5	248-402-0709СпрСЦ 05.2024	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1147G2-LUF, объектив 2,8~4 мм, 4 Мп	шт.	32	64 845	2 075 040
3	6	248-402-0604СпрСЦ 05.2024	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 50 м, DS-2CD1653G0-IZ, объектив 2,8~12 мм, 5 Мп	шт.	23	96 612	2 222 076
			Итого по подразделу: Оборудование				**5 121 456**
			Подраздел: Изделия и материалы				
4	19	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3598	743	2 673 314
5	20	243-304-0202РСНБ РК 2022	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	м	3498	761	2 661 978
6	21	243-402-0104РСНБ РК 2022	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х1,5 мм2	м	100	191	19 100
7	22	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3532.98	54	190 781
8	23	241-207-0304РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	101	65	6 565
9	24	243-902-1801СпрСЦ 05.2024	Разъем для системного монтажного кабеля (в комплекте 50 шт.) DCNM-CBCON	шт.	2	305 796	611 592
10	25	241-221-0102РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	7000	5	35 000
			Итого по подразделу: Изделия и материалы				**6 198 330**
			Итого по разделу: Видеонаблюдение				**11 319 786**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Видеонаблюдение				**11 319 786**
			ИТОГО по акту:				**11 319 786**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				11319786.000 x 8.10%	916 902
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				11319786.000 + 916902.709	12 236 688
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				11319786.000 x 0.05409035	612 291
		Сметная прибыль, 5.00%				12236688.709 x 5.00%	611 834
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(12236688.709 + 612291.154) x 5.000%	642 448
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					14 103 263
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				14103263.292 x 1.0182	14 359 942
		НДС (12%)				14359942.684 x 12%	1 723 193
		Итого с НДС				14359942.684 + 1723193.122	16 083 135

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:15
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:27
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:45
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:52
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:58
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:31
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:00
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:42 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:06

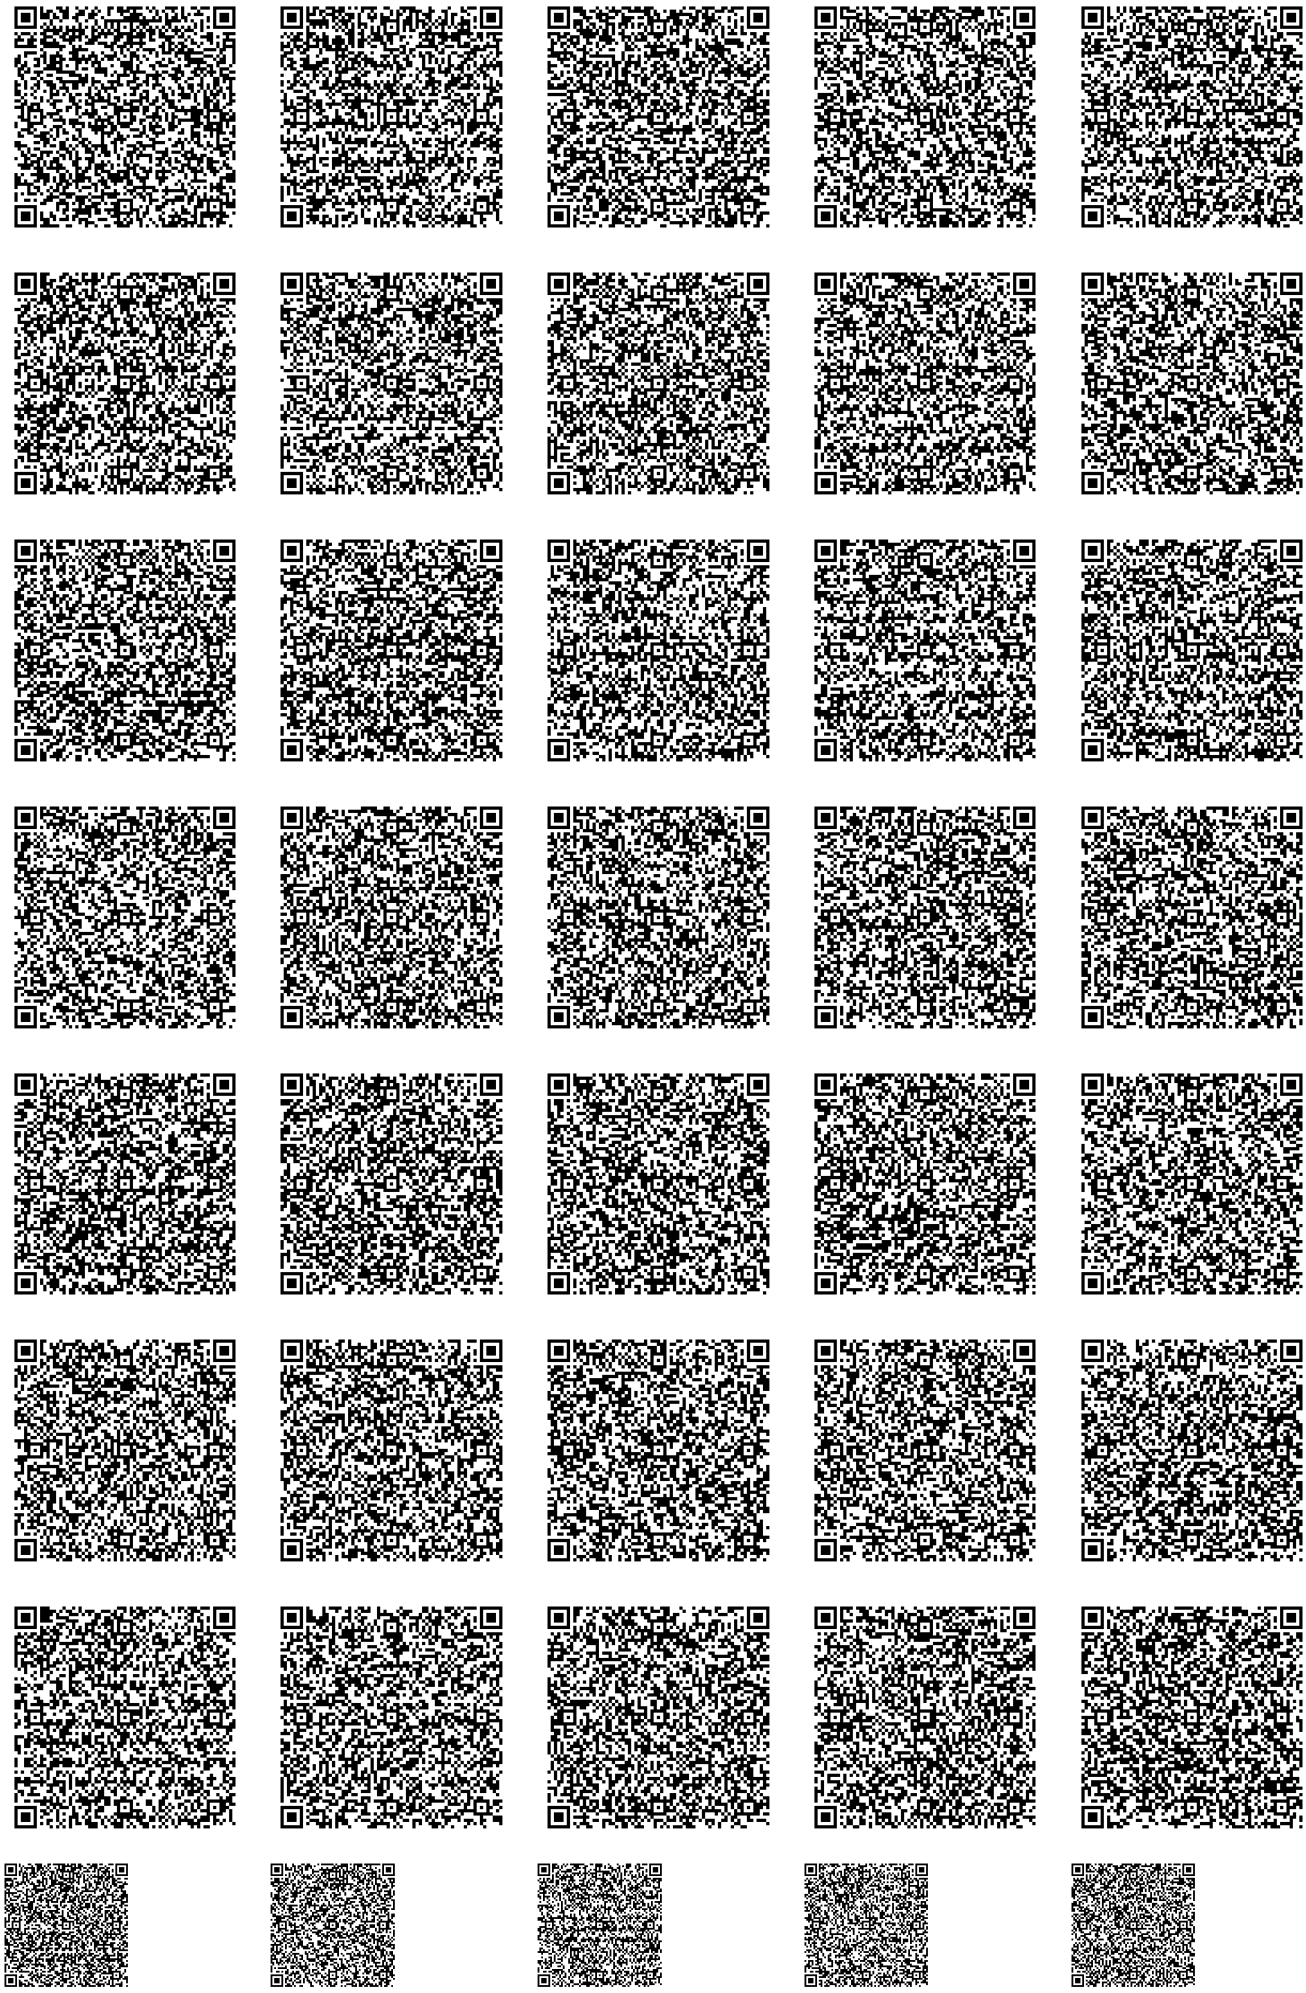

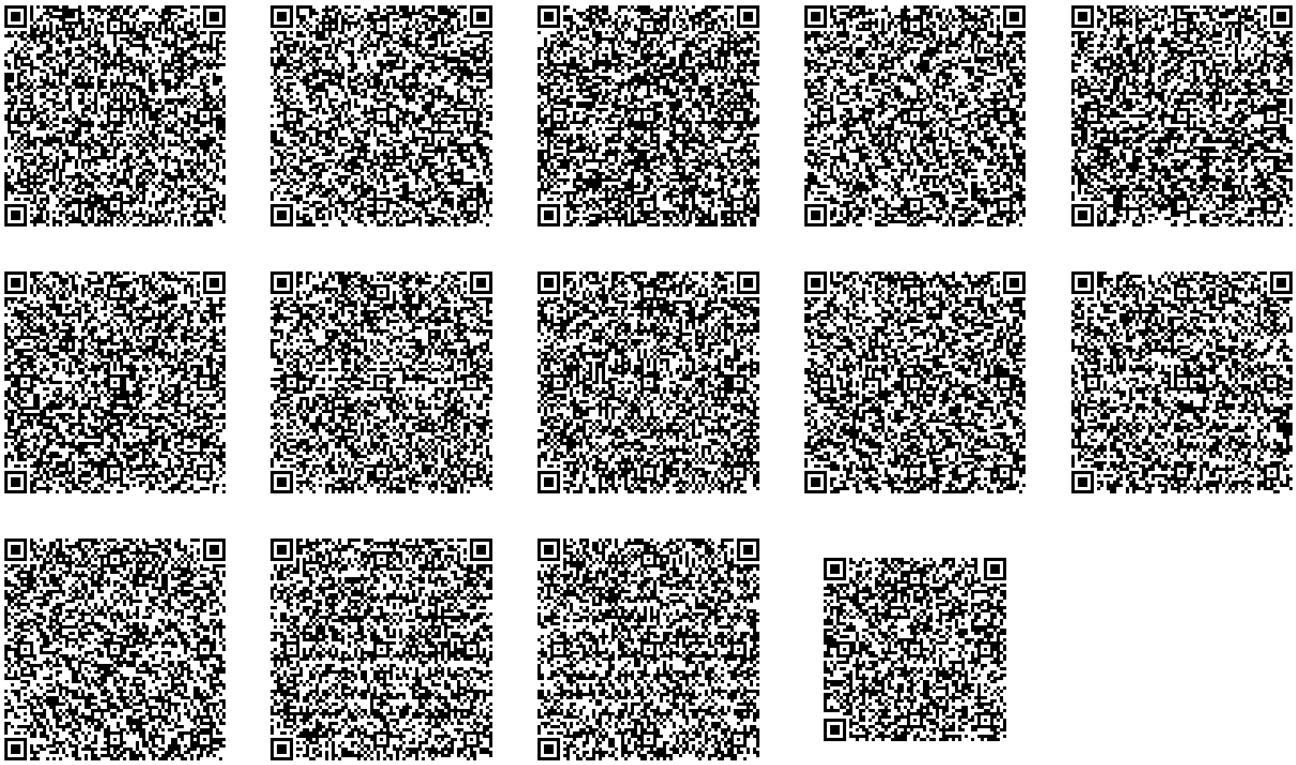

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом				
			Раздел: СКУД				
			Подраздел: Оборудование				
1	1	6125-0801-0503ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж турникета -трипода напольного	шт.	4	14 909	59 636
2	2	248-405-1418СпрСЦ 05.2024	Турникет тумбовый NT02	шт.	4	847 509	3 390 036
3	3	СТКПСпрСЦ 05.2024	Поручень длиной 925 мм PERCo-BH02 1-00	шт	10	29 194	291 945
4	4	СТКПСпрСЦ 05.2024	Двухсторонняя стойка L-образная PERCo-BH02 2-02	шт	1	60 472	60 472
5	5	СТКПСпрСЦ 05.2024	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков (крайняя) PERCo-BH02 2-00	шт	8	56 940	455 526
6	6	СТКПСпрСЦ 05.2024	Калитка с электромагнитной разблокировкой К-13	шт	2	177 702	355 405
7	10	6125-0801-0507ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	шт.	38	3 626	137 788
8	11	248-405-0341РСНБ РК 2022	ST-PR011EM-WT, считыватель бесконтактный формата EM-Marin	шт.	38	4 509	171 342
9	20	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	38	4 831	183 578
10	21	248-301-0102РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	38	1 001	38 038
			Итого по подразделу: Оборудование				**5 143 766**
			Подраздел: Кабели и трубы				
11	28	6119-0102-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2110	743	1 567 730

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	29	243-305-0601СпрСЦ 05.2024	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	1600	171	273 600
13	30	243-304-0138СпрСЦ 05.2024	Кабель для структурированных кабельных систем U/UTP кат.5Е 4х2х24AWG LSZH	м	450	333	149 850
14	31	243-304-0134РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF	м	60	143	8 580
15	32	241-207-1702СпрСЦ 05.2024	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	м	2131.1	140	298 354
16	33	241-207-0206РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	20.2	331	6 686
17	34	252-201-0545РСНБ РК 2022	Скоба типа СО-22	10 шт.	429	181	77 649
			Итого по подразделу: Кабели и трубы				**2 382 449**
			Итого по разделу: СКУД				**7 526 215**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом				**7 526 215**
			ИТОГО по акту:				**7 526 215**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	7526215.000 x 8.10%	609 623
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7526215.000 + 609623.444	8 135 838
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	7526215.000 x 0.05409035	407 095
	Сметная прибыль, 5.00%	8135838.444 x 5.00%	406 791
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(8135838.444 + 407095.582) x 5.000%	427 146
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 376 872
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	9376872.649 x 1.0182	9 547 531
	НДС (12%)	9547531.731 x 12%	1 145 703
	Итого с НДС	9547531.731 + 1145703.808	10 693 235

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:17
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:42
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:45
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:52
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:26
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:30
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:06
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 10:59
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

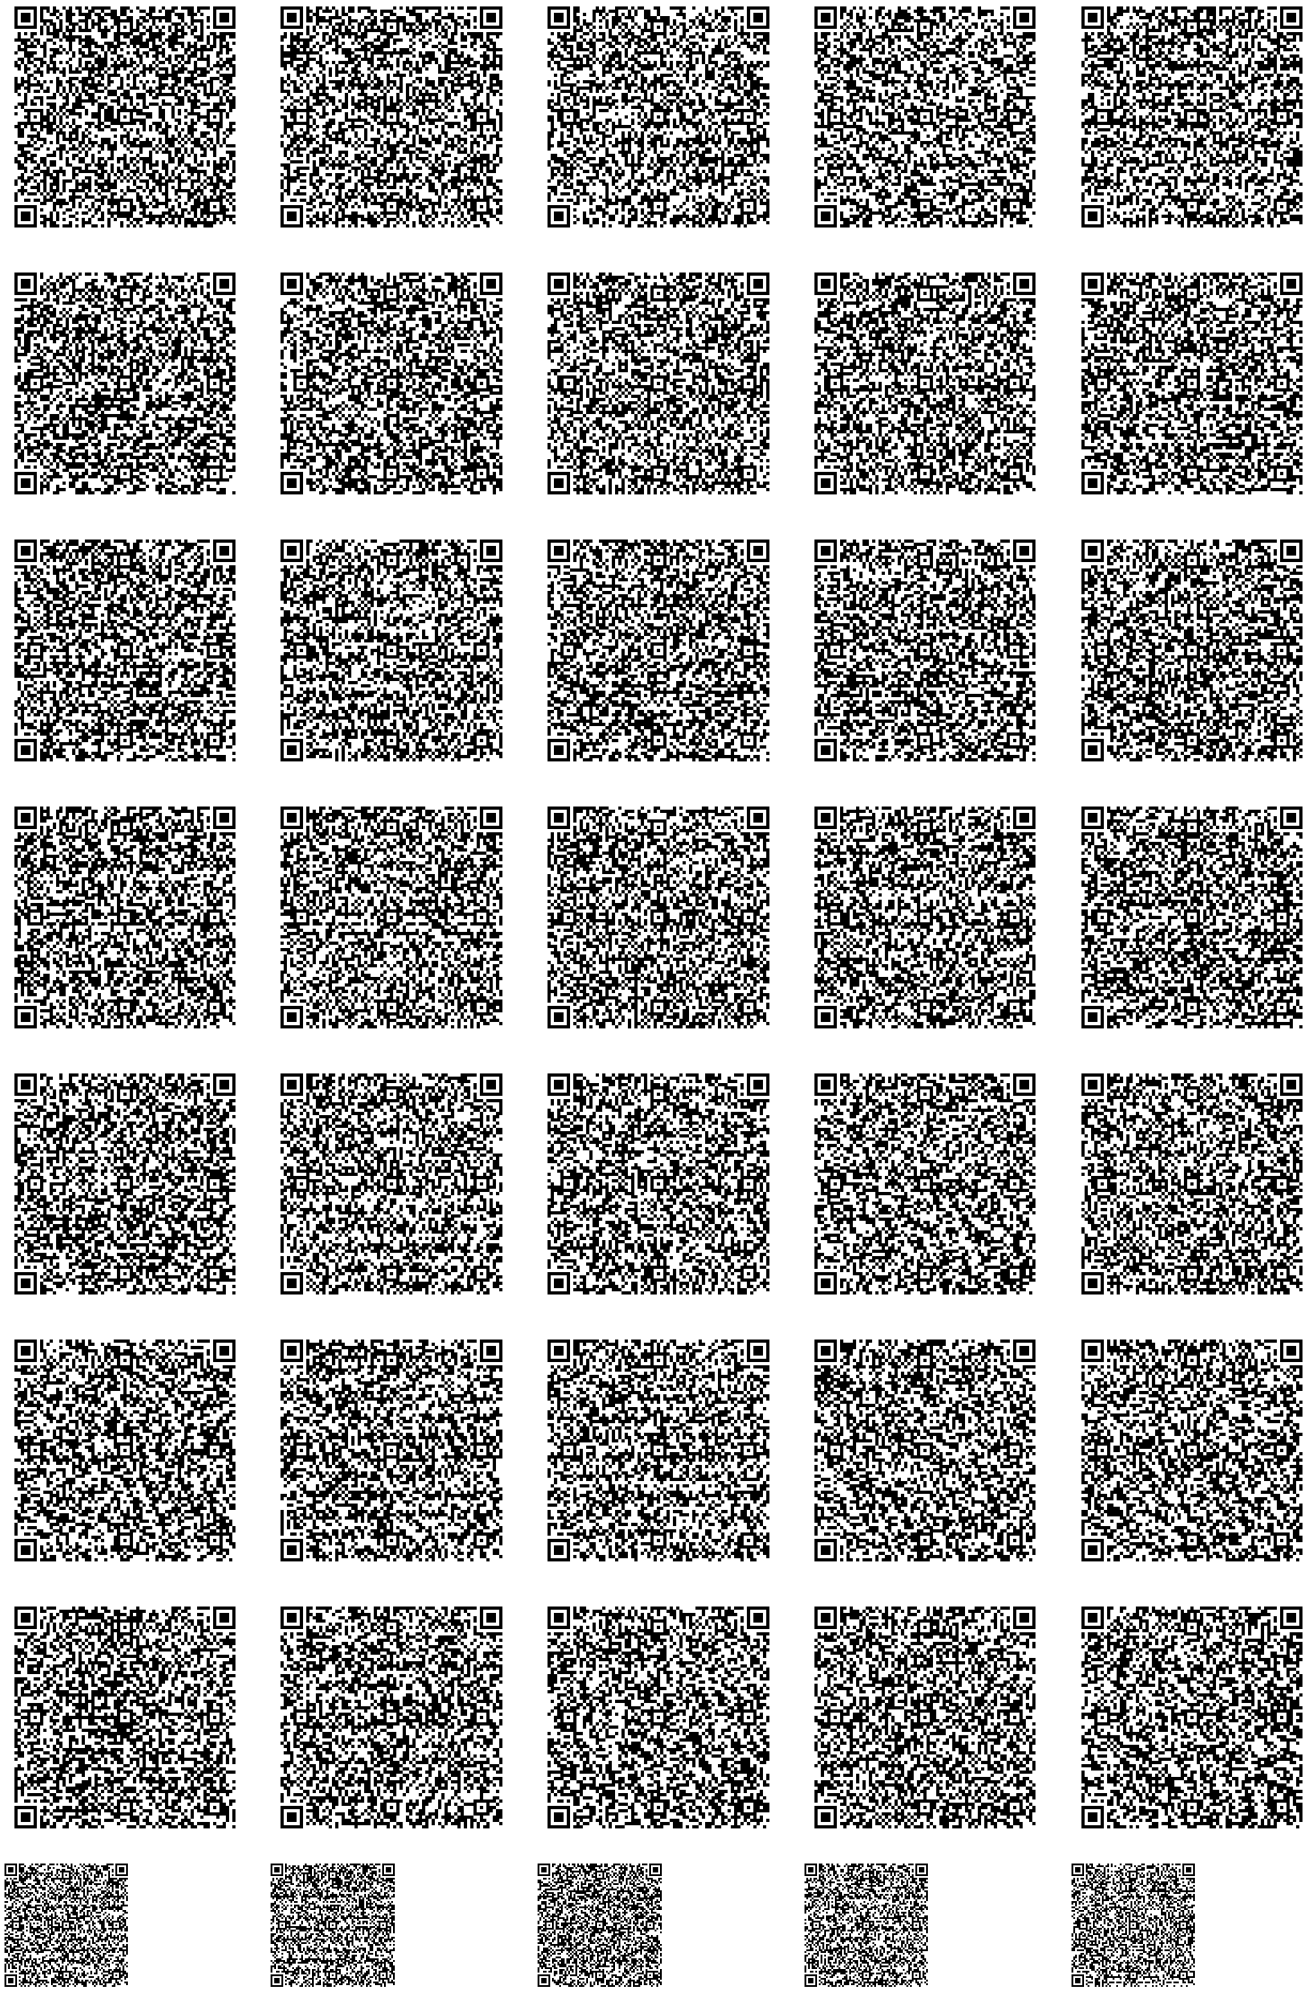

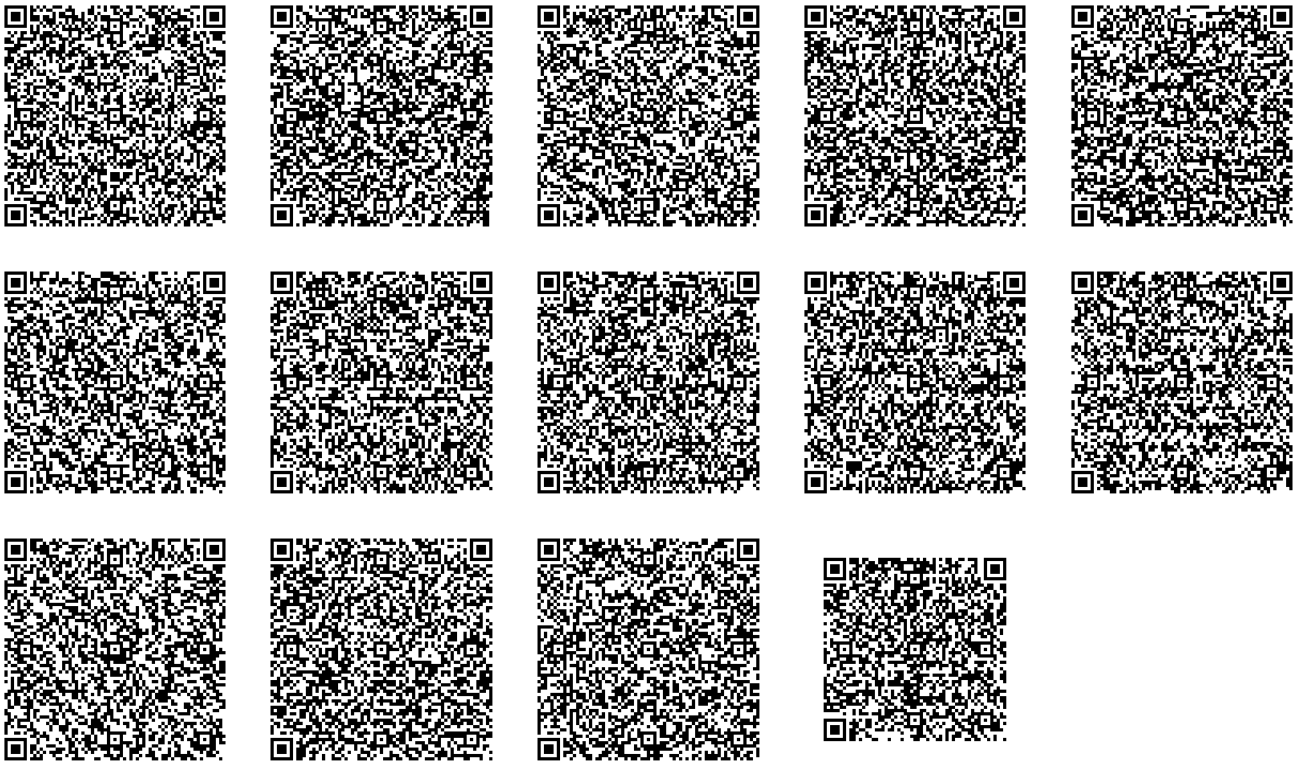

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматическая пожарная сигнализация				
			Раздел: АПС				
			Подраздел: Оборудование				
1	7	6125-0601-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования приборов ПС на 1 луч	шт.	1	57 911	57 911
2	8	248-303-1101СпрСЦ 05.2024	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122 969	122 969
3	12	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	355	4 831	1 715 005
4	13	248-302-0216РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный	шт.	291	22 683	6 600 753
5	14	248-302-0519РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	17	19 566	332 622
6	15	248-302-0120СпрСЦ 05.2024	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR прот. R3	шт.	79	22 323	1 763 517
7	16	248-302-0403СпрСЦ 05.2024	Извещатель пожарный дымовой линейный Модели ИПДЛ-264/1-50-R3	шт.	6	139 505	837 030
8	19	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	45	4 831	217 395
9	20	248-302-0519РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11 ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	37	19 566	723 942
10	21	248-302-0519РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной Модели ИП 513-11 ИК3-А-R3, электроконтактный адресный	шт.	13	19 566	254 358
11	22	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	16	5 790	92 640
12	23	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	16	3 989	63 826
13	25	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	78	5 790	451 620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	26	248-306-0836СпрСЦ 05.2024	Модуль контроля и управления МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления	шт.	41	28 127	1 153 207
15	27	248-306-0831СпрСЦ 05.2024	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный	шт.	6	21 389	128 334
16	28	248-306-0830СпрСЦ 05.2024	Модуль контроля и управления РМ-1С-R3, модуль релейный	шт.	31	17 422	540 082
17	30	6125-0601-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2 698	5 396
18	31	248-304-0106РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	2	2 712	5 424
19	36	1308-0304-0501РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	5 791	23 164
20	38	248-306-0399СпрСЦ 05.2024	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР /2х40/	шт.	1	65 616	65 616
21	39	248-306-0340РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР	шт.	1	29 585	29 585
22	40	248-306-0339РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/1,2 1х4	шт.	2	15 282	30 564
23	46	1308-0304-0501РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	5 791	5 791
24	47	РСНБ РК 2022	ИБП Back Verso 800	шт	1	47 076	47 076
			Итого по подразделу: Оборудование				**15 267 827**
			Подраздел: Газовое пожаротушение				
25	50	6125-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	4 831	4 831
26	51	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извещатель ИО 102-26	шт	1	23 542	23 543
27	52	6125-0601-0701ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	15 314	15 314
28	53	248-304-0232СпрСЦ 05.2024	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	1	24 322	24 322
			Итого по подразделу: Газовое пожаротушение				**68 010**
			Итого по разделу: АПС				**15 335 837**
			Итого по локальной смете: Автоматическая пожарная сигнализация				**15 335 837**
			ИТОГО по акту:				**15 335 837**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				15335837.000 x 8.10%	1 242 202
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				15335837.000 + 1242202.856	16 578 039
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				15335837.000 x 0.05409035	829 520
		Сметная прибыль, 5.00%				16578039.856 x 5.00%	828 901
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(16578039.856 + 829520.747) x 5.000%	870 378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					19 106 840
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				19106840.625 x 1.0182	19 454 585
		НДС (12%)				19454585.125 x 12%	2 334 550
		Итого с НДС				19454585.125 + 2334550.215	21 789 135

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:14
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:46
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:52
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:58
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:27
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:32
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:01
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:07

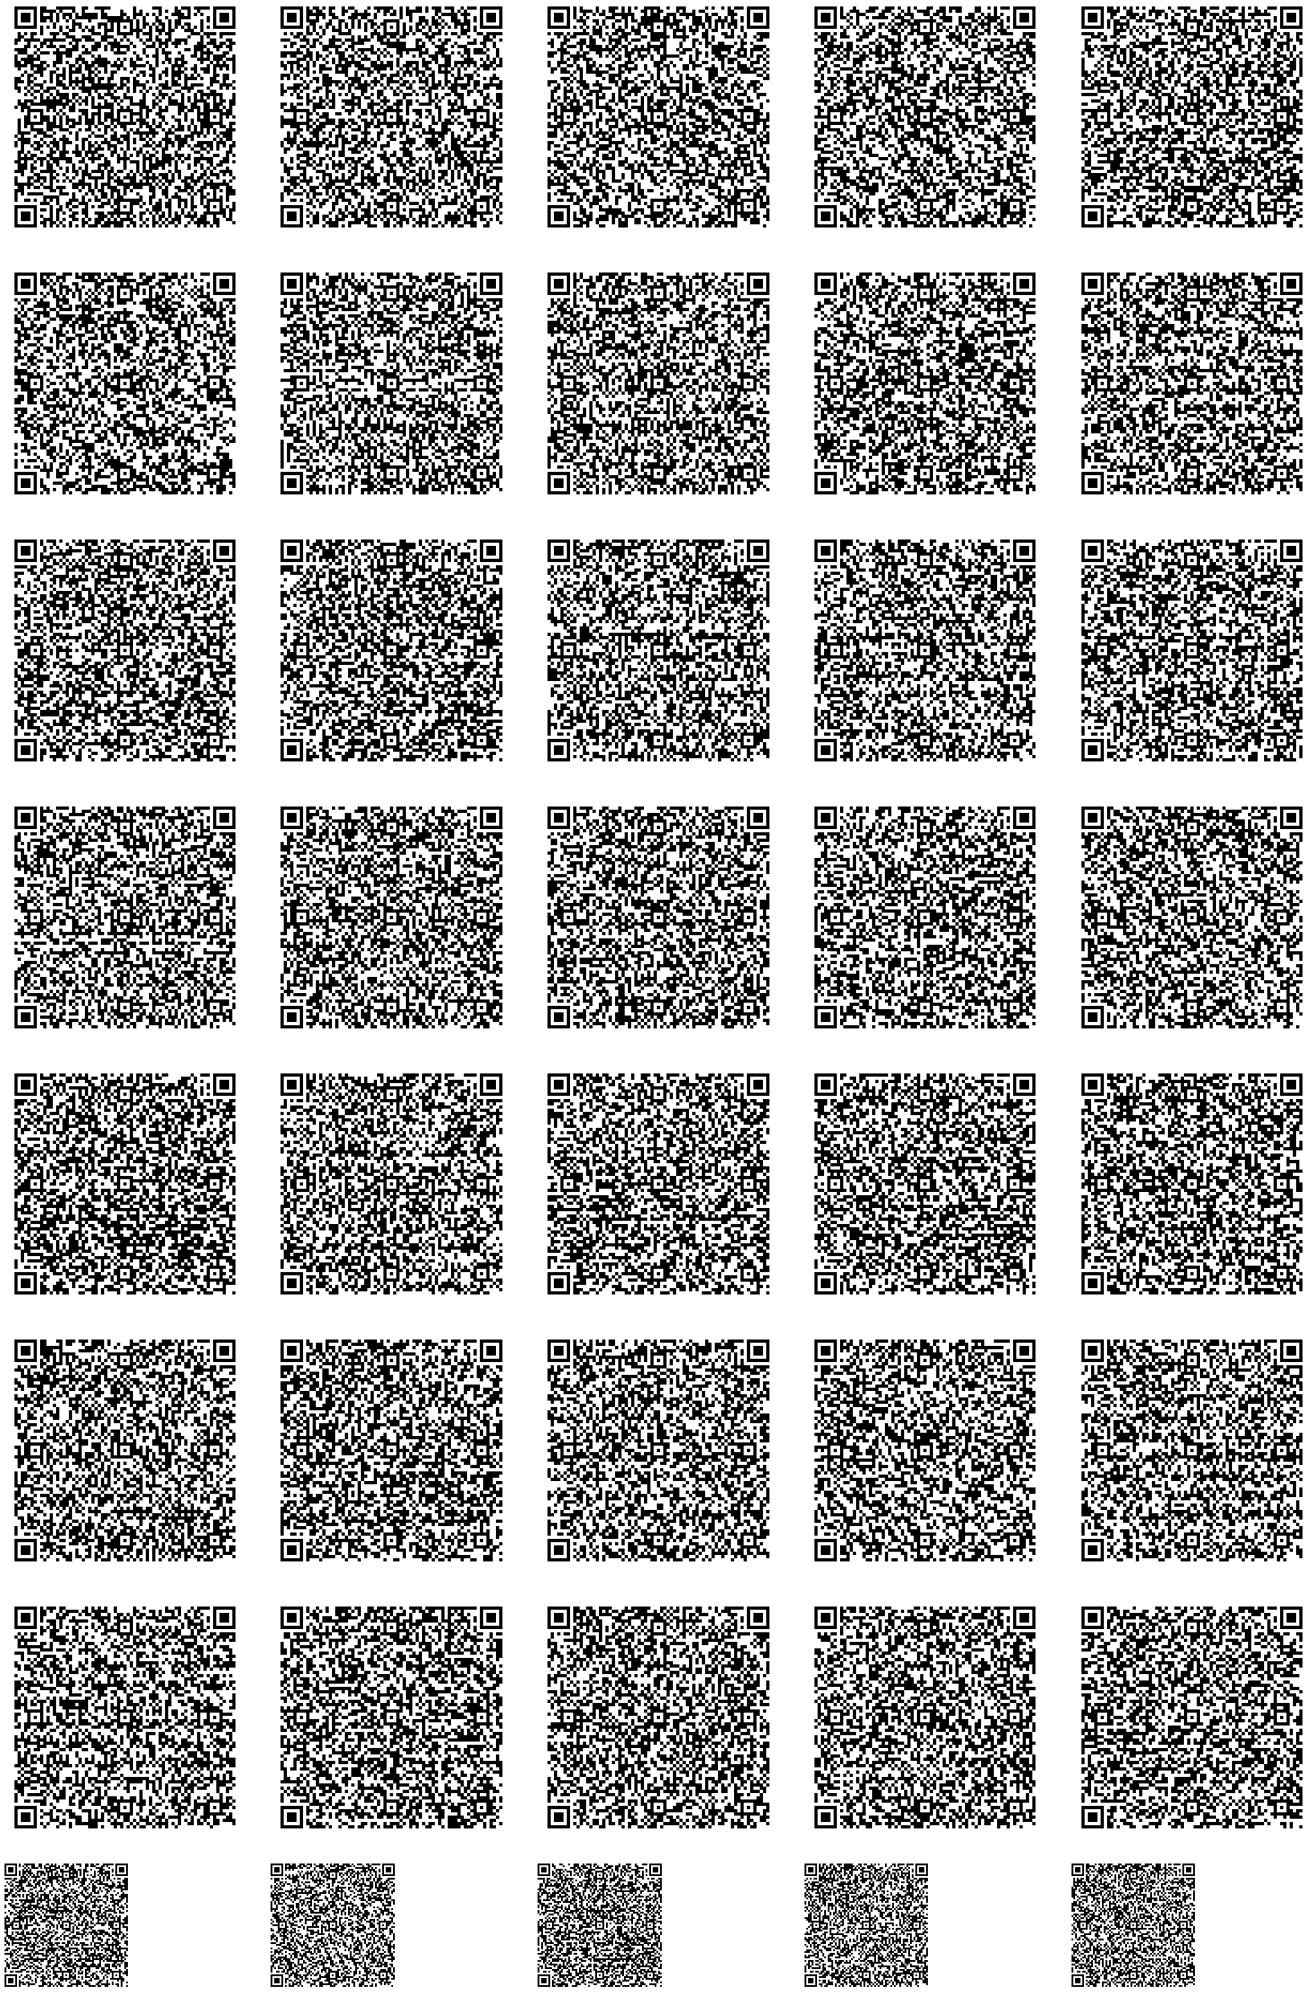

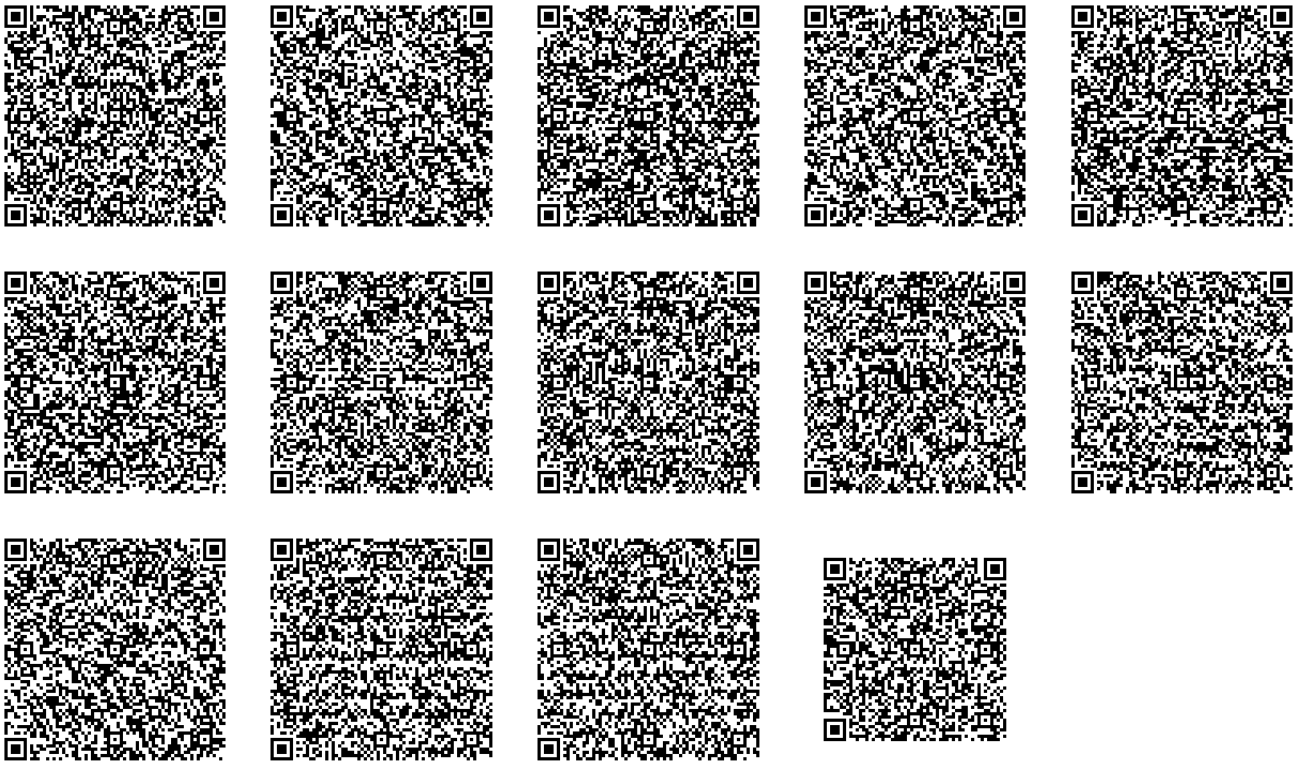

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электросила.				
			Раздел: Фундамент под 2КТПБ				
1	21	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.03841	192	391
2	22	6124-0201-3108ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	175.5	275	48 262
3	23	241-701-0201РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	175.5	1 852	325 026
			Итого по разделу: Фундамент под 2КТПБ				**373 679**
			Итого по локальной смете: Электросила.				**373 679**
			ИТОГО по акту:				**373 679**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	373679.000 x 8.10%	30 268
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	373679.000 + 30268.000	403 947
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	373679.000 x 0.05409035	20 212
	Сметная прибыль, 5.00%	403947.000 x 5.00%	20 197
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(403947.000 + 20212.427) x 5.000%	21 207
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		465 564
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	465564.749 x 1.0182	474 038
	НДС (12%)	474038.027 x 12%	56 884
	Итого с НДС	474038.027 + 56884.563	530 922

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:11
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:46
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:53
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:58
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:27
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:34
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:01
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:40 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:08

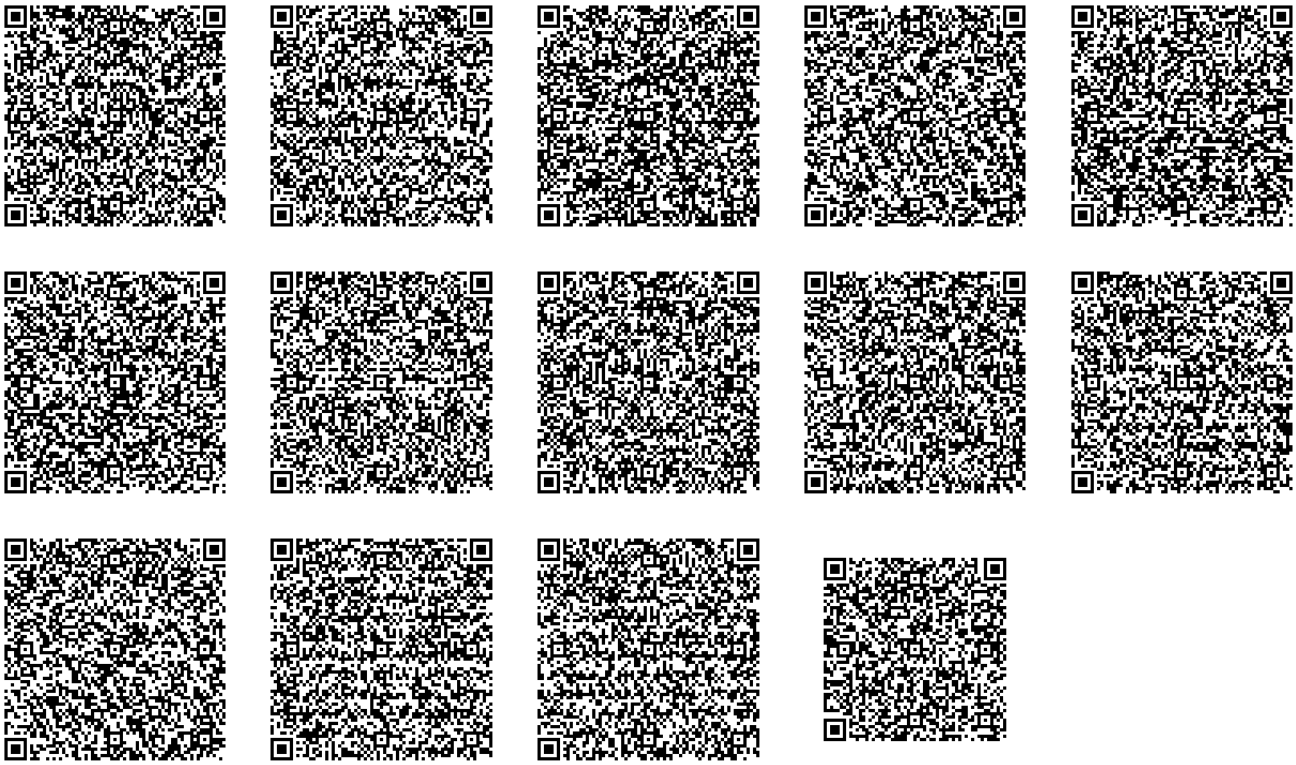

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Блочно-модульная котельная				
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: Земляные работы				
1	5	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	40.2	1 255	50 451
			Итого по подразделу: Земляные работы				**50 451**
			Подраздел: Фундамент монолитный, ФМ-1				
2	14	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	14.8	4 097	60 636
3	15	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.48472	192	477
			Итого по подразделу: Фундамент монолитный, ФМ-1				**61 113**
			Подраздел: Фундамент монолитный ФМ-2				
4	23	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	29	4 097	118 813
			Итого по подразделу: Фундамент монолитный ФМ-2				**118 813**
			Подраздел: Приямок ПРМ-1 (500x500x1000)				
5	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.06	39 292	2 358
6	25	1106-1301-0103РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0.36	87 253	31 411

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	26	212-101-2109РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0.3654	32 288	11 798
8	27	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.005	387 658	1 938
9	28	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.04935	338 778	16 719
10	29	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг /МИ4-46/	т	0.0066	982 249	6 483
11	30	222-509-1006РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0066	1 195 418	7 890
12	34	6124-0201-3104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных, диаметр 50 мм	м	1.85	154	285
13	35	241-207-0206РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	1.85	331	612
			Итого по подразделу: Приямок ПРМ-1 (500х500х1000)				**79 494**
			Итого по разделу: Строительные работы				**309 871**
			Итого по локальной смете: Блочно-модульная котельная				**309 871**
			ИТОГО по акту:				**309 871**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	309871.000 x 8.10%	25 099
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	309871.000 + 25099.552	334 970
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	309871.000 x 0.05409035	16 761
	Сметная прибыль, 5.00%	334970.552 x 5.00%	16 748
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(334970.552 + 16761.030) x 5.000%	17 586
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		386 066
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	386066.689 x 1.0182	393 093
	НДС (12%)	393093.103 x 12%	47 171
	Итого с НДС	393093.103 + 47171.172	440 264

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:25
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:42
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:44
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:51
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:26
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:29
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 10:58
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:04

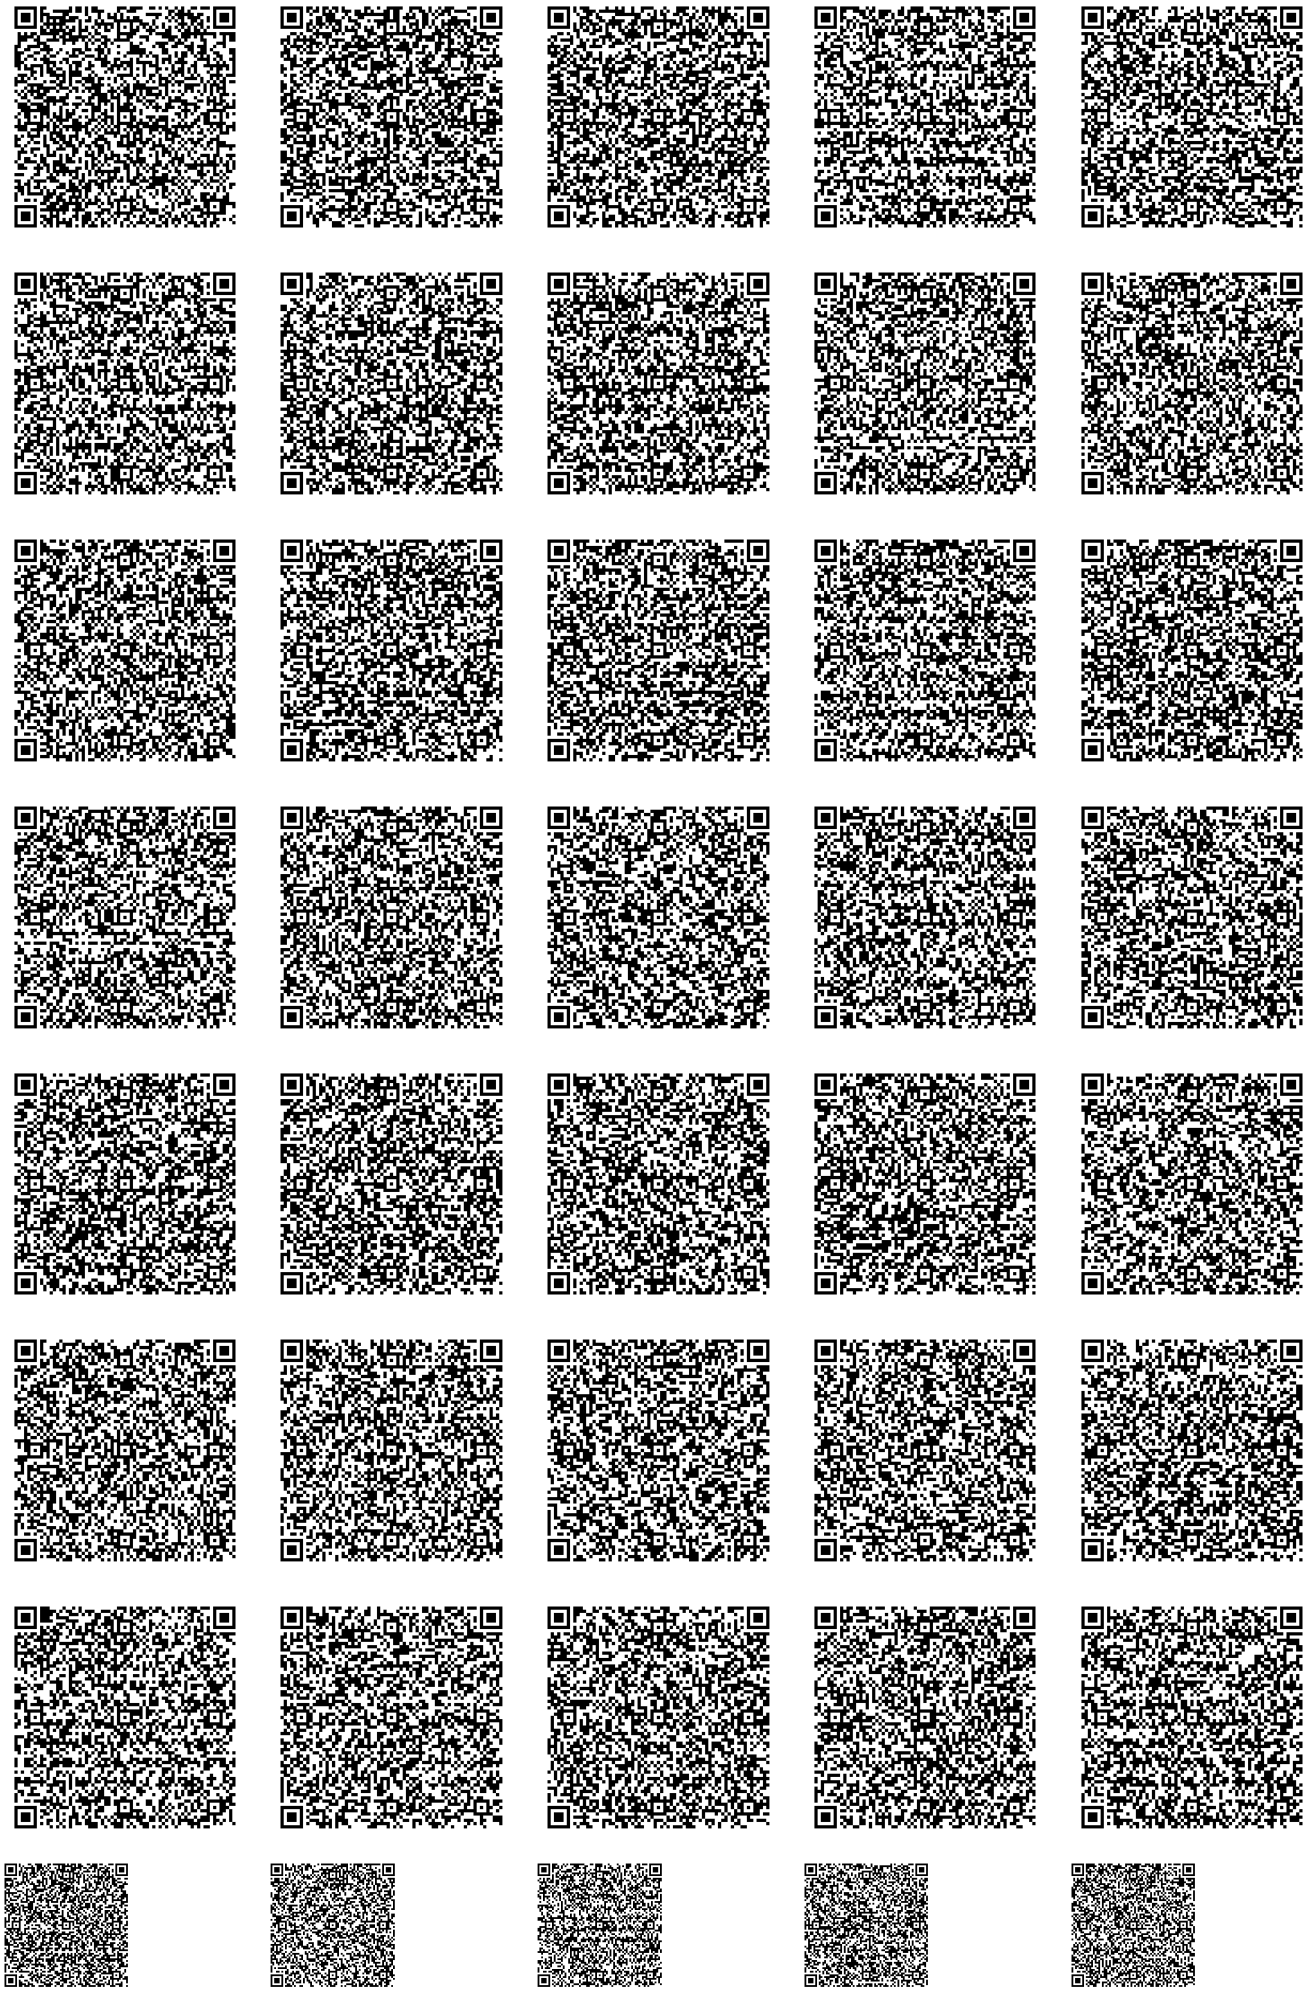

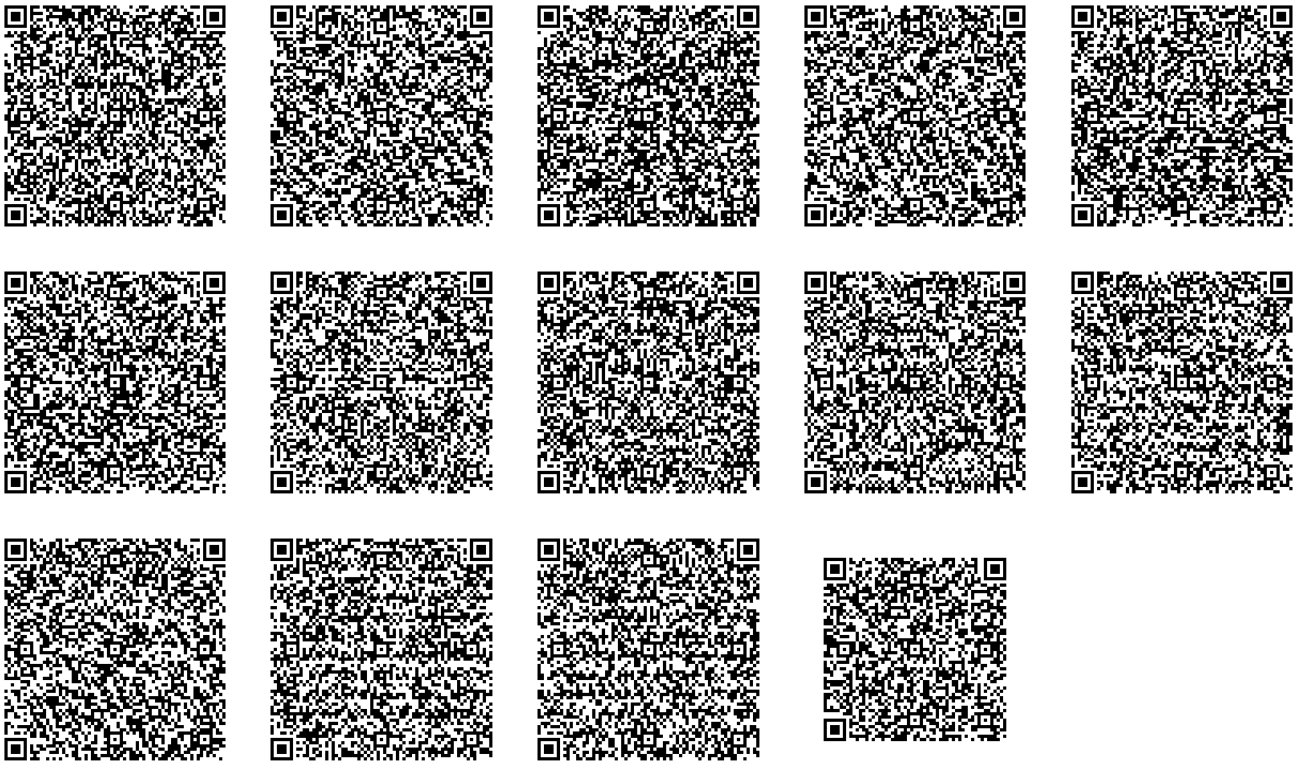

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные тепловые сети				
			Раздел: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				
			Подраздел: Водонепроницаемый ввод в здание				
1	33	1129-0174-0103РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	4 688	9 376
2	34	241-102-0252РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	1.6	38 287	61 259
3	35	6114-0801-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 400 мм	сальник	2	17 401	34 802
4	36	212-101-0613РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0.24	30 968	7 432
5	37	217-204-0401РСНБ РК 2022	Жгут углеродный анкерный Carbon Wrap Anchor диаметром 10 мм	м	1.6	5 223	8 357
6	38	241-704-0222РСНБ РК 2022	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	2	68 671	137 342
			Итого по подразделу: Водонепроницаемый ввод в здание				**258 568**
			Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				**258 568**
			Раздел: СИСТЕМА ОДК				
			Подраздел: null				
7	81	6123-0104-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1	23 221	23 221
8	82	6123-0104-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	85 932	85 932

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	83	6123-0104-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Удлинение кабеля системы ОДК. Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	комплект	2	18 621	37 242
			Итого по подразделу: null				**146 395**
			Итого по разделу: СИСТЕМА ОДК				**146 395**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные тепловые сети				**404 963**
			ИТОГО по акту:				**404 963**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)				404963.000 x 8.10%	32 802
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				404963.000 + 32802.005	437 765
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035				404963.000 x 0.05409035	21 904
		Сметная прибыль, 5.00%				437765.005 x 5.00%	21 888
		Непредвиденные расходы, 5.000%				(437765.005 + 21904.589) x 5.000%	22 983
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					504 541
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				504541.324 x 1.0182	513 723
		НДС (12%)				513723.976 x 12%	61 646
		Итого с НДС				513723.976 + 61646.877	575 370

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:29
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:51
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:25
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:41
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:44
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:28
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 10:58
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:42 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:03

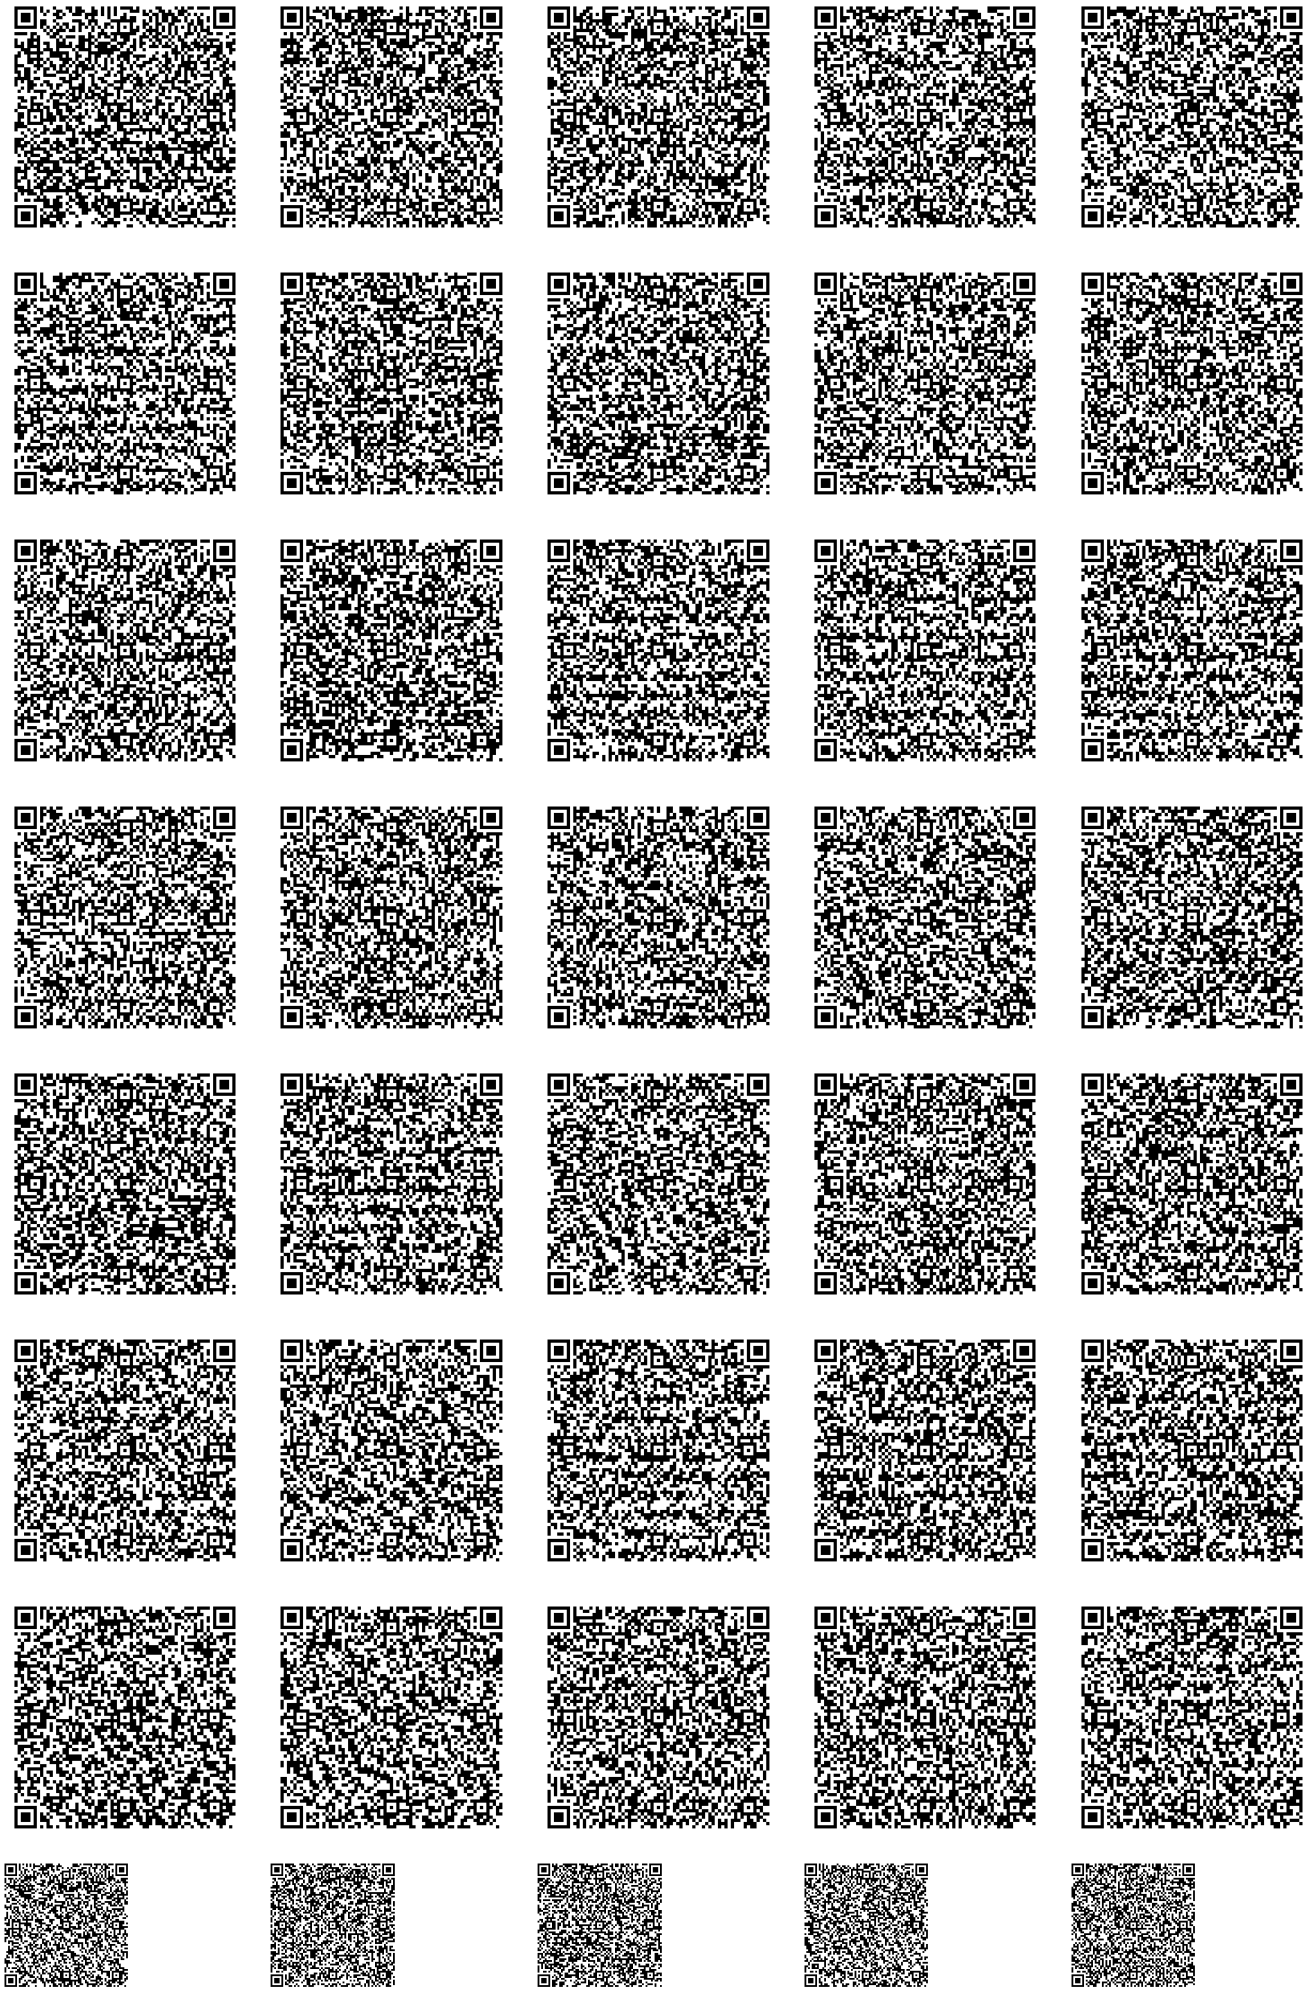

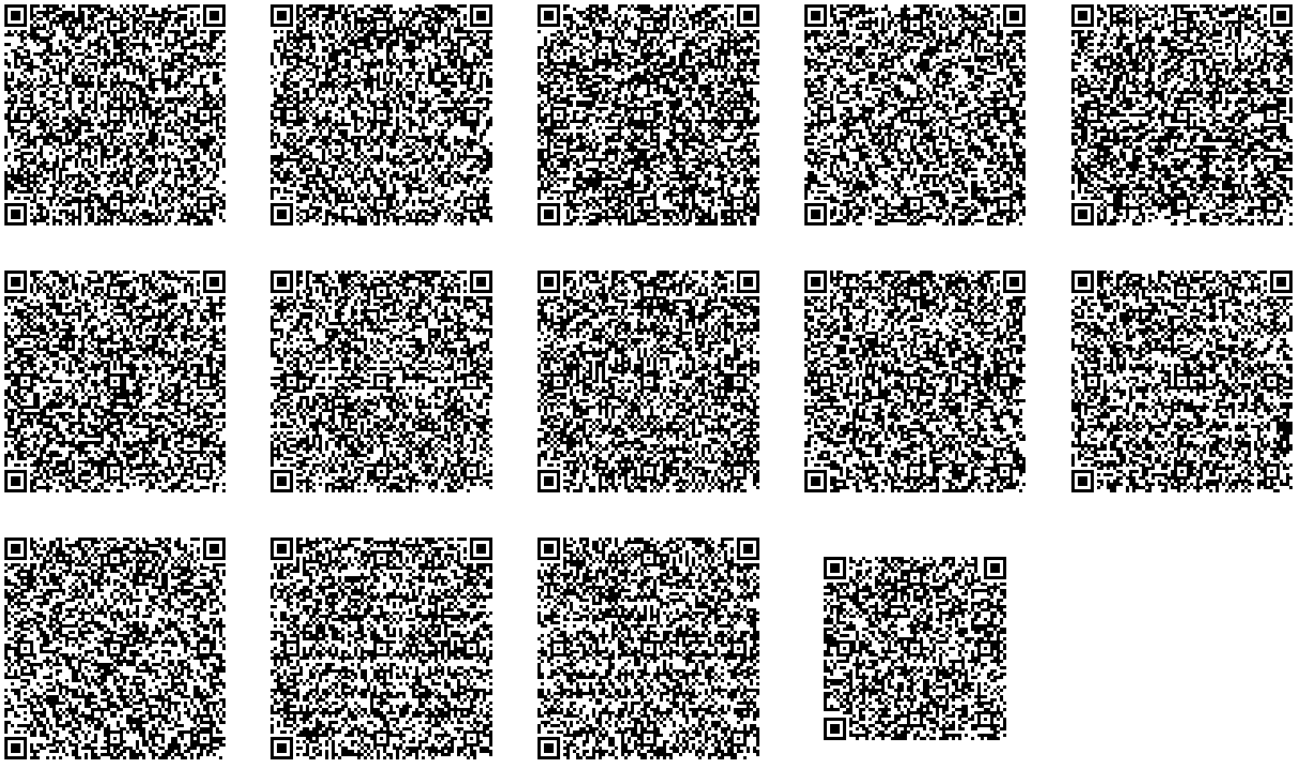

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна (листы АР-5.1...5.4)				
1	9	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53.6	7 495	401 732
2	10	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-17,ОК-18/	м2	53.6	46 137	2 472 971
3	11	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	28.8	3 399	97 891
4	12	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	28.8	1 655	47 664
5	13	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	м2	359.574	575	206 755
6	14	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	м2	359.574	4 971	1 787 442
7	15	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	467	2 259	1 054 953
			Итого по подразделу: Окна (листы АР-5.1...5.4)				**6 069 408**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				
8	18	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	293.8	19 389	5 696 487

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	261-102-0120 РСНБ РК 2022	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	1.67466	576 228	964 986
10	20	223-301-0206 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	51.555	141 200	7 279 566
11	21	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	145.145	127 323	18 480 297
12	22	223-102-0601 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /ВН-10,ВН-4/	м2	97.1	37 704	3 661 058
13	24	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	17	5 110	86 870
14	25	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	17	5 650	96 050
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				**36 265 315**
			Подраздел: Защитная сетка (витраж ВН-10 спортзала) /лист АР-72/				
15	26	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.101052	220 513	22 283
16	27	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.076752	1 140 313	87 521
17	28	217-202-0503 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	99.9	278	27 772
18	29	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.225808	192	426
			Итого по подразделу: Защитная сетка (витраж ВН-10 спортзала) /лист АР-72/				**138 003**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				
19	30	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока витражного из ПВХ/алюминий/	м2	126.8	5 541	702 599
20	31	223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	59.67	129 267	7 713 411
21	32	223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	21.33	115 865	2 471 408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	33	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	14.28	123 298	1 760 695
23	34	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	31.52	110 393	3 479 587
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				**16 127 700**
			Подраздел: Замки и доводчики				
24	46	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	12	5 110	61 320
25	47	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	12	5 650	67 800
26	48	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	180	4 853	873 540
27	49	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2 310	2 310
			Итого по подразделу: Замки и доводчики				**1 004 970**
			Подраздел: Двери внутренние деревянные				
28	50	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	7.245	5 583	40 448
29	53	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	7.245	14 666	106 255
			Итого по подразделу: Двери внутренние деревянные				**146 703**
			Подраздел: Дверь Тип31 /лист 4.10/				
30	54	1109-0306-0103 РСНБ РК 2022	Перегородки стальные консольные сетчатые. Монтаж	м2	2.5	2 901	7 253
31	55	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 /дверь решетчатая +ЗД/	т	0.10939	1 140 313	124 739
32	56	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.17231	248	787
33	57	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /ПФ-1189/	м2	3.17231	385	1 221
			Итого по подразделу: Дверь Тип31 /лист 4.10/				**134 000**
			Подраздел: Окно выдачи Тип14 /лист 4.11/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	58	6107-0103-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению дощатых однослойных	м2	0.49	9 849	4 826
35	59	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная /ручка кнопка/	пара	2	3 217	6 434
			Итого по подразделу: Окно выдачи Тип14 /лист 4.11/				**11 260**
			Итого по разделу: Проемы				**59 897 361**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 1				
36	66	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	110.27	954	105 198
37	67	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	110.27	422	46 534
			Итого по подразделу: Тип 1				**151 732**
			Подраздел: Тип 2				
38	68	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	49.16	954	46 899
39	69	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	49.16	422	20 746
			Итого по подразделу: Тип 2				**67 645**
			Подраздел: Тип 3				
40	70	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	164.94	954	157 353
41	71	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	164.94	422	69 605
			Итого по подразделу: Тип 3				**226 958**
			Подраздел: Тип 4				
42	72	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	115.81	954	110 483
43	73	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	115.81	422	48 872
			Итого по подразделу: Тип 4				**159 355**
			Подраздел: Тип 6				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	74	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	7.08	954	6 754
45	75	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	7.08	422	2 988
			Итого по подразделу: Тип 6				**9 742**
			Подраздел: Тип 7				
46	95	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	610.74	1 295	790 908
47	96	233-101-0403 СпрСЦ 05.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	635.1696	24 975	15 863 361
			Итого по подразделу: Тип 7				**16 654 269**
			Подраздел: Тип 8				
48	115	6109-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	24.02	7 718	185 386
49	116	6109-0202-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303	м2	24.02	5 702	136 962
			Итого по подразделу: Тип 8				**322 348**
			Подраздел: Тип 12				
50	178	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1/3/ мм	м2	107.29	7 726	828 923
51	179	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	0.225309	5 215	1 175
52	180	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м2	107.29	10 226	1 097 148
53	181	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	0.021458	5 215	112
			Итого по подразделу: Тип 12				**1 927 358**
			Подраздел: Тип 14				
54	222	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	724.95	1 295	938 810
55	223	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	753.948	5 214	3 931 085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	224	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	443.7	513	227 618
57	225	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	448.137	179	80 217
			Итого по подразделу: Тип 14				**5 177 730**
			Подраздел: Тип 14.1				
58	240	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	111.72	1 295	144 677
59	241	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 /кислотостойкий/	м2	116.1888	5 214	605 808
60	242	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	57.4	513	29 446
61	243	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	57.974	179	10 377
			Итого по подразделу: Тип 14.1				**790 308**
			Подраздел: Тип 15				
62	254	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	293.41	1 435	421 043
63	255	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1643.096	110	180 741
64	256	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	938.912	110	103 280
65	257	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	293.41	9 815	2 879 819
66	258	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	103.87	1 230	127 760
67	259	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6.2322	3 632	22 635
			Итого по подразделу: Тип 15				**3 735 278**
			Подраздел: Тип 16 (лист АР-2.3)				
68	274	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	70.35	1 295	91 103

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	275	233-101-0107 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43 /спортивный/	м2	73.164	3 215	235 222
70	276	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	33	513	16 929
71	277	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	33.33	179	5 966
			Итого по подразделу: Тип 16 (лист АР-2.3)				**349 220**
			Подраздел: Тип 16.1				
72	292	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	20.42	1 295	26 444
73	293	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	21.2368	5 214	110 729
74	294	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	24	513	12 312
75	295	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	24.24	179	4 339
			Итого по подразделу: Тип 16.1				**153 824**
			Подраздел: Тип 18				
76	319	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	15.89	6 663	105 875
77	320	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	16.2078	2 551	41 346
			Итого по подразделу: Тип 18				**147 221**
			Подраздел: Тип 19				
78	335	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	39.61	1 295	51 295
79	336	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	41.1944	5 214	214 788
80	337	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	37.5	513	19 238
81	338	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	37.875	179	6 780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 19				**292 101**
			Подраздел: Тип 19.1				
82	349	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	16.97	6 663	113 071
83	350	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17.3094	2 551	44 156
			Итого по подразделу: Тип 19.1				**157 227**
			Подраздел: Тип 20				
84	361	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	54.75	6 663	364 799
85	362	233-202-0104 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	55.845	2 551	142 461
			Итого по подразделу: Тип 20				**507 260**
			Подраздел: Тип 20.1				
86	373	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	405.8	1 435	582 323
87	374	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	2272.48	110	249 973
88	375	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1298.56	110	142 842
89	376	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	405.8	299	121 334
90	377	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	405.8	1 295	525 511
91	378	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	422.032	5 214	2 200 475
92	379	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	254	513	130 302
93	380	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	256.54	179	45 921
			Итого по подразделу: Тип 20.1				**3 998 681**
			Подраздел: Тип 33				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	403	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	35.72	9 815	350 592
95	404	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	16.02	1 230	19 705
96	405	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	0.9612	3 632	3 491
			Итого по подразделу: Тип 33				**373 788**
			Подраздел: Тип 23				
97	425	6109-0307-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесноволокнистых	м2	14.6	2 710	39 566
98	426	215-301-0105 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	14.6	2 747	40 106
99	427	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	53.1	8 577	455 439
100	428	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м2	49.89	1 418	70 744
101	429	233-201-0101 РСНБ РК 2022	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 31	м2	51.8856	3 729	193 481
102	430	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	8.13	513	4 171
103	431	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	8.2113	179	1 470
			Итого по подразделу: Тип 23				**804 977**
			Подраздел: Тип 24				
104	440	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	273.05	1 435	391 827
105	441	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1529.08	110	168 199
106	442	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	873.76	110	96 114

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	443	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	273.05	299	81 642
108	444	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	273.05	1 295	353 600
109	445	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	283.972	5 214	1 480 630
110	446	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	150.5	513	77 206
111	447	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	152.005	179	27 209
			Итого по подразделу: Тип 24				**2 676 427**
			Подраздел: Тип 26				
112	467	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	134.63	5 134	691 190
113	468	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	150.7856	435	65 592
114	469	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	84.63	9 815	830 643
			Итого по подразделу: Тип 26				**1 587 425**
			Подраздел: Тип 27				
115	476	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	11	1 435	15 785
116	477	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	61.6	110	6 776
117	478	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	35.2	110	3 872
			Итого по подразделу: Тип 27				**26 433**
			Подраздел: Тип 28				
118	494	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	888.26	1 295	1 150 297
119	495	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	923.7904	5 214	4 816 643

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	496	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	588.3	513	301 798
121	497	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	594.183	179	106 359
			Итого по подразделу: Тип 28				**6 375 097**
			Подраздел: Тип 28.1				
122	510	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	185.2	1 295	239 833
123	511	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 /антистатический/	м2	192.608	5 214	1 004 258
124	512	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	93.8	513	48 119
125	513	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	94.738	179	16 958
			Итого по подразделу: Тип 28.1				**1 309 169**
			Подраздел: Тип 28.2 (лист АР-2.6)				
126	526	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	94.2	1 295	121 989
127	527	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	97.968	5 214	510 804
128	528	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	37.9	513	19 443
129	529	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	38.279	179	6 852
			Итого по подразделу: Тип 28.2 (лист АР-2.6)				**659 089**
			Подраздел: Тип 29.1				
130	542	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	69.25	1 295	89 679
131	543	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	72.02	5 214	375 512
132	544	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	43.48	513	22 304

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	545	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	43.9148	179	7 861
			Итого по подразделу: Тип 29.1				**495 357**
			Подраздел: Тип 30				
134	567	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	349.04	1 435	500 872
135	568	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1954.624	110	215 009
136	569	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1116.928	110	122 862
137	570	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	349.04	1 295	452 007
138	571	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	363.0016	5 214	1 892 690
139	572	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	195.18	513	100 127
140	573	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	197.1318	179	35 287
			Итого по подразделу: Тип 30				**3 318 854**
			Подраздел: Тип 31				
141	584	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	18.02	1 295	23 336
142	585	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	18.7408	5 214	97 715
143	586	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	19.7	513	10 106
144	587	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	19.897	179	3 562
			Итого по подразделу: Тип 31				**134 719**
			Подраздел: Тип 32				
145	601	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1/3/ мм	м2	60.45	7 726	467 037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	602	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	0.126945	5 215	662
147	603	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м2	60.45	10 226	618 162
148	604	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	0.01209	5 215	63
			Итого по подразделу: Тип 32				**1 085 924**
			Итого по разделу: Полы				**53 675 516**
			Раздел: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				
			Подраздел: Потолки				
149	609	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	422.58	1 256	530 760
150	610	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.2915802	199 032	58 034
			Итого по подразделу: Потолки				**588 794**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
151	615	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	222.09	1 252	278 057
152	616	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	610.52541	76	46 400
153	620	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	381.65	1 856	708 342
154	621	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.2404395	199 032	47 855
155	622	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	141.97	1 116	158 439
156	623	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0894411	199 032	17 802
157	624	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	228.61	973	222 438
158	625	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27.14856	790	21 447

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**1 500 780**
			Подраздел: Потолки				
159	630	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	1187.32	1 256	1 491 274
160	631	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.8192508	199 032	163 057
161	632	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	243.18	1 158	281 602
162	633	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	60.795	278	16 901
163	634	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	243.18	614	149 313
164	635	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	36.477	278	10 141
			Итого по подразделу: Потолки				**2 112 288**
			Подраздел: Стены и перегородки				
165	659	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	3133.86	1 116	3 497 388
166	660	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.9743318	199 032	392 955
167	661	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	2912.86	1 856	5 406 268
168	662	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.8351018	199 032	365 244
169	663	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	712.95	1 158	825 595
170	664	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	178.2375	278	49 549
171	665	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	712.95	614	437 751

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	666	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106.9425	278	29 730
173	669	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	143	354	50 622
174	670	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	4.4187	31 847	140 722
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**11 195 826**
			Подраздел: Потолки				
175	673	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	1511.23	1 256	1 898 105
176	674	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.0427487	199 032	207 540
			Итого по подразделу: Потолки				**2 105 645**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
177	689	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	3034.35	1 122	3 404 541
178	690	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.9116405	199 032	380 478
179	691	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	1830.82	1 856	3 398 002
180	692	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.1534166	199 032	229 567
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**7 412 588**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				**24 915 921**
			Раздел: Кровля (лист АР-10)				
			Подраздел: Тип 1				
181	706	6118-0101-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм	м2	500	3 874	1 937 000
182	707	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	4.0231	538 333	2 165 767
			Итого по подразделу: Тип 1				**4 102 767**
			Подраздел: Тип 3				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	735	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	7.6	352	2 675
184	736	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	8.36	120	1 003
185	737	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	7.6	1 679	12 760
186	738	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	1.1742	63 122	74 118
187	739	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	7.6	320	2 432
188	740	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40 мм/	м2	7.6	1 281	9 736
189	741	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0046512	28 485	132
190	742	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	7.6	170	1 292
191	743	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.007752	28 485	221
192	744	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0145312	59 456	864
193	745	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0145312	415 660	6 040
194	746	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	7.6	769	5 844
195	747	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	8.74	1 210	10 575
196	748	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	8.74	2 858	24 979
197	749	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	1.824	649	1 184
			Итого по подразделу: Тип 3				**153 855**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Тип 4				
198	750	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	15.6	352	5 491
199	751	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	17.16	120	2 059
200	752	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	15.6	1 679	26 192
201	753	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	2.4102	63 122	152 137
202	754	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	15.6	320	4 992
203	755	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /70 мм/	м2	15.6	1 281	19 984
204	756	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0095472	28 485	272
205	757	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	15.6	374	5 834
206	758	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0350064	28 485	996
207	759	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0298272	59 456	1 773
208	760	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0298272	415 660	12 398
209	761	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	15.6	769	11 996
210	762	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	17.94	1 210	21 707
211	763	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	17.94	2 858	51 273
212	764	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	3.744	649	2 430

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
213	765	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство аэраторов /Лист 46 поз.10 тип кровли 1/	шт.	99	3 038	300 762
214	766	261-101-0104 РСНБ РК 2022	Песок керамзитовый М900 СТ РК 948-92 /Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм/	м3	0.42	14 646	6 151
215	767	СТКПРСНБ РК 2022	Аэраторы д.110	шт.	99	15 477	1 532 227
216	768	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг /парапетная воронка лист 10,68.5-68.6/	т	0.07929	290 358	23 022
217	769	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.07929	1 192 498	94 553
218	770	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг /металлическая решетка МР-1 68.6/	т	0.0078	290 358	2 265
219	771	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0078	1 192 498	9 301
			Итого по подразделу: Тип 4				**2 287 816**
			Итого по разделу: Кровля (лист АР-10)				**6 544 439**
			Раздел: Узел К-8. Утепление и облицовка фасада блока 5 выше отм.+7.600 (лист 19)				
220	772	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм /24мм/ в 2 слоя	м2	99.3	3 599	357 381
221	773	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм /24мм/	м2	204.558	2 561	523 872
222	774	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	222.06	354	78 609
223	775	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	228.7218	120	27 447
224	776	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	222.06	354	78 609
225	777	234-101-0108 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	м3	22.87218	34 016	778 020
226	778	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	11.43609	31 847	364 205

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
227	779	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	293.79	1 477	433 928
228	780	224-102-1007 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	293.79	4 033	1 184 855
			Итого по разделу: Узел К-8. Утепление и облицовка фасада блока 5 выше отм.+7.600 (лист 19)				**3 826 927**
			Раздел: Декоративный элемент ДЭ-1 (лист 24,25)				
229	788	6112-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали гипсовой погонной орнаментированной, плоской, выпуклой, рельефной, простого или сложного рисунка, высота до 100 мм/ПВХ/	м	8.5	1 177	10 004
230	789	261-103-0148 РСНБ РК 2022	Декоративный элемент	м2	5.95	1 129	6 718
			Итого по разделу: Декоративный элемент ДЭ-1 (лист 24,25)				**16 722**
			Раздел: Навес для приямка, Приямок (АР-40.1...41.3)				
			Подраздел: Приямок Пр-1-1шт				
231	841	6112-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены и колонны на полимерной мастике	м2	16.8	6 075	102 060
232	842	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16.8	3 632	61 018
233	843	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	78	3 250	253 500
234	844	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.4742	25 496	37 586
235	845	6112-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	78	1 316	102 648
236	846	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	46.02	605	27 841
237	847	6109-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	м2	13.1535	3 127	41 131
238	848	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.5192294	34 212	51 976
239	849	6109-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106	м2	13.1535	-476	-6 261

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
240	850	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8286705	-34 212	-28 350
241	851	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	7.2	610	4 392
			Итого по подразделу: Приямок Пр-1-1шт				**647 542**
			Подраздел: Навес приямка Пр-1(лист 40.3)				
242	852	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1.973298	63 710	125 719
243	853	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1.3779	100 375	138 307
244	854	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3.351198	1 160 502	3 889 072
245	855	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	51.305748	248	12 724
246	856	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	51.305748	385	19 753
247	857	6110-0101-0510 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	41.28	6 165	254 491
248	858	224-102-1006 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	41.28	3 992	164 790
249	859	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер	1000 шт.	0.054	659 944	35 637
250	860	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг(ЗД-1)	т	0.10728	1 279 987	137 317
251	861	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг(ЗД-2,ЗД-3)	т	0.03264	1 467 786	47 909
252	862	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	0.00612	272 684	1 669
253	863	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00612	357 986	2 191

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
254	864	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.79704	248	942
255	865	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3.79704	385	1 462
256	866	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	11.94	4 491	53 623
257	867	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.068058	538 333	36 638
			Итого по подразделу: Навес приямка Пр-1(лист 40.3)				**4 922 244**
			Подраздел: Приямок Пр-2-1шт(лист 40.5)				
258	868	6112-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены и колонны на полимерной мастике	м2	16.8	6 075	102 060
259	869	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16.8	3 632	61 018
260	870	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	78	3 250	253 500
261	871	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.4742	25 496	37 586
262	872	6112-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	78	1 316	102 648
263	873	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	46.02	605	27 841
264	874	6109-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	м2	5.661	3 127	17 702
265	875	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6538455	34 212	22 369
266	876	6109-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106	м2	5.661	-476	-2 695
267	877	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.356643	-34 212	-12 201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
268	878	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	7.2	610	4 392
			Итого по подразделу: Приямок Пр-2-1шт(лист 40.5)				**614 221**
			Подраздел: Навес приямка Пр-2(лист 40.5)				
269	879	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	2.28594	63 710	145 637
270	880	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.72318	100 375	72 589
271	881	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3.00912	1 160 502	3 492 090
272	882	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	59.43444	248	14 740
273	883	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	59.43444	385	22 882
274	884	6110-0101-0510 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	30.75	6 165	189 574
275	885	224-102-1006 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	30.75	3 992	122 754
276	886	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер	1000 шт.	0.054	659 944	35 637
277	887	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг(ЗД-1)	т	0.07152	1 279 987	91 545
278	888	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг(ЗД-2,ЗД-3)	т	0.05412	1 467 786	79 437
279	889	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	0.00753	272 684	2 053
280	890	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00753	357 986	2 696
281	891	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.46242	248	859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
282	892	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3.46242	385	1 333
283	893	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9.18	4 491	41 227
284	894	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.068058	538 333	36 638
			Итого по подразделу: Навес приямка Пр-2(лист 40.5)				**4 351 691**
			Подраздел: Приямок Пр-3-9шт(лист 41.1)				
285	895	6112-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены и колонны на полимерной мастике	м2	30.6	6 075	185 895
286	896	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	30.6	3 632	111 139
287	897	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	65.7	3 250	213 525
288	898	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1.24173	25 496	31 659
289	899	6112-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	65.7	1 316	86 461
290	900	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	38.763	605	23 452
291	901	6109-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм	м2	26.46	3 127	82 740
292	902	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.05613	34 212	104 556
293	903	6109-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106	м2	26.46	-476	-12 595
294	904	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.66698	-34 212	-57 031
295	905	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	21.6	610	13 176

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
296	906	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.03312	2 159 677	71 529
297	907	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.86112	248	214
298	908	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.86112	385	332
			Итого по подразделу: Приямок Пр-3-9шт(лист 41.1)				**855 052**
			Подраздел: Приямок Пр-4 -3шт(лист 41.2)				
299	909	6112-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены и колонны на полимерной мастике	м2	9	6 075	54 675
300	910	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	9	3 632	32 688
301	911	6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	18.9	3 250	61 425
302	912	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.35721	25 496	9 107
303	913	6112-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	18.9	1 316	24 872
304	914	261-201-0330 РСНБ РК 2022	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	11.151	605	6 746
305	915	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /40-70 мм по уклону/	м2	6.48	1 406	9 111
306	916	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.132192	28 485	3 765
307	917	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	6.48	203	1 315
308	918	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.231336	28 485	6 590
309	919	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0123	59 456	731

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
310	920	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0123	415 660	5 113
311	921	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /стремянка Ст-1/	т	0.08952	237 208	21 235
312	922	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.08952	1 146 761	102 657
313	923	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	96	33	3 168
314	924	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2.32752	248	577
315	925	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.32752	385	896
316	926	241-102-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	23.4	610	14 274
			Итого по подразделу: Приямок Пр-4 -3шт(лист 41.2)				**358 946**
			Итого по разделу: Навес для приямка, Приямок (АР-40.1...41.3)				**11 749 696**
			Раздел: Экран Эк-1 для радиаторов в спортзале(лист 42.1)				
			Подраздел: Экран Эк-1				
317	927	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.51336	317 013	162 742
318	928	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.49242	438 481	215 917
319	929	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.01584	365 165	5 784
320	930	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13.34736	248	3 310
321	931	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13.34736	385	5 139
322	932	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0.0198	117 771	2 332

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
323	933	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.020988	100 947	2 119
			Итого по подразделу: Экран Эк-1				**397 343**
			Подраздел: Деталь крепления ДК-1				
324	934	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.098136	1 468 102	144 074
325	935	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2.551536	248	633
326	936	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.551536	385	982
			Итого по подразделу: Деталь крепления ДК-1				**145 689**
			Подраздел: Панель П-1				
327	937	6107-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	м2	19.26	5 872	113 095
328	938	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	19.26	2 897	55 795
329	939	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.05598	563 894	31 567
330	940	217-107-0101 РСНБ РК 2022	Саморез	шт.	648	95	61 560
			Итого по подразделу: Панель П-1				**262 018**
			Подраздел: Панель П-2				
331	941	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	11.34	2 308	26 173
332	942	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	11.34	2 897	32 852
333	943	217-107-0101 РСНБ РК 2022	Саморез	шт.	198	95	18 810
			Итого по подразделу: Панель П-2				**77 835**
			Итого по разделу: Экран Эк-1 для радиаторов в спортзале(лист 42.1)				**882 885**
			Раздел: Экран Эк-1 для радиаторов в рекреации (лист 42.2)				
			Подраздел: Экран Эк-1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
334	944	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0.2572	317 013	81 536
335	945	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.2572	438 481	112 777
336	946	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6.6872	248	1 658
337	947	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6.6872	385	2 575
			Итого по подразделу: Экран Эк-1				**198 546**
			Подраздел: Деталь крепления ДК-1				
338	948	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.16356	1 468 102	240 123
339	949	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.25256	248	1 055
340	950	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.25256	385	1 637
			Итого по подразделу: Деталь крепления ДК-1				**242 815**
			Подраздел: Панель П-1				
341	951	6107-0103-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	м2	9	5 872	52 848
342	952	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	9	2 897	26 073
343	953	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.0274	563 894	15 450
344	954	217-107-0101 РСНБ РК 2022	Саморез	шт.	280	95	26 600
			Итого по подразделу: Панель П-1				**120 972**
			Подраздел: Панель П-2				
345	955	6107-0101-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	м2	18.9	2 308	43 621
346	956	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	18.9	2 897	54 753

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
347	957	217-107-0101 РСНБ РК 2022	Саморез	шт.	330	95	31 350
			Итого по подразделу: Панель П-2				**129 724**
			Итого по разделу: Экран Эк-1 для радиаторов в рекреации (лист 42.2)				**692 057**
			Раздел: Отмостка, цоколь (лист 43.3)				
			Подраздел: РОтмостка				
348	958	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем /до толщ.250мм/	м2	228	2 812	641 136
349	959	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	53.9	39 626	2 135 841
350	960	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.41075	59 456	83 878
351	961	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.41075	518 798	731 894
352	963	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	361	3 395	1 225 595
353	964	212-102-0106 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	7.29	29 631	216 010
354	965	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	361	1 508	544 388
			Итого по подразделу: РОтмостка				**5 578 742**
			Подраздел: Цоколь /тип 2/				
355	966	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем /лист 24/	м2	358.33	17 040	6 105 943
356	967	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3009.972	67	201 668
357	968	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1827.483	54	98 684
358	969	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм /тип 2,тип 1/	м2	365.4966	4 732	1 729 530
359	970	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	248.352	120	29 802

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
360	971	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	19.104	39 491	754 436
			Итого по подразделу: Цоколь /тип 2/				**8 920 063**
			Подраздел: Цоколь /тип 1, стены ниже 0,000/				
361	972	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /в один слой/	м2	1026	-2 046	-2 099 196
362	973	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	1026	2 774	2 846 124
363	974	235-103-0306 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	1169.64	995	1 163 792
364	975	6111-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 6111-0401-0111 /2 доп.слоя/	м2	228	2 316	528 048
365	976	235-103-0305 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	519.84	1 096	569 745
366	977	6111-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности /стены/	м3	53.126	65 078	3 457 334
367	978	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	52.59474	44 064	2 317 535
368	979	6111-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2	836	2 214	1 850 904
369	980	217-203-0104 РСНБ РК 2022	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,3 мм, гладкая	м2	919.6	405	372 438
370	981	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 /бортик/	м3	1.9	23 268	44 209
371	982	6111-0401-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м	398	6 139	2 443 322
372	983	261-107-0992 РСНБ РК 2022	Дюбели	шт.	1266	19	24 054
373	984	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	238.7	4 491	1 072 002

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
374	985	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	1.4995	538 333	807 230
			Итого по подразделу: Цоколь /тип 1, стены ниже 0,000/				**15 397 541**
			Итого по разделу: Отмостка, цоколь (лист 43.3)				**29 896 346**
			Раздел: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				
			Подраздел: ВГ-1, ВГ-2 ВГ-3(лист 50.4, 50.5)				
375	1009	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	37.8	7 635	288 603
376	1010	231-201-0308 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	28.87	18 602	537 040
377	1011	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	8.93	3 632	32 434
378	1012	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2	216.92	18 366	3 983 953
379	1013	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	203.58	17 940	3 652 224
380	1014	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	13.34	13 429	179 143
381	1015	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада линеарные панелями	м2	43.14	2 018	87 057
382	1016	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	43.14	4 956	213 801
383	1017	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	41.57	4 785	198 911
384	1018	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.0703	289 515	20 353
385	1019	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0.0703	167 407	11 769
			Итого по подразделу: ВГ-1, ВГ-2 ВГ-3(лист 50.4, 50.5)				**9 205 291**
			Подраздел: Навес НВ-1, НВ-2, НВ-3 (лист 50.4,50.5)				
386	1020	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	159.89	934	149 337

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
387	1021	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	183.8735	964	177 254
388	1022	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	183.8735	964	177 254
389	1023	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	159.89	-356	-56 921
390	1024	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	183.8735	-964	-177 254
391	1025	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40-140 мм/	м2	86.8888889	1 281	111 305
392	1026	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.3294	28 485	37 868
393	1027	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	86.8888889	510	44 313
394	1028	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.647	28 485	189 340
395	1029	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40-120 мм/	м2	120.25	1 281	154 040
396	1030	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.839825	28 485	52 407
397	1031	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	120.25	442	53 150
398	1032	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7.972575	28 485	227 099
399	1033	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3960496	59 456	23 548
400	1034	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3960496	415 660	164 622
401	1037	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм/ЦСП/	м2	88.27	3 599	317 684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
402	1038	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	м2	88.27	3 264	288 113
403	1039	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	40.32816	4 491	181 114
404	1040	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	40.32816	4 515	182 082
405	1041	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	0.03044	272 684	8 301
406	1042	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.03044	357 986	10 897
407	1043	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей /стойки Ст-1/ масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	154.88	1 710	264 845
408	1044	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	38.10048	790	30 099
			Итого по подразделу: Навес НВ-1, НВ-2, НВ-3 (лист 50.4,50.5)				**2 610 497**
			Итого по разделу: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				**11 815 788**
			Раздел: Крыльцо. Навес				
			Подраздел: Крыльца Кр-1...-Кр-7 (АР-56.2...56.5)				
409	1045	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	44.5	7 635	339 758
410	1046	231-201-0308 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	12	18 602	223 224
411	1047	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	32.5	3 632	118 040
412	1048	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2	92	18 366	1 689 672
413	1049	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	55.2	17 940	990 288
414	1050	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	36.8	13 429	494 187

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
415	1051	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	41.04	4 785	196 376
416	1052	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада линеарные панелями	м2	40.4	2 018	81 527
417	1053	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	40.4	4 956	200 222
418	1054	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска прочих поверхностей /стойки Ст-1/ масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	68.52	1 710	117 169
419	1055	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	16.85592	790	13 316
420	1056	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	68.52	248	16 993
421	1057	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка плитами ЛЮКСАЛОН с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	75	4 998	374 850
422	1058	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	78.75	6 053	476 674
423	1059	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	77.71	934	72 581
424	1060	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	89.3665	964	86 149
425	1061	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	89.3665	964	86 149
426	1062	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	77.71	-356	-27 665
427	1063	235-103-0117 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	89.3665	-964	-86 149
428	1064	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40-80 мм/	м2	14.6666667	1 281	18 788
429	1065	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2244	28 485	6 392

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
430	1066	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	14.6666667	306	4 488
431	1067	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.6732	28 485	19 176
432	1068	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40-130 мм/	м2	13.4117647	1 281	17 180
433	1069	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2052	28 485	5 845
434	1070	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	13.4117647	476	6 384
435	1071	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.9576	28 485	27 277
436	1072	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40-90 мм/	м2	14.7692308	1 281	18 919
437	1073	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2259692	28 485	6 437
438	1074	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	14.7692308	340	5 022
439	1075	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.7532308	28 485	21 456
440	1076	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150/бортик/	м3	0.847	28 485	24 127
441	1077	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 16 мм/ЦСП/	м2	131.4	3 599	472 909
442	1078	232-104-0104 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 16 мм	м2	131.4	3 264	428 890
443	1079	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	42.28	4 491	189 879
444	1080	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	42.28	3 353	141 765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
445	1081	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	0.08166	272 684	22 267
446	1082	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.08166	357 986	29 233
			Итого по подразделу: Крыльца Кр-1...-Кр-7 (АР-56.2...56.5)				**6 929 795**
			Подраздел: Ограждение ОГ-1- ОГ-4 (АР-58)				
447	1088	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	222.49	6 448	1 434 616
448	1089	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	152.53	29 813	4 547 377
449	1090	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	69.96	33 336	2 332 187
			Итого по подразделу: Ограждение ОГ-1- ОГ-4 (АР-58)				**8 314 180**
			Подраздел: Элементы вентшахт Вш-1... 4, Вш-6... 8(АР-60.2)				
450	1091	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.0023492	272 684	641
451	1092	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	7.1	1 347	9 564
452	1093	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00056	387 658	217
453	1094	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	15.8	4 491	70 958
454	1095	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0.09006	4 515	407
455	1096	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	27.8	354	9 841
456	1097	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1.4317	19 185	27 466
457	1098	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	34.8	4 153	144 524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
458	1099	6112-0202-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса цементно-песчаным раствором М50, колонна - вентшахт	м2	80.5	17 832	1 435 476
459	1100	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	86.94	1 069	92 939
			Итого по подразделу: Элементы вентшахт Вш-1... 4, Вш-6... 8(АР-60.2)				**1 792 034**
			Подраздел: Элементы вентшахт Вш-9, 10, 12, 13, 16... 18 (АР-60.3)				
460	1101	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.0019124	272 684	521
461	1102	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	5.7	1 347	7 678
462	1103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.000476	387 658	185
463	1104	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	13.1	4 491	58 831
464	1105	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0.07467	4 515	337
465	1106	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	1.08	158 839	171 546
466	1107	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1.0476	19 185	20 098
467	1108	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	29.3	4 153	121 683
468	1109	6112-0202-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса цементно-песчаным раствором М50, колонна - вентшахт	м2	67.5	17 832	1 203 660
469	1110	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	72.9	1 069	77 930
			Итого по подразделу: Элементы вентшахт Вш-9, 10, 12, 13, 16... 18 (АР-60.3)				**1 662 470**
			Подраздел: Элементы вентшахт Вш-19... Вш-23 (АР-60.4)				
470	1111	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.0027552	272 684	751

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
471	1112	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	5.1	1 347	6 870
472	1113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00147	387 658	570
473	1114	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	13.2	4 491	59 281
474	1115	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0.07524	4 515	340
475	1116	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	1.235	158 839	196 166
476	1117	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1.19795	19 185	22 983
477	1118	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	22.2	4 153	92 196
478	1119	6112-0202-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса цементно-песчаным раствором М50, колонна - вентшахт	м2	57.6	17 832	1 027 123
479	1120	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	62.208	1 069	66 500
			Итого по подразделу: Элементы вентшахт Вш-19... Вш-23 (АР-60.4)				**1 472 781**
			Подраздел: Элементы вентшахт Вш-24... Вш-25.1 (АР-60.5)				
480	1121	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.0009156	272 684	250
481	1122	214-401-0101 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм	м2	2.8	1 347	3 772
482	1123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00021	387 658	81
483	1124	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	5.7	4 517	25 747
484	1125	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	0.505	158 839	80 214

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
485	1126	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0.48985	19 185	9 398
486	1127	6111-0401-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	м2	13	4 153	53 989
487	1128	6112-0202-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса цементно-песчаным раствором М50, колонна - вентшахт	м2	30.1	17 832	536 743
488	1129	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	32.508	1 069	34 751
			Итого по подразделу: Элементы вентшахт Вш-24... Вш-25.1 (АР-60.5)				**744 945**
			Подраздел: Зонты ЗН для ВШ-1... 13 (АР-61.2)				
489	1130	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка зонтов над оборудованием	м2	31.27	5 406	169 046
490	1131	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	31.27	4 515	141 184
491	1132	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.08505	498 871	42 429
492	1133	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	9.79823	248	2 430
493	1134	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	9.79823	385	3 772
			Итого по подразделу: Зонты ЗН для ВШ-1... 13 (АР-61.2)				**358 861**
			Подраздел: Зонты ЗН для ВШ-14...25.1 (АР-61.3)				
494	1135	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка зонтов над оборудованием	м2	29.9	5 406	161 639
495	1136	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	29.9	4 515	134 998
496	1137	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.06804	498 871	33 943
497	1138	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	8.95926	248	2 222

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
498	1139	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8.95926	385	3 449
			Итого по подразделу: Зонты ЗН для ВШ-14...25.1 (АР-61.3)				**336 251**
			Подраздел: Вентшахта ВШп-1 (АР-62)				
499	1140	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	3.1	934	2 895
500	1141	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	3.1	-356	-1 104
501	1142	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм - Техноэласт соло ЭКМ	м2	3.565	3 053	10 884
502	1143	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	5.76	3 838	22 107
503	1144	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	6.624	4 507	29 853
504	1145	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.013	100 947	1 312
505	1146	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0.013	3 746	49
506	1147	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0.0000221	205 945	5
507	1148	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0000871	725 499	63
508	1149	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.000013	435 089	6
509	1150	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	1.675	4 491	7 521
510	1151	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0.0095475	4 515	43
511	1152	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	0.0026	272 684	709

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
512	1153	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0026	357 986	931
513	1154	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.0754	248	19
514	1155	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.0754	385	29
515	1156	6112-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками, стены и колонны на полимерной мастике	м2	22.4	6 075	136 080
516	1157	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	22.4	2 546	57 030
			Итого по подразделу: Вентшахта ВШп-1 (АР-62)				**268 434**
			Подраздел: Вентшахта ВШп-2 - ВШп-4 (АР-63.2)				
517	1158	6112-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов цементно-песчаным раствором М50, колонна прямоугольная	м2	31.72	6 524	206 941
518	1159	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	6.2	934	5 791
519	1160	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	6.2	-356	-2 207
520	1161	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	7.13	1 210	8 627
521	1162	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	10.5	3 838	40 299
522	1163	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	12.075	4 507	54 422
523	1164	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0.028	100 947	2 827
524	1165	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0.028	3 746	105
525	1166	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0.0000476	205 945	10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
526	1167	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0001876	725 499	136
527	1168	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.000028	435 089	12
528	1169	6110-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	9.34	1 740	16 252
529	1170	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	16.1	1 210	19 481
530	1171	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	2.2	4 517	9 937
531	1172	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.0029106	272 684	794
532	1173	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0029106	1 179 654	3 434
533	1174	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.0844074	248	21
534	1175	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.0844074	385	32
535	1176	6111-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	0.12	158 839	19 061
536	1177	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0.1164	19 185	2 233
			Итого по подразделу: Вентшахта ВШп-2 - ВШп-4 (АР-63.2)				**388 208**
			Подраздел: Жалюзийная решетка РЖ-1...4 (АР-65)				
537	1178	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.63009	221 603	139 630
538	1179	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0.63009	932 114	587 316
539	1180	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	18.27261	496	9 063

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
540	1181	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	18.27261	192	3 508
			Итого по подразделу: Жалюзийная решетка РЖ-1...4 (АР-65)				**739 517**
			Подраздел: Стремянка Ст-1...4 (АР-66.1 ... 66.3)				
541	1182	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.73711	237 208	174 848
542	1183	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.72347	1 146 761	829 647
543	1184	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	224	33	7 392
544	1185	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	21.37619	248	5 301
545	1186	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	21.37619	385	8 230
			Итого по подразделу: Стремянка Ст-1...4 (АР-66.1 ... 66.3)				**1 025 418**
			Подраздел: Будка Бв-1 -3шт (лист АР-67.1)				
546	1187	6110-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	м2	19.2	1 086	20 851
547	1188	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	21.12	120	2 534
548	1189	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	19.2	1 679	32 237
549	1190	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	2.57088	44 064	113 283
550	1191	6110-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	м2	19.2	1 086	20 851
551	1192	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.02112	95 688	2 020
552	1193	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /70 мм/	м2	19.2	1 281	24 595

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
553	1194	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.29376	28 485	8 368
554	1195	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	19.2	374	7 181
555	1196	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.07712	28 485	30 682
556	1197	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0367104	59 456	2 183
557	1198	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0367104	415 660	15 258
558	1199	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	19.2	769	14 765
559	1200	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	22.08	1 210	26 716
560	1201	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	22.08	2 858	63 105
561	1202	235-201-0103 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный	кг	4.608	649	2 991
			Итого по подразделу: Будка Бв-1 -3шт (лист АР-67.1)				**387 623**
			Подраздел: Отделка стен будки Бв (лист АР-67.1)				
562	1203	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	57.06	1 603	91 467
563	1204	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	5.9913	19 185	114 943
564	1205	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	62.766	120	7 532
565	1206	6112-0201-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	м2	57.06	3 221	183 790
566	1207	6112-0303-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	57.06	640	36 518

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
567	1208	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	22.2534	497	11 060
			Итого по подразделу: Отделка стен будки Бв (лист АР-67.1)				**445 310**
			Подраздел: Откосы дв.проема Бв (лист АР-67.1)				
568	1209	6112-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м	2.82	2 740	7 727
569	1210	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.029892	25 496	762
570	1211	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	0.54	1 932	1 043
571	1212	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	0.54	9 808	5 296
			Итого по подразделу: Откосы дв.проема Бв (лист АР-67.1)				**14 828**
			Подраздел: Металлические изделия кровли будки Бв (лист АР-67.3)				
572	1213	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /уголки/	т	0.16407	272 684	44 739
573	1214	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.16407	365 165	59 913
574	1215	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.75803	248	1 180
575	1216	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4.75803	385	1 832
576	1217	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	15.2562	4 517	68 912
577	1218	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0.040866	117 771	4 813
578	1219	215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0.0433179	103 583	4 487
579	1220	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0.040866	3 746	153

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
580	1221	217-701-0117 РСНБ РК 2022	Сульфат аммония	т	0.0000696	205 945	14
581	1222	217-701-0118 РСНБ РК 2022	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0.0002739	725 499	199
582	1223	217-701-0215 РСНБ РК 2022	Контакт Петрова керосиновый	т	0.0000408	435 089	18
			Итого по подразделу: Металлические изделия кровли будки Бв (лист АР-67.3)				**186 260**
			Подраздел: Узлы кровли К-1-7 (листы АР-68.4)				
583	1226	6110-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	488.8	1 608	785 990
584	1227	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.49288	28 485	71 010
585	1228	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм - Техноэласт соло ЭКМ	м2	366.6	3 053	1 119 230
586	1229	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - Фартуков Ф-1 - Ф-4	м2	487.8	4 517	2 203 393
587	1230	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыли К-1 - К-5/	т	0.873	272 684	238 053
588	1231	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.873	357 986	312 522
589	1232	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	25.317	248	6 279
590	1233	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25.317	385	9 747
			Итого по подразделу: Узлы кровли К-1-7 (листы АР-68.4)				**4 746 224**
			Подраздел: Узлы 19-22 (лист АР-69.2)				
591	1234	6107-0205-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов отделочных уголков - профиля углозащитного	м уголка	42.7	846	36 124
592	1235	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50/5х5/	м2	2.135	145	310
			Итого по подразделу: Узлы 19-22 (лист АР-69.2)				**36 434**
			Подраздел: Лестница Лм-1 (лист АР-70.4)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
593	1243	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	13.1	6 111	80 054
594	1244	261-102-0380 РСНБ РК 2022	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	28.82	355	10 231
595	1245	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	14.41	4 956	71 416
596	1246	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм /40 мм/	м2	21	1 281	26 901
597	1247	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.012852	28 485	366
598	1248	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	21	170	3 570
599	1249	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.02142	28 485	610
600	1250	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.040152	59 456	2 387
601	1251	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.040152	415 660	16 690
602	1252	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	21	472	9 912
603	1253	217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м2	23.1	405	9 356
604	1254	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	21	934	19 614
605	1255	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вычитается позиция: Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	21	-356	-7 476
606	1256	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	24.15	2 858	69 021
			Итого по подразделу: Лестница Лм-1 (лист АР-70.4)				**312 652**
			Подраздел: Элементы сцены (АР-74.2)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
607	1257	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	2.63679	647 260	1 706 689
608	1258	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2.46389	438 481	1 080 369
609	1259	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.1083	498 871	54 028
610	1260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0646	365 165	23 590
611	1261	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	76.46691	248	18 964
612	1262	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	76.46691	385	29 440
613	1263	6107-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного	м2	37.8	6 746	254 999
614	1264	6107-0102-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка досками	м2	24.4	1 931	47 116
615	1265	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	24.4	2 897	70 687
			Итого по подразделу: Элементы сцены (АР-74.2)				**3 285 882**
			Подраздел: Ограждение СО-1 (АР-75)				
616	1266	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.148004	63 710	9 429
617	1267	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.12804	438 481	56 143
618	1268	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.019964	498 871	9 959
619	1269	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	32	33	1 056
620	1270	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.0635	237 208	15 063

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
621	1271	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.05278	365 165	19 273
622	1272	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00311	387 658	1 206
623	1273	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0.00211	498 871	1 053
624	1274	214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	5.1	809	4 126
625	1275	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6.133616	248	1 521
626	1276	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6.133616	385	2 361
			Итого по подразделу: Ограждение СО-1 (АР-75)				**121 190**
			Подраздел: Декоративная решетка ДР-1 (АР-76)				
627	1277	6118-0202-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток площадь в свету до 5 м2.	шт.	1	20 605	20 605
628	1278	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0316	365 165	11 539
629	1279	214-206-0401 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0.044	498 871	21 950
630	1280	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00026	357 986	93
631	1281	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.00754	248	2
632	1282	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.00754	192	1
			Итого по подразделу: Декоративная решетка ДР-1 (АР-76)				**54 190**
			Итого по разделу: Крыльцо. Навес				**33 623 487**
			Раздел: Подъемные устройства (лифты) /лист АР 1.7/				
			Подраздел: Подъемник вертикальный электрический для ММГН /лист АР 1.7/				
633	1287	6120-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	1	197 504	197 504

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
634	1288	516-201-0102 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	1	2 316 543	2 316 543
			Итого по подразделу: Подъемник вертикальный электрический для ММГН /лист АР 1.7/				**2 514 047**
			Итого по разделу: Подъемные устройства (лифты) /лист АР 1.7/				**2 514 047**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**240 051 192**
			ИТОГО по акту:				**240 051 192**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	237734649.650 x 8.10%	19 256 507
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	240051192.650 + 19256507.528	259 307 700
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	237734649.650 x 0.05409035	12 859 149
	Сметная прибыль, 5.00%	256991157.178 x 5.00%	12 849 557
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(259307700.178 + 12859149.727) x 5.000%	13 608 342
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		298 624 750
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	298624750.259 x 1.0557	315 258 148
	НДС (12%)	315258148.849 x 12%	37 830 977
	Итого с НДС	315258148.849 + 37830977.862	353 089 126

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:48
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:43
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:24
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:41
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:50
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:28
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:02
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 10:57
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

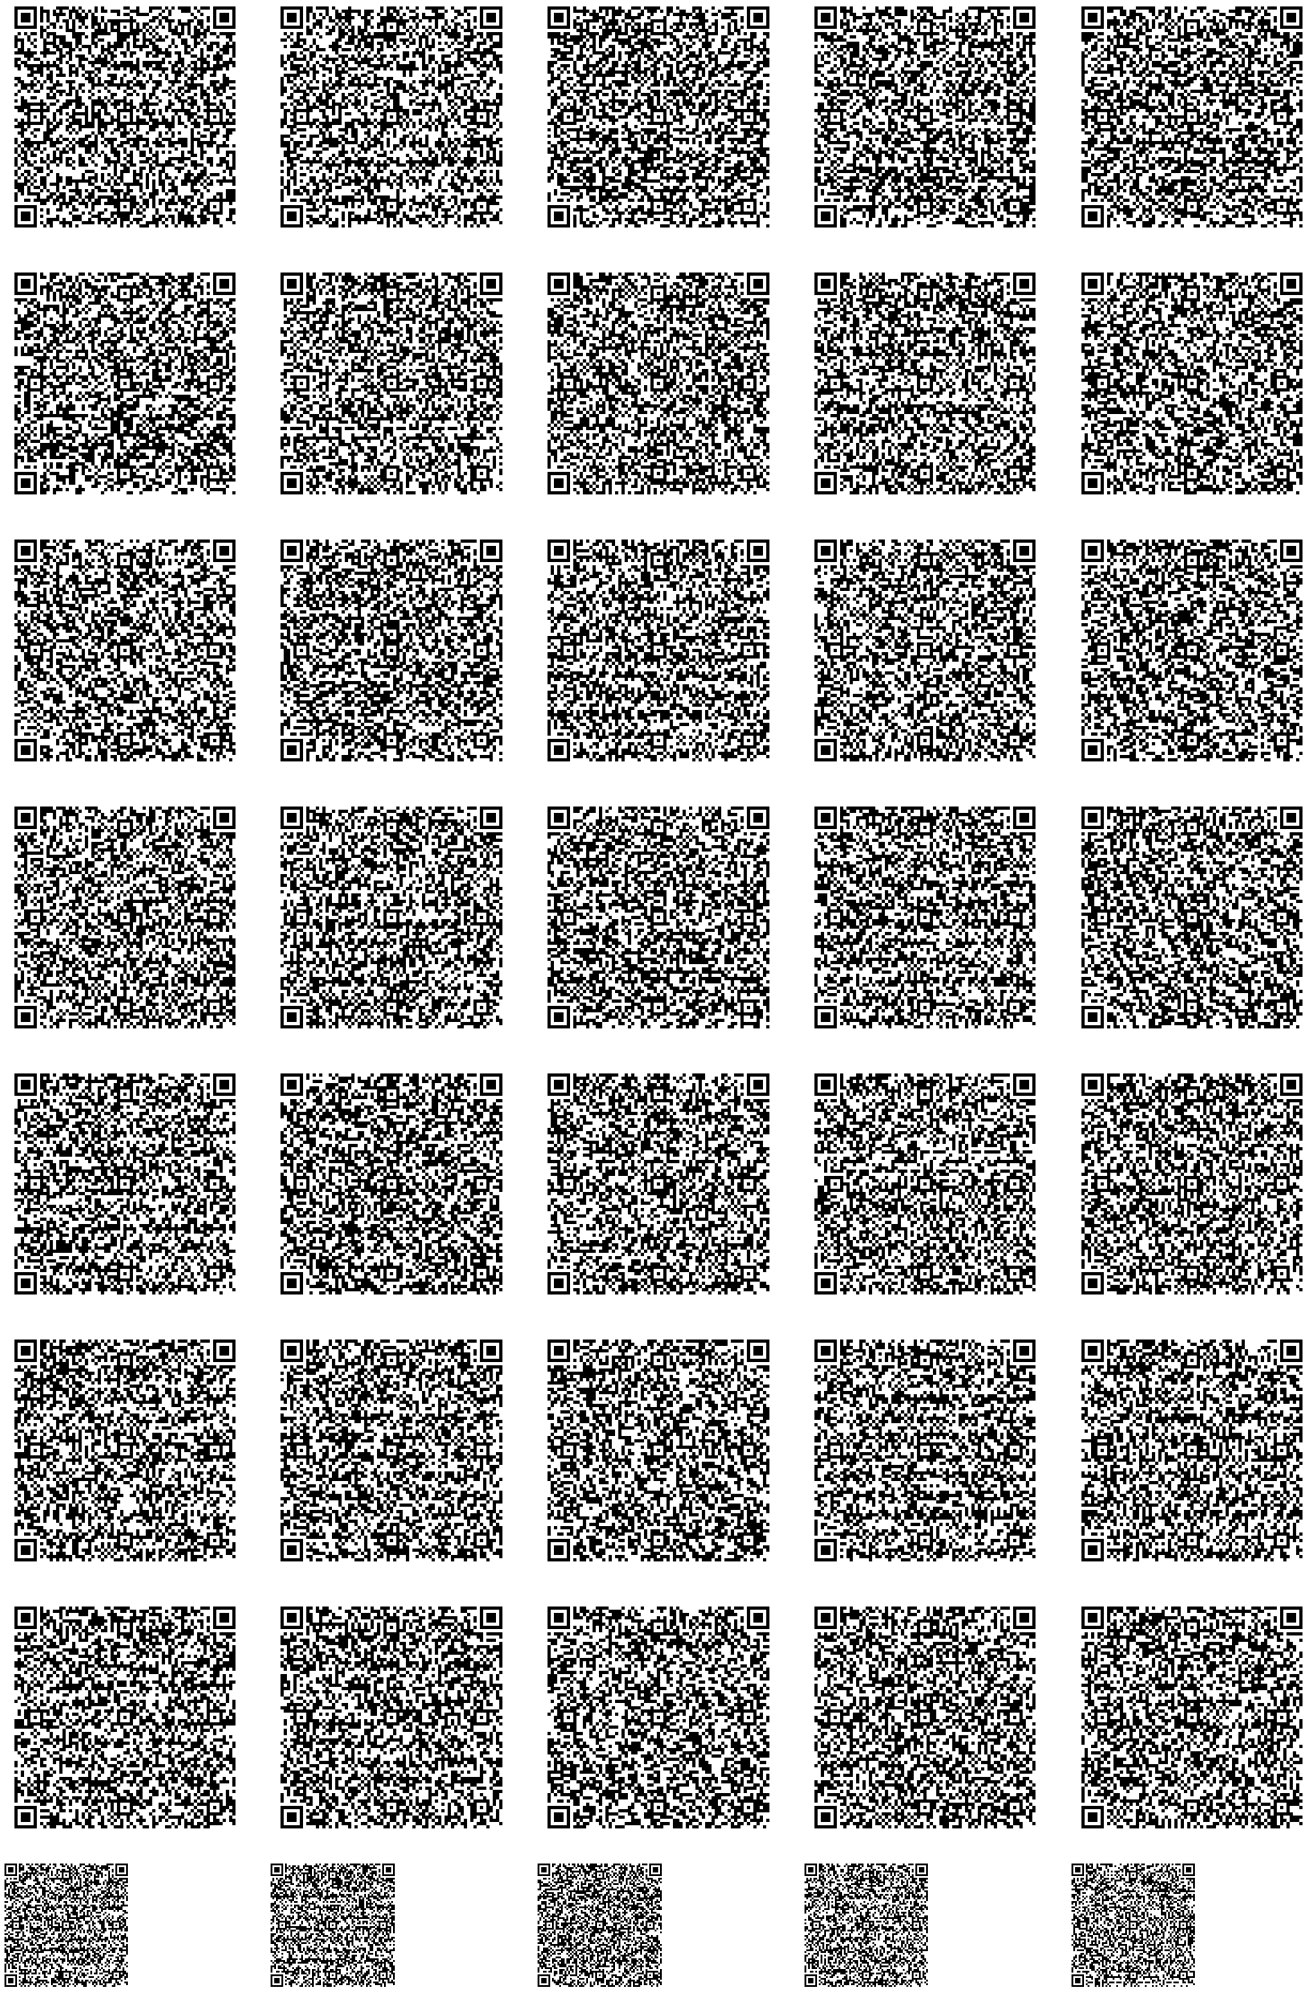

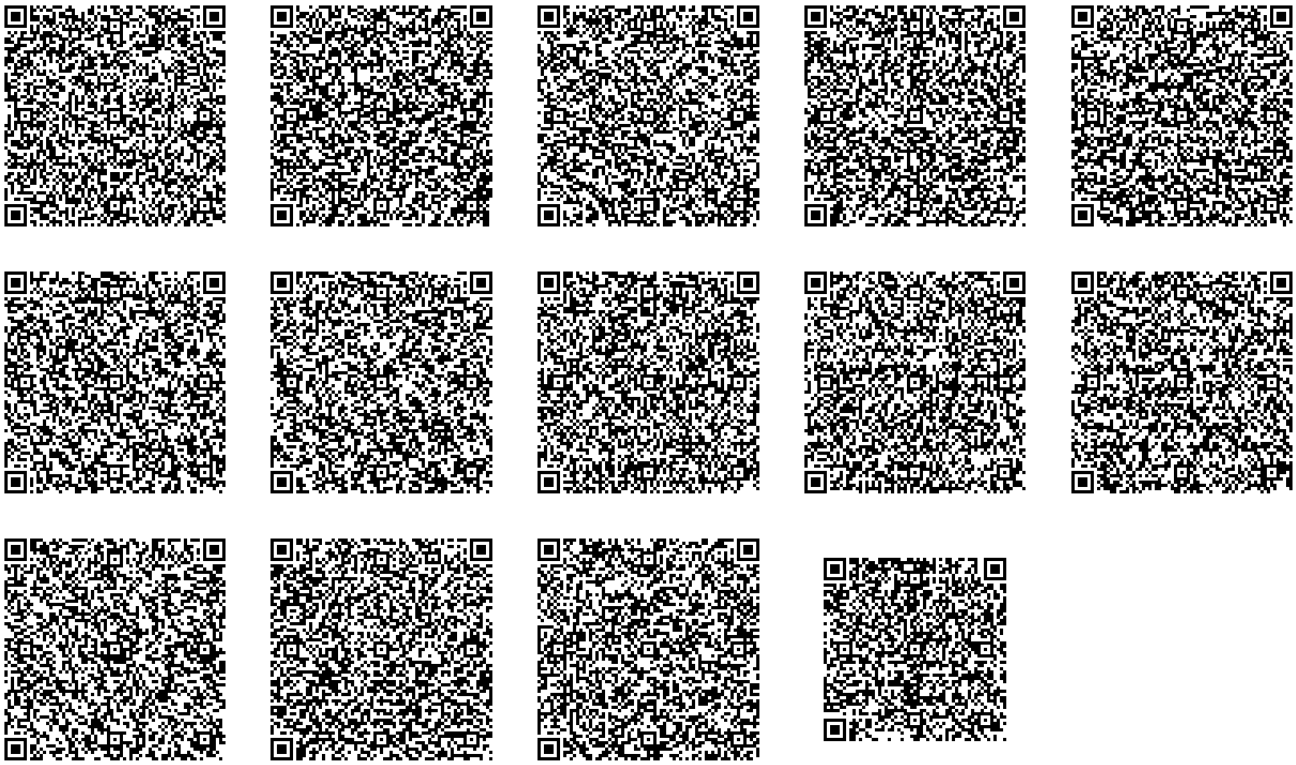

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные газопроводы				
			Раздел: Резервуарная установка				
			Подраздел: Оборудование				
1	3	6117-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	68 045	68 045
2	4	ЕСЦ РСНБ РК 2024	Испарительная установка шкафного исполнения TG-KEV-100-SR-25kPa-1 производительностью 100 кг/ч, расчетное давление	шт	1	5 640 770	5 640 770
			Итого по подразделу: Оборудование				**5 708 815**
			Подраздел: Трубопроводная арматура				
3	8	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	23	7 497	172 431
4	9	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	7 577	37 885
5	10	242-209-0703РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	21	16 831	353 451
6	11	242-209-3006РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	5	33 983	169 915
7	12	242-309-0502РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	2	11 949	23 898
			Итого по подразделу: Трубопроводная арматура				**757 580**
			Подраздел: Трубопроводы				
8	13	6123-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0.0792	3 369 937	266 899

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	14	241-108-0104РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	0.2	988	198
10	15	241-108-0106РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	64	1 143	73 152
11	16	241-108-0110РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 38х3,0 мм	м	1	1 376	1 376
12	17	241-108-0120РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х4,0 мм	м	14	3 611	50 554
			Итого по подразделу: Трубопроводы				**392 179**
			Подраздел: Фитинги				
13	18	241-112-0112РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	29	359	10 411
14	19	241-112-0127РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	5	1 015	5 075
15	20	241-113-0103РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	13	1 110	14 430
16	21	241-113-0109РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	8	2 517	20 136
17	22	241-114-0102РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	287	287
18	23	241-114-0104РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм (45х32)	шт.	4	323	1 292
19	24	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	2	1 751	3 502
20	25	242-207-4301РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1 797	3 594
21	26	242-207-3801РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	320	640
22	27	245-701-0201РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	2	4 290	8 580
23	28	241-114-0106РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	6	530	3 180
24	29	241-114-0107РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	476	1 904
25	30	241-117-0301РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	4	1 084	4 336
26	31	241-116-0303РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	845	845
27	32	241-116-0304РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	5	999	4 995
28	33	241-116-0305РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	8	1 547	12 376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	34	241-116-0307РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2 415	19 320
30	35	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11.128	1 092	12 152
31	36	261-301-0303РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d±50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.026	41 747	1 085
32	37	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (насадка для свечи, штуцер)	т	0.00316	3 904 266	12 337
33	38	241-115-0104РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	6	443	2 658
34	39	241-115-0103РСНБ РК 2022	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	2	312	624
35	40	261-301-0258РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	2	81	162
			Итого по подразделу: Фитинги				**143 921**
			Итого по разделу: Резервуарная установка				**7 002 495**
			Раздел: Газопровод среднего давления				
			Подраздел: Трубопроводная арматура				
36	56	6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 756	17 268
37	57	242-209-3003РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	25 635	25 635
38	58	242-209-3005РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	30 787	30 787
39	59	242-209-3006РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	33 983	33 983
40	60	6114-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр до 50 мм	соединение	2	10 838	21 676
41	61	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	1	1 751	1 751
42	62	242-207-4301РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
43	63	245-701-0201РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	4 290	4 290
			Итого по подразделу: Трубопроводная арматура				**137 187**
			Подраздел: Трубопроводы				
44	64	6123-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0.0305	3 369 937	102 783

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	65	241-101-0201РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1.5	483	725
46	66	241-108-0114РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	1	5 264	5 264
47	67	241-108-0119РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	28	3 640	101 920
48	68	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	1.1	3 090	3 399
49	69	241-201-0611РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	1.111	855	950
			Итого по подразделу: Трубопроводы				**215 041**
			Подраздел: Фитинги				
50	70	241-112-0122РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х4,0 мм	шт.	1	763	763
51	71	241-112-0126РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	764	3 056
52	72	241-114-0107РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
53	73	241-114-0123РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 557	1 557
54	74	241-114-0201РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-57х3,0 мм	шт.	2	3 659	7 318
55	75	241-116-0306РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	3	1 897	5 691
56	76	241-116-0307РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4 830
57	77	241-117-0301РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	шт.	1	1 084	1 084
58	78	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3.372	1 092	3 682
59	79	261-301-0303РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d±50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.007	41 747	292
60	80	6104-0802-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг /конденсатосборник/	т	0.2014	1 399 572	281 874
61	81	241-102-0174РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1.2	2 889	3 467
			Итого по подразделу: Фитинги				**314 090**
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления				**666 318**
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: Газовый колодец				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	145	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0.11	9 823	1 081
63	146	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки /бетон В10, сульфатостойкий F150, W6/	м3	0.4	39 502	15 801
64	147	6105-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка стен приямков и каналов	м3	0.25	31 939	7 985
65	148	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0.06	23 268	1 396
66	149	213-101-0101РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.1	67 837	6 784
67	150	6105-0201-1115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка трубы дымовой кирпичной	м3	0.25	103 090	25 772
68	151	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	1	8 789	8 789
69	152	244-202-0101РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23 039
			Итого по подразделу: Газовый колодец				**90 647**
			Итого по разделу: Строительные работы				**90 647**
			Итого по локальной смете: Наружные газопроводы				**7 759 460**
			ИТОГО по акту:				**7 759 460**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	2118690.000 x 8.10%	171 613
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7759460.000 + 171613.898	7 931 073
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	2118690.000 x 0.05409035	114 600
	Сметная прибыль, 5.00%	2290303.898 x 5.00%	114 515
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(7931073.898 + 114600.678) x 5.000%	402 283
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 562 473
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	8562473.499 x 1.0368	8 877 572
	НДС (12%)	8877572.524 x 12%	1 065 308
	Итого с НДС	8877572.524 + 1065308.703	9 942 881

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:09
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:46
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:53
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:59
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:28
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:35
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:02
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:09

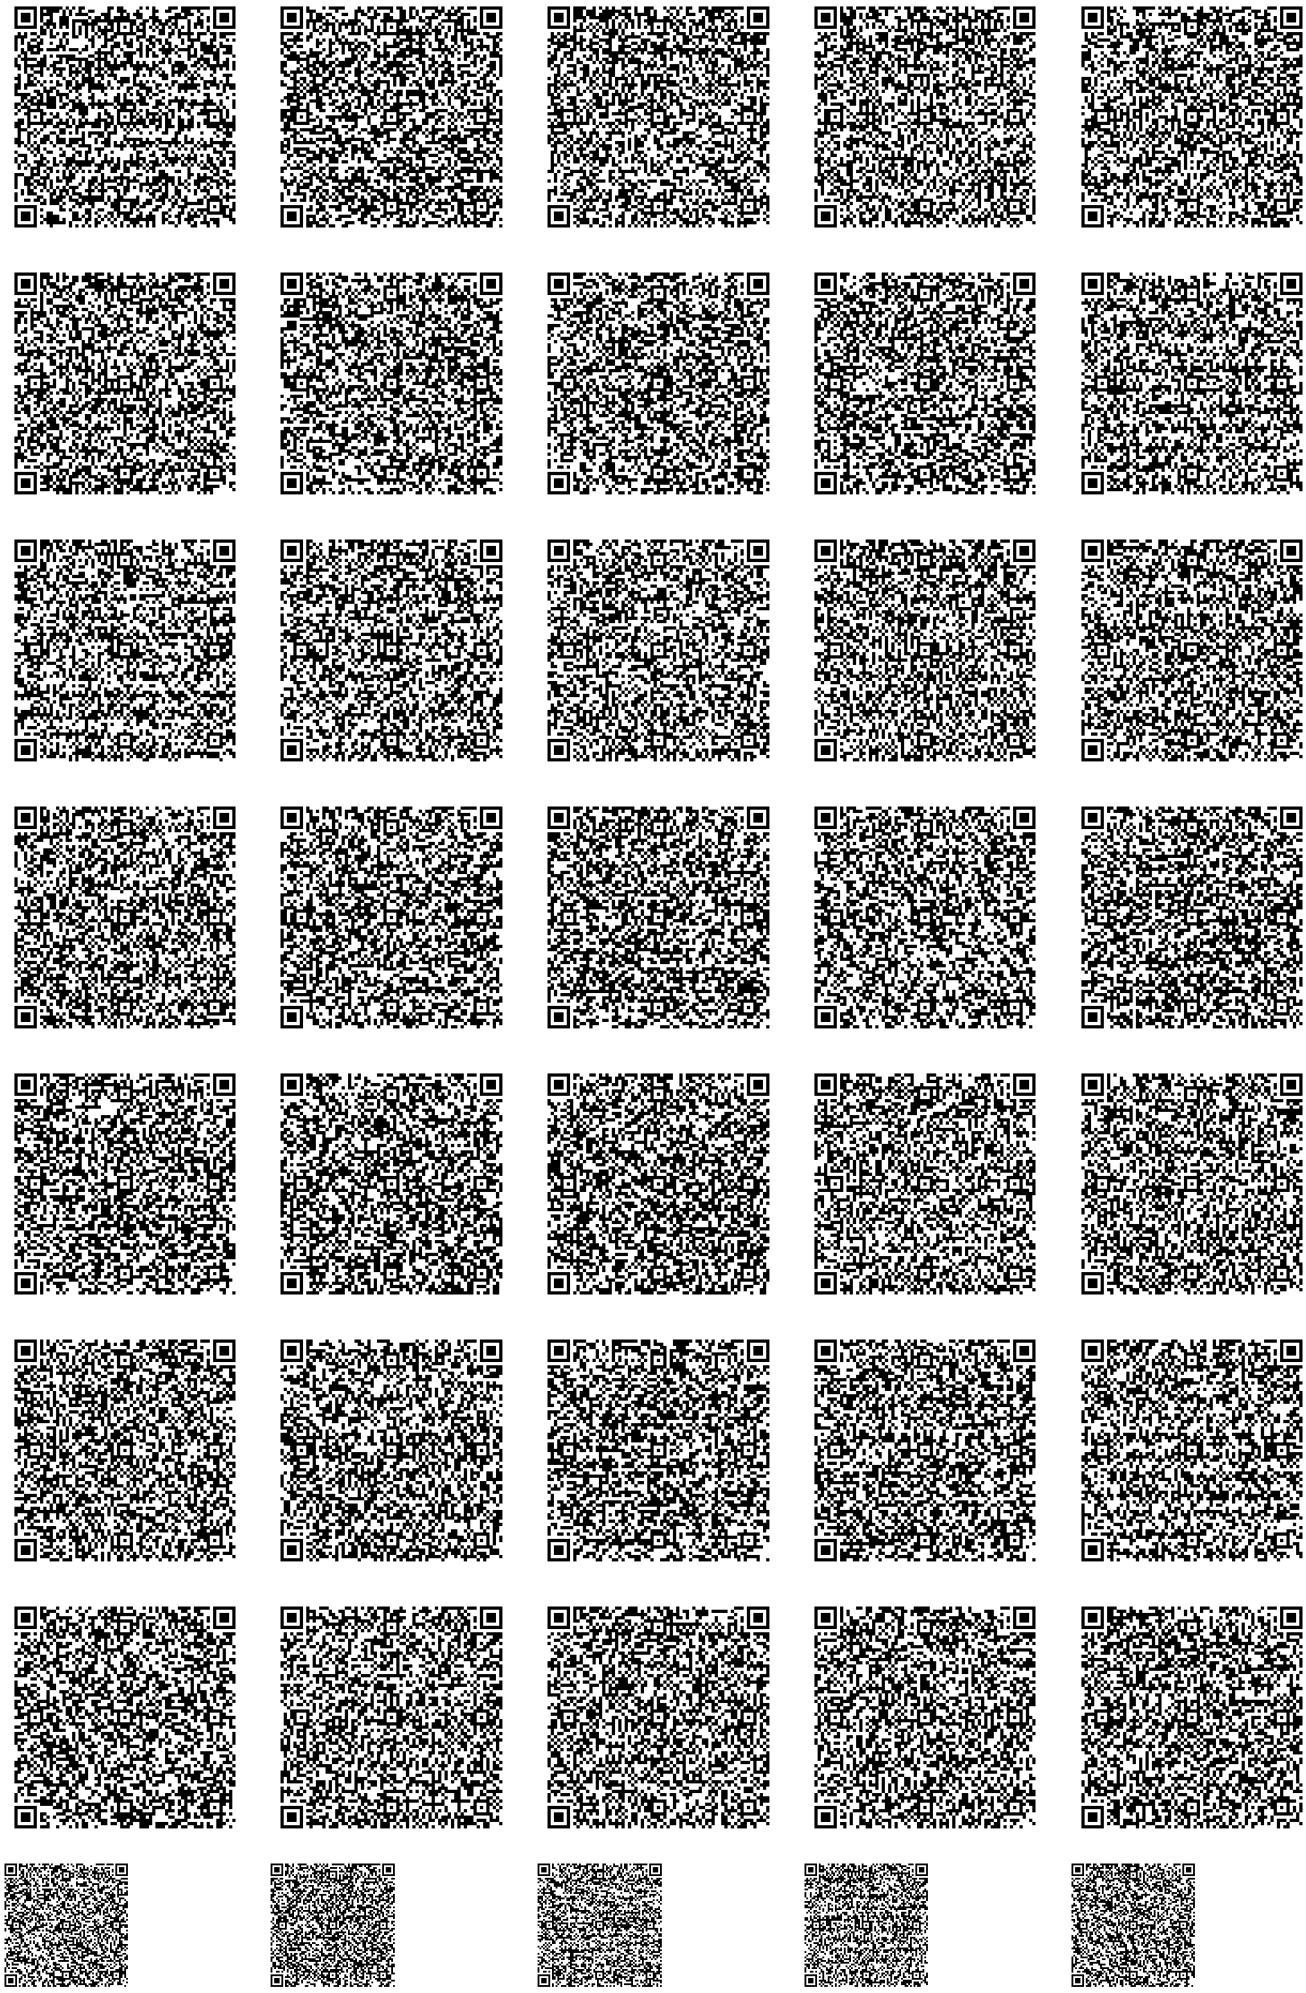

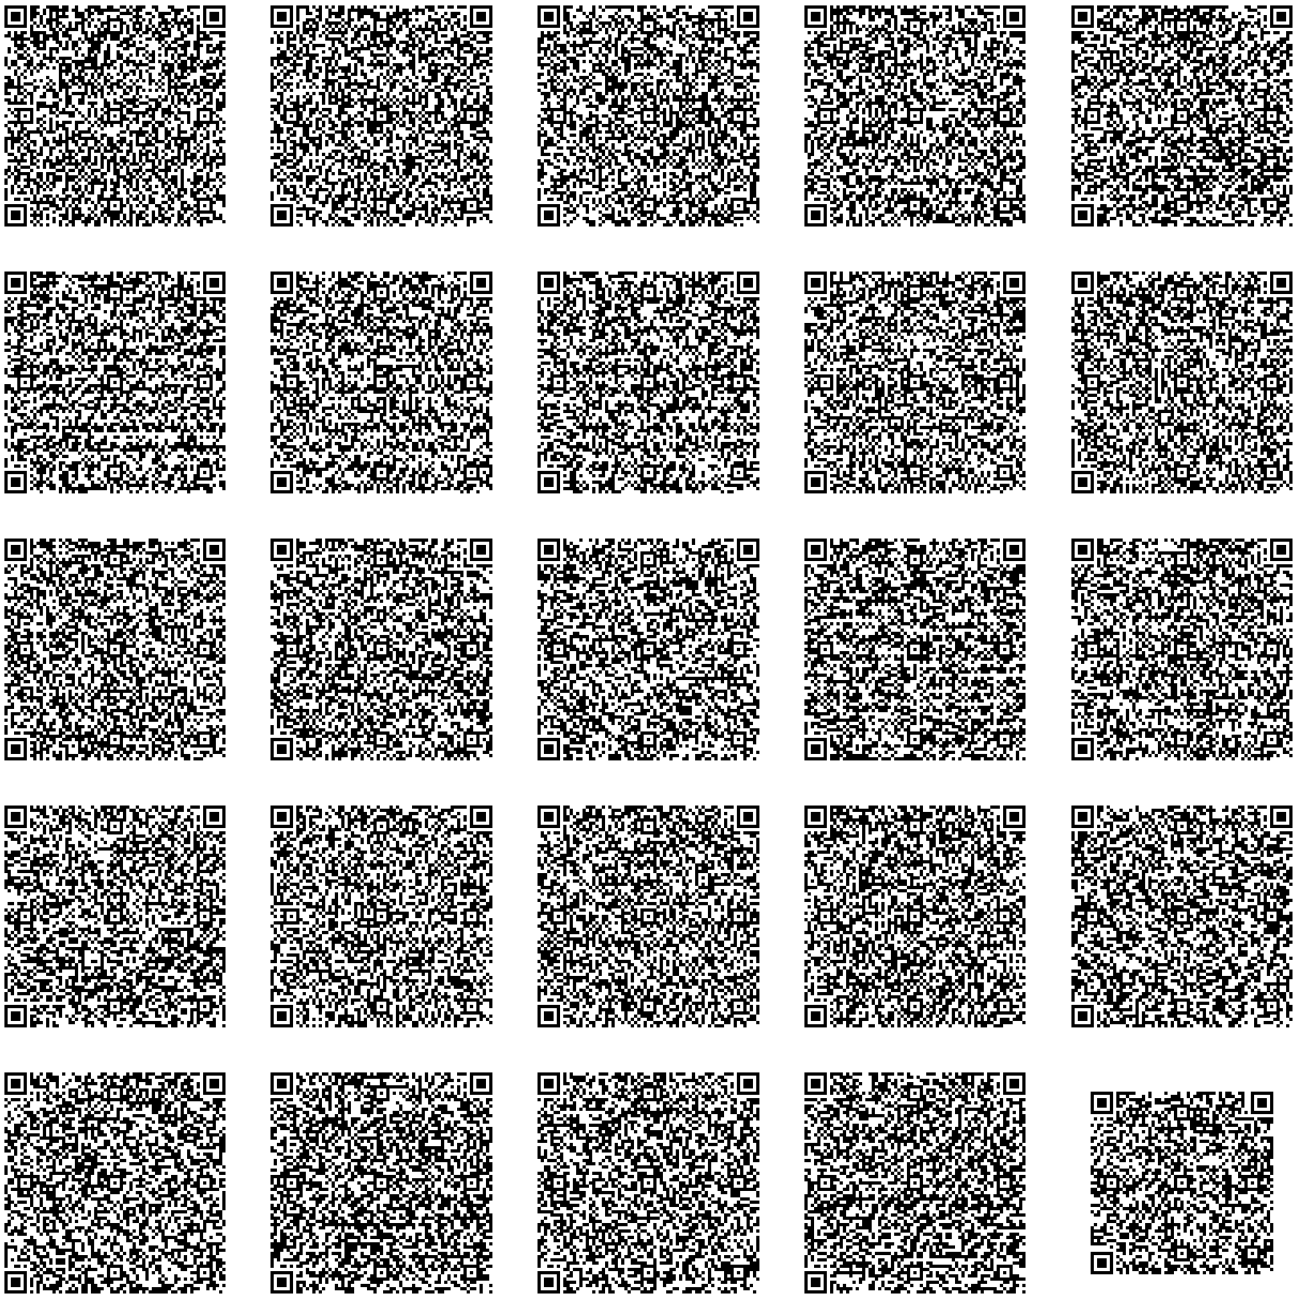

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление. Вентиляция				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	6116-0301-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	310.592	3 529	1 096 079
2	2	245-104-0528РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	19	18 911	359 309
3	3	245-104-0529РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	14	21 901	306 614
4	4	245-104-0530РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	39	25 433	991 887
5	5	245-104-0531РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	24	28 875	693 000
6	6	245-104-0532РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	40	32 407	1 296 280
7	7	245-104-0533РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	38	35 397	1 345 086
8	8	245-104-0534РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	16	39 020	624 320
9	9	245-104-0535РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	5	42 552	212 760
10	10	245-104-0536РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	5	46 265	231 325
11	11	245-104-0537РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	5	50 158	250 790
12	12	245-104-0538РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	3	53 871	161 613
13	13	245-104-0539РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	6	57 403	344 418

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	245-104-0540РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	61 297	61 297
15	15	245-104-0541РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	10	65 010	650 100
16	16	245-104-0542РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	5	68 361	341 805
17	17	245-104-0545РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	66 619	66 619
18	18	245-104-0549РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2500 мм	комплект	1	76 015	76 015
19	19	245-104-0550РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	92 618	92 618
20	20	245-104-0554РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 3000 мм	комплект	1	103 658	103 658
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				**9 305 593**
			Итого по локальной смете: Отопление. Вентиляция				**9 305 593**
			ИТОГО по акту:				**9 305 593**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	9305593.000 x 8.10%	753 753
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	9305593.000 + 753753.068	10 059 346
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	9305593.000 x 0.05409035	503 342
	Сметная прибыль, 5.00%	10059346.068 x 5.00%	502 967
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(10059346.068 + 503342.756) x 5.000%	528 134
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		11 593 790
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	11593790.569 x 1.0368	12 020 442
	НДС (12%)	12020442.062 x 12%	1 442 453
	Итого с НДС	12020442.062 + 1442453.047	13 462 895

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:07
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 07:00
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:28
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:47
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:54
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:35
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:03
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:32 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:36 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:10

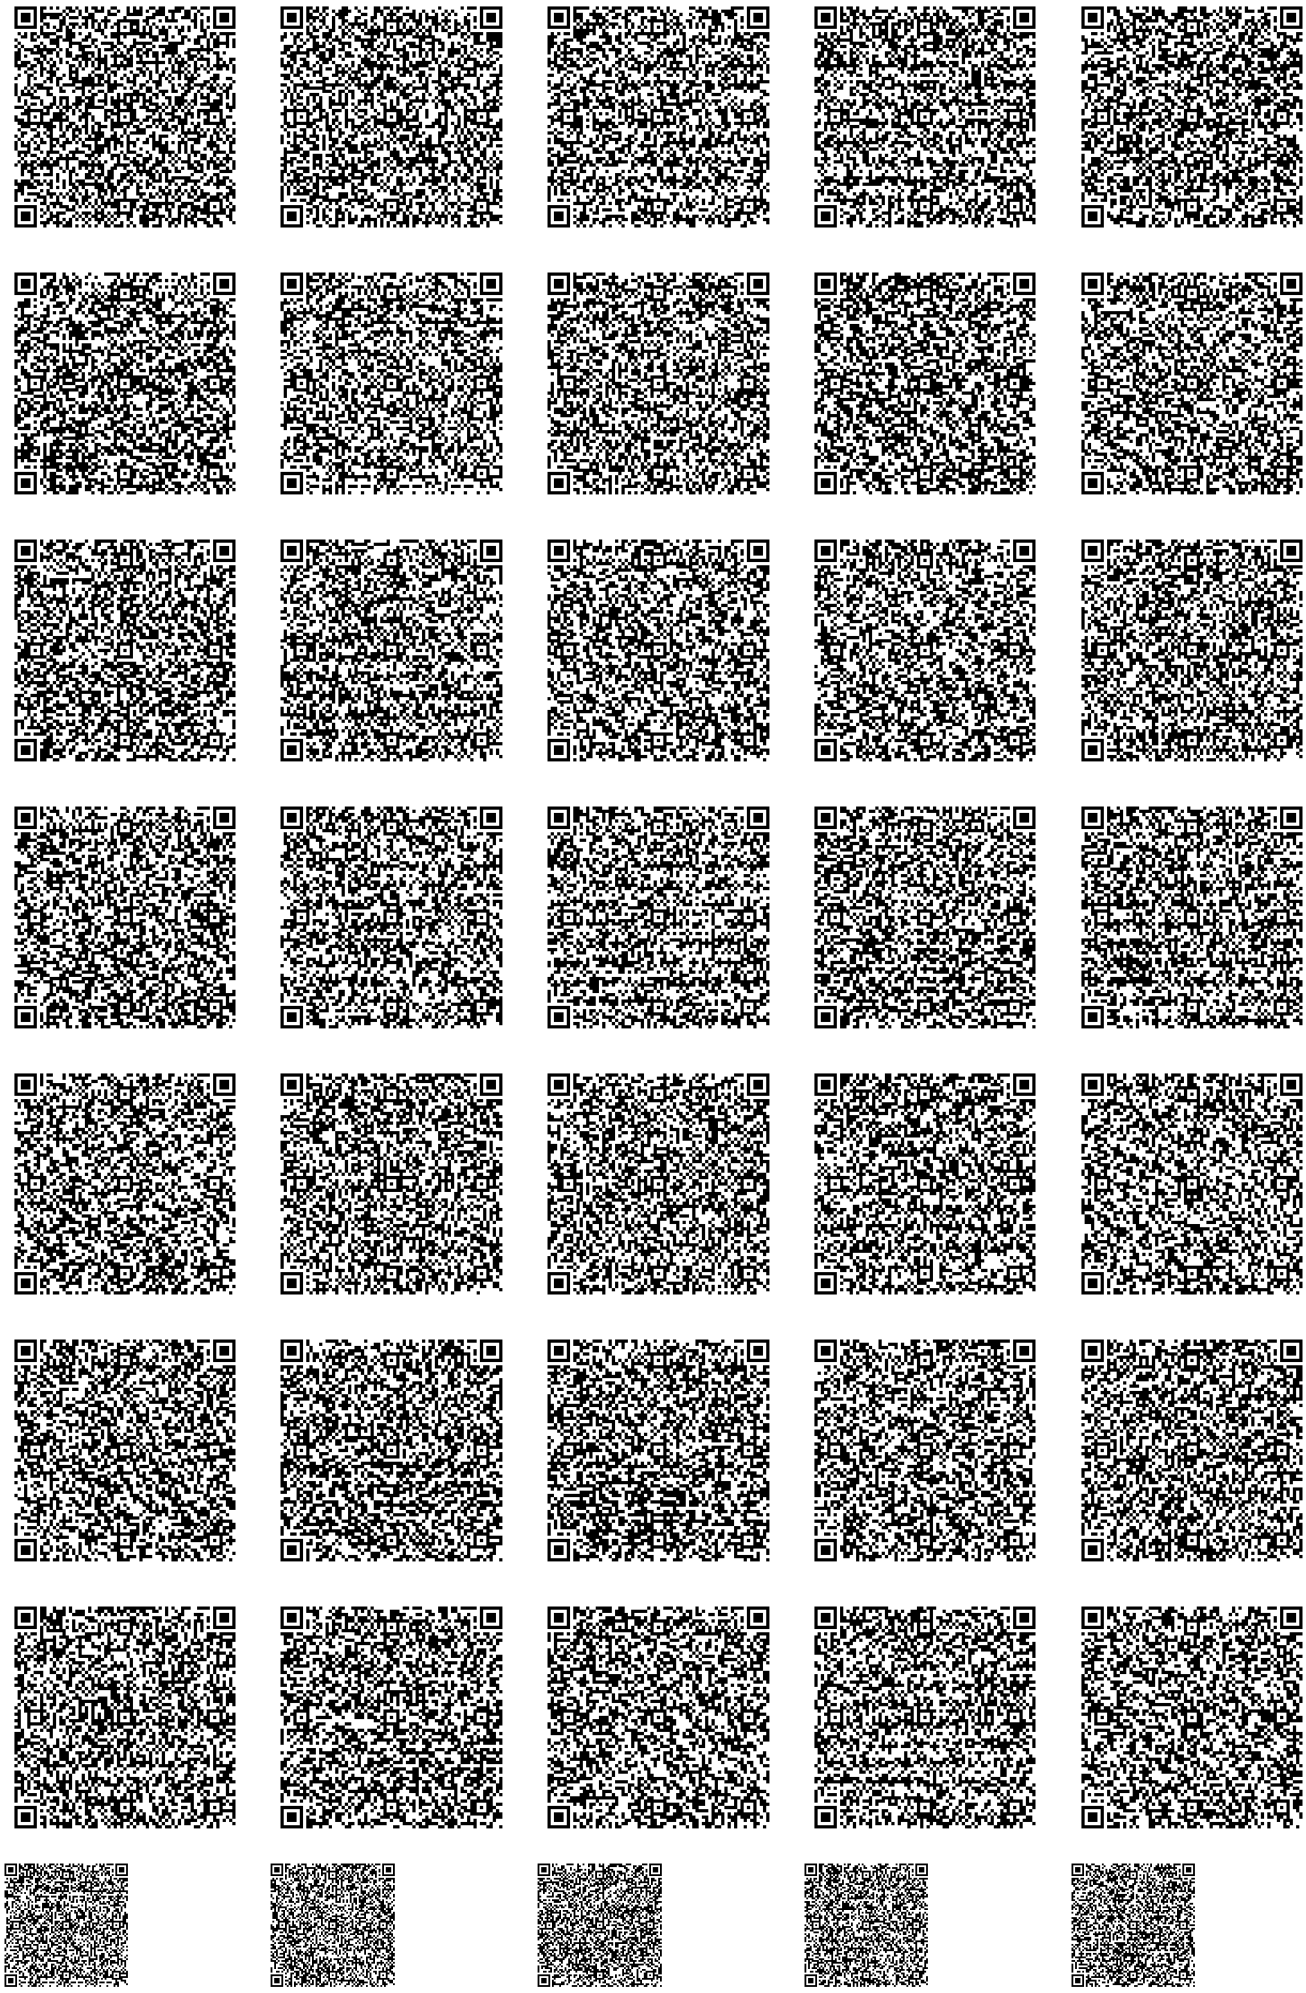

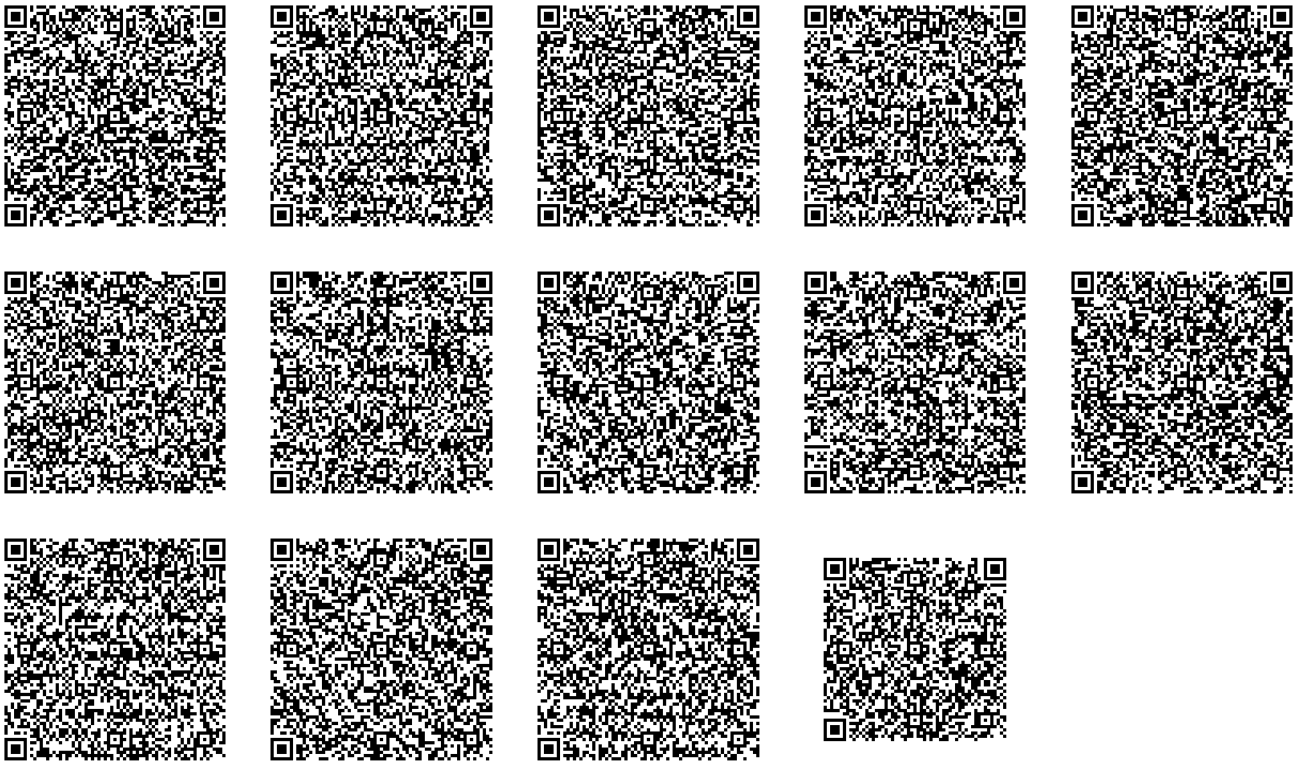

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Фасадное освещение				
			Раздел: Фасадное освещение				
			Подраздел: УСветотехническое оборудование,кабельные изд.трубные изд.				
1	11	6124-0202-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	47	13 978	656 966
2	12	247-103-3568РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный SPP-503-0-50K-050, мощность 50Вт, IP65	шт.	47	13 324	626 228
3	13	261-303-0102РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	47	42	1 974
			Итого по подразделу: УСветотехническое оборудование,кабельные изд.трубные изд.				**1 285 168**
			Итого по разделу: Фасадное освещение				**1 285 168**
			Итого по локальной смете: Фасадное освещение				**1 285 168**
			ИТОГО по акту:				**1 285 168**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	1285168.000 x 8.10%	104 098
Итого с затратами на организацию и управление СМР	1285168.000 + 104098.613	1 389 266
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	1285168.000 x 0.05409035	69 515
Сметная прибыль, 5.00%	1389266.613 x 5.00%	69 463
Непредвиденные расходы, 5.000%	(1389266.613 + 69515.183) x 5.000%	72 939
Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 601 184
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	1601184.217 x 1.0368	1 660 107
НДС (12%)	1660107.796 x 12%	199 212
Итого с НДС	1660107.796 + 199212.935	1 859 320

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:08
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:59
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:28
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:47
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:54
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:35
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:02
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:10

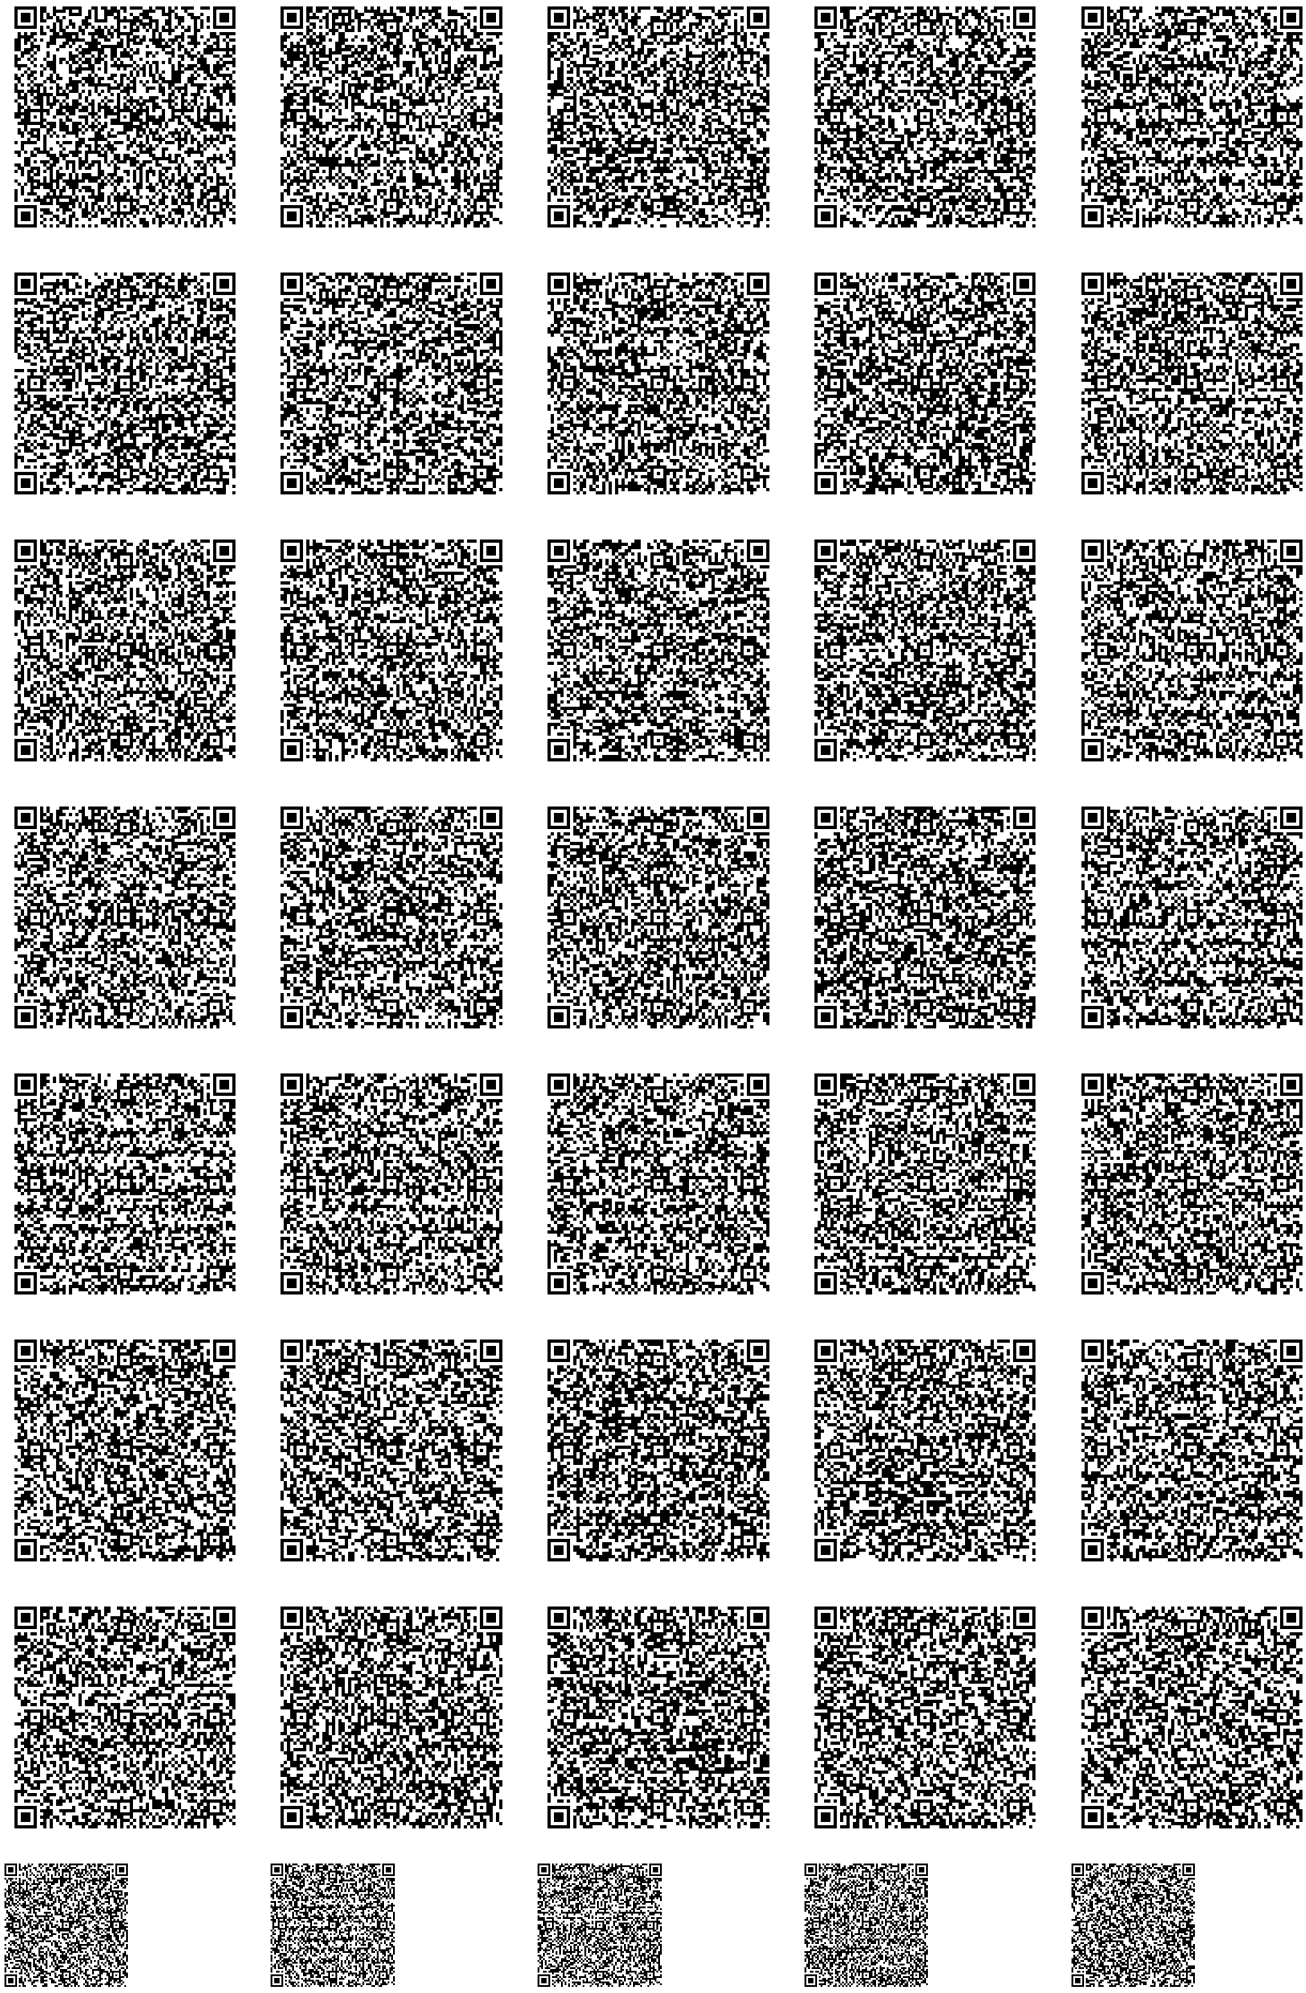

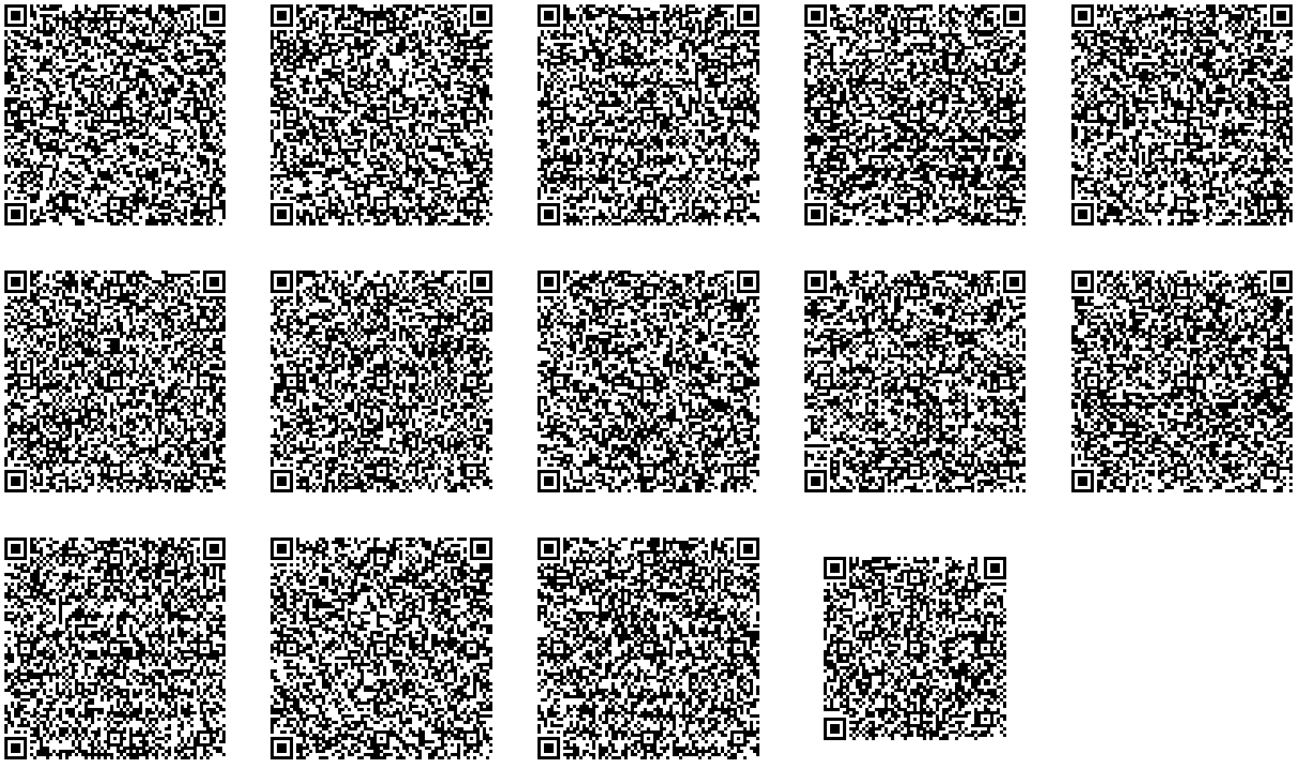

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Силовое электрооборудование				
			Раздел: null				
			Подраздел: Изделия и материалы.				
1	297	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	21	1 054	22 134
2	298	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	936	1 872
3	299	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	11	478	5 258
4	300	247-212-0201РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	408	816
5	301	261-303-0102РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	150	42	6 300
6	302	247-214-0115РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	377	528	199 056
7	303	247-212-0301РСНБ РК 2022	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54	шт.	215	1 780	382 700
8	304	261-303-0102РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	600	42	25 200
			Итого по подразделу: Изделия и материалы.				**643 336**
			Подраздел: Молниезащита.Заземление				
9	324	6124-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	1320	1 096	1 446 720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	325	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	6 892	186 084
11	326	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	550	1 493	821 150
12	327	6124-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	300	1 289	386 700
13	328	6124-0203-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	280	2 118	593 040
14	329	243-122-0103РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 1x2,5 (ок)-0,66	км	0.28	230	64
15	330	252-301-1485РСНБ РК 2022	Шина уравнивания потенциалов /главная заземляющая шина ГЗШ/	шт.	2	10 801	21 602
			Итого по подразделу: Молниезащита.Заземление				**3 455 360**
			Подраздел: Антиобледенительная система				
16	331	1308-0305-0901РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	13 462	40 386
17	332	247-201-0504РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	2	19 163	38 326
18	333	247-201-0503РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826	15 826
19	334	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	16	5 790	92 640
20	335	247-204-0653РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	13	2 611	33 943
21	336	247-204-0242РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С63 30 мА	шт.	3	6 224	18 672
22	337	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка прибора или аппарата	шт.	6	5 790	34 740
23	338	245-712-0201РСНБ РК 2022	Терморегулятор с датчиком модели TP 111	шт.	3	6 054	18 162
24	339	245-703-0101РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	3	21 245	63 735
25	340	243-906-2202РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	3	2 349	7 047
26	341	261-301-0220РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	5 399	5 399
27	342	217-105-0201РСНБ РК 2022	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.	100	18	1 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	343	247-202-0101РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	16	508	8 128
29	344	245-601-0601РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	16	29 939	479 024
30	345	241-216-0101РСНБ РК 2022	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм, без монтажного комплекта	шт.	100	81	8 100
31	346	6124-0201-1402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7	шт.	16	3 503	56 048
32	347	6124-0202-1103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 50 мм	м	60	883	52 980
33	348	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	415	959	397 985
34	349	243-403-0104РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR	м	60	1 220	73 200
35	350	243-107-0502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	95	601	57 095
36	351	243-107-0901РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	585	638	373 230
37	352	1308-0206-1906РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	415	965	400 475
38	353	241-207-0102РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	415	161	66 815
			Итого по подразделу: Антиобледенительная система				**2 343 756**
			Подраздел: .Монтажные изделия				
39	354	1308-0206-0502РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0.5016	296 505	148 727
40	355	243-907-1128РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 400 мм	м	114	4 177	476 178
41	356	243-907-2507РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 400 мм	м	114	2 153	245 442
42	357	243-907-1528РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	5	4 088	20 440
43	358	243-907-2808РСНБ РК 2022	Крышка для Т-образного поворота шириной 400 мм	шт.	5	2 970	14 850
44	359	243-907-1728РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм	шт.	76	9 817	746 092
45	360	243-907-3605РСНБ РК 2022	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	76	1 114	84 664
46	361	243-907-5401РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	8	162	1 296

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	362	243-907-3901РСНБ РК 2022	Скоба потолочная высотой 72,5 мм, шириной 62 мм, длиной 120 мм для крепления профиля перфорированного к потолку	шт.	76	950	72 200
48	363	243-907-6106РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	152	560	85 120
49	364	243-907-5302РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8	1000 шт.	0.152	84 484	12 842
			Итого по подразделу: .Монтажные изделия				**1 907 851**
			Итого по разделу: null				**8 350 303**
			Итого по локальной смете: Силовое электрооборудование				**8 350 303**
			ИТОГО по акту:				**8 350 303**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	8350303.000 x 8.10%	676 374
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8350303.000 + 676374.575	9 026 677
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	8350303.000 x 0.05409035	451 670
	Сметная прибыль, 5.00%	9026677.575 x 5.00%	451 333
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(9026677.575 + 451670.788) x 5.000%	473 917
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		10 403 599
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	10403599.660 x 1.0182	10 592 945
	НДС (12%)	10592945.174 x 12%	1 271 153
	Итого с НДС	10592945.174 + 1271153.421	11 864 098

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	17.12.2024 14:28
Представители технического надзора		
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:55
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 07:01
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	19.12.2024 17:14
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	19.12.2024 17:24
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:47
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 11:04
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:33 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:12

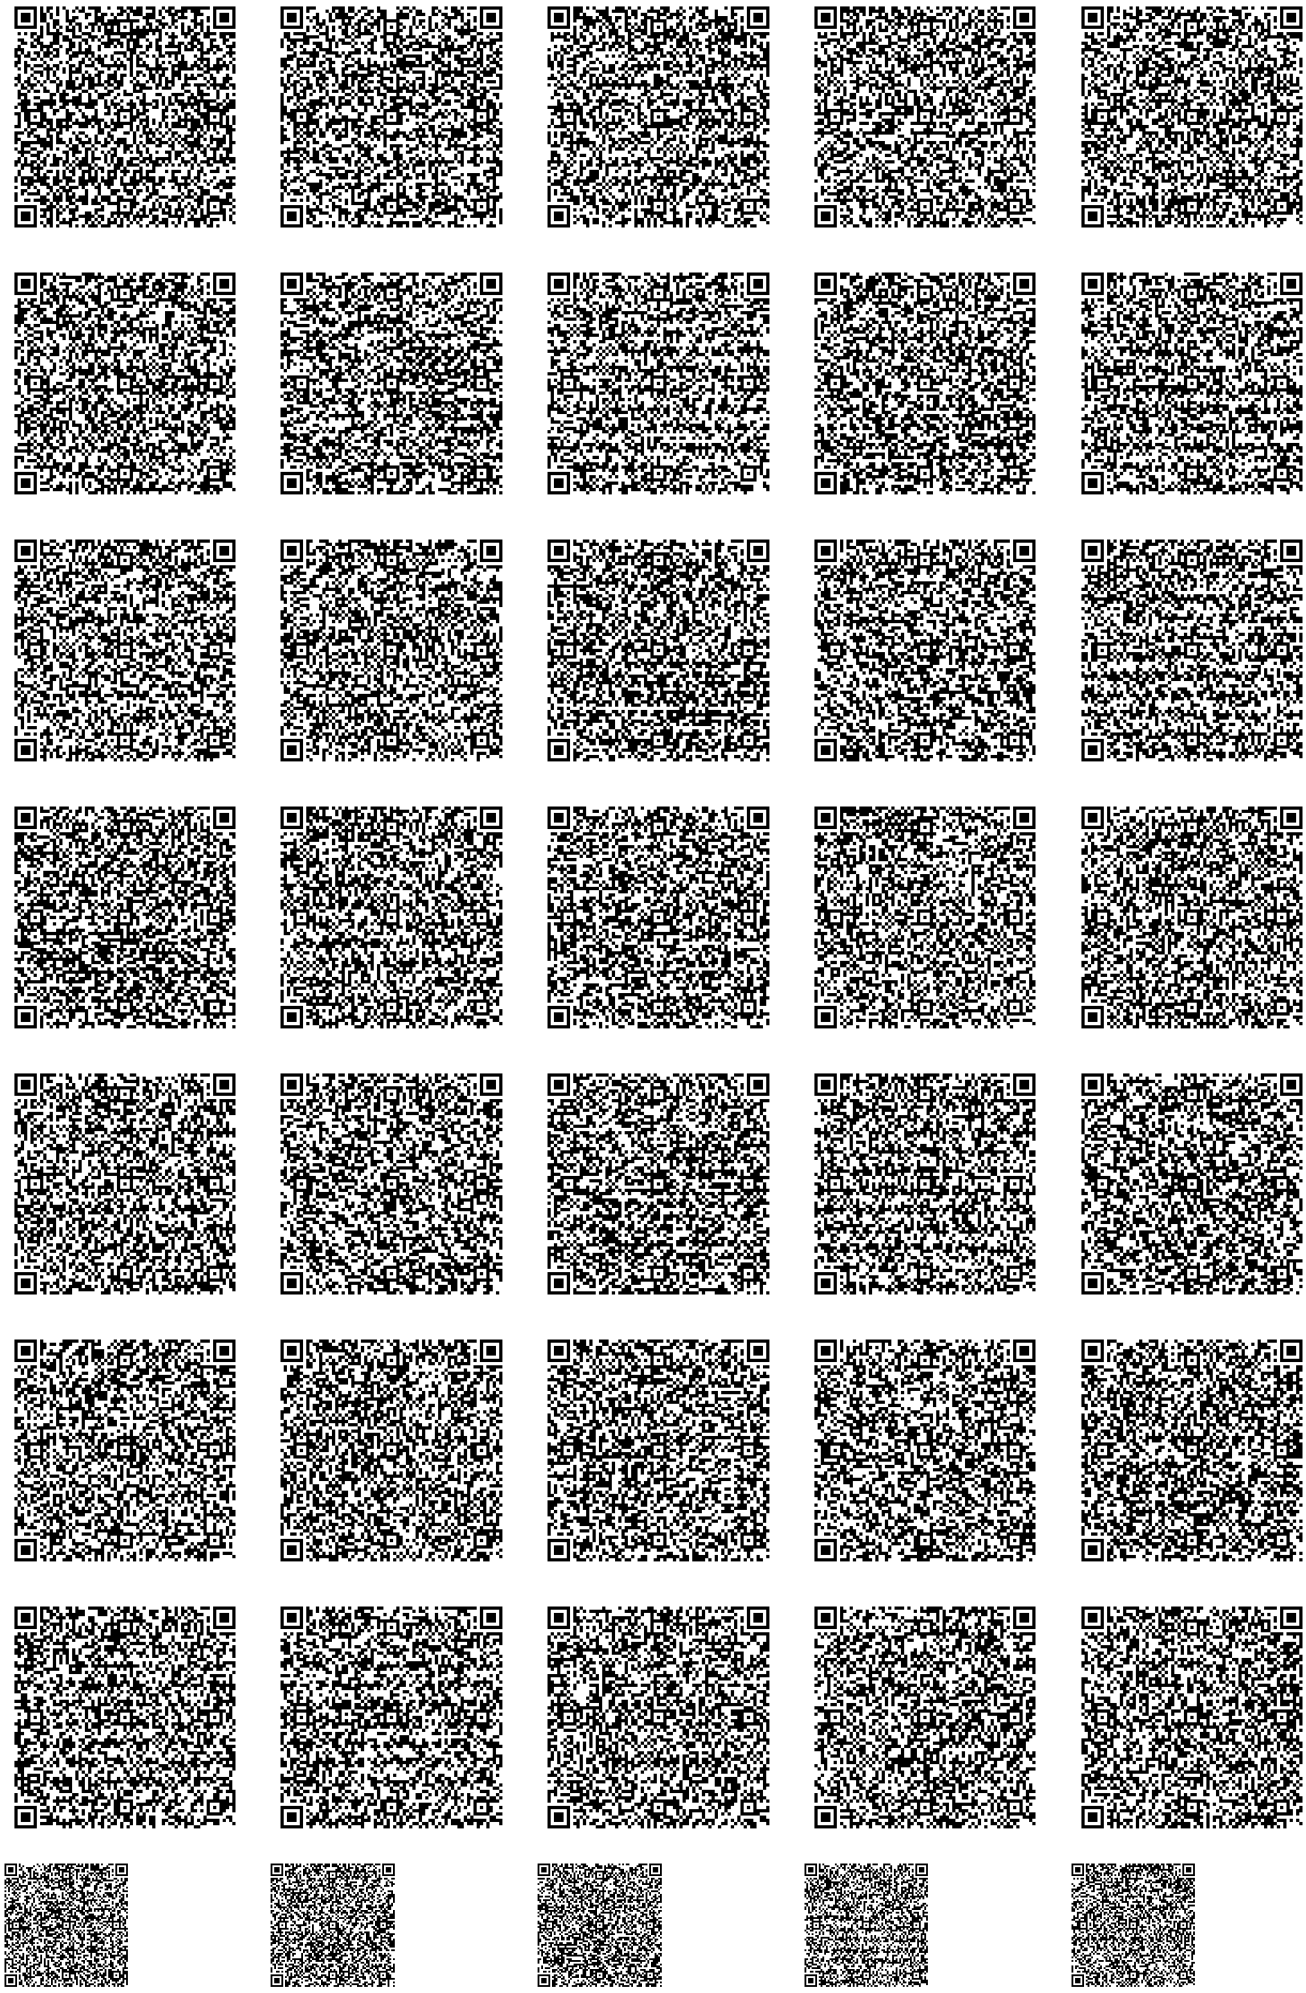

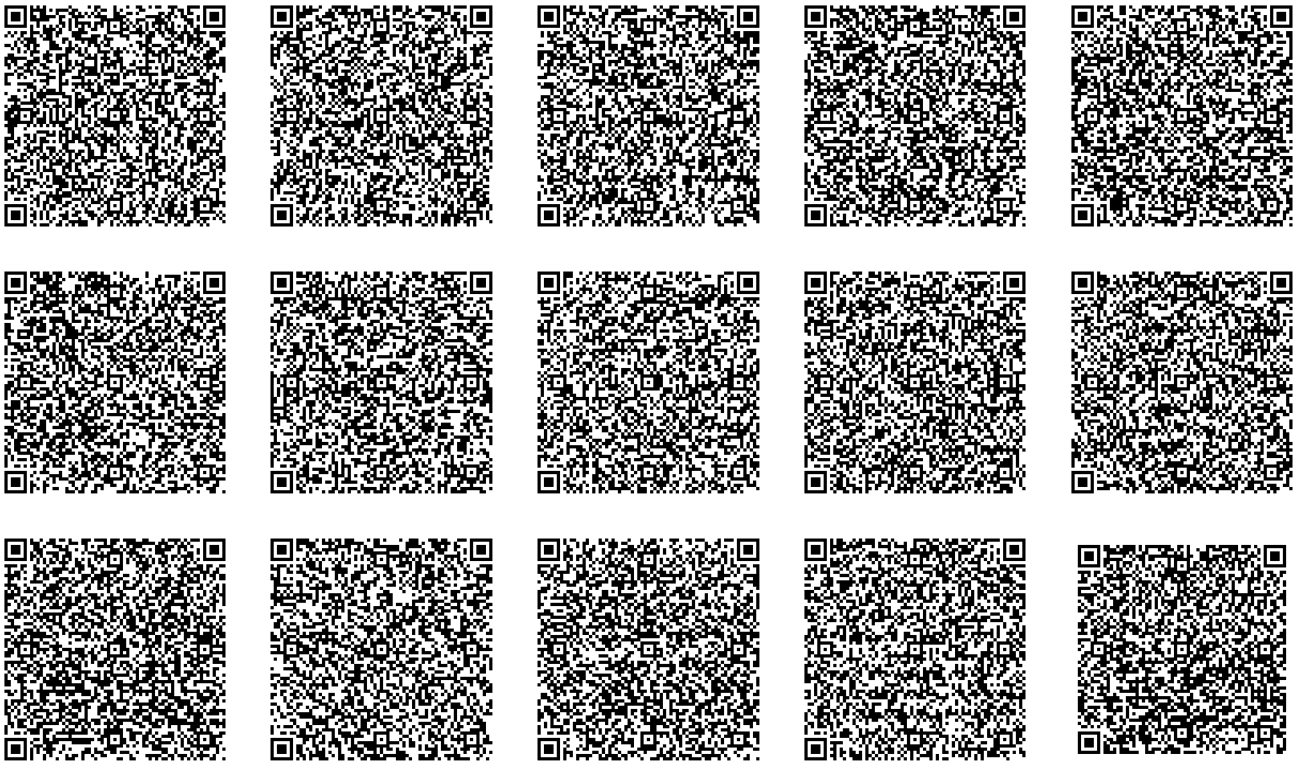

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные сети водоснабжения и каанализации				
			Раздел: Водоснабжение В1				
			Подраздел: Трубопроводы				
1	11	6121-0301-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0.0466	238 675	11 122
2	12	6121-0301-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0.0728	244 009	17 764
3	13	6121-0301-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0.1265	295 630	37 396
			Итого по подразделу: Трубопроводы				**66 283**
			Подраздел: Колодцы круглые из сб.железобетона, диаметром 1500 мм -2 шт				
4	59	222-503-0201РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0.04736	1 146 761	54 311
5	61	1115-0403-1004РСНБ РК 2022	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.37344	3 163	4 344
			Итого по подразделу: Колодцы круглые из сб.железобетона, диаметром 1500 мм -2 шт				**58 655**
			Подраздел: Колодцы круглые из сб.железобетона, диаметром 2000 мм -2 шт				
6	74	222-503-0201РСНБ РК 2022	Стремянка	т	0.04736	1 146 761	54 311
7	76	1115-0403-1004РСНБ РК 2022	Стремянка. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.37344	3 163	4 344
			Итого по подразделу: Колодцы круглые из сб.железобетона, диаметром 2000 мм -2 шт				**58 655**
			Итого по разделу: Водоснабжение В1				**183 593**
			Раздел: Канализация К1				
			Подраздел: Земляные работы				
8	80	6101-0106-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	136.9336056	76	10 407

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	81	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	136.9336056	576	78 874
			Итого по подразделу: Земляные работы				**89 281**
			Итого по разделу: Канализация К1				**89 281**
			Раздел: Канализация К2 (дренаж)				
			Подраздел: Канализационные колодцы D=1000мм /1 шт/ /лист 6и/				
10	117	6122-0401-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в мокрых грунтах	м3	0.82	123 405	101 192
11	118	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок /лист 6и/	м3	0.36	29 631	10 667
12	119	225-101-0601РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22 406	22 406
13	120	225-101-0105РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16 436	16 436
14	121	225-101-0606РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	19 308	19 308
15	122	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 108	7 108
16	123	244-202-0102РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352	40 352
			Итого по подразделу: Канализационные колодцы D=1000мм /1 шт/ /лист 6и/				**217 469**
			Итого по разделу: Канализация К2 (дренаж)				**217 469**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные сети водоснабжения и каанализации				**490 343**
			ИТОГО по акту:				**490 343**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (8.100%)	490343.000 x 8.10%	39 717
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	490343.000 + 39717.785	530 060
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.05409035	490343.000 x 0.05409035	26 522
	Сметная прибыль, 5.00%	530060.785 x 5.00%	26 503
	Непредвиденные расходы, 5.000%	(530060.785 + 26522.823) x 5.000%	27 829
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		610 915
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	610915.828 x 1.0182	622 034
	НДС (12%)	622034.496 x 12%	74 644
	Итого с НДС	622034.496 + 74644.139	696 678

Лист согласования
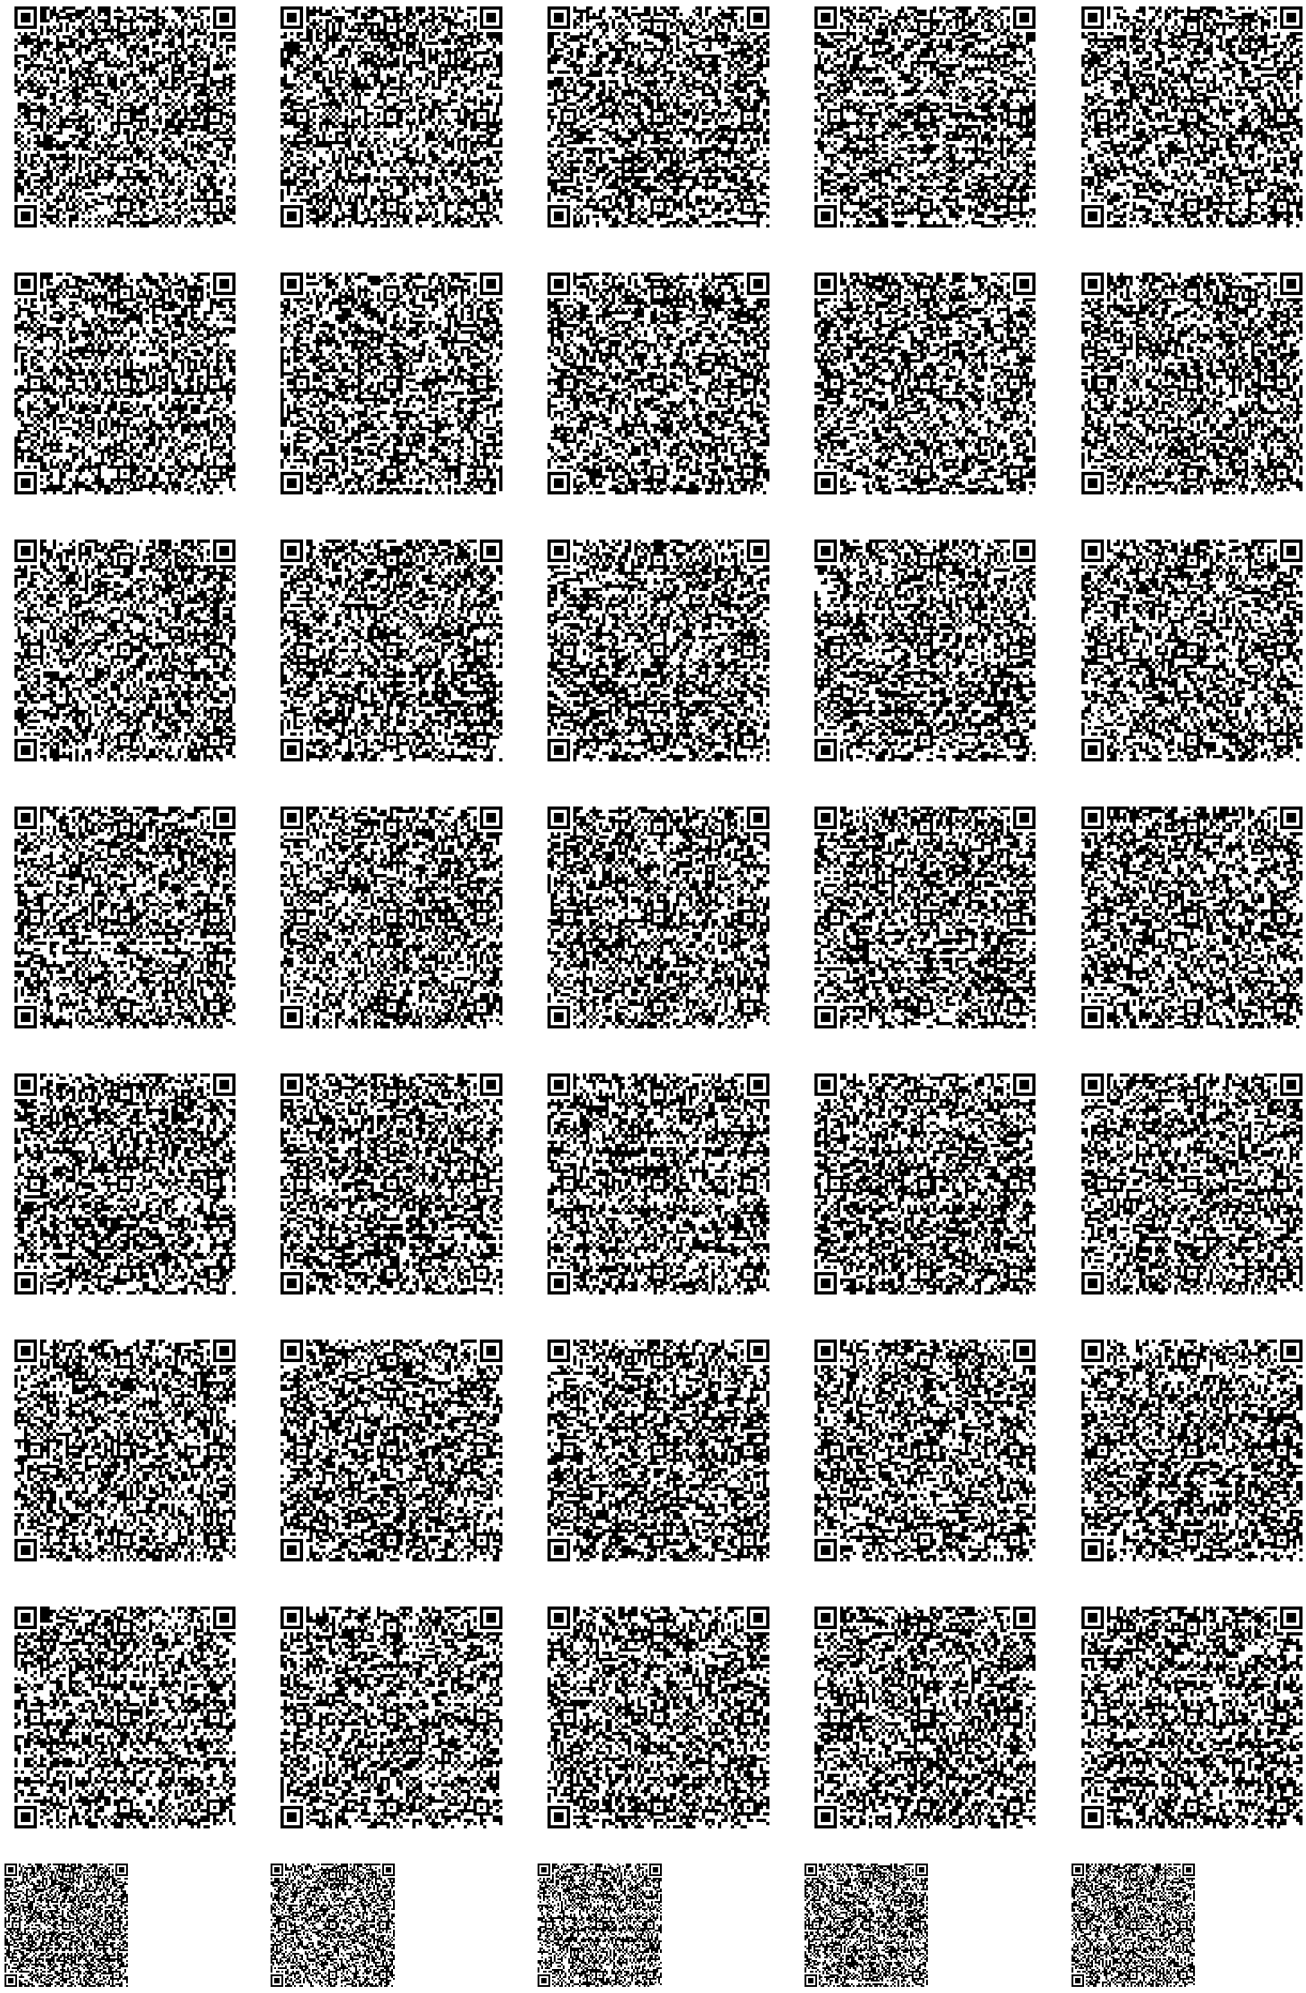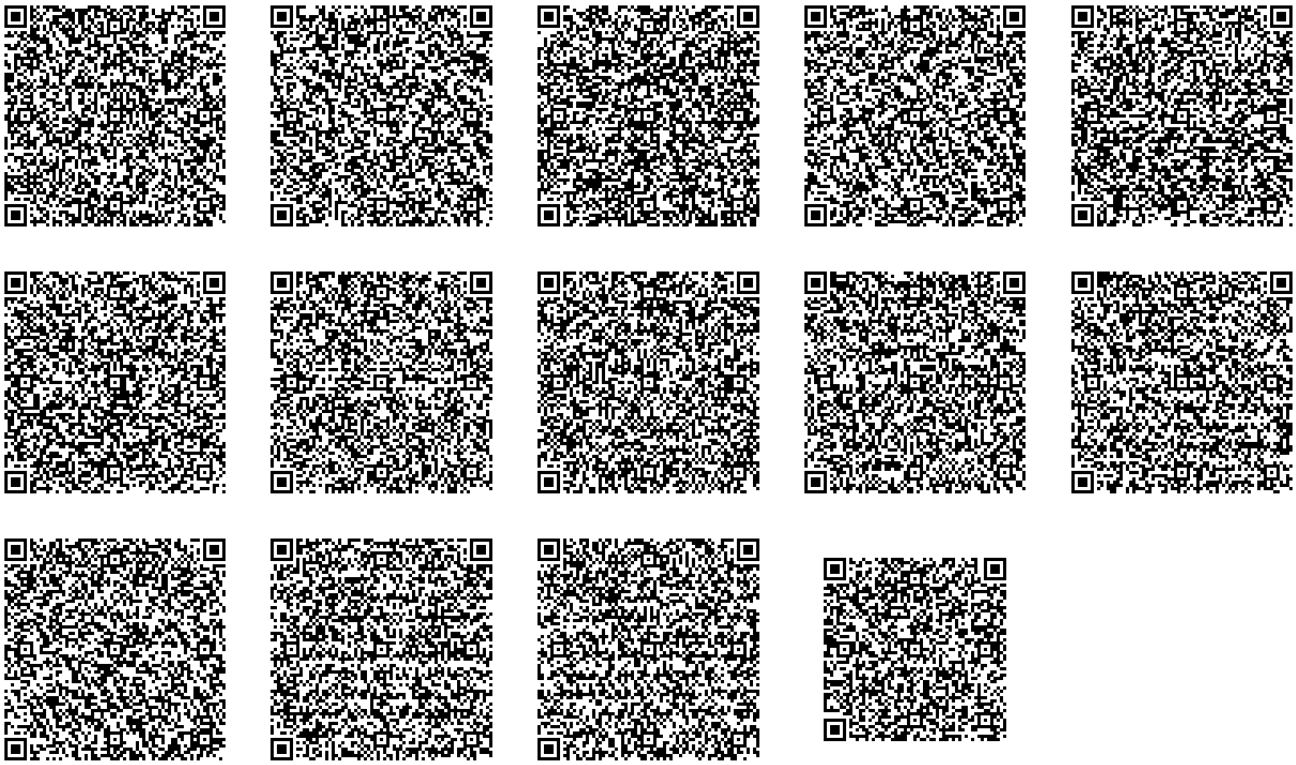
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	20.12.2024 05:22
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	20.12.2024 07:26
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:42
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:45
841004301126 - ОРАЛБЕКОВ БОЛАТБЕК БАТЫРОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.12.2024 06:51
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	20.12.2024 08:29
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	20.12.2024 10:59
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	20.12.2024 11:40 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.12.2024 16:44 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.12.2024 17:05
