Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от "2 " апреля 2019 года №178

Заказчик: **Акционерное общество «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, г. Астана, улица Сыганак, строение 17/10**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060840008183			**96**	**24.05.2023**		
				Дополнительное соглашение №1	**19.12.2023**		
				Дополнительное соглашение №2	**24.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №3	**28.02.2024**		
				Дополнительное соглашение №4	**16.04.2024**		
				Дополнительное соглашение №5	**24.06.2024**		
				Дополнительное соглашение №6	**31.07.2024**		
				Дополнительное соглашение №7	**15.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №8	**19.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №9	**29.08.2024**		
				Дополнительное соглашение №10	**13.12.2024**		
				Дополнительное соглашение №11	**30.12.2024**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	3 818 800 920	851 764 212	3 409 643 678,57				409 157 241,43	3 818 800 920
в том числе: за апрель месяц 2025 года	366 551 893	366 551 893	327 278 475,89				39 273 417,11	366 551 893

М.П.

Заказчик Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический надзор Заместитель директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813, Бердаулетов С.К. действующий на основании доверенности №45 от 07.12.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#6b386c07-8851-4b90-aa6a-7c5e5ea14f1c)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183, г. Кызылорда, мкр Левый берег, 3/21А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест"

Реестр актов выполненных работ
за апрель месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №76	Архитектурно-строительная часть	-269 407 355
2	Акт №77	Архитектурно-строительная часть	48 433 474
3	Акт №78	Архитектурно-строительная часть	37 482 431
4	Акт №79	Архитектурно-строительная часть	176 201 237
5	Акт №80	Отопление. Вентиляция	-4 145 585
6	Акт №81	Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация	341 459
7	Акт №82	Автоматическая пожарная сигнализация	341 665
8	Акт №83	Благоустройство	438 513
9	Акт №84	Технологическое оборудование	1 935 308
10	Акт №85	Система контроля и управления доступом	11 748 623
11	Акт №86	Водопровод. Канализация	39 962 768
12	Акт №87	Отопление. Вентиляция	55 806 208
13	Акт №88	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации	481 970
14	Акт №89	Наружные газопроводы	824 902
15	Акт №90	Архитектурно-строительная часть	9 792 224
16	Акт №91	Конструкции железобетонные	2 253 217
17	Акт №92	Конструкции металлические	9 485 399
18	Акт №93	Архитектурно-строительная часть	27 977 546
19	Акт №94	Водопровод. Канализация	6 136 834
20	Акт №95	Отопление. Вентиляция	24 041 909
21	Акт №96	Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация	2 858 705
22	Акт №97	Технологическое оборудование	37 085 161
23	Акт №98	Электросила. Наружные электрические сети КЛ-0,4 кВ	5 948 474
24	Акт №99	Благоустройство	140 526 806
		ИТОГО	**366 551 893**

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Куанышев Э.Т. (Доверенность № 295 от 14.11.2024 г.)**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183 Егізбайұлы Е.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Зам. Директора ТОО "Сартобе", БИН 050540003813,** **Бердаулетов С.К.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#6b386c07-8851-4b90-aa6a-7c5e5ea14f1c)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	Подписано: 08.04.2025 14:57
Технический надзор: ИИН 870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН null	Заместитель директора	Подписано: 08.04.2025 15:11
Заказчик: ИИН 910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР null	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	Подписано: 08.04.2025 15:20
Заказчик: ИИН 830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД null		Подписано: 08.04.2025 15:31

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#6b386c07-8851-4b90-aa6a-7c5e5ea14f1c)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#6b386c07-8851-4b90-aa6a-7c5e5ea14f1c)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#6b386c07-8851-4b90-aa6a-7c5e5ea14f1c)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна (листы АР-5.1...5.4)				
1	9	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	-53.6	7 495	-401 732
2	10	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-17,ОК-18/	м2	-53.6	46 138	-2 472 971
3	11	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	-28.8	3 399	-97 891
4	12	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	-28.8	1 655	-47 664
5	13	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	м2	-359.574	575	-206 755
6	14	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	м2	-359.574	4 971	-1 787 442
7	15	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	-467	2 259	-1 054 953
			Итого по подразделу: Окна (листы АР-5.1...5.4)				**-6 069 408**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				
8	18	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	-293.8	19 389	-5 696 488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	261-102-0120 РСНБ РК 2022	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	-1.67466	576 228	-964 986
10	20	223-301-0206 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	-51.555	141 200	-7 279 566
11	21	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	-145.145	127 323	-18 480 297
12	22	223-102-0601 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /ВН-10,ВН-4/	м2	-97.1	37 704	-3 661 058
13	24	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	-17	5 110	-86 870
14	25	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	-17	5 650	-96 050
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				**-36 265 315**
			Подраздел: Защитная сетка (витраж ВН-10 спортзала) /лист АР-72/				
15	26	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	-0.101052	220 513	-22 283
16	27	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	-0.076752	1 140 313	-87 521
17	28	217-202-0503 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	-99.9	278	-27 772
18	29	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	-2.225808	192	-427
			Итого по подразделу: Защитная сетка (витраж ВН-10 спортзала) /лист АР-72/				**-138 003**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				
19	30	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока витражного из ПВХ/алюминий/	м2	-126.8	5 541	-702 599
20	31	223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	-59.67	129 268	-7 713 412
21	32	223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	-21.33	115 865	-2 471 408

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	33	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	-14.28	123 298	-1 760 695
23	34	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	-31.52	110 393	-3 479 587
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				**-16 127 701**
			Подраздел: Замки и доводчики				
24	46	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	-12	5 110	-61 320
25	47	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	-12	5 650	-67 800
26	48	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	-180	4 853	-873 540
27	49	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	-1	2 310	-2 310
			Итого по подразделу: Замки и доводчики				**-1 004 970**
			Итого по разделу: Проемы				**-59 605 397**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 3				
28	70	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	-164.94	954	-157 353
29	71	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	-164.94	422	-69 605
			Итого по подразделу: Тип 3				**-226 958**
			Подраздел: Тип 4				
30	72	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	-115.81	954	-110 483
31	73	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	-115.81	422	-48 872
			Итого по подразделу: Тип 4				**-159 355**
			Подраздел: Тип 7				
32	95	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-610.74	1 295	-790 908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	96	233-101-0403 СпрСЦ 05.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	-635.1696	24 975	-15 863 361
			Итого по подразделу: Тип 7				**-16 654 269**
			Подраздел: Тип 8				
34	115	6109-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	-24.02	7 718	-185 386
35	116	6109-0202-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303	м2	-24.02	5 702	-136 962
			Итого по подразделу: Тип 8				**-322 348**
			Подраздел: Тип 12				
36	178	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1/3/ мм	м2	-107.29	7 726	-828 923
37	179	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	-0.225309	5 215	-1 175
38	180	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м2	-107.29	10 226	-1 097 148
39	181	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	-0.021458	5 215	-112
			Итого по подразделу: Тип 12				**-1 927 358**
			Подраздел: Тип 14				
40	222	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-724.95	1 295	-938 810
41	223	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	-753.948	5 214	-3 931 085
42	224	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-443.7	513	-227 618
43	225	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-448.137	179	-80 217
			Итого по подразделу: Тип 14				**-5 177 730**
			Подраздел: Тип 14.1				
44	240	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-111.72	1 295	-144 677

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	241	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 /кислотостойкий/	м2	-116.1888	5 214	-605 808
46	242	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-57.4	513	-29 446
47	243	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-57.974	179	-10 377
			Итого по подразделу: Тип 14.1				**-790 308**
			Подраздел: Тип 15				
48	254	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	-293.41	1 435	-421 043
49	255	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-1643.096	110	-180 741
50	256	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-938.912	110	-103 280
51	257	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	-293.41	9 815	-2 879 819
52	258	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-103.87	1 230	-127 760
53	259	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	-6.2322	3 632	-22 635
			Итого по подразделу: Тип 15				**-3 735 278**
			Подраздел: Тип 20.1				
54	373	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	-405.8	1 435	-582 323
55	374	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-2272.48	110	-249 973
56	375	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-1298.56	110	-142 842
57	376	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-405.8	299	-121 334

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	377	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-405.8	1 295	-525 511
59	378	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	-422.032	5 214	-2 200 475
60	379	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-254	513	-130 302
61	380	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-256.54	179	-45 921
			Итого по подразделу: Тип 20.1				**-3 998 681**
			Подраздел: Тип 24				
62	440	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	-273.05	1 435	-391 827
63	441	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-1529.08	110	-168 199
64	442	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-873.76	110	-96 114
65	443	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-273.05	299	-81 642
66	444	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-273.05	1 295	-353 600
67	445	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	-283.972	5 214	-1 480 630
68	446	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-150.5	513	-77 206
69	447	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-152.005	179	-27 209
			Итого по подразделу: Тип 24				**-2 676 427**
			Подраздел: Тип 26				
70	467	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	-134.63	5 134	-691 190

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	468	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	-150.7856	435	-65 592
72	469	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	-84.63	9 815	-830 643
			Итого по подразделу: Тип 26				**-1 587 425**
			Подраздел: Тип 28				
73	494	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-888.26	1 295	-1 150 297
74	495	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	-923.7904	5 214	-4 816 643
75	496	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-588.3	513	-301 798
76	497	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-594.183	179	-106 359
			Итого по подразделу: Тип 28				**-6 375 097**
			Подраздел: Тип 28.1				
77	510	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-185.2	1 295	-239 834
78	511	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 /антистатический/	м2	-192.608	5 214	-1 004 258
79	512	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-93.8	513	-48 119
80	513	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-94.738	179	-16 958
			Итого по подразделу: Тип 28.1				**-1 309 169**
			Подраздел: Тип 30				
81	567	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	-349.04	1 435	-500 872
82	568	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-1954.624	110	-215 009
83	569	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	-1116.928	110	-122 862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	570	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	-349.04	1 295	-452 007
85	571	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	-363.0016	5 214	-1 892 690
86	572	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	-195.18	513	-100 127
87	573	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	-197.1318	179	-35 287
			Итого по подразделу: Тип 30				**-3 318 854**
			Итого по разделу: Полы				**-48 259 257**
			Раздел: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				
			Подраздел: Потолки				
88	609	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	-422.58	1 256	-530 760
89	610	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-0.2915802	199 032	-58 034
			Итого по подразделу: Потолки				**-588 794**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
90	615	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	-222.09	1 252	-278 057
91	616	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	-610.52541	76	-46 400
92	620	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	-381.65	1 856	-708 342
93	621	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-0.2404395	199 032	-47 855
94	622	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	-141.97	1 116	-158 439
95	623	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-0.0894411	199 032	-17 802
96	624	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	-228.61	973	-222 438

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	625	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	-27.14856	790	-21 447
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**-1 500 780**
			Подраздел: Потолки				
98	630	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	-1187.32	1 256	-1 491 274
99	631	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-0.8192508	199 032	-163 057
100	632	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	-243.18	1 158	-281 602
101	633	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	-60.795	278	-16 901
102	634	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	-243.18	614	-149 313
103	635	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	-36.477	278	-10 141
			Итого по подразделу: Потолки				**-2 112 288**
			Подраздел: Стены и перегородки				
104	659	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	-3133.86	1 116	-3 497 388
105	660	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-1.9743318	199 032	-392 955
106	661	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	-2912.86	1 856	-5 406 268
107	662	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-1.8351018	199 032	-365 244
108	663	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	-712.95	1 158	-825 596
109	664	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	-178.2375	278	-49 550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	665	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	-712.95	614	-437 751
111	666	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	-106.9425	278	-29 730
112	669	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	-143	354	-50 622
113	670	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	-4.4187	31 847	-140 722
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**-11 195 826**
			Подраздел: Потолки				
114	673	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	-1511.23	1 256	-1 898 105
115	674	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-1.0427487	199 032	-207 540
			Итого по подразделу: Потолки				**-2 105 645**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
116	689	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	-3034.35	1 122	-3 404 541
117	690	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-1.9116405	199 032	-380 478
118	691	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	-1830.82	1 856	-3 398 002
119	692	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	-1.1534166	199 032	-229 567
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**-7 412 588**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				**-24 915 921**
			Раздел: Кровля (лист АР-10)				
			Подраздел: Тип 1				
120	706	6118-0101-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм	м2	-500	3 874	-1 937 000
121	707	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	-4.0231	538 333	-2 165 768

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 1				**-4 102 768**
			Итого по разделу: Кровля (лист АР-10)				**-4 102 768**
			Раздел: Навес для приямка, Приямок (АР-40.1...41.3)				
			Подраздел: Навес приямка Пр-1(лист 40.3)				
122	852	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	-1.973298	63 710	-125 719
123	853	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	-1.3779	100 375	-138 307
124	854	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	-3.351198	1 160 502	-3 889 072
125	855	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-51.305748	248	-12 724
126	856	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	-51.305748	385	-19 753
127	857	6110-0101-0510 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	-41.28	6 165	-254 491
128	858	224-102-1006 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	-41.28	3 992	-164 790
129	859	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер	1000 шт.	-0.054	659 944	-35 637
130	860	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг(ЗД-1)	т	-0.10728	1 279 987	-137 317
131	861	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг(ЗД-2,ЗД-3)	т	-0.03264	1 467 786	-47 909
132	862	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	-0.00612	272 684	-1 669
133	863	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	-0.00612	357 986	-2 191
134	864	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-3.79704	248	-942

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	865	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	-3.79704	385	-1 462
136	866	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	-11.94	4 491	-53 623
137	867	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	-0.068058	538 333	-36 638
			Итого по подразделу: Навес приямка Пр-1(лист 40.3)				**-4 922 244**
			Итого по разделу: Навес для приямка, Приямок (АР-40.1...41.3)				**-4 922 244**
			Раздел: Отмостка, цоколь (лист 43.3)				
			Подраздел: РОтмостка				
138	958	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем /до толщ.250мм/	м2	-228	2 812	-641 136
139	959	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	-53.9	39 626	-2 135 841
140	960	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	-1.41075	59 456	-83 878
141	961	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	-1.41075	518 798	-731 894
142	963	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	-361	3 395	-1 225 595
143	964	212-102-0106 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	-7.29	29 631	-216 010
144	965	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	-361	1 508	-544 388
			Итого по подразделу: РОтмостка				**-5 578 742**
			Подраздел: Цоколь /тип 2/				
145	966	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем /лист 24/	м2	-358.33	17 040	-6 105 943
146	967	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	-3009.972	67	-201 668
147	968	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	-1827.483	54	-98 684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	969	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм /тип 2,тип 1/	м2	-365.4966	4 732	-1 729 530
149	970	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	-248.352	120	-29 802
150	971	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	-19.104	39 491	-754 436
			Итого по подразделу: Цоколь /тип 2/				**-8 920 063**
			Итого по разделу: Отмостка, цоколь (лист 43.3)				**-14 498 805**
			Раздел: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				
			Подраздел: ВГ-1, ВГ-2 ВГ-3(лист 50.4, 50.5)				
151	1009	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	-37.8	7 635	-288 603
152	1010	231-201-0308 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	-28.87	18 602	-537 040
153	1011	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	-8.93	3 632	-32 434
154	1012	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2	-216.92	18 366	-3 983 953
155	1013	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	-203.58	17 940	-3 652 225
156	1014	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	-13.34	13 429	-179 143
157	1015	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада линеарные панелями	м2	-43.14	2 018	-87 057
158	1016	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	-43.14	4 956	-213 802
159	1017	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	-41.57	4 785	-198 912
160	1018	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	-0.0703	289 515	-20 353

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
161	1019	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	-0.0703	167 407	-11 769
			Итого по подразделу: ВГ-1, ВГ-2 ВГ-3(лист 50.4, 50.5)				**-9 205 291**
			Итого по разделу: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				**-9 205 291**
			Раздел: Крыльцо. Навес				
			Подраздел: Ограждение ОГ-1- ОГ-4 (АР-58)				
162	1088	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	-222.49	6 448	-1 434 616
163	1089	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	-152.53	29 813	-4 547 377
164	1090	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	-69.96	33 336	-2 332 187
			Итого по подразделу: Ограждение ОГ-1- ОГ-4 (АР-58)				**-8 314 180**
			Подраздел: Стремянка Ст-1...4 (АР-66.1 ... 66.3)				
165	1182	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	-0.73711	237 208	-174 848
166	1183	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0.72347	1 146 761	-829 647
167	1184	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	-224	33	-7 392
168	1185	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-21.37619	248	-5 301
169	1186	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	-21.37619	385	-8 230
			Итого по подразделу: Стремянка Ст-1...4 (АР-66.1 ... 66.3)				**-1 025 418**
			Подраздел: Узлы кровли К-1-7 (листы АР-68.4)				
170	1226	6110-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	-488.8	1 608	-785 990
171	1227	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	-2.49288	28 485	-71 010
172	1228	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм - Техноэласт соло ЭКМ	м2	-366.6	3 053	-1 119 230

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
173	1229	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - Фартуков Ф-1 - Ф-4	м2	-487.8	4 517	-2 203 393
174	1230	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыли К-1 - К-5/	т	-0.873	272 684	-238 053
175	1231	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	-0.873	357 986	-312 522
176	1232	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-25.317	248	-6 279
177	1233	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	-25.317	385	-9 747
			Итого по подразделу: Узлы кровли К-1-7 (листы АР-68.4)				**-4 746 224**
			Подраздел: Элементы сцены (АР-74.2)				
178	1257	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	-2.63679	647 260	-1 706 689
179	1258	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	-2.46389	438 481	-1 080 369
180	1259	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	-0.1083	498 871	-54 028
181	1260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0.0646	365 165	-23 590
182	1261	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-76.46691	248	-18 964
183	1262	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	-76.46691	385	-29 440
184	1263	6107-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного	м2	-37.8	6 746	-254 999
185	1264	6107-0102-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка досками	м2	-24.4	1 931	-47 116
186	1265	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	-24.4	2 897	-70 687
			Итого по подразделу: Элементы сцены (АР-74.2)				**-3 285 882**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Крыльцо. Навес				**-17 371 704**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**-182 881 387**
			ИТОГО по акту:				**-182 881 387**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				-182881386.942 x 8.10%	-14 813 393
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				-182881386.942 + -14813393.040	-197 694 780
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				-182881386.942 x 0.05409035%	-9 892 118
		Сметная прибыль, (5.00%)				-197694779.982 x 5.00%	-9 884 739
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(-197694779.982 + -9892117.705) x 5.000%	-10 379 345
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					-227 850 982
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				-227850981.571 x 1.0557	-240 542 281
		НДС (12%)				-240542281.245 x 12%	-28 865 074
		Итого с НДС				-240542281.245 + -28865073.749	-269 407 355

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:41
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:50
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:24
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:01
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:48
Представители заказчика		
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:38
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:44
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:39

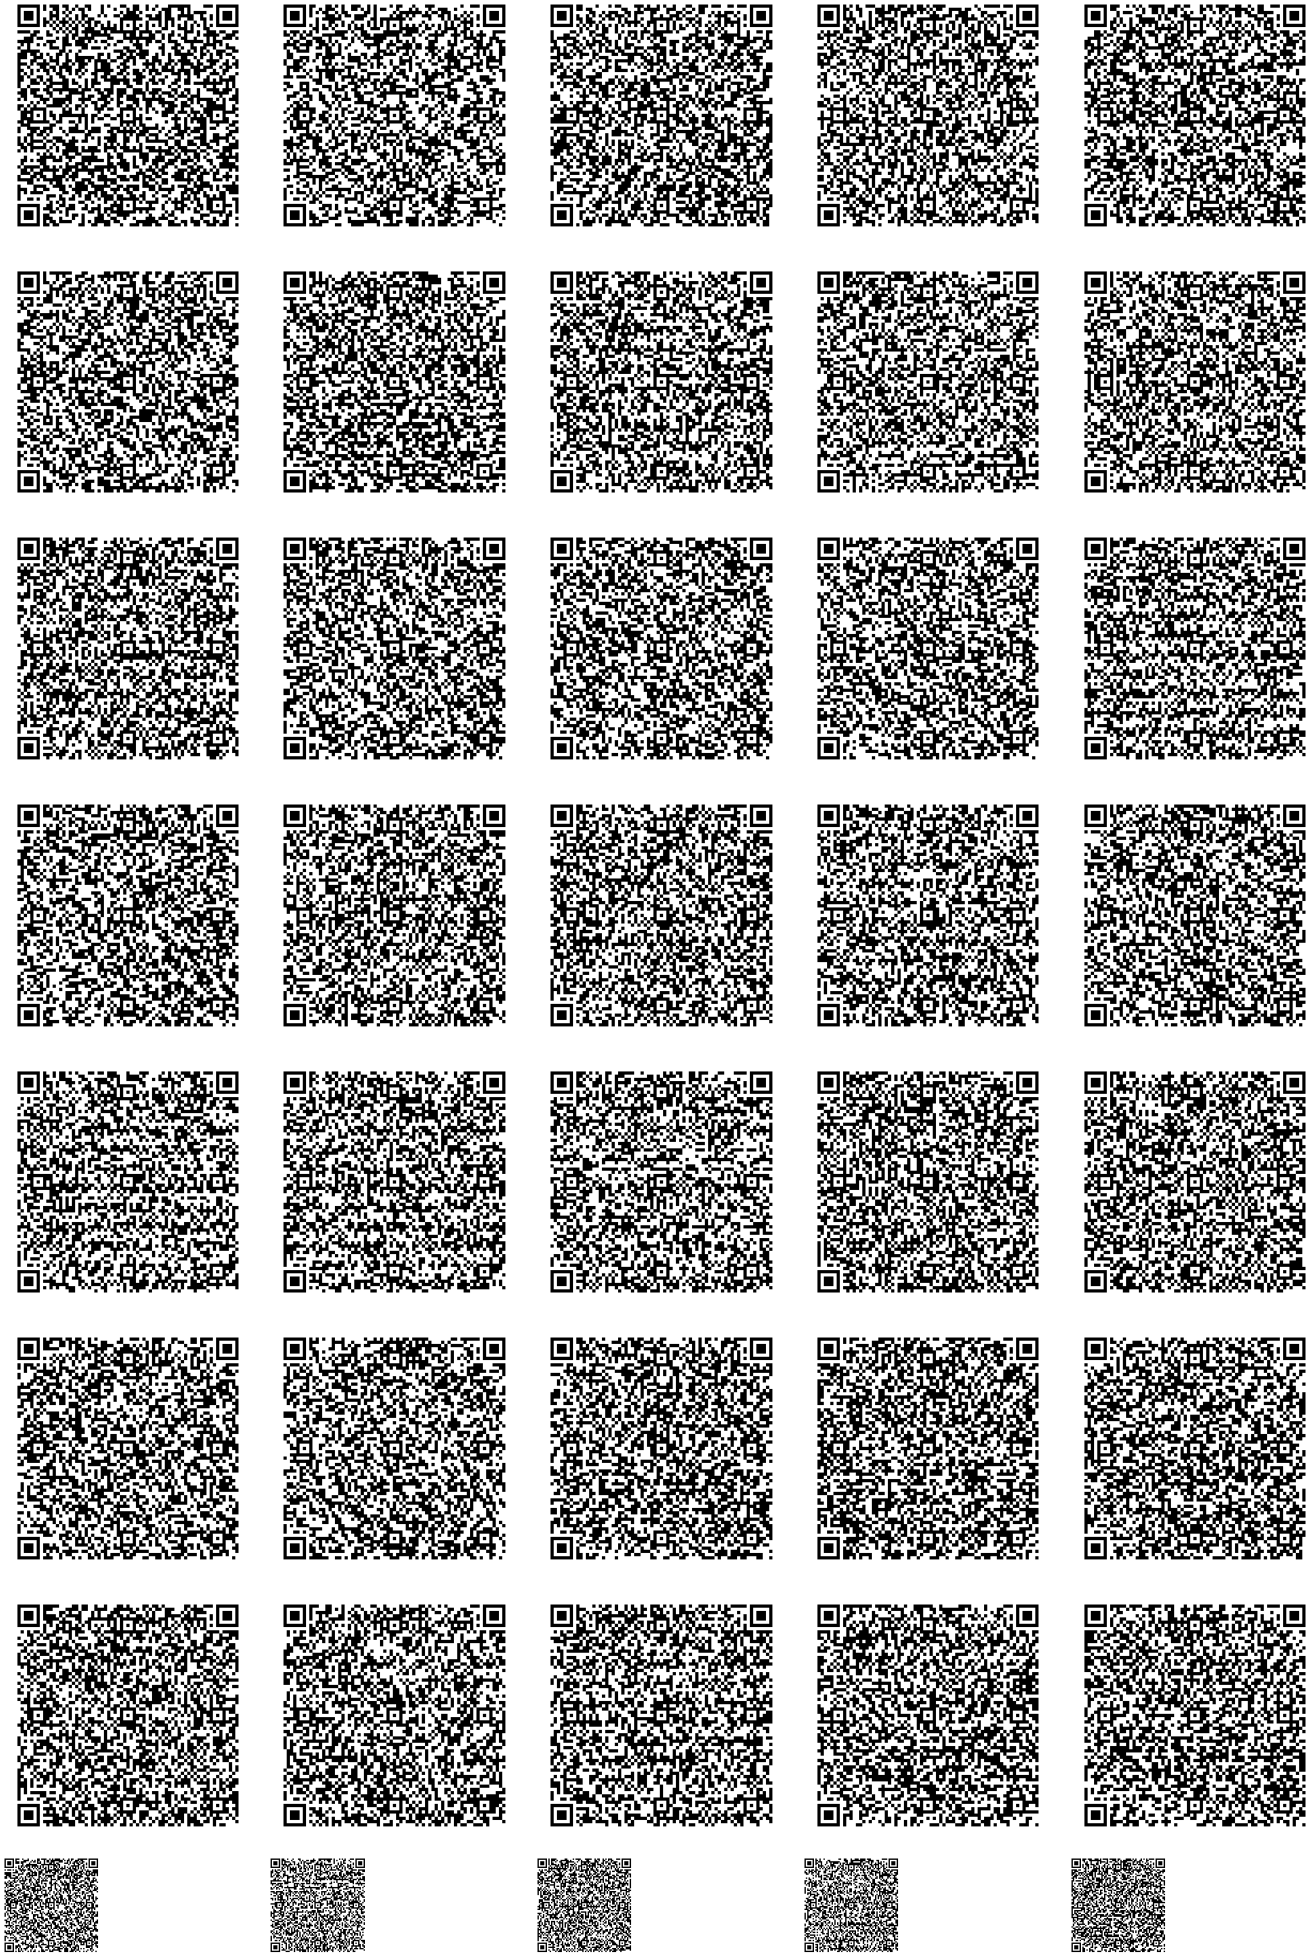

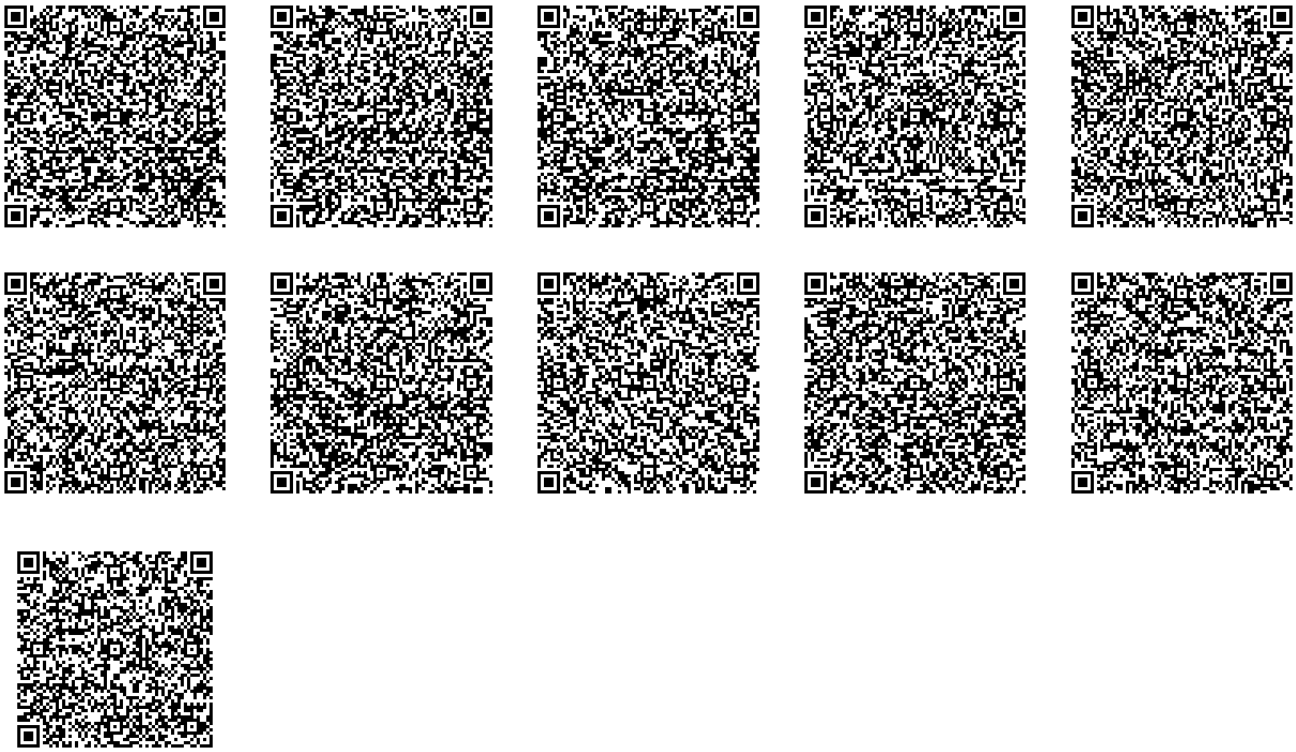

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				
1	30	6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока витражного из ПВХ/алюминий/	м2	126.8	5 541	702 599
2	31	223-301-0202 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	59.67	129 268	7 713 412
3	32	223-301-0102 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	21.33	115 865	2 471 408
4	33	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	14.28	123 298	1 760 695
5	34	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	31.52	110 393	3 479 587
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				**16 127 701**
			Итого по разделу: Проемы				**16 127 701**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 7				
6	95	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	610.74	1 295	790 908
7	96	233-101-0403 СпрСЦ 05.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	635.1696	24 975	15 863 361

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 7				**16 654 269**
			Подраздел: Тип 12				
8	178	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1/3/ мм	м2	107.29	7 726	828 923
9	179	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	0.225309	5 215	1 175
10	180	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м2	107.29	10 226	1 097 148
11	181	211-402-0101 РСНБ РК 2022	Песок кварцевый строительный	т	0.021458	5 215	112
			Итого по подразделу: Тип 12				**1 927 358**
			Итого по разделу: Полы				**18 581 627**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**34 709 328**
			ИТОГО по акту:				**34 709 328**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	34709327.840 x 8.10%	2 811 456
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	34709327.840 + 2811455.687	37 520 784
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	34709327.840 x 0.05409035%	1 877 440
	Сметная прибыль, (5.00%)	37520783.527 x 5.00%	1 876 039
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(37520783.527 + 1877439.592) x 5.000%	1 969 911
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		43 244 173
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2023 год , к = 1.0000	43244173.452 x 1.0000	43 244 173
	НДС (12%)	43244173.452 x 12%	5 189 301
	Итого с НДС	43244173.452 + 5189300.814	48 433 474

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:41
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:03
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:50
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:24
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:49
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:39
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:45
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:40
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

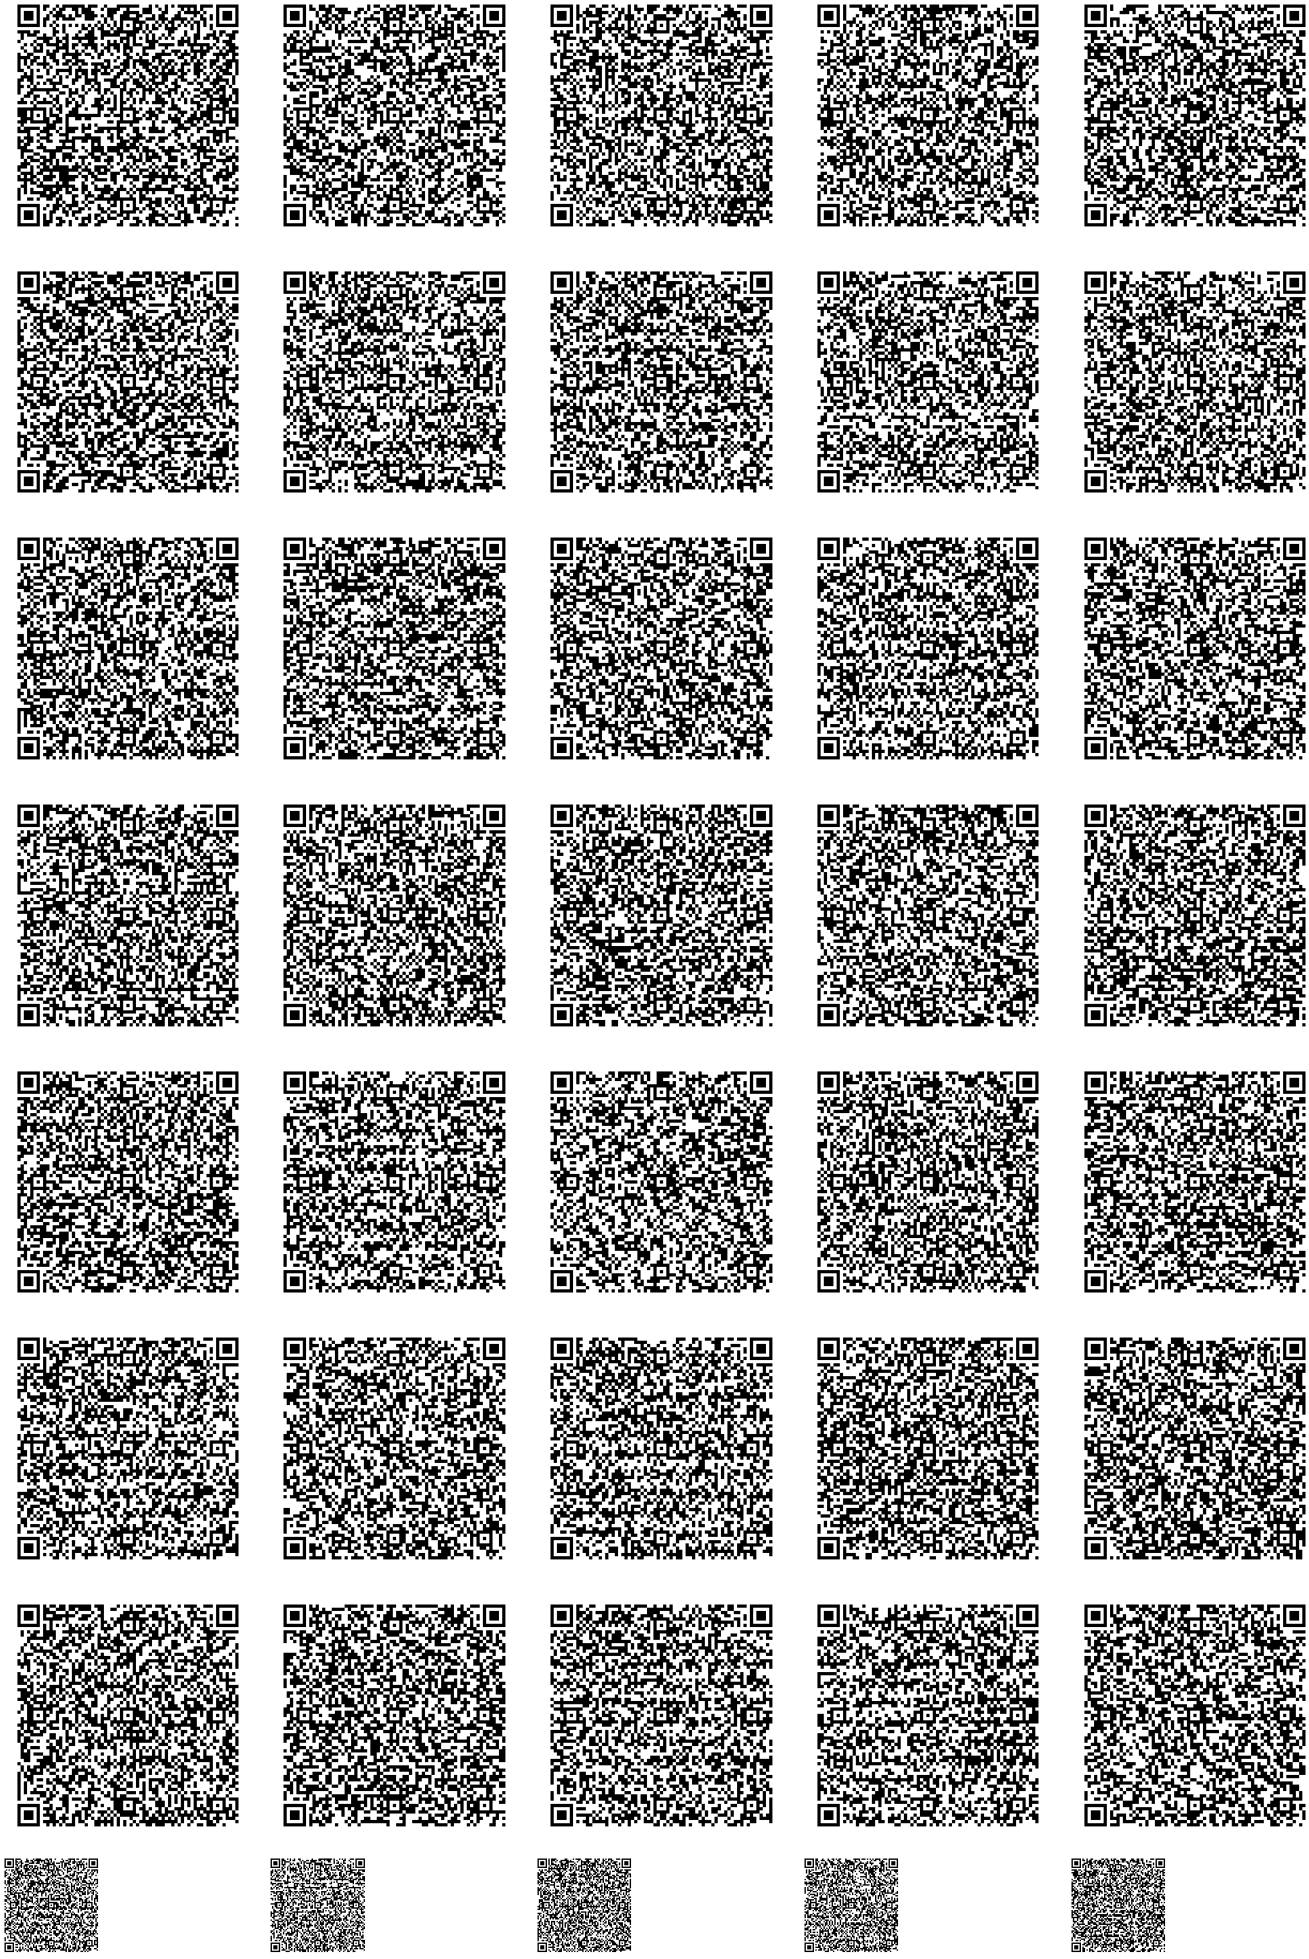

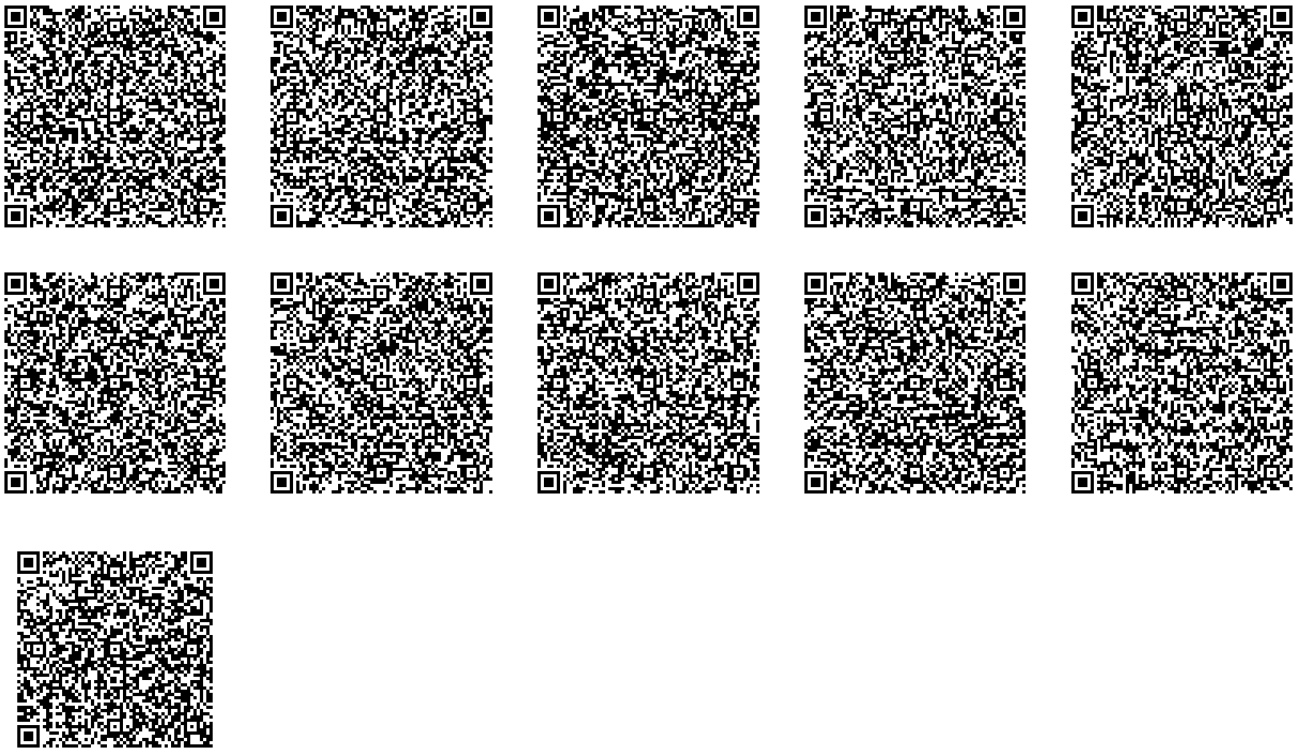

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Защитная сетка (витраж ВН-10 спортзала) /лист АР-72/				
1	26	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.101052	220 513	22 283
2	27	222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0.076752	1 140 313	87 521
3	28	217-202-0503 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	99.9	278	27 772
4	29	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.225808	192	427
			Итого по подразделу: Защитная сетка (витраж ВН-10 спортзала) /лист АР-72/				**138 003**
			Подраздел: Замки и доводчики				
5	46	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	12	5 110	61 320
6	47	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	12	5 650	67 800
7	48	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	180	4 853	873 540
8	49	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2 310	2 310

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Замки и доводчики				**1 004 970**
			Итого по разделу: Проемы				**1 142 973**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 8				
9	115	6109-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	24.02	7 718	185 386
10	116	6109-0202-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0303	м2	24.02	5 702	136 962
			Итого по подразделу: Тип 8				**322 348**
			Итого по разделу: Полы				**322 348**
			Раздел: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				
			Подраздел: Потолки				
11	609	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	422.58	1 256	530 760
12	610	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.2915802	199 032	58 034
			Итого по подразделу: Потолки				**588 794**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
13	615	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	222.09	1 252	278 057
14	616	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	610.52541	76	46 400
15	620	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	381.65	1 856	708 342
16	621	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.2404395	199 032	47 855
17	622	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	141.97	1 116	158 439
18	623	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.0894411	199 032	17 802
19	624	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	228.61	973	222 438

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	625	236-202-1014 РСНБ РК 2022	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27.14856	790	21 447
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**1 500 780**
			Подраздел: Потолки				
21	630	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	1187.32	1 256	1 491 274
22	631	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0.8192508	199 032	163 057
23	632	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	243.18	1 158	281 602
24	633	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	60.795	278	16 901
25	634	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	243.18	614	149 313
26	635	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	36.477	278	10 141
			Итого по подразделу: Потолки				**2 112 288**
			Подраздел: Стены и перегородки				
27	659	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	3133.86	1 116	3 497 388
28	660	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.9743318	199 032	392 955
29	661	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	2912.86	1 856	5 406 268
30	662	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.8351018	199 032	365 244
31	663	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	712.95	1 158	825 596
32	664	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	178.2375	278	49 550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	665	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	712.95	614	437 751
34	666	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	106.9425	278	29 730
35	669	6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	143	354	50 622
36	670	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	4.4187	31 847	140 722
			Итого по подразделу: Стены и перегородки				**11 195 826**
			Подраздел: Потолки				
37	673	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	1511.23	1 256	1 898 105
38	674	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.0427487	199 032	207 540
			Итого по подразделу: Потолки				**2 105 645**
			Подраздел: Стены и перегородки, колонны				
39	689	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	3034.35	1 122	3 404 541
40	690	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.9116405	199 032	380 478
41	691	6112-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	1830.82	1 856	3 398 002
42	692	236-202-0301 РСНБ РК 2022	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1.1534166	199 032	229 567
			Итого по подразделу: Стены и перегородки, колонны				**7 412 588**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				**24 915 921**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**26 381 242**
			ИТОГО по акту:				**26 381 242**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	26381242.000 x 8.10%	2 136 881
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	26381242.000 + 2136880.703	28 518 123
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	26381242.000 x 0.05409035%	1 426 971
	Сметная прибыль, (5.00%)	28518122.703 x 5.00%	1 425 906

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(28518122.703 + 1426970.538) x 5.000%	1 497 255
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					32 868 254
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				32868254.038 x 1.0182	33 466 456
		НДС (12%)				33466456.261 x 12%	4 015 975
		Итого с НДС				33466456.261 + 4015974.751	37 482 431

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:41
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:04
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:51
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:25
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:49
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:39
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:45
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:06 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:41

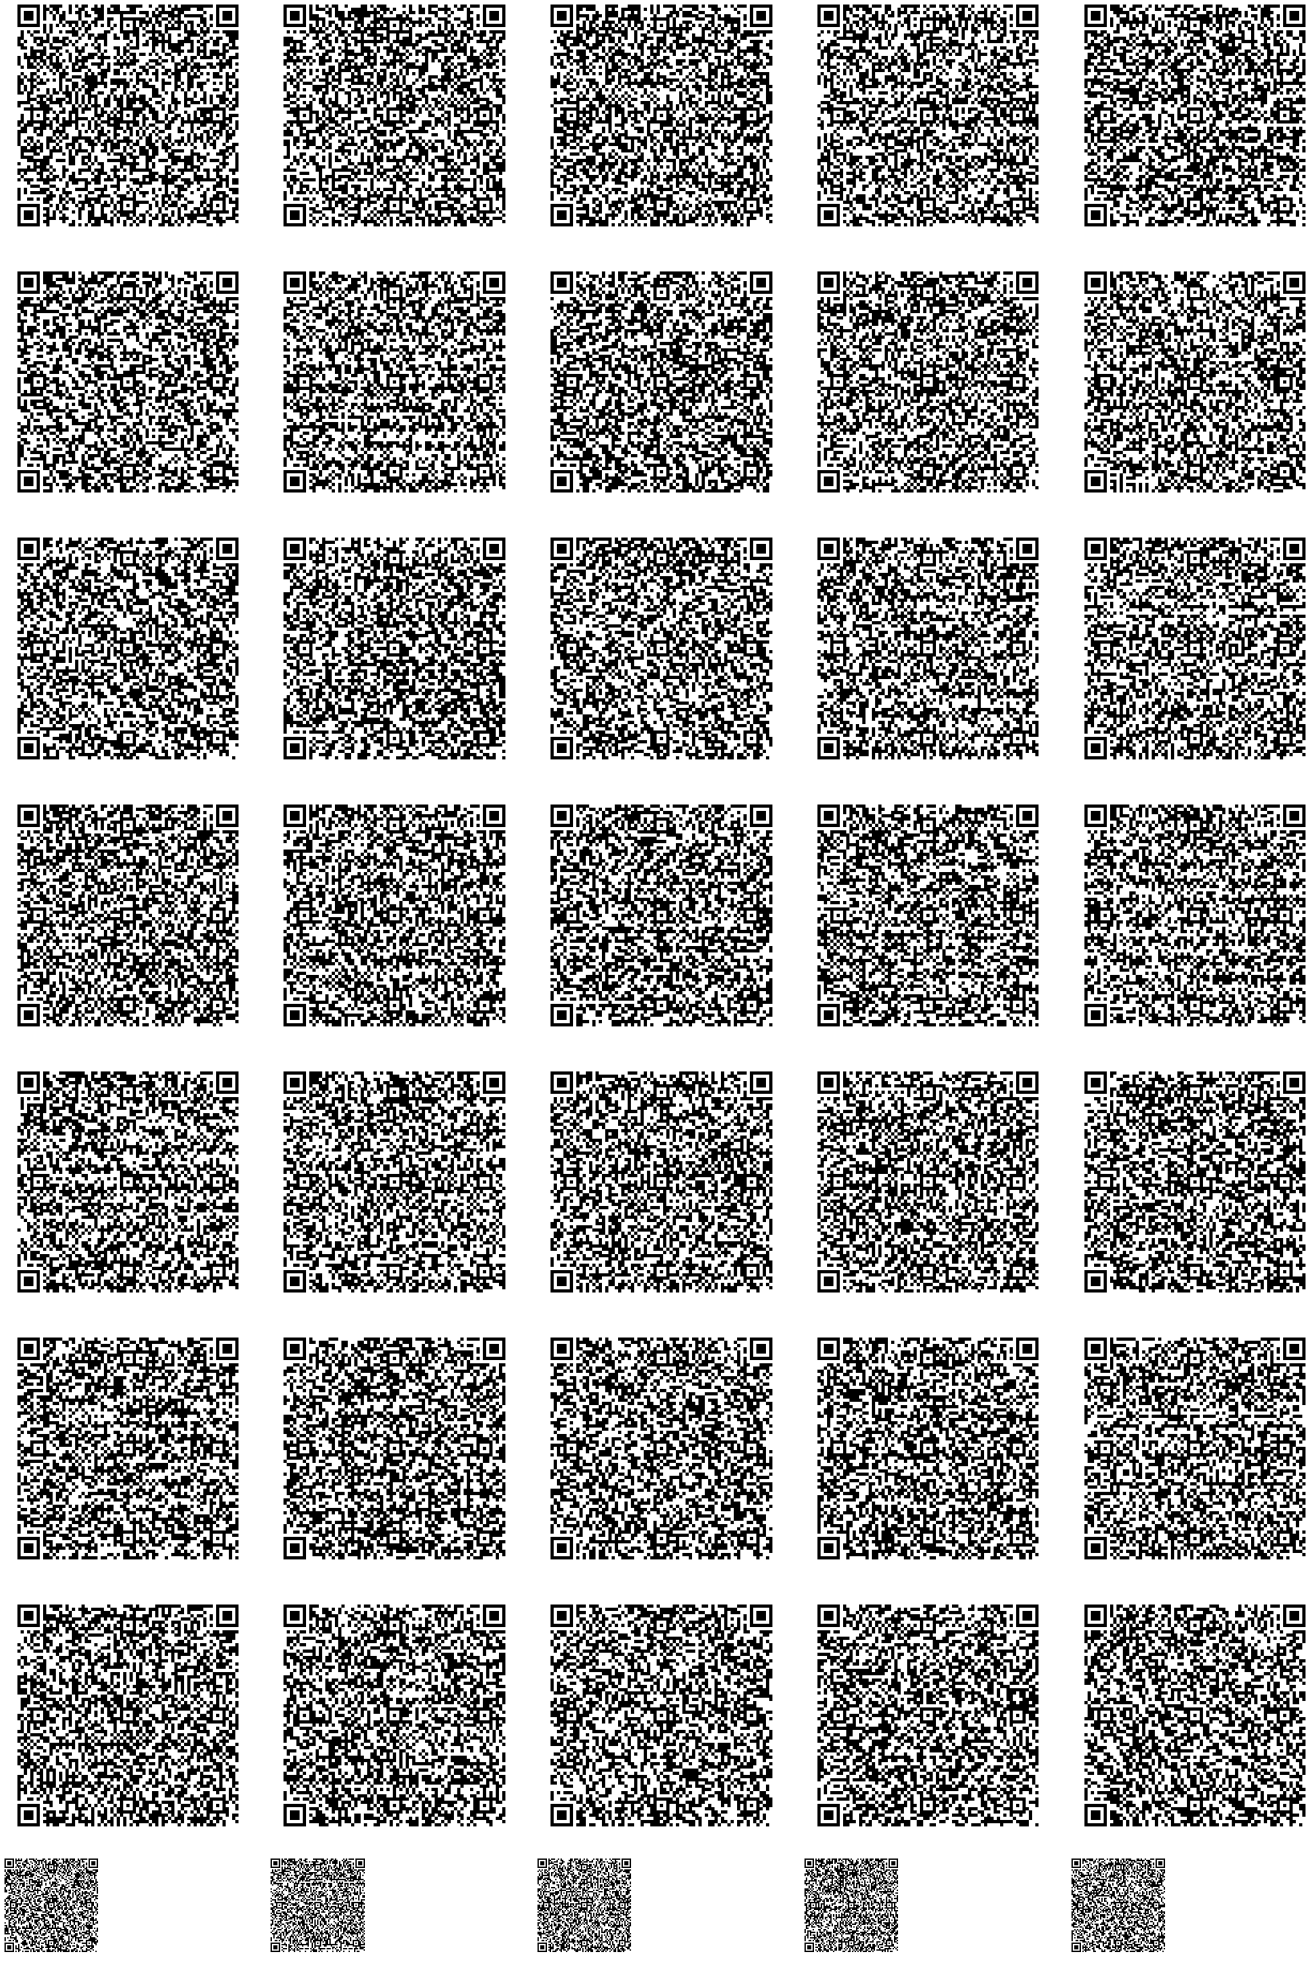

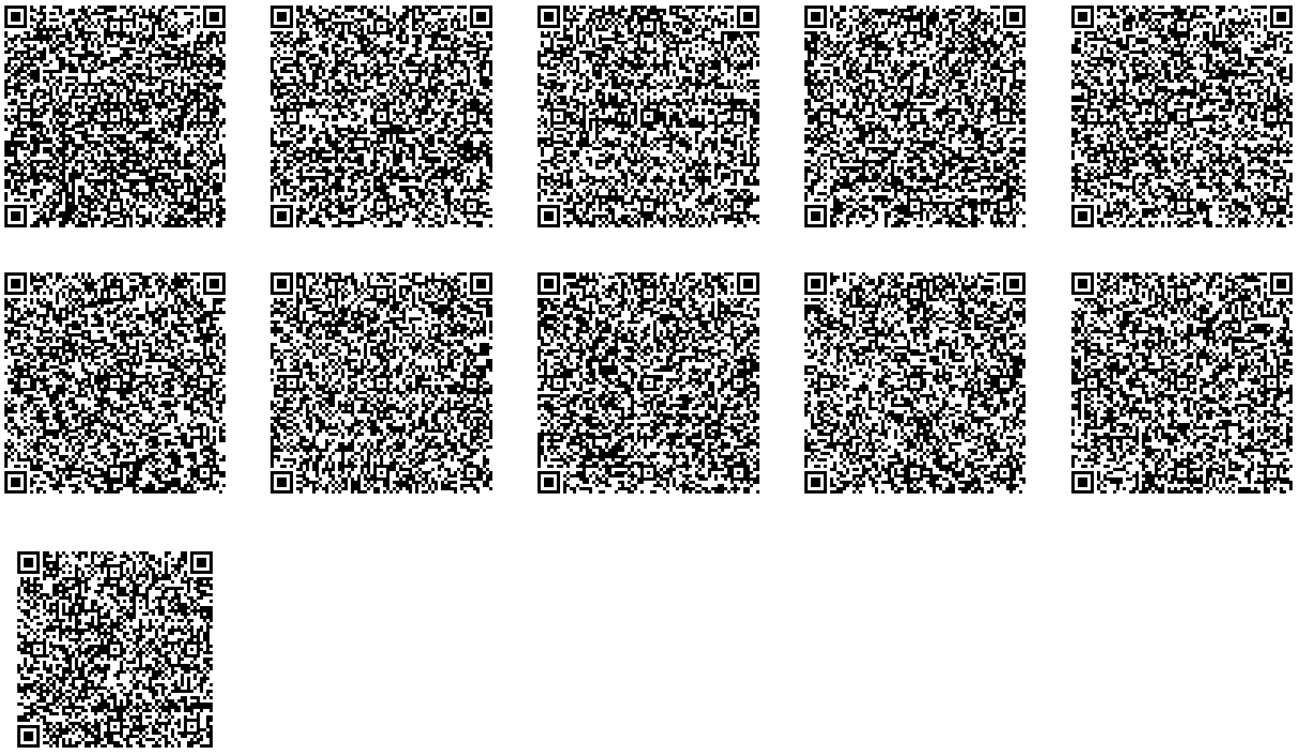

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна (листы АР-5.1...5.4)				
1	9	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53.6	7 495	401 732
2	10	223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками /ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5,ОК-6,ОК-17,ОК-18/	м2	53.6	46 138	2 472 971
3	11	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	28.8	3 399	97 891
4	12	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	28.8	1 655	47 664
5	13	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка сетки антимоскитной	м2	359.574	575	206 755
6	14	223-503-0401 РСНБ РК 2022	Сетка антимоскитная	м2	359.574	4 971	1 787 442
7	15	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	467	2 259	1 054 953
			Итого по подразделу: Окна (листы АР-5.1...5.4)				**6 069 408**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				
8	18	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	293.8	19 389	5 696 488

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	19	261-102-0120 РСНБ РК 2022	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	1.67466	576 228	964 986
10	20	223-301-0206 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	51.555	141 200	7 279 566
11	21	223-301-0106 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	145.145	127 323	18 480 297
12	22	223-102-0601 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой /ВН-10,ВН-4/	м2	97.1	37 704	3 661 058
13	24	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	17	5 110	86 870
14	25	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	17	5 650	96 050
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				**36 265 315**
			Итого по разделу: Проемы				**42 334 723**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 3				
15	70	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	164.94	954	157 353
16	71	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	164.94	422	69 605
			Итого по подразделу: Тип 3				**226 958**
			Подраздел: Тип 4				
17	72	6111-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м2	115.81	954	110 483
18	73	6111-0501-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ХВ-785	м2	115.81	422	48 872
			Итого по подразделу: Тип 4				**159 355**
			Подраздел: Тип 14				
19	222	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	724.95	1 295	938 810
20	223	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	753.948	5 214	3 931 085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	224	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	443.7	513	227 618
22	225	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	448.137	179	80 217
			Итого по подразделу: Тип 14				**5 177 730**
			Подраздел: Тип 14.1				
23	240	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	111.72	1 295	144 677
24	241	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 /кислотостойкий/	м2	116.1888	5 214	605 808
25	242	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	57.4	513	29 446
26	243	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	57.974	179	10 377
			Итого по подразделу: Тип 14.1				**790 308**
			Подраздел: Тип 15				
27	254	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	293.41	1 435	421 043
28	255	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1643.096	110	180 741
29	256	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	938.912	110	103 280
30	257	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	293.41	9 815	2 879 819
31	258	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса из керамогранита	м	103.87	1 230	127 760
32	259	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	6.2322	3 632	22 635
			Итого по подразделу: Тип 15				**3 735 278**
			Подраздел: Тип 20.1				
33	373	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	405.8	1 435	582 323

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	374	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	2272.48	110	249 973
35	375	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1298.56	110	142 842
36	376	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	405.8	299	121 334
37	377	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	405.8	1 295	525 511
38	378	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	422.032	5 214	2 200 475
39	379	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	254	513	130 302
40	380	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	256.54	179	45 921
			Итого по подразделу: Тип 20.1				**3 998 681**
			Подраздел: Тип 24				
41	440	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5/6/ мм	м2 стяжки	273.05	1 435	391 827
42	441	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1529.08	110	168 199
43	442	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	873.76	110	96 114
44	443	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	273.05	299	81 642
45	444	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	273.05	1 295	353 600
46	445	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	283.972	5 214	1 480 630
47	446	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	150.5	513	77 206

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	447	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	152.005	179	27 209
			Итого по подразделу: Тип 24				**2 676 427**
			Подраздел: Тип 26				
49	467	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	134.63	5 134	691 190
50	468	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	150.7856	435	65 592
51	469	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	84.63	9 815	830 643
			Итого по подразделу: Тип 26				**1 587 425**
			Подраздел: Тип 28				
52	494	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	888.26	1 295	1 150 297
53	495	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	923.7904	5 214	4 816 643
54	496	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	588.3	513	301 798
55	497	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	594.183	179	106 359
			Итого по подразделу: Тип 28				**6 375 097**
			Подраздел: Тип 28.1				
56	510	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	185.2	1 295	239 834
57	511	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34 /антистатический/	м2	192.608	5 214	1 004 258
58	512	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	93.8	513	48 119
59	513	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	94.738	179	16 958
			Итого по подразделу: Тип 28.1				**1 309 169**
			Подраздел: Тип 30				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	567	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	349.04	1 435	500 872
61	568	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1954.624	110	215 009
62	569	233-401-0501 РСНБ РК 2022	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006 М100	кг	1116.928	110	122 862
63	570	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из линолеума на клее	м2	349.04	1 295	452 007
64	571	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	363.0016	5 214	1 892 690
65	572	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	195.18	513	100 127
66	573	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	197.1318	179	35 287
			Итого по подразделу: Тип 30				**3 318 854**
			Итого по разделу: Полы				**29 355 282**
			Раздел: Кровля (лист АР-10)				
			Подраздел: Тип 1				
67	706	6118-0101-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм	м2	500	3 874	1 937 000
68	707	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	4.0231	538 333	2 165 768
			Итого по подразделу: Тип 1				**4 102 768**
			Итого по разделу: Кровля (лист АР-10)				**4 102 768**
			Раздел: Навес для приямка, Приямок (АР-40.1...41.3)				
			Подраздел: Навес приямка Пр-1(лист 40.3)				
69	852	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1.973298	63 710	125 719
70	853	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	1.3779	100 375	138 307
71	854	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	3.351198	1 160 502	3 889 072

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	855	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	51.305748	248	12 724
73	856	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	51.305748	385	19 753
74	857	6110-0101-0510 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	м2	41.28	6 165	254 491
75	858	224-102-1006 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	41.28	3 992	164 790
76	859	217-103-0106 РСНБ РК 2022	Анкер	1000 шт.	0.054	659 944	35 637
77	860	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес более 20 кг(ЗД-1)	т	0.10728	1 279 987	137 317
78	861	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг(ЗД-2,ЗД-3)	т	0.03264	1 467 786	47 909
79	862	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыль/	т	0.00612	272 684	1 669
80	863	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00612	357 986	2 191
81	864	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.79704	248	942
82	865	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3.79704	385	1 462
83	866	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	11.94	4 491	53 623
84	867	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.068058	538 333	36 638
			Итого по подразделу: Навес приямка Пр-1(лист 40.3)				**4 922 244**
			Итого по разделу: Навес для приямка, Приямок (АР-40.1...41.3)				**4 922 244**
			Раздел: Отмостка, цоколь (лист 43.3)				
			Подраздел: РОтмостка				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	958	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем /до толщ.250мм/	м2	228	2 812	641 136
86	959	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	53.9	39 626	2 135 841
87	960	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1.41075	59 456	83 878
88	961	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.41075	518 798	731 894
89	963	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	361	3 395	1 225 595
90	964	212-102-0106 РСНБ РК 2022	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	7.29	29 631	216 010
91	965	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	361	1 508	544 388
			Итого по подразделу: РОтмостка				**5 578 742**
			Подраздел: Цоколь /тип 2/				
92	966	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем /лист 24/	м2	358.33	17 040	6 105 943
93	967	217-109-0108 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	3009.972	67	201 668
94	968	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1827.483	54	98 684
95	969	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм /тип 2,тип 1/	м2	365.4966	4 732	1 729 530
96	970	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	248.352	120	29 802
97	971	234-101-0110 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м3	19.104	39 491	754 436
			Итого по подразделу: Цоколь /тип 2/				**8 920 063**
			Итого по разделу: Отмостка, цоколь (лист 43.3)				**14 498 805**
			Раздел: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				
			Подраздел: ВГ-1, ВГ-2 ВГ-3(лист 50.4, 50.5)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	1009	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	37.8	7 635	288 603
99	1010	231-201-0308 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	28.87	18 602	537 040
100	1011	231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	8.93	3 632	32 434
101	1012	6109-0306-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2	216.92	18 366	3 983 953
102	1013	231-201-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм	м2	203.58	17 940	3 652 225
103	1014	231-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	13.34	13 429	179 143
104	1015	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка фасада линеарные панелями	м2	43.14	2 018	87 057
105	1016	231-305-0502 СпрСЦ 05.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием высотой от 172 до 400 мм, шириной от 900 до 6000 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	43.14	4 956	213 802
106	1017	6111-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	41.57	4 785	198 912
107	1018	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0.0703	289 515	20 353
108	1019	261-301-0261 РСНБ РК 2022	Решетки для приямков стальные	т	0.0703	167 407	11 769
			Итого по подразделу: ВГ-1, ВГ-2 ВГ-3(лист 50.4, 50.5)				**9 205 291**
			Итого по разделу: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				**9 205 291**
			Раздел: Крыльцо. Навес				
			Подраздел: Ограждение ОГ-1- ОГ-4 (АР-58)				
109	1088	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	222.49	6 448	1 434 616
110	1089	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	152.53	29 813	4 547 377

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	1090	222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	69.96	33 336	2 332 187
			Итого по подразделу: Ограждение ОГ-1- ОГ-4 (АР-58)				**8 314 180**
			Подраздел: Стремянка Ст-1...4 (АР-66.1 ... 66.3)				
112	1182	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.73711	237 208	174 848
113	1183	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.72347	1 146 761	829 647
114	1184	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	224	33	7 392
115	1185	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	21.37619	248	5 301
116	1186	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	21.37619	385	8 230
			Итого по подразделу: Стремянка Ст-1...4 (АР-66.1 ... 66.3)				**1 025 418**
			Подраздел: Узлы кровли К-1-7 (листы АР-68.4)				
117	1226	6110-0301-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков	м	488.8	1 608	785 990
118	1227	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.49288	28 485	71 010
119	1228	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм - Техноэласт соло ЭКМ	м2	366.6	3 053	1 119 230
120	1229	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали - Фартуков Ф-1 - Ф-4	м2	487.8	4 517	2 203 393
121	1230	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /костыли К-1 - К-5/	т	0.873	272 684	238 053
122	1231	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.873	357 986	312 522
123	1232	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	25.317	248	6 279

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	1233	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	25.317	385	9 747
			Итого по подразделу: Узлы кровли К-1-7 (листы АР-68.4)				**4 746 224**
			Подраздел: Элементы сцены (АР-74.2)				
125	1257	6106-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж конструкции стационарной сцены: колосников, штанкетных площадок, рабочих галерей и мостиков	т	2.63679	647 260	1 706 689
126	1258	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2.46389	438 481	1 080 369
127	1259	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0.1083	498 871	54 028
128	1260	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0646	365 165	23 590
129	1261	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	76.46691	248	18 964
130	1262	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	76.46691	385	29 440
131	1263	6107-0101-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 40 мм сплошного	м2	37.8	6 746	254 999
132	1264	6107-0102-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обшивка досками	м2	24.4	1 931	47 116
133	1265	215-301-0205 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм	м2	24.4	2 897	70 687
			Итого по подразделу: Элементы сцены (АР-74.2)				**3 285 882**
			Итого по разделу: Крыльцо. Навес				**17 371 704**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**121 790 817**
			ИТОГО по акту:				**121 790 817**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				121790817.102 x 8.10%	9 865 057
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				121790817.102 + 9865056.650	131 655 874
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				121790817.102 x 0.05409035%	6 587 708
		Сметная прибыль, (5.00%)				131655873.752 x 5.00%	6 582 794
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(131655873.752 +	6 912 179

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						6587707.576) x 5.000%	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				151 738 554
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368			151738554.082 x 1.0368	157 322 533
			НДС (12%)			157322532.872 x 12%	18 878 704
			Итого с НДС			157322532.872 + 18878703.945	176 201 237

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:41
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:26
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:09
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:51
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:50
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:40
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:05 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:42
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:17 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:46

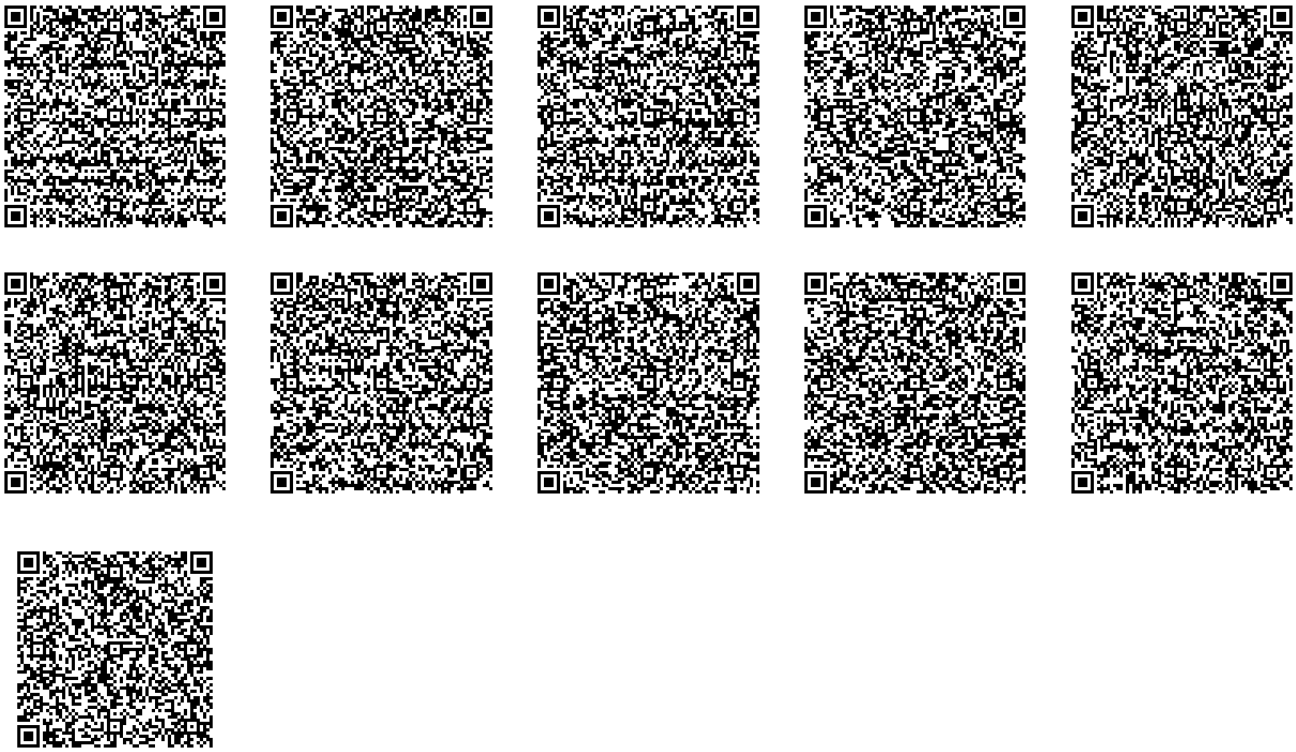

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление. Вентиляция				
			Раздел: Магистральные трубопроводы системы теплоснабженияПВ1-ПВ2, П1-П5 и Тепловых завес				
			Подраздел: Кондиционирование				
1	891	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	-1	46 871	-46 871
2	893	246-701-0109СпрСЦ 05.2024	Блок наружный типа Toshiba холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0806HS8-E	шт.	-1	2 767 270	-2 767 270
			Итого по подразделу: Кондиционирование				**-2 814 141**
			Итого по разделу: Магистральные трубопроводы системы теплоснабженияПВ1-ПВ2, П1-П5 и Тепловых завес				**-2 814 141**
			Итого по локальной смете: Отопление. Вентиляция				**-2 814 141**
			ИТОГО по акту:				**-2 814 141**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	-2814141.000 x 8.10%	-227 945
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	-2814141.000 + -227945.432	-3 042 086
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	-2814141.000 x 0.05409035%	-152 218
	Сметная прибыль, (5.00%)	-3042086.432 x 5.00%	-152 104
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(-3042086.432 + -152217.864) x 5.000%	-159 715
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		-3 506 124
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	-3506123.832 x 1.0557	-3 701 415
	НДС (12%)	-3701414.929 x 12%	-444 170
	Итого с НДС	-3701414.929 + -444169.791	-4 145 585

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:38
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:10
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:52
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:27
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:49
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:40
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:46
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:42
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:04 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

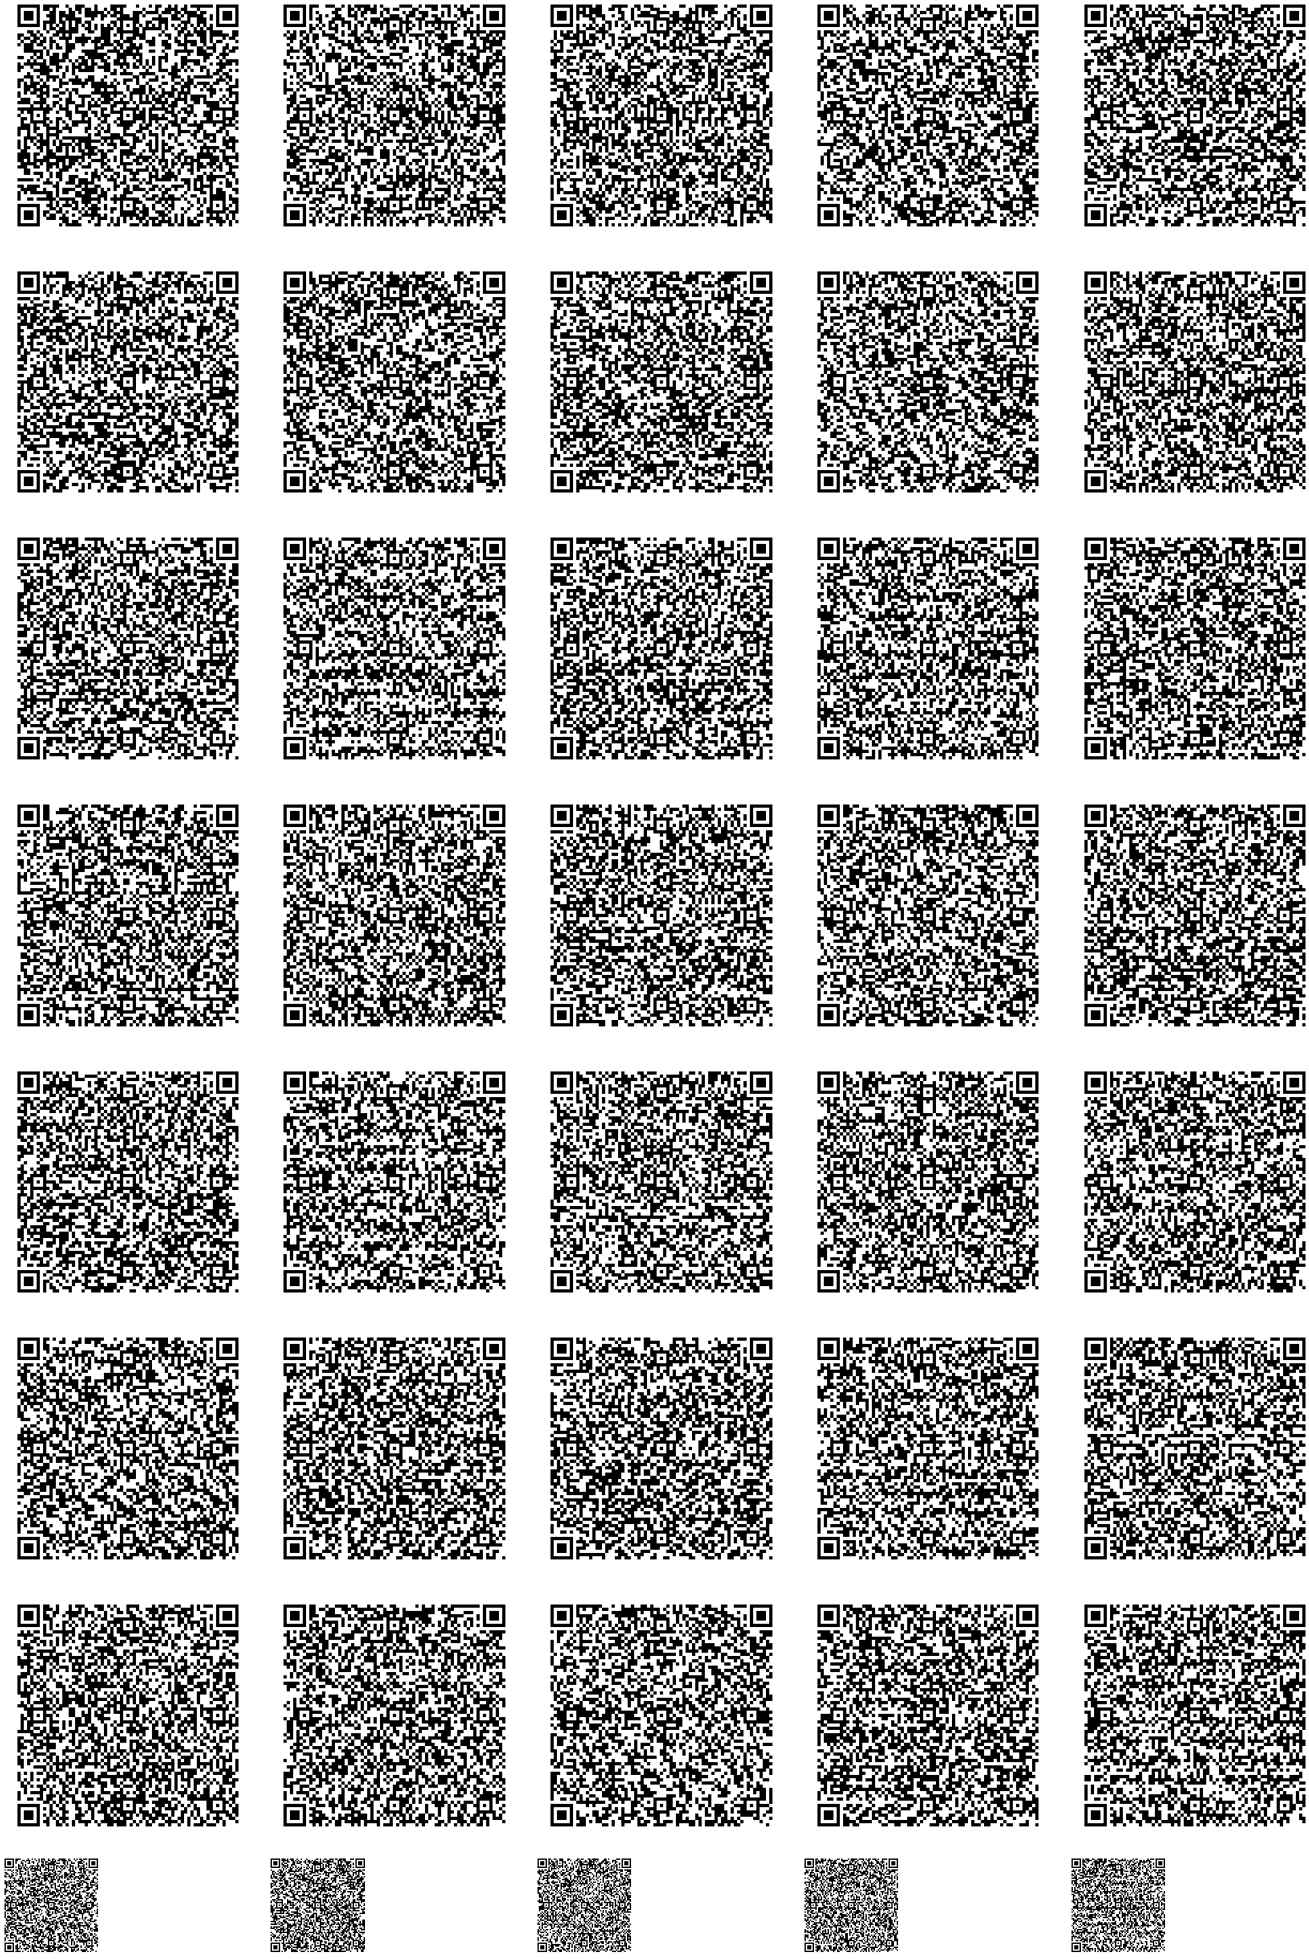

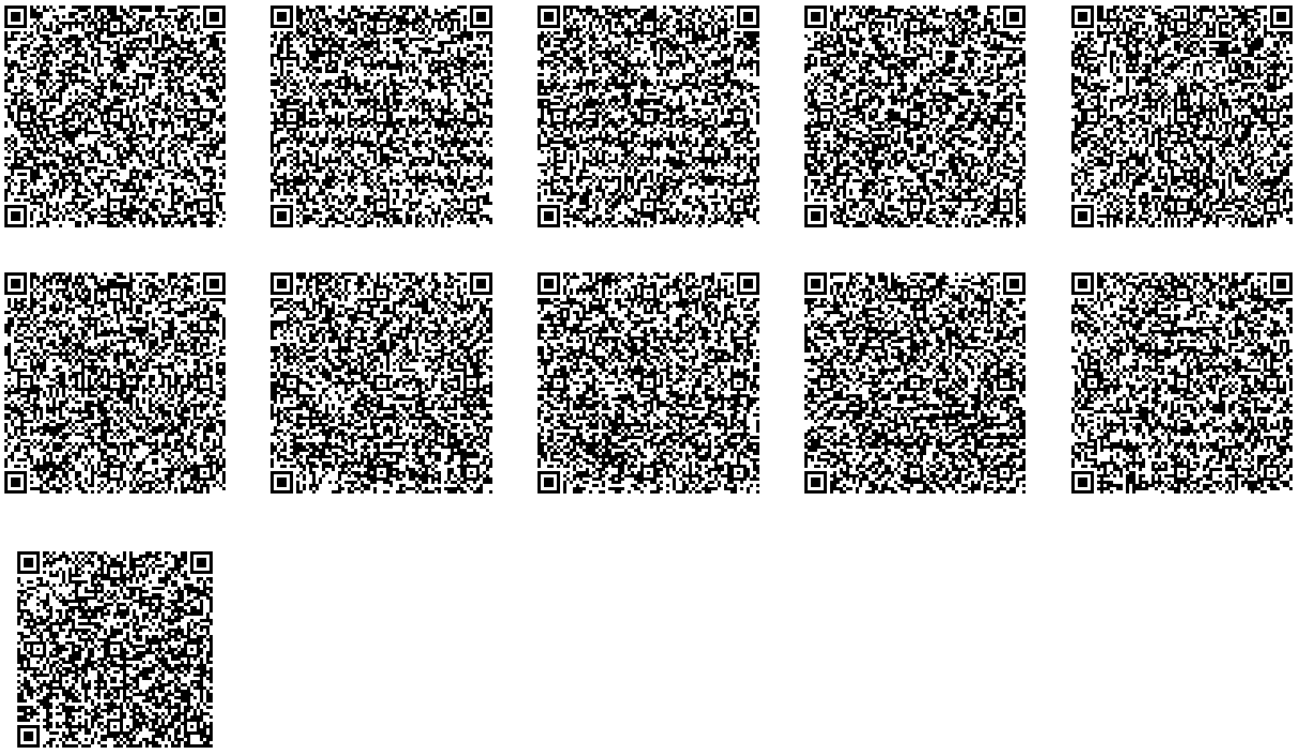

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация				
			Раздел: Система СКС				
			Подраздел: ШТК1				
1	7	248-102-3719СпрСЦ 05.2024	Патч-панель наборная типа Shelbi, 1U, SPP24, на 24 порта, с органайзером, пустая /Eurolan 27B-00-24BL/	шт.	8	6 212	49 696
2	8	248-102-4004СпрСЦ 05.2024	Розеточный модуль категория 6 UTP 1xRJ45 Keystone jack, чёрный 90° (наборный), типа Shelbi SKJ-45-6-B /UTR Eurolan 16B-U5-03BL/	шт.	192	546	104 832
			Итого по подразделу: ШТК1				**154 528**
			Подраздел: ШТК3				
3	40	248-102-3719СпрСЦ 05.2024	Патч-панель наборная типа Shelbi, 1U, SPP24, на 24 порта, с органайзером, пустая /Eurolan 27B-00-24BL/	шт.	4	6 212	24 848
4	41	248-102-4004СпрСЦ 05.2024	Розеточный модуль категория 6 UTP 1xRJ45 Keystone jack, чёрный 90° (наборный), типа Shelbi SKJ-45-6-B /UTR Eurolan 16B-U5-03BL/	шт.	96	546	52 416
			Итого по подразделу: ШТК3				**77 264**
			Итого по разделу: Система СКС				**231 792**
			Итого по локальной смете: Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация				**231 792**
			ИТОГО по акту:				**231 792**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	231792.000 x 8.10%	18 775
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	231792.000 + 18775.153	250 567
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	231792.000 x 0.05409035%	12 538
	Сметная прибыль, (5.00%)	250567.153 x 5.00%	12 528
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(250567.153 + 12537.710) x 5.000%	13 155
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		288 788
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	288788.463 x 1.0557	304 874
	НДС (12%)	304873.981 x 12%	36 585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				304873.981 + 36584.878	341 459

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:35
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:10
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:52
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:34
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:50
Представители заказчика		
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:03 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:41
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:43
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:47

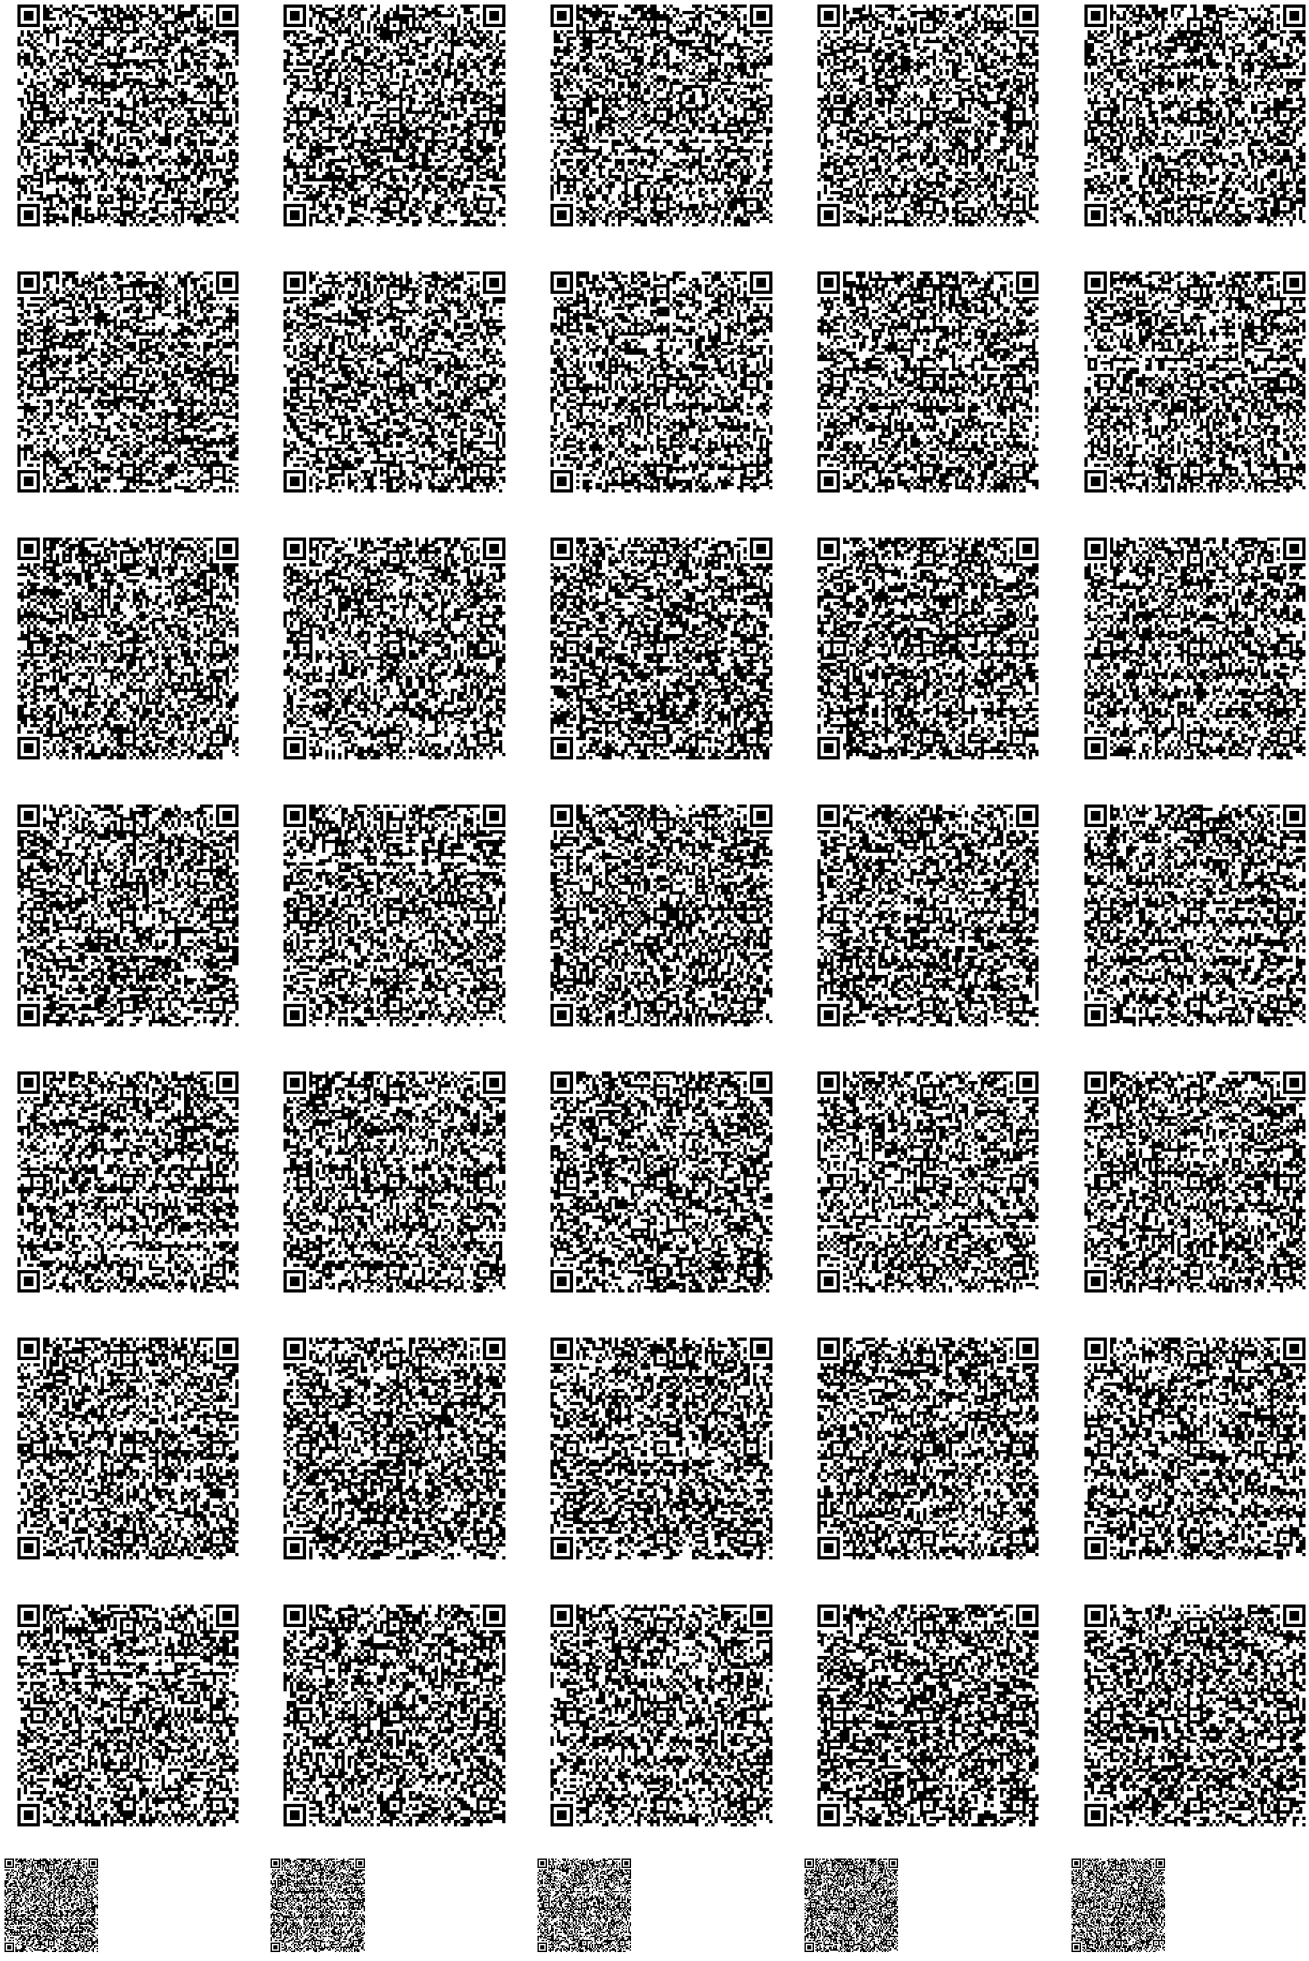

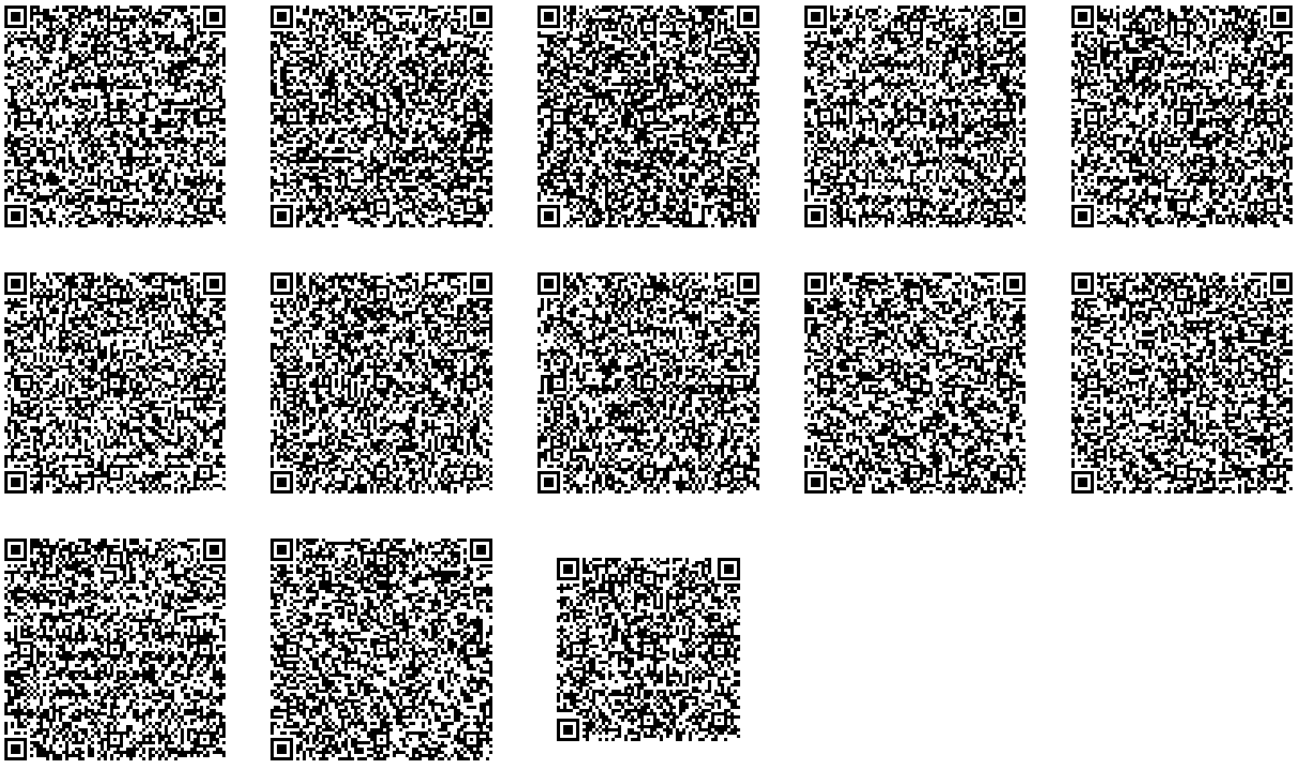

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Автоматическая пожарная сигнализация				
			Раздел: АПС				
			Подраздел: Оборудование				
1	36	1308-0304-0501РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	5 791	34 746
2	41	248-306-0385СпрСЦ 05.2024	Аккумулятор 12 В, 26 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1226К	шт.	2	67 111	134 222
3	42	248-306-0376СпрСЦ 05.2024	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	2	15 941	31 882
4	43	248-306-0373СпрСЦ 05.2024	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	2	15 541	31 082
			Итого по подразделу: Оборудование				**231 932**
			Итого по разделу: АПС				**231 932**
			Итого по локальной смете: Автоматическая пожарная сигнализация				**231 932**
			ИТОГО по акту:				**231 932**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	231932.000 x 8.10%	18 786
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	231932.000 + 18786.493	250 718
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	231932.000 x 0.05409035%	12 545
	Сметная прибыль, (5.00%)	250718.493 x 5.00%	12 536
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(250718.493 + 12545.282) x 5.000%	13 163
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		288 963
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	288962.889 x 1.0557	305 058
	НДС (12%)	305058.122 x 12%	36 607
	Итого с НДС	305058.122 + 36606.975	341 665

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:30
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:10
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:53
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:35
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:49
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:48
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:41
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:23 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:44
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:02 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

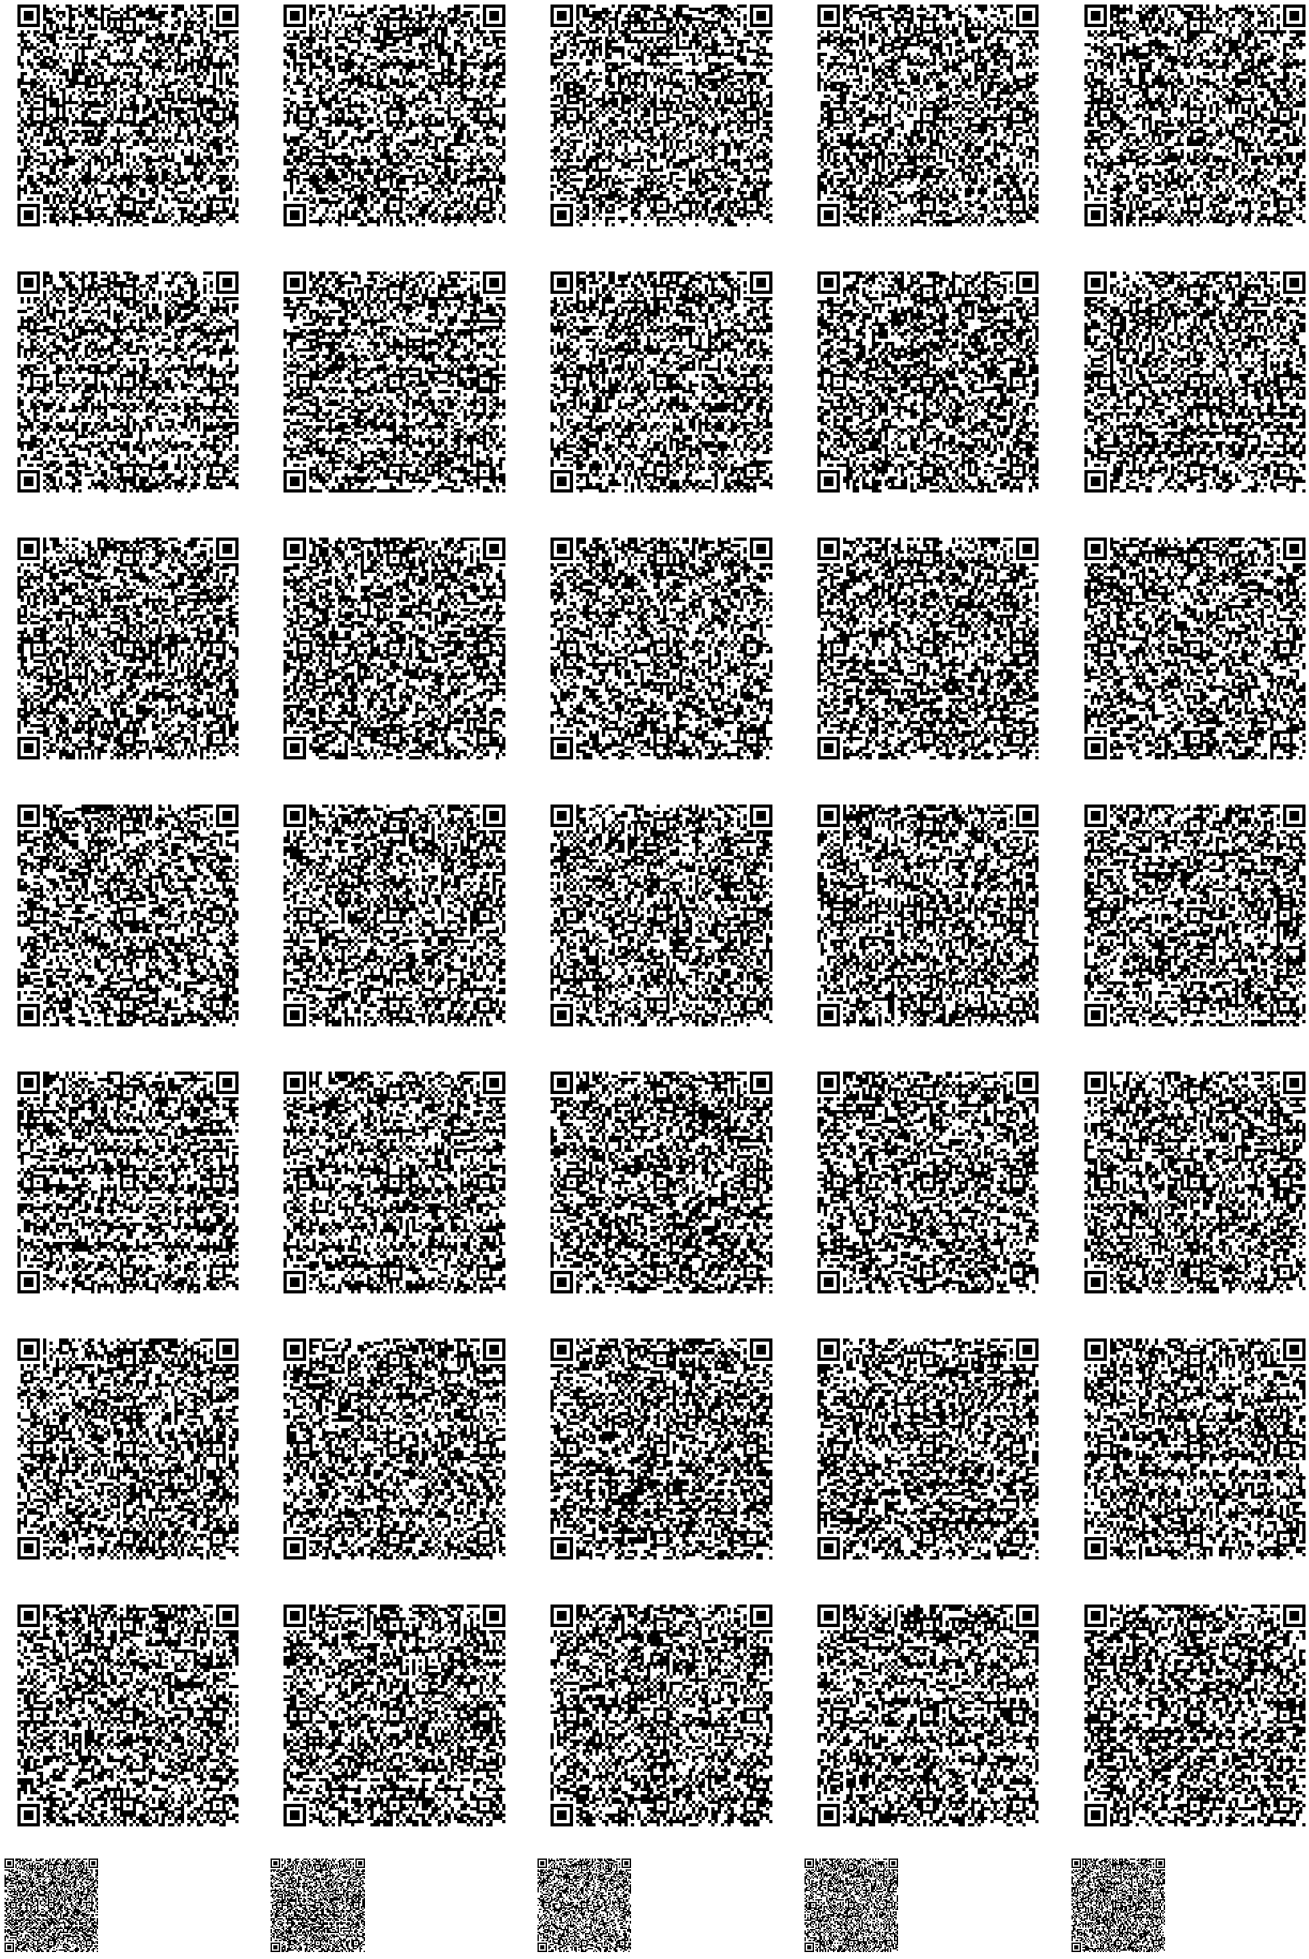

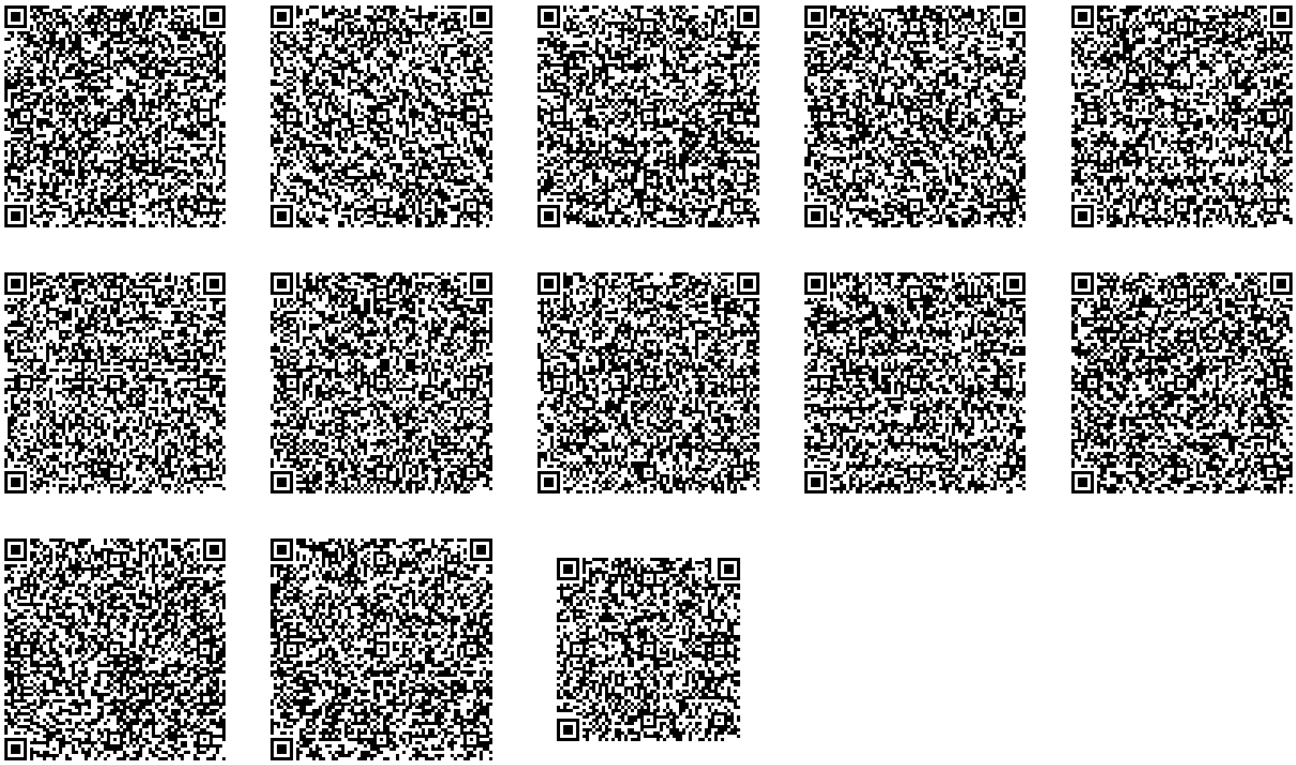

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство				
			Раздел: Малые архитектурные формы				
			Подраздел: МАФ				
1	93.1	8601-0303-0201УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	15	13	195
2	93.2	8601-0303-0201УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	15	23 532	352 980
			Итого по подразделу: МАФ				**353 175**
			Итого по разделу: Малые архитектурные формы				**353 175**
			Итого по локальной смете: Благоустройство				**353 175**
			ИТОГО по акту:				**353 175**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	195.000 x 8.10%	15
Итого с затратами на организацию и управление СМР	353175.000 + 15.795	353 190
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	195.000 x 0.05409035%	10
Сметная прибыль, (5.00%)	210.795 x 5.00%	10
Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(353190.795 + 10.548) x 5.000%	17 660
Итого с непредвидемыми работами и затратами		370 871
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	370871.949 x 1.0557	391 529
НДС (12%)	391529.517 x 12%	46 983
Итого с НДС	391529.517 + 46983.542	438 513

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:30
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:53
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:11
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:36
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:51
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:38
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:24 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:45
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:48

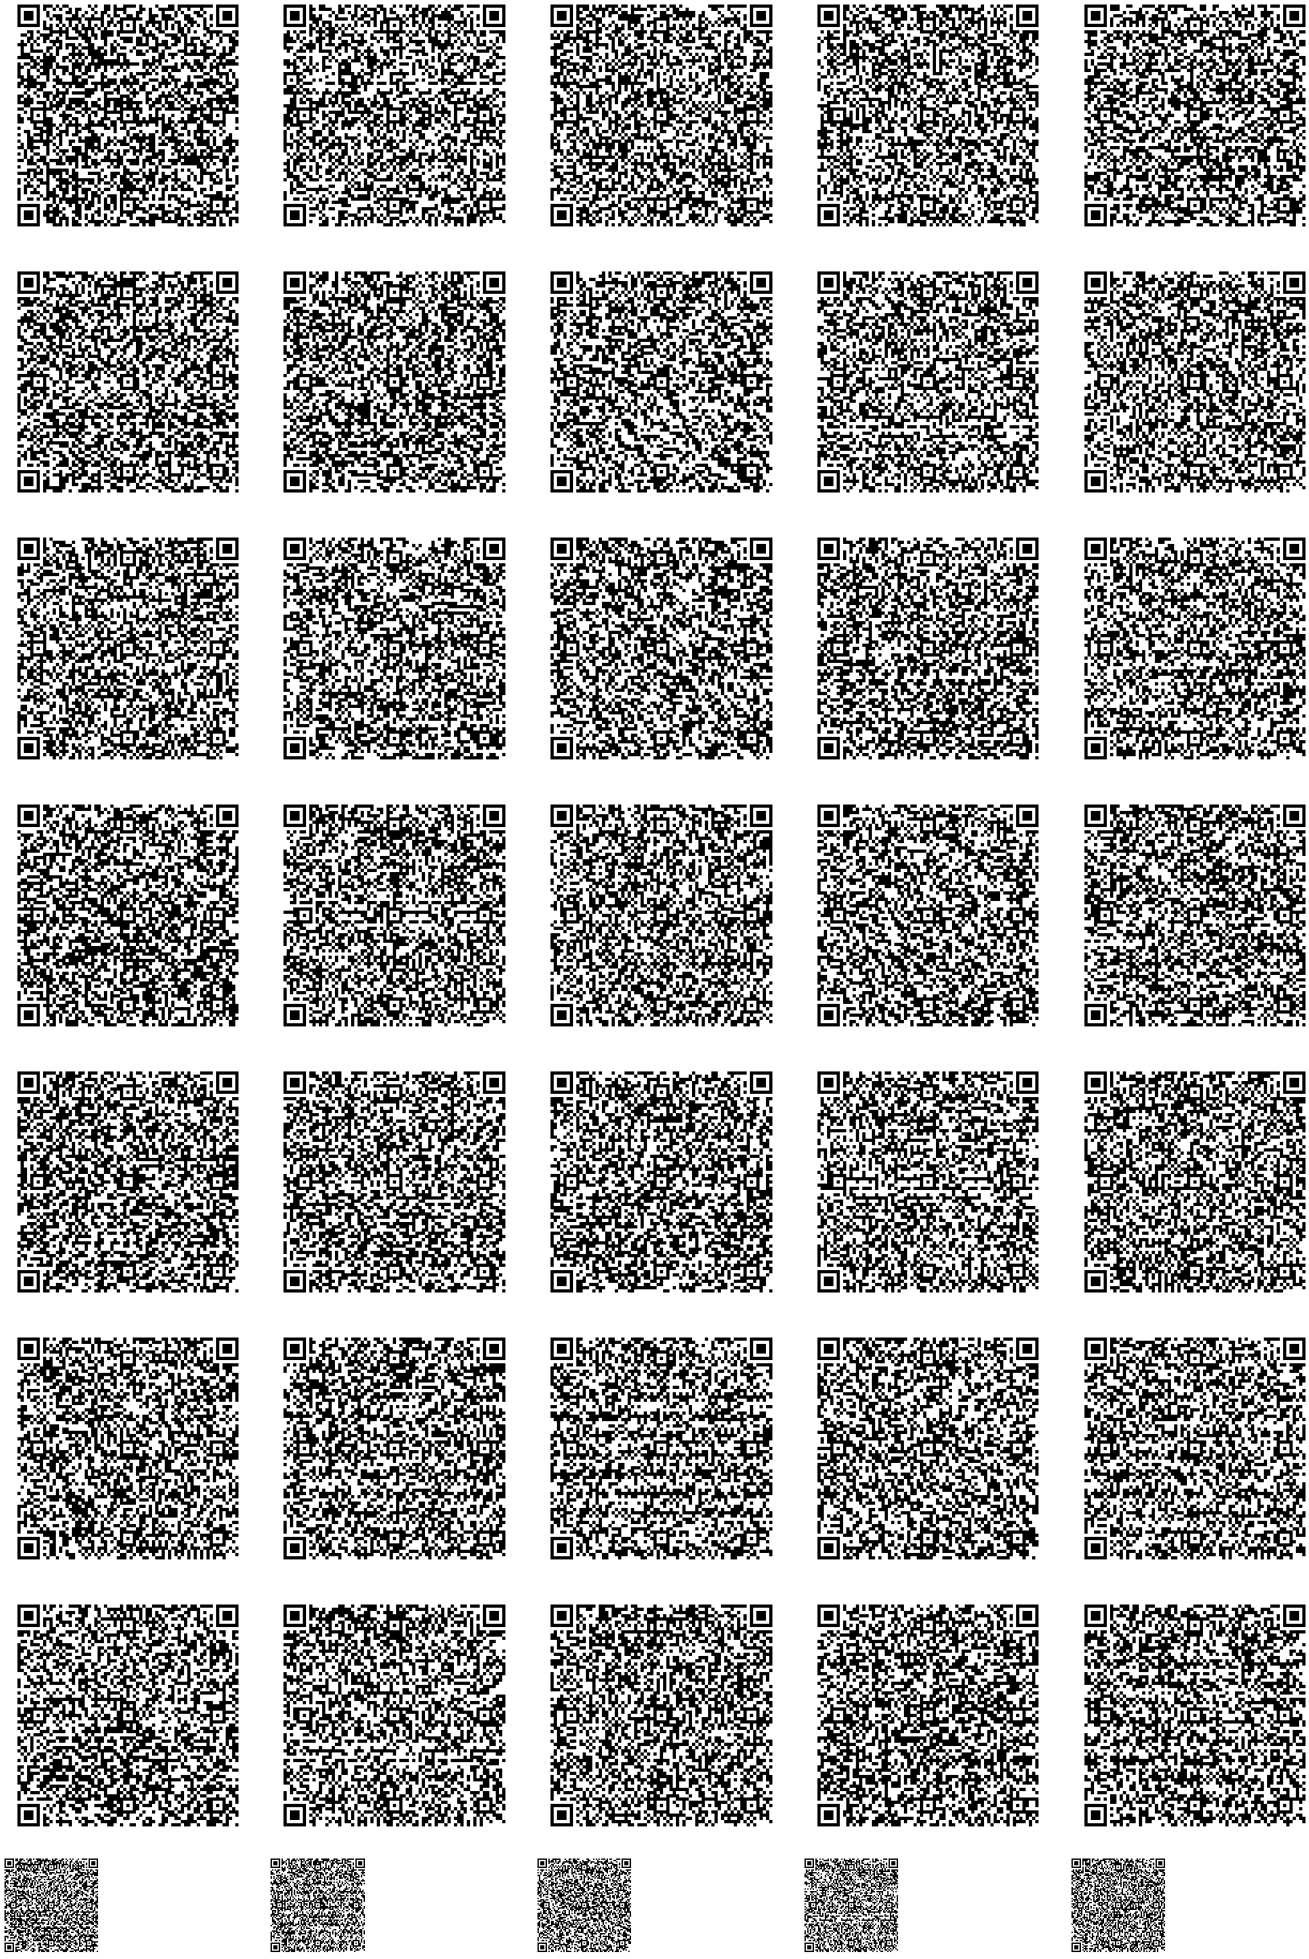

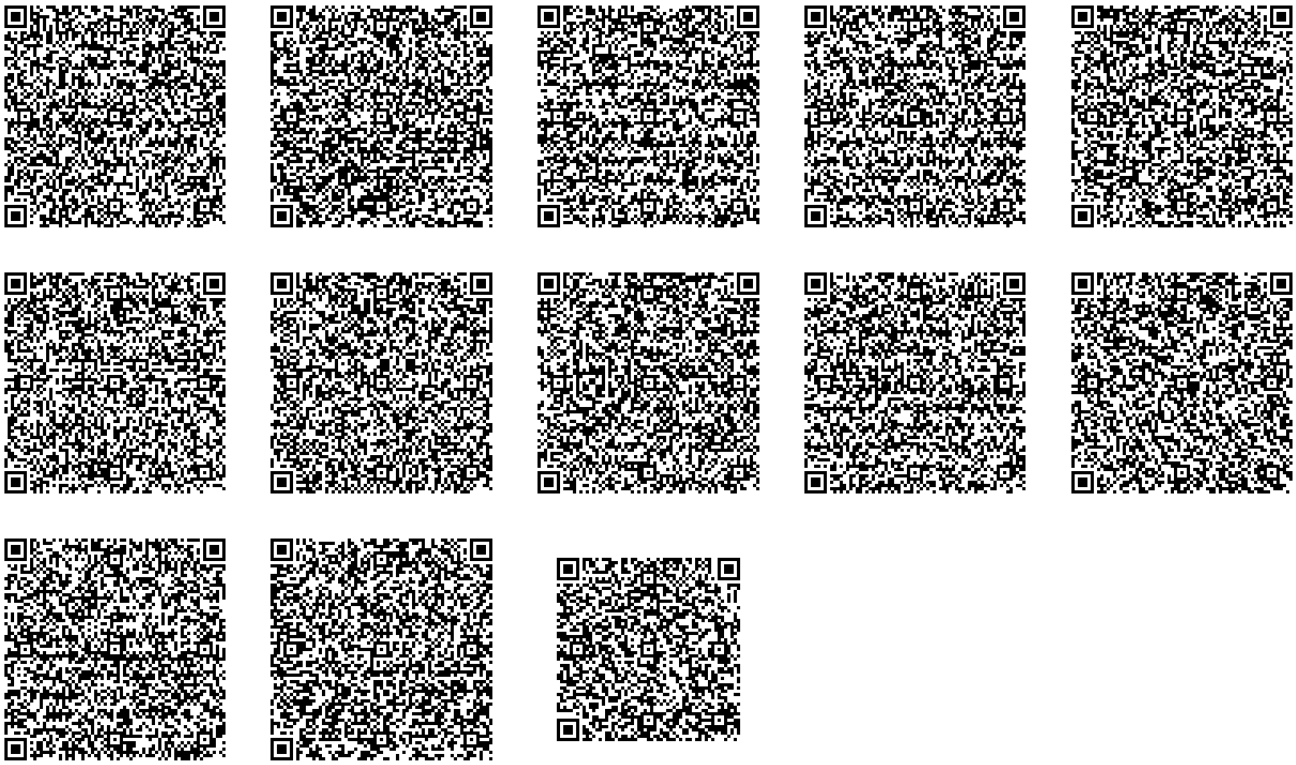

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Раздел: 1-ый этаж				
			Подраздел: Зал хореографии(146) Раздевальная (144, 145).				
1	555	522-101-1252003СпрСЦ 05.2024	Скамья гардеробная со спинкой и встроенной вешалкой с крючками	шт.	4	53 854	215 416
2	556	522-101-1078005СпрСЦ 05.2024	Станок хореографический однорядный RAG-3050. Две стойки, деревянная жердь толщиной 50мм. Длина 3 м	шт.	8	159 641	1 277 128
3	557	ТПрайсСпрСЦ 05.2024	Зеркало высотой 2м с настенным креплением	шт.	8	8 287	66 299
			Итого по подразделу: Зал хореографии(146) Раздевальная (144, 145).				**1 558 843**
			Итого по разделу: 1-ый этаж				**1 558 843**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**1 558 843**
			ИТОГО по акту:				**1 558 843**

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	0.000 x 8.10%	0
Итого с затратами на организацию и управление СМР	1558843.000 + 0.000	1 558 843
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	0.000 x 0.05409035%	0
Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(1558843.000 + 0.000) x 5.000%	77 942
Итого с непредвидемыми работами и затратами		1 636 785
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	1636785.150 x 1.0557	1 727 954
НДС (12%)	1727954.083 x 12%	207 354
Итого с НДС	1727954.083 + 207354.490	1 935 308

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:29
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:36
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:11
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:53
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:51
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 13:00 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:42
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:49
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:46

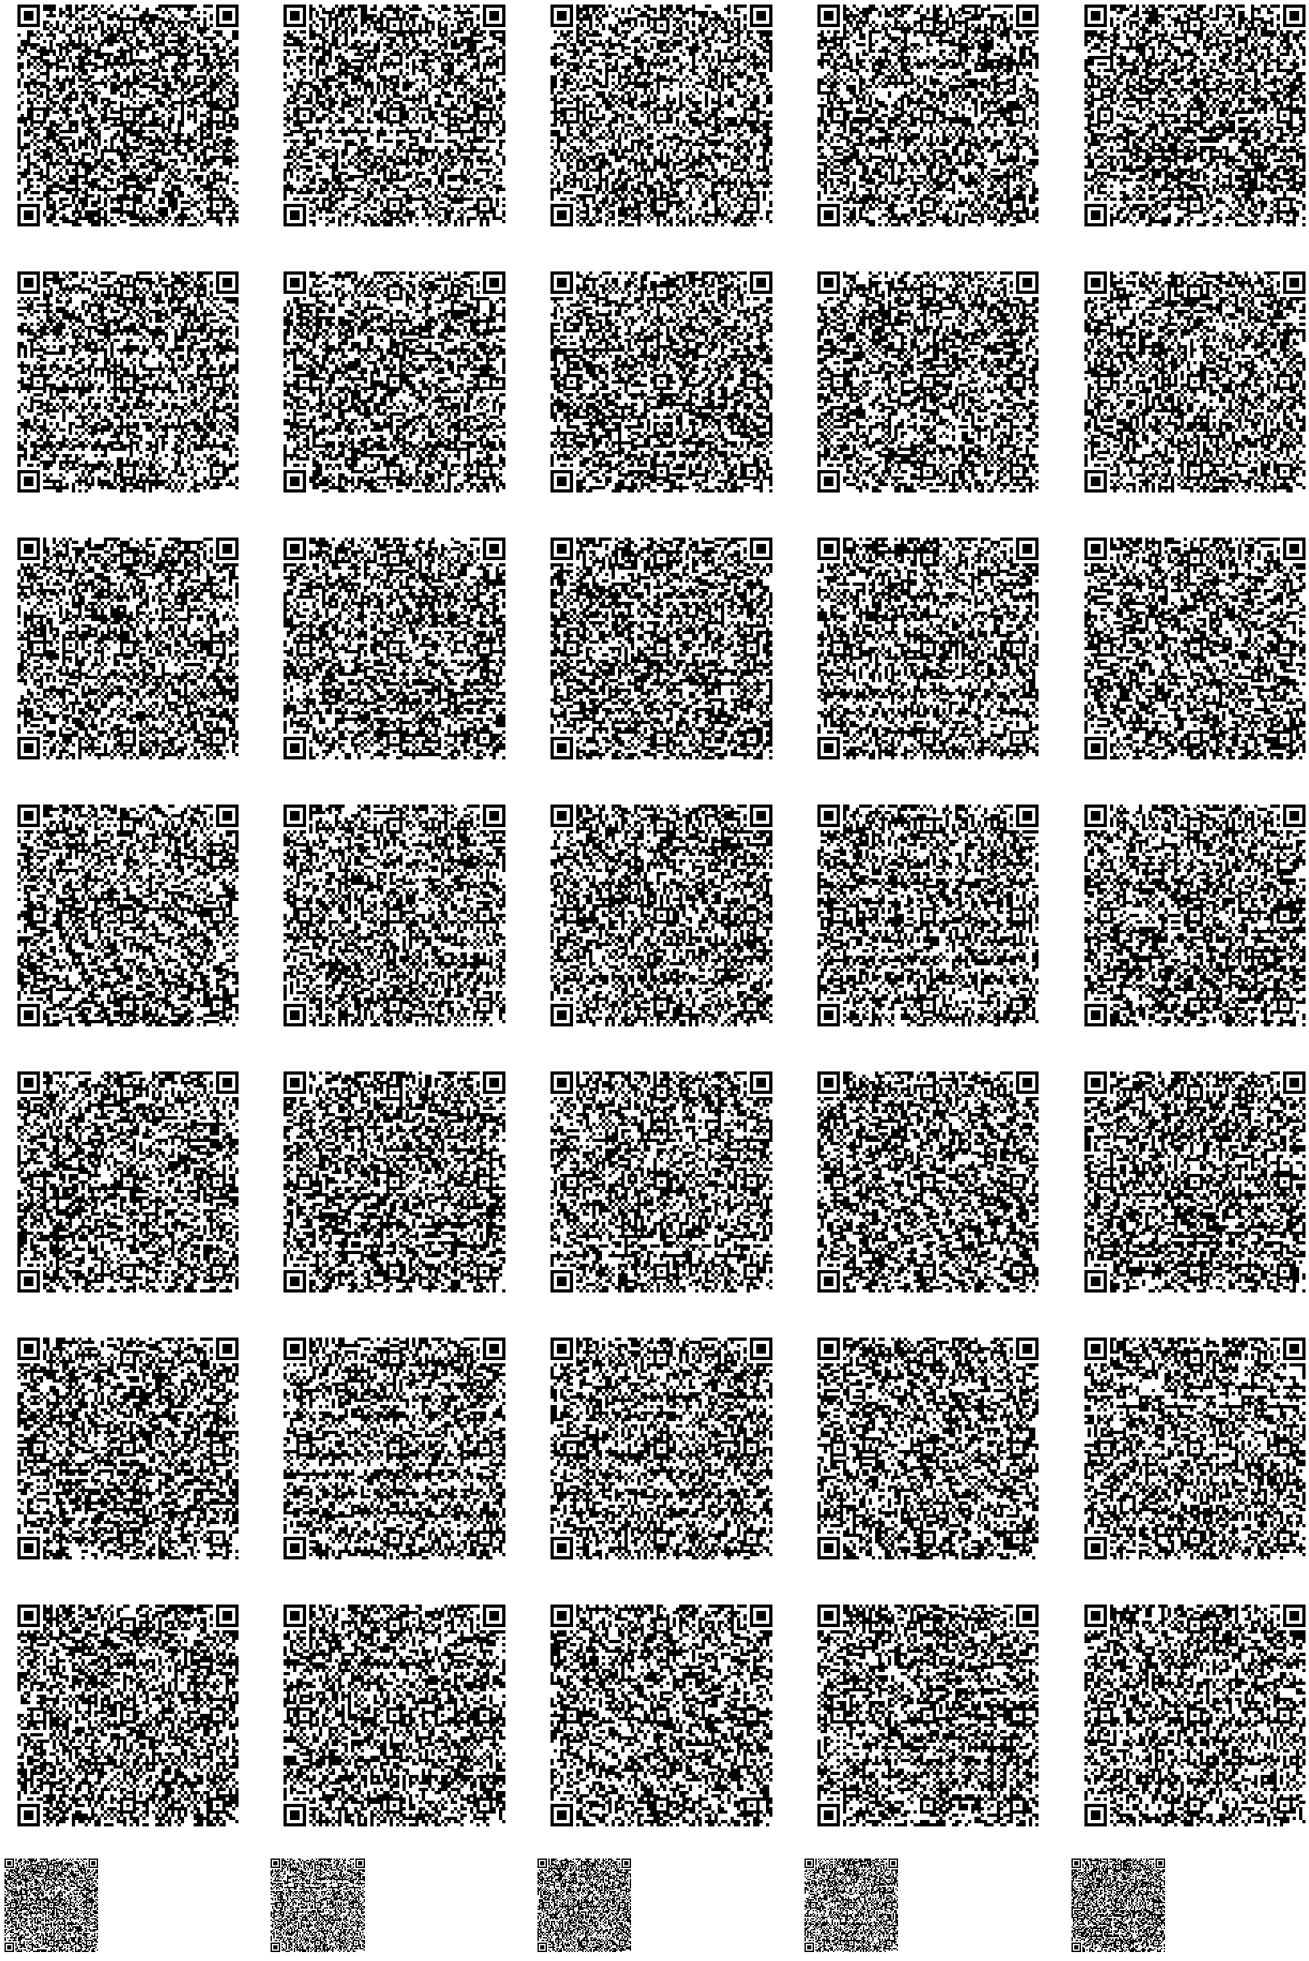

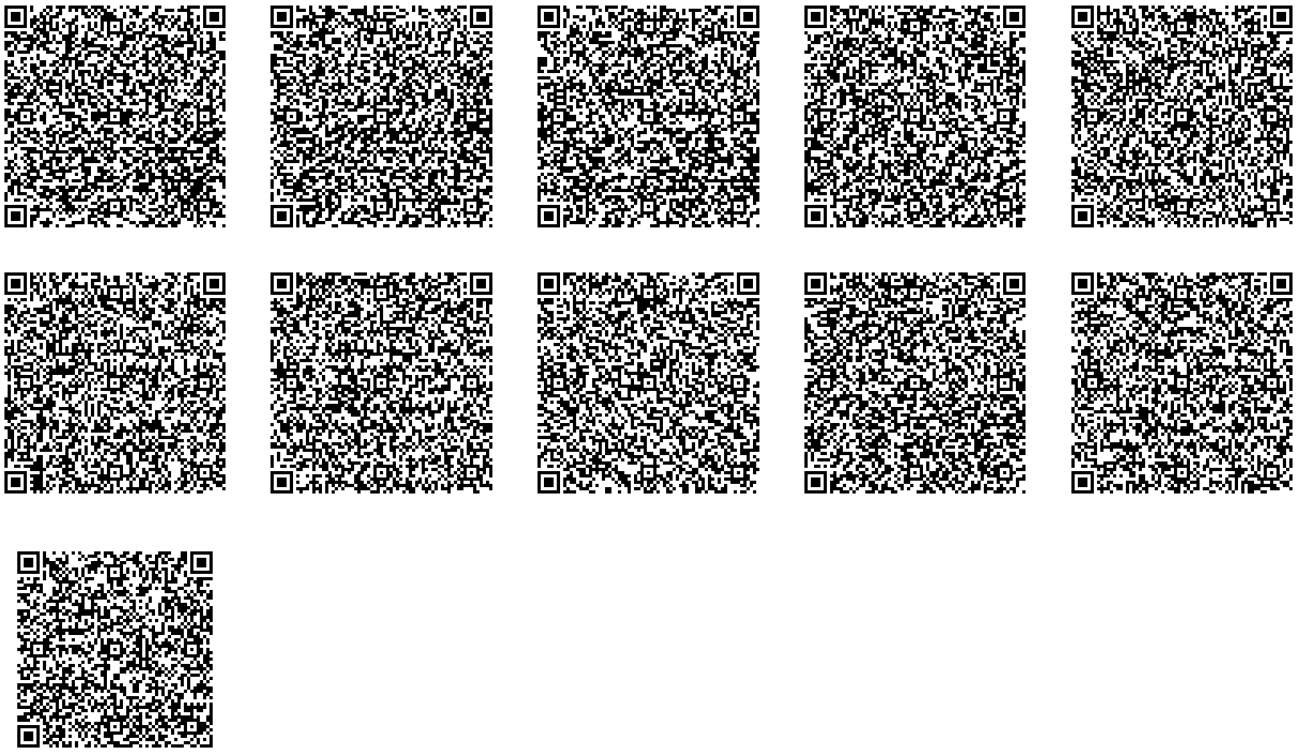

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Система контроля и управления доступом				
			Раздел: СКУД				
			Подраздел: Оборудование				
1	7	1311-0401-0701РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	35	4 160	145 600
2	8	ТПрайс-листРСНБ РК 2022	Сетевой контроллер STR20-IP	шт	4	318 958	1 275 832
3	9	ТПрайс-листРСНБ РК 2022	Модуль доступа STR20-1AP	шт	31	87 194	2 703 034
4	12	1310-1001-0605РСНБ РК 2022	Монтаж и расключение электромагнитного замка	шт.	25	10 716	267 900
5	13	248-401-0302РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML240-40	шт.	12	20 609	247 308
6	14	248-405-0607РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг	шт.	13	46 568	605 384
7	15	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	38	5 110	194 180
8	16	248-401-0750РСНБ РК 2022	VIZIT-DC505S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной	шт.	38	20 779	789 602
9	17	1310-1001-0603РСНБ РК 2022	Монтаж и расключение кнопки выхода	шт.	14	4 586	64 204
10	18	248-405-0534СпрСЦ 05.2024	ST-EX142L, накладная кнопка выхода с индикацией	шт.	14	1 222	17 108
11	19	248-405-0402РСНБ РК 2022	EM-marine, бесконтактная карта доступа	шт.	100	101	10 100
12	22	1308-0304-0501РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	34	5 791	196 894

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	23	248-306-0344РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР	шт.	1	48 982	48 982
14	24	248-306-0341РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р	шт.	31	22 504	697 624
15	25	248-306-0345РСНБ РК 2022	Источник электропитания ИВЭПР 12/2,5, RS R3 2х7 БР	шт.	2	170 699	341 398
16	26	6124-0103-2101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	25	6 292	157 300
17	27	248-310-0101РСНБ РК 2022	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска	шт.	25	8 514	212 850
			Итого по подразделу: Оборудование				**7 975 300**
			Итого по разделу: СКУД				**7 975 300**
			Итого по локальной смете: Система контроля и управления доступом				**7 975 300**
			ИТОГО по акту:				**7 975 300**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	7975300.000 x 8.10%	645 999
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7975300.000 + 645999.330	8 621 299
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	7975300.000 x 0.05409035%	431 386
	Сметная прибыль, (5.00%)	8621299.330 x 5.00%	431 064
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(8621299.330 + 431386.746) x 5.000%	452 634
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		9 936 385
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	9936385.346 x 1.0557	10 489 842
	НДС (12%)	10489842.010 x 12%	1 258 781
	Итого с НДС	10489842.010 + 1258781.041	11 748 623

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:29
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:12
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:53
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:37
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:51
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:43
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:59 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:49
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:47

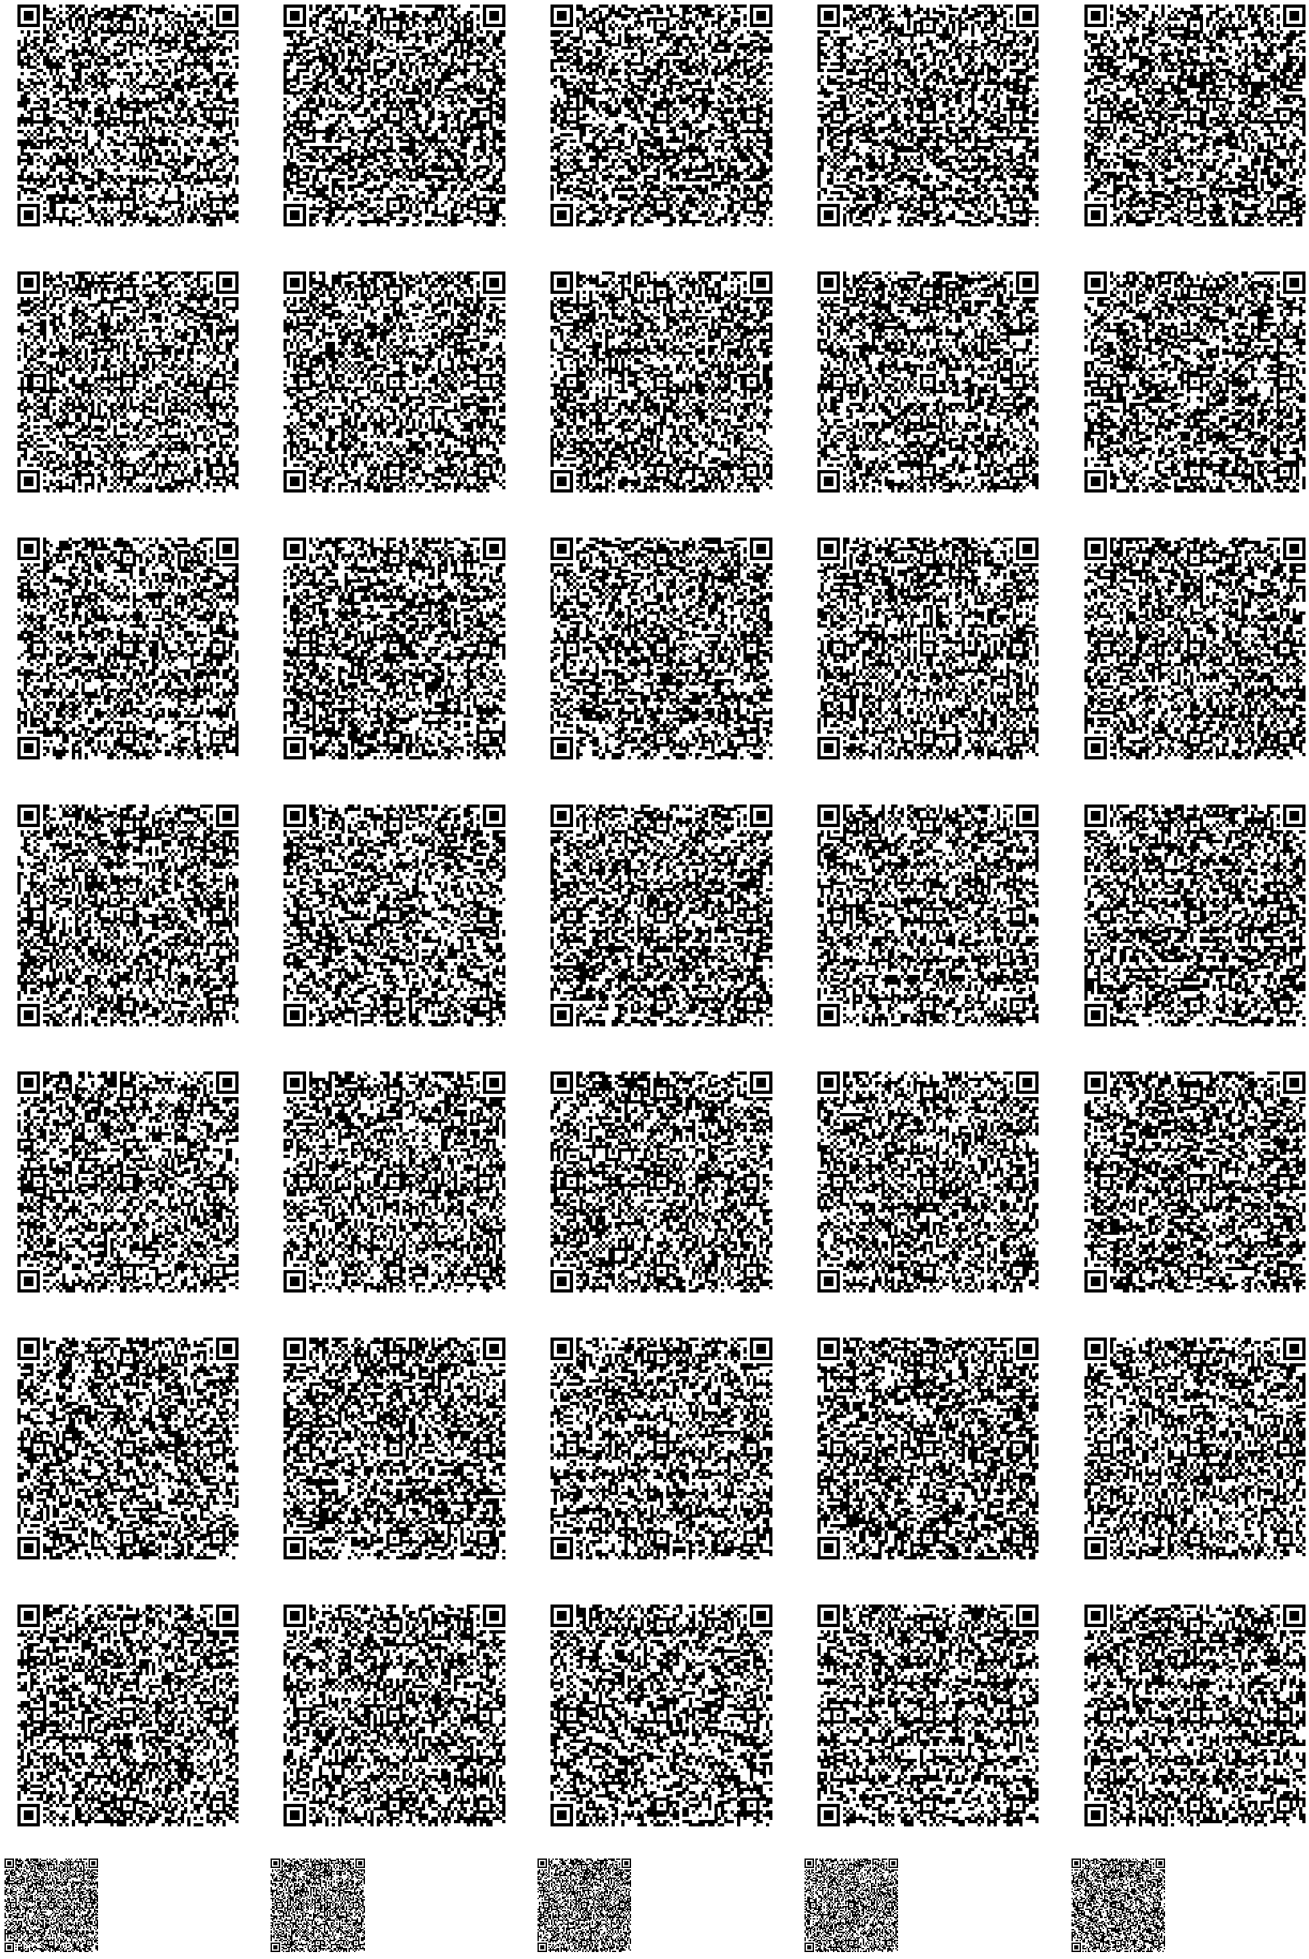

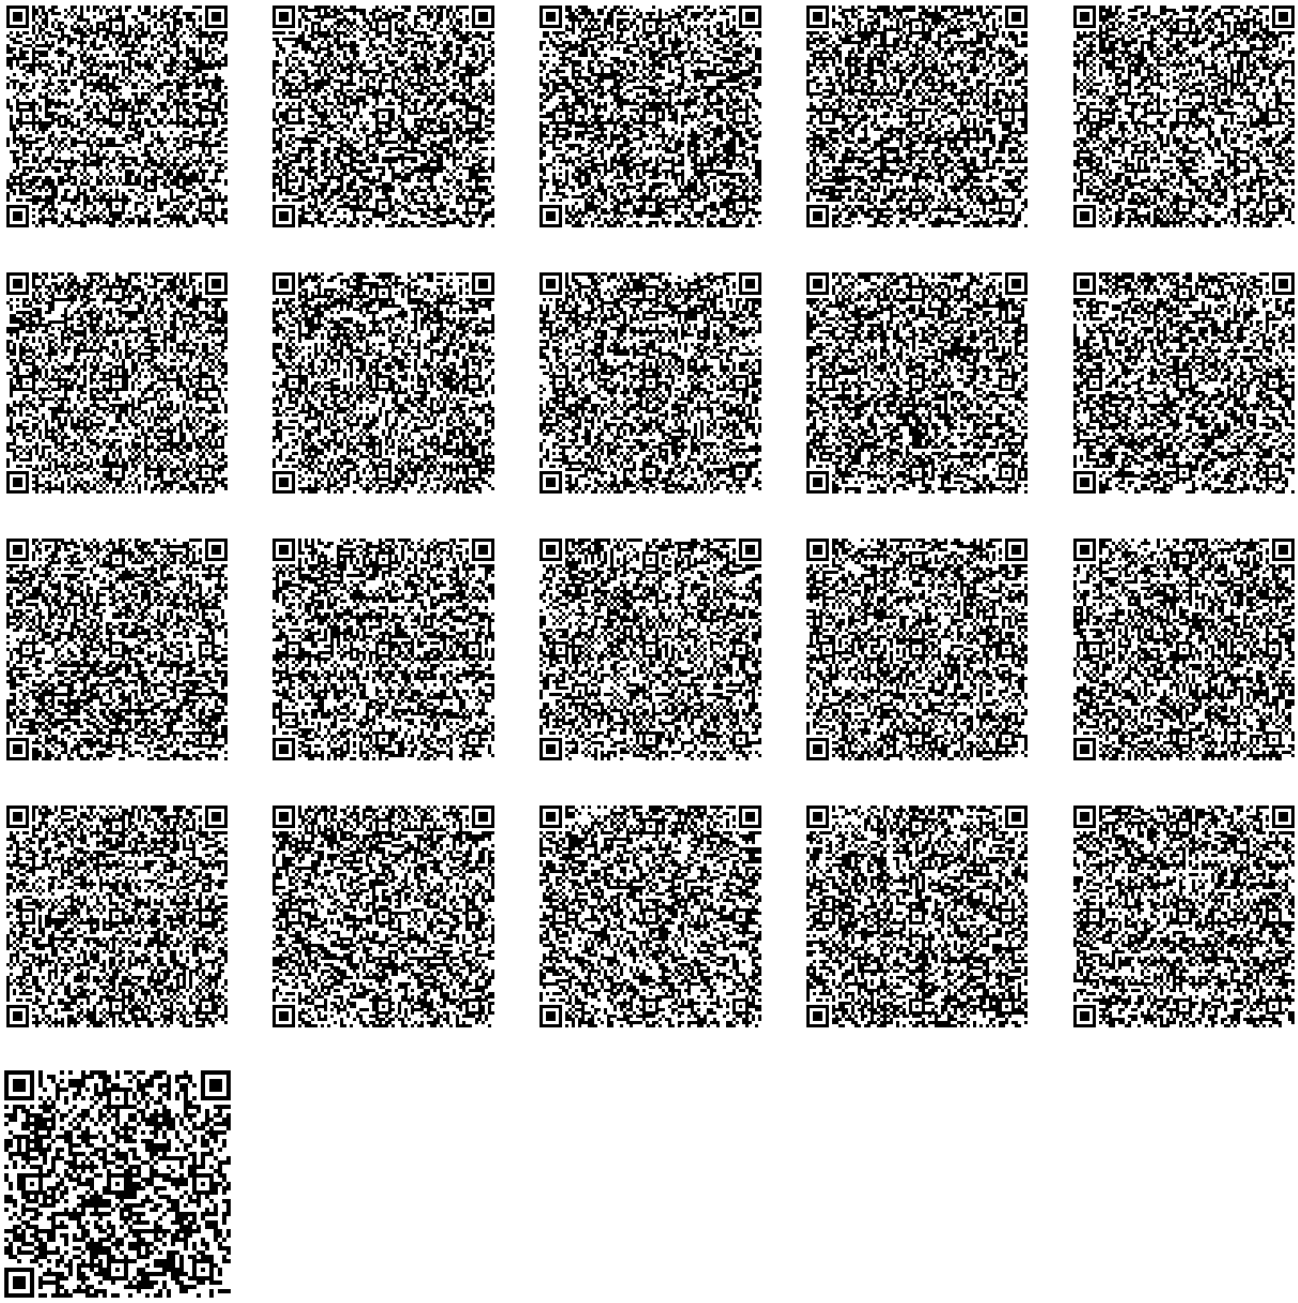

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод. Канализация				
			Раздел: ВОДОПРОВОД				
			Подраздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	134 725	134 725
2	2	511-703-2628 СпрСЦ 05.2024	Установка с тремя вертикальными насосами (2 рабочих и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-3 HELIX V 603/SKw-EB Q 12 м3/ч, H 19 м вод. ст.	шт.	1	3 434 533	3 434 533
3	3	6115-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка бака металлического для воды, масса до 0,5 т	бак	1	67 313	67 313
4	4	513-204-0113 РСНБ РК 2022	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 500, Elbi (A112L55) V±500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax±10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	1	316 161	316 161
5	5	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	8 512	17 024
6	6	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	15 438	77 190
7	7	242-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, T до +100°C, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	11 788	23 576
8	8	242-101-0102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, T до +100°C, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 80 /65	шт.	4	18 501	74 004

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	6 598	6 598
10	10	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 598	49 598
11	11	242-304-1002 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	40 429	40 429
12	12	6116-0501-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 65 мм	шт.	1	12 147	12 147
13	13	245-405-0204 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	1	11 801	11 801
14	14	6116-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 50 мм	шт.	3	8 707	26 121
15	15	242-403-0503 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 32	шт.	1	12 206	12 206
16	16	242-403-0502 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25	шт.	2	11 210	22 420
17	17	6115-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фонтанчика питьевого напольного с педальным пуском	комплект	8	11 114	88 912
18	18	261-301-0266 РСНБ РК 2022	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	8	101 508	812 064
19	19	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	127	1 667	211 709
20	20	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	101	2 530	255 530
21	21	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	3 796	75 920
22	22	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7 365	44 190
23	23	6114-0601-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	7	27 516	192 612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530	17 710
			Итого по подразделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				**6 024 493**
			Подраздел: Водомерный узел1 /лист 6и/				
25	25	6114-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	54 694	54 694
26	26	244-301-0905 РСНБ РК 2022	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	180 745	180 745
27	27	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	6 598	6 598
28	28	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 598	49 598
29	29	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
30	30	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7 365
31	31	242-101-1103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	3	127 001	381 003
32	32	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	6	3 380	20 280
33	33	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	5	323	1 615
34	34	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	5	287	1 435
35	35	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	530	530
36	36	241-114-0112 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585	585
37	37	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	102.5	1 370	140 425

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	102.5	524	53 710
39	39	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	142	36	5 112
40	40	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	31	55	1 705
41	41	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	11	107	1 177
42	42	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	142	18	2 556
43	43	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	25	34	850
44	44	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	18	53	954
45	45	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	41	20	820
46	46	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	18	24	432
47	47	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	5	55	275
48	48	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	25	500
49	49	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	5	49	245
50	50	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	6.38	5 399	34 446
51	51	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	290	708	205 320
52	52	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	165	5 561	917 565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	53	6114-0103-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	6 004	438 292
54	54	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	6 554	124 526
55	55	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	163.35	217	35 447
56	56	241-205-1103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	29.7	352	10 454
57	57	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	42.57	362	15 409
58	58	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	6.93	590	4 089
59	59	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11.88	586	6 962
60	60	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	257	339	87 123
61	66	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	265.5	4 135	1 097 842
62	67	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	265.5	2 301	610 916
63	68	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	13.5	4 592	61 992
64	69	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	13.5	3 789	51 152
65	70	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	279	342	95 418
66	71	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм /футляр/	м	10	23 626	236 260
67	72	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	531	1 806	958 986

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	73	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	247.5	295	73 012
69	74	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	110	341	37 510
70	75	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	152.9	383	58 561
71	76	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	48.4	602	29 136
72	77	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	25.3	815	20 620
			Итого по подразделу: Водомерный узел1 /лист 6и/				**6 127 119**
			Подраздел: Водопровод противопожарный В2				
73	83	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	18	8 512	153 216
74	84	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	15 438	108 066
75	85	242-101-0601001 СпрСЦ 05.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV	шт.	18	16 543	297 774
76	86	242-101-0607001 СпрСЦ 05.2024	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65, типа AV	шт.	7	17 734	124 138
77	87	1312-1101-0304 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	25 826	25 826
78	88	519-101-1703 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	1 571 719	1 571 719
79	89	242-207-3602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	7 643	68 787
80	90	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	6 598	13 196
81	91	242-404-0307 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	59 755	119 510

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	92	6116-0501-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением 1,6 Мпа, диаметр 65 мм	шт.	2	12 147	24 294
83	93	245-405-0204 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65	комплект	2	11 801	23 602
84	106	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	46.8	339	15 865
85	107	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	72.8	496	36 109
86	108	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	72.8	267	19 438
			Итого по подразделу: Водопровод противопожарный В2				**2 601 540**
			Подраздел: Водоснабжение горячее Т3,Т4				
87	123	6115-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка полотенцесушителя из водогазопроводных труб	шт.	2	17 130	34 260
88	124	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 530	17 710
89	125	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Смесители. Установка	шт.	12	3 755	45 060
90	126	245-508-0101 РСНБ РК 2022	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75 подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20	шт.	5	28 015	140 075
91	127	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	97	6 779	657 563
92	128	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735	3 735
93	129	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	9 945	69 615
			Итого по подразделу: Водоснабжение горячее Т3,Т4				**968 018**
			Подраздел: Водомерный узел (школа) /лист 6и/				
94	141	6114-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	39 126	39 126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	142	244-301-0903 РСНБ РК 2022	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°	шт.	1	116 189	116 189
96	143	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4 463	4 463
97	144	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	25 388	25 388
98	145	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	1	1 743	1 743
99	146	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	1	5 565	5 565
100	147	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2 870	2 870
101	148	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7 365
102	149	242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	22 400	44 800
103	150	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 734	3 468
104	151	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	11	323	3 553
105	152	241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	9	287	2 583
106	153	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	530	2 120
107	154	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	84	1 370	115 080
108	155	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	84	524	44 016
109	156	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	105	36	3 780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	157	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	28	55	1 540
111	158	241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	9	107	963
112	159	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	69	50	3 450
113	160	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	9	80	720
114	161	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	1	87	87
115	162	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	106	18	1 908
116	163	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	11	34	374
117	164	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	8	53	424
118	165	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	30	20	600
119	166	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	17	24	408
120	167	241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	4	55	220
121	168	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	20	25	500
122	169	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	5	49	245
123	170	261-301-0220 РСНБ РК 2022	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2.5	5 399	13 498
124	171	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/кг	кг	853	708	603 924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	180	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	217	339	73 563
126	188	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	714	339	242 046
127	189	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	390	1 806	704 340
128	190	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	71.5	394	28 171
129	191	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	104.5	470	49 115
130	192	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	198	515	101 970
131	193	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	55	783	43 065
			Итого по подразделу: Водомерный узел (школа) /лист 6и/				**2 293 240**
			Подраздел: Водомерный узел В1.1(столовая)				
132	256	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	144.5	339	48 986
133	257	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	91	1 806	164 346
134	258	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	8.8	238	2 094
135	259	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	40.7	295	12 006
136	260	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	16.5	341	5 627
137	261	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	16.5	476	7 854
138	262	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	6.6	602	3 973

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	263	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	11	599	6 589
			Итого по подразделу: Водомерный узел В1.1(столовая)				**251 475**
			Подраздел: Водомерный узел 5 (столовая)				
140	331	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	144.5	339	48 986
141	332	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	91	1 806	164 346
142	333	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	8.8	316	2 781
143	334	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	40.7	394	16 036
144	335	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	16.5	470	7 755
145	336	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	7.7	515	3 966
146	337	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	8.8	581	5 113
147	338	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	6.6	783	5 168
148	339	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	11	1 206	13 266
			Итого по подразделу: Водомерный узел 5 (столовая)				**267 417**
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				**18 533 302**
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Подраздел: Канализация бытовая К1				
149	340	6115-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	101	38 193	3 857 493
150	341	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	101	13 128	1 325 928
151	342	6115-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Унитазы напольные. Установка	комплект	37	10 129	374 773

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
152	343	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	37	36 171	1 338 327
153	344	6115-0102-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	5 126	10 252
154	345	6115-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	7	4 251	29 757
155	346	6115-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	7	32 074	224 518
156	347	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	30	1 620	48 600
157	348	244-104-0202 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для детского унитаза	шт.	7	4 185	29 295
158	349	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	2	19 544	39 088
159	350	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	7	18 312	128 184
160	351	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	98	815	79 870
161	352	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	14	896	12 544
162	353	241-512-0101 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	13	6 283	81 679
163	354	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	13	13 917	180 921
164	355	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	69	3 469	239 361
165	356	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	602	69	41 538
166	357	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	417	203	84 651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
167	358	СТКПРСНБ РК 2022	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-50 /ПМ-50/60/	шт	29	2 067	59 968
168	359	СТКПРСНБ РК 2022	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-110 /ПМ-110/60/	шт	12	2 240	26 882
169	360	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108	708	76 464
170	361	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	72	112	8 064
171	362	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	27	189	5 103
172	363	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	277	13 296
173	364	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	132	106	13 992
174	365	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	75	382	28 650
175	366	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	32	781	24 992
176	367	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	578	4 046
177	368	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	66	382	25 212
178	369	241-210-0205 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм	шт.	13	1 248	16 224
179	370	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	91	1 547
180	371	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	91	367	33 397
181	372	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	75	653	48 975
182	373	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	133	3 214	427 462

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	374	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	132.734	556	73 800
184	375	6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	55	3 090	169 950
185	376	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	54.89	899	49 346
			Итого по подразделу: Канализация бытовая К1				**9 234 149**
			Подраздел: Бачок разрыва струи в том числе:				
186	406	1109-0701-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций /бак разрыва струи/	0.12282	636 195	78 137
187	407	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.049	357 986	17 541
188	408	241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	0.4	15 564	6 226
189	409	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0.2	585	117
190	410	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0.4	1 511	604
191	411	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	5	815	4 075
192	412	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5.2	708	3 682
193	413	6114-0102-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	8	2 878	23 024
194	414	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	8	1 504	12 032
195	415	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	21	1 806	37 926
196	416	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	23.1	602	13 906
			Итого по подразделу: Бачок разрыва струи в том числе:				**197 270**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				**9 431 419**
			Итого по локальной смете: Водопровод. Канализация				**27 964 721**
			ИТОГО по акту:				**27 964 721**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				22642308.000 x 8.10%	1 834 027
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				27964721.000 + 1834027.034	29 798 748
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				22642308.000 x 0.05409035%	1 224 730
		Сметная прибыль, (5.00%)				24476335.034 x 5.00%	1 223 816
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(29798748.034 + 1224730.300) x 5.000%	1 551 173
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					33 798 469
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				33798469.003 x 1.0557	35 681 043
		НДС (12%)				35681043.726 x 12%	4 281 725
		Итого с НДС				35681043.726 + 4281725.247	39 962 768

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:29
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:54
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:38
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:12
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:52
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:50
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:27 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:50
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:51 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:43

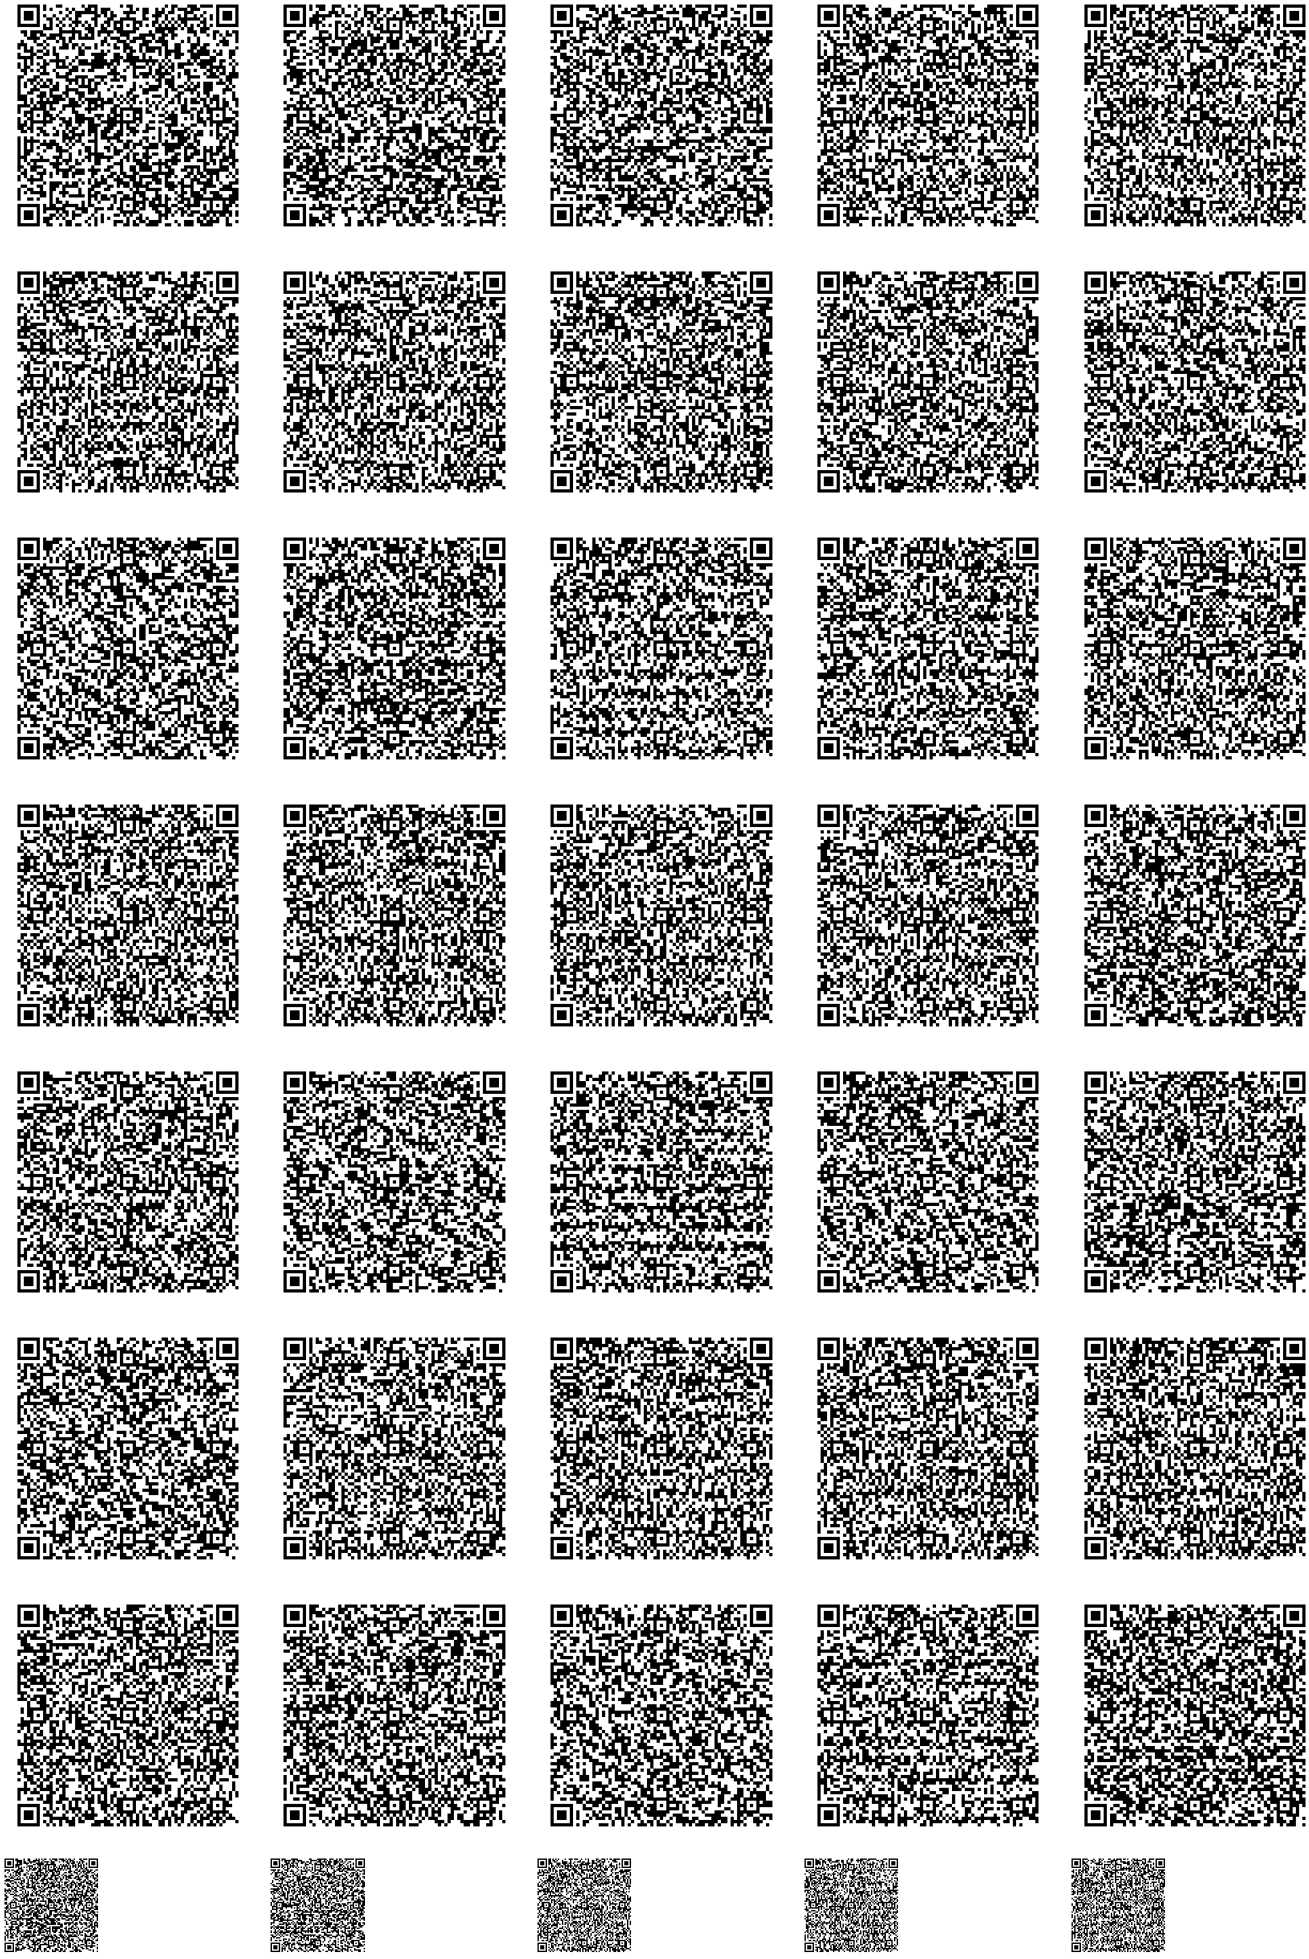

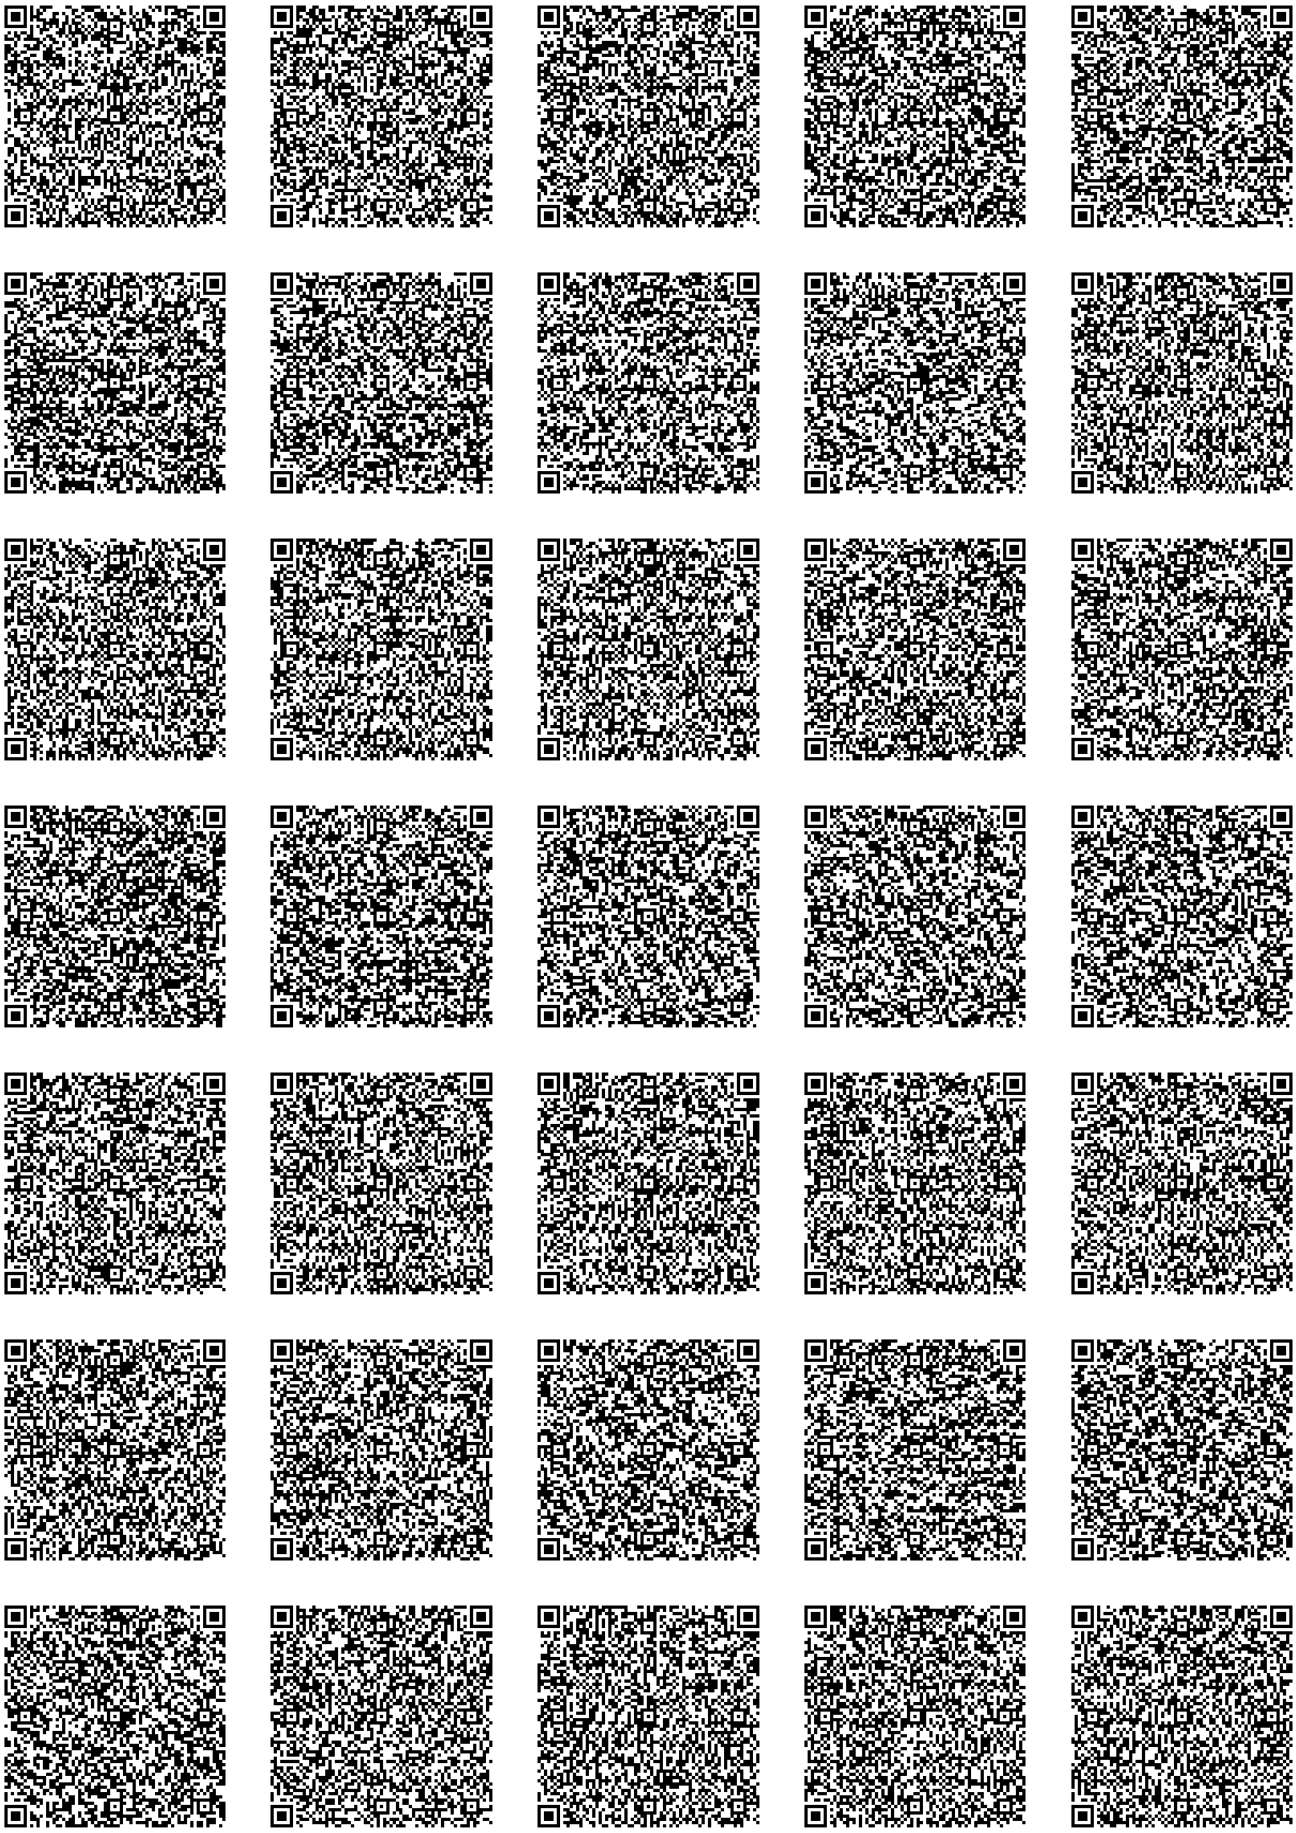

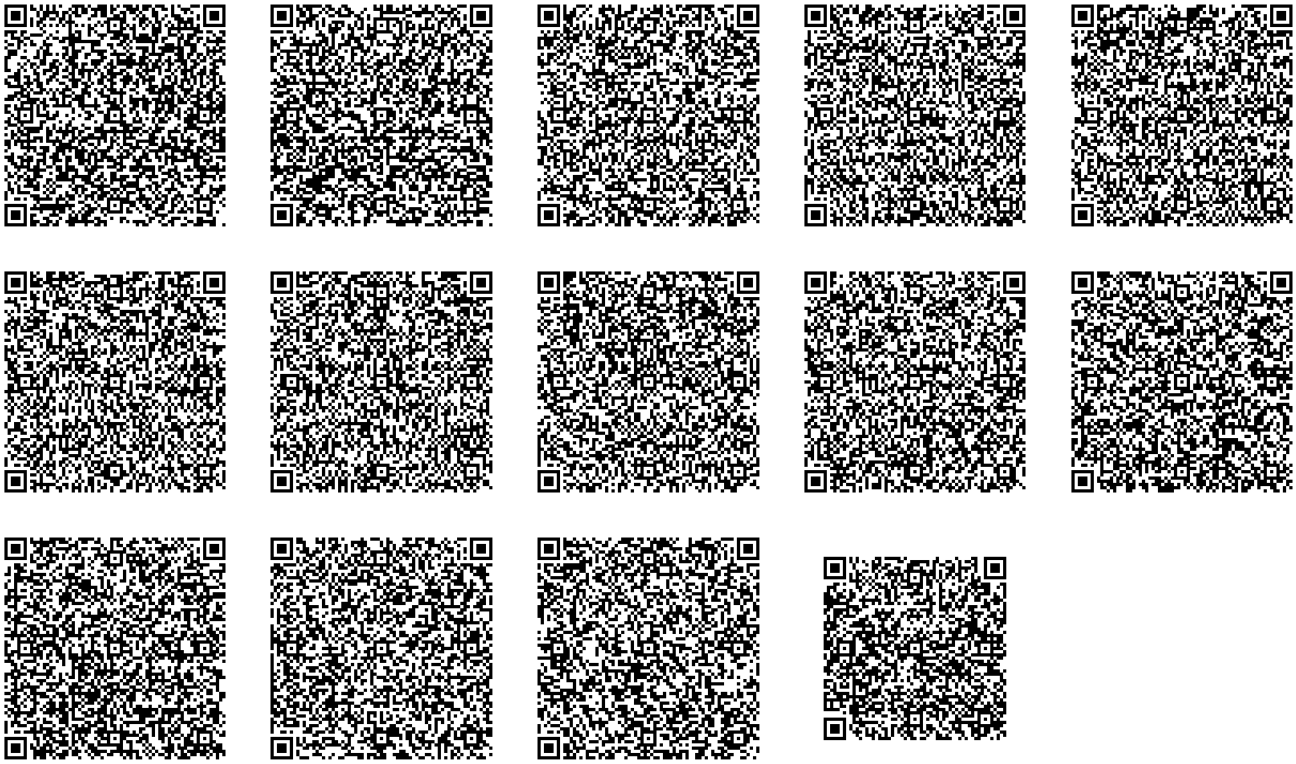

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление. Вентиляция				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	73	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2612	339	885 468
2	86	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	677	339	229 503
3	90	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	120	339	40 680
4	91	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	51	342	17 442
5	92	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	671	1 806	1 211 826
6	93	234-303-0303 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	170.5	302	51 491
7	94	234-303-0307 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	55	388	21 340
8	95	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	145.2	470	68 244
9	96	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	216.7	515	111 600

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	97	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	105.6	770	81 312
11	98	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	45.1	925	41 718
12	99	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	144	248	35 712
13	100	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	288	267	76 896
			Подраздел: Тепловой узел				
14	168	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	1 806	119 196
15	169	234-303-0326 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	13.2	2 887	38 108
16	170	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	4.4	1 206	5 306
17	171	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	33	925	30 525
18	172	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8 470
19	173	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	11	581	6 391
20	174	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	248	4 464
21	175	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	36	267	9 612
			Итого по подразделу: Тепловой узел				**222 072**
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				**3 095 304**
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Подраздел: Приточная установка П1				
22	177	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	226 099	226 099

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	178	514-401-0204 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час	комплект	1	2 343 881	2 343 881
24	194	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	1.079	87 175	94 061
25	195	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	83	3 745	310 835
26	196	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	83	1 616	134 128
27	197	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	99	2 831	280 269
			Итого по подразделу: Приточная установка П1				**3 389 273**
			Подраздел: Приточная установка П2				
28	199	6118-0207-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	322 558	322 558
29	200	514-401-0207 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час	комплект	1	3 173 345	3 173 345
30	208	246-306-0615 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 400 мм	шт.	2	101 369	202 738
31	209	246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный периметром от 701 мм до 1000 мм	шт.	9	47 779	430 011
32	225	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	2.86	87 175	249 320
33	226	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	220	3 745	823 900
34	227	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	220	1 616	355 520
35	228	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	264	2 831	747 384
36	229	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	85	775	65 875
			Итого по подразделу: Приточная установка П2				**6 370 651**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Приточная установка П3				
37	230	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	226 099	226 099
38	231	514-401-0702 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	2 497 603	2 497 603
39	249	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.351	87 175	30 598
40	250	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	27	3 745	101 115
41	251	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	27	1 616	43 632
42	252	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	32	2 831	90 592
43	253	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	11	775	8 525
			Итого по подразделу: Приточная установка П3				**2 998 164**
			Подраздел: Приточная установка П4				
44	254	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	226 099	226 099
45	255	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час	комплект	1	1 504 290	1 504 290
46	266	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.806	87 175	70 262
47	267	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	62	3 745	232 190
48	268	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	62	1 616	100 192
49	269	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	74	2 831	209 494
50	270	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	31	775	24 025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Приточная установка П4				**2 366 552**
			Подраздел: Приточная установка П5(обеденная зона)				
51	271	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	226 099	226 099
52	272	514-401-0702 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	2 497 603	2 497 603
			Итого по подразделу: Приточная установка П5(обеденная зона)				**2 723 702**
			Подраздел: Приточная установка П6				
53	286	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	226 099	226 099
54	287	514-401-0702 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 м3/час	комплект	1	2 497 603	2 497 603
55	297	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.624	87 175	54 397
56	298	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	48	3 745	179 760
57	299	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	48	1 616	77 568
58	300	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	58	2 831	164 198
59	301	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24	775	18 600
			Итого по подразделу: Приточная установка П6				**3 218 225**
			Подраздел: Приточная установка П7				
60	302	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	226 099	226 099
61	303	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час	комплект	1	1 504 290	1 504 290
62	308	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.0195	87 175	1 699
63	309	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1.5	3 745	5 618

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	310	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	1.5	1 616	2 424
65	311	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1.8	2 831	5 096
66	312	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	3 100
			Итого по подразделу: Приточная установка П7				**1 748 327**
			Подраздел: В1				
67	327	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.091	87 175	7 933
68	328	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	7	3 745	26 215
69	329	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	7	1 616	11 312
70	330	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9	2 831	25 479
71	331	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	775	5 425
			Итого по подразделу: В1				**76 364**
			Подраздел: В2				
72	342	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.039	87 175	3 399
73	343	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	3	3 745	11 235
74	344	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	3	1 616	4 848
75	345	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	3.6	2 831	10 192
76	346	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775	2 325
			Итого по подразделу: В2				**32 000**
			Подраздел: В3,В3,1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	357	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.026	87 175	2 266
78	358	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	2	3 745	7 490
79	359	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2	1 616	3 232
80	360	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2.4	2 831	6 794
81	361	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775	1 550
			Итого по подразделу: В3,В3,1				**21 333**
			Подраздел: В4,В4,1				
82	373	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.0195	87 175	1 699
83	374	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1.5	3 745	5 617
84	375	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	1.5	1 616	2 424
85	376	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2	2 831	5 662
86	377	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775	1 550
			Итого по подразделу: В4,В4,1				**16 953**
			Подраздел: В6				
87	402	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.117	87 175	10 199
88	403	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	9	3 745	33 705
89	404	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	9	1 616	14 544

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	405	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	7	2 831	19 817
91	406	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6.5	775	5 037
			Итого по подразделу: В6				**83 303**
			Подраздел: В7				
92	417	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.039	87 175	3 399
93	418	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	3	3 745	11 235
94	419	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	3	1 616	4 848
95	420	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	5	2 831	14 155
96	421	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	3 100
			Итого по подразделу: В7				**36 738**
			Подраздел: В8				
97	431	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.13	87 175	11 333
98	432	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	10	3 745	37 450
99	433	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	10	1 616	16 160
100	434	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	11.6	2 831	32 839
101	435	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10.8	775	8 370
			Итого по подразделу: В8				**106 152**
			Подраздел: В9				
102	447	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.182	87 175	15 866

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
103	448	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	14	3 745	52 430
104	449	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	14	1 616	22 624
105	450	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	16	2 831	45 296
106	451	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	775	10 850
			Итого по подразделу: В9				**147 066**
			Подраздел: В11				
107	477	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.026	87 175	2 266
108	478	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	2	3 745	7 490
109	479	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	2	1 616	3 232
110	480	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2.4	2 831	6 794
111	481	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775	1 550
			Итого по подразделу: В11				**21 333**
			Подраздел: В13				
112	517	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.13	87 175	11 332
113	518	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	10	3 745	37 450
114	519	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	10	1 616	16 160
115	520	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	11	2 831	31 141

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
116	521	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	775	13 950
			Итого по подразделу: В13				**110 033**
			Подраздел: В14				
117	532	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.13	87 175	11 332
118	533	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	10	3 745	37 450
119	534	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	10	1 616	16 160
120	535	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	11	2 831	31 141
121	536	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	775	3 100
			Итого по подразделу: В14				**99 183**
			Подраздел: В15				
122	546	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.039	87 175	3 399
123	547	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	3	3 745	11 235
124	548	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	3	1 616	4 848
125	549	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	4	2 831	11 324
126	550	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775	2 325
			Итого по подразделу: В15				**33 132**
			Подраздел: В17				
127	574	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.117	87 175	10 199
128	575	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	9	3 745	33 705

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	576	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	9	1 616	14 544
130	577	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	10.8	2 831	30 574
131	578	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	775	6 975
			Итого по подразделу: В17				**95 998**
			Подраздел: В18				
132	581	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.13	87 175	11 333
133	582	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	10	3 745	37 450
134	583	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	10	1 616	16 160
135	584	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	12	2 831	33 972
136	585	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	775	7 750
			Итого по подразделу: В18				**106 665**
			Подраздел: В19				
137	593	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.013	87 175	1 133
138	594	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1	3 745	3 745
139	595	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	1	1 616	1 616
140	596	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1	2 831	2 831
141	597	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	775	775
			Итого по подразделу: В19				**10 100**
			Подраздел: В20				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	606	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.013	87 175	1 133
143	607	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1	3 745	3 745
144	608	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	1	1 616	1 616
145	609	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	1.2	2 831	3 397
146	610	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	775	775
			Итого по подразделу: В20				**10 666**
			Подраздел: В21				
147	624	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.065	87 175	5 666
148	625	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	5	3 745	18 725
149	626	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	5	1 616	8 080
150	627	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	6	2 831	16 986
151	628	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3.4	775	2 635
			Итого по подразделу: В21				**52 092**
			Подраздел: В21,1				
152	637	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.078	87 175	6 799
153	638	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	6	3 745	22 470
154	639	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	6	1 616	9 696

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
155	640	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	8	2 831	22 648
156	641	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6	775	4 650
			Итого по подразделу: В21,1				**66 264**
			Подраздел: В22				
157	655	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.078	87 175	6 799
158	656	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	6	3 745	22 470
159	657	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	6	1 616	9 696
160	658	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	7.2	2 831	20 383
161	659	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6.6	775	5 115
			Итого по подразделу: В22				**64 464**
			Подраздел: В23				
162	679	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.273	87 175	23 798
163	680	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	21	3 745	78 645
164	681	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	21	1 616	33 936
165	682	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	25.4	2 831	71 907
166	683	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10.5	775	8 137
			Итого по подразделу: В23				**216 424**
			Подраздел: В24				
167	690	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.039	87 175	3 399

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
168	691	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	3	3 745	11 235
169	692	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	3	1 616	4 848
170	693	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	4	2 831	11 324
171	694	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775	2 325
			Итого по подразделу: В24				**33 132**
			Подраздел: ДВ1				
172	706	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.5	248	620
173	707	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.23	87 175	20 050
174	708	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	23	3 745	86 135
175	709	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	775	6 200
			Итого по подразделу: ДВ1				**113 005**
			Подраздел: ДВ2				
176	721	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2.5	248	620
177	722	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.23	87 175	20 050
178	723	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	23	3 745	86 135
179	724	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	775	6 200
			Итого по подразделу: ДВ2				**113 005**
			Подраздел: ДПЕ1				
180	730	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.5	248	372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
181	731	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.01	87 175	872
182	732	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1	3 745	3 745
183	733	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0.5	775	388
			Итого по подразделу: ДПЕ1				**5 377**
			Подраздел: ДПЕ2				
184	739	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.5	248	372
185	740	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.01	87 175	872
186	741	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1	3 745	3 745
187	742	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0.5	775	388
			Итого по подразделу: ДПЕ2				**5 377**
			Подраздел: ДПЕ3				
188	748	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.5	248	372
189	749	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.01	87 175	872
190	750	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1	3 745	3 745
191	751	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0.5	775	388
			Итого по подразделу: ДПЕ3				**5 377**
			Подраздел: ДПЕ4				
192	757	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1.5	248	372
193	758	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.01	87 175	872

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	759	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	1	3 745	3 745
195	760	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0.5	775	388
			Итого по подразделу: ДПЕ4				**5 377**
			Подраздел: ДП1-ДП2				
196	775	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	248	1 488
197	776	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.26	87 175	22 666
198	777	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	26	3 745	97 370
199	778	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	775	9 300
			Итого по подразделу: ДП1-ДП2				**130 824**
			Подраздел: ДП1.1-ДП2.1				
200	784	6118-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 3200 мм	шт.	2	29 381	58 762
201	785	246-306-1242 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 600 мм х 400 мм	шт.	2	106 239	212 478
202	792	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6	248	1 488
203	793	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	0.26	87 175	22 666
204	794	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	26	3 745	97 370
205	795	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	775	9 300
			Итого по подразделу: ДП1.1-ДП2.1				**402 064**
			Подраздел: ВЕ1-ВЕ28				
206	796	6118-0208-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дефлектора диаметр патрубка 280 мм	шт.	17	12 789	217 413

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
207	797	6118-0208-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	17	15 137	257 329
208	798	6118-0208-0608 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка турбины вентиляционной ротационной (турбодефлектора), диаметр патрубка, мм 500	шт.	3	4 594	13 782
209	799	246-301-0606 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	1	15 261	15 261
210	800	246-301-0608 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм	шт.	16	18 946	303 136
211	801	246-301-0610 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	15	25 288	379 320
212	802	246-301-0611 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	2	37 617	75 234
213	803	246-301-0623 РСНБ РК 2022	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 500 мм	шт.	3	21 064	63 192
214	804	6118-0203-0903 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметр до 560 мм	шт.	3	11 546	34 638
215	805	246-302-1836 РСНБ РК 2022	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм размерами 500х500 мм	шт.	3	56 455	169 365
216	806	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	3	16 128	48 384
217	807	246-308-0306 РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	шт.	3	178 938	536 814
218	808	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	33	1 351	44 583
219	809	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	30	1 700	51 000
220	810	6118-0202-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,36 м2 в конструкцию подвесных потолков	шт.	3	3 239	9 717
221	811	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	7	7 489	52 423

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
222	812	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	23	7 338	168 774
223	813	246-304-0574 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	2	6 317	12 634
224	814	246-304-0576 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	7 065	7 065
225	815	246-304-0577 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 250 мм	шт.	10	7 687	76 870
226	816	246-304-0607 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	7 893	7 893
227	817	246-304-0608 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм	шт.	12	8 685	104 220
228	818	246-304-0609 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	9 331	9 331
229	819	246-304-0580 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	3	9 742	29 226
230	820	246-304-0655 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	11 377	11 377
231	821	246-304-0678 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 450 мм х 300 мм	шт.	2	12 430	24 860
232	822	246-304-0713 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	3	18 114	54 342
233	823	6118-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	9.42	10 987	103 498
234	824	6118-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	104.6	12 178	1 273 819
235	825	6118-0101-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	83.2	11 712	974 438
236	826	6118-0101-0409 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 900 мм	м2	16.2	12 162	197 024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	827	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	60.8	10 628	646 182
238	828	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	2.73	87 175	237 988
239	829	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	210	3 745	786 450
240	830	6111-0501-0604 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	210	1 616	339 360
241	831	236-202-1010 РСНБ РК 2022	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	231	2 831	653 961
242	832	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	250	775	193 750
			Итого по подразделу: ВЕ1-ВЕ28				**8 184 653**
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				**33 219 355**
			Раздел: Магистральные трубопроводы системы теплоснабженияПВ1-ПВ2, П1-П5 и Тепловых завес				
243	835	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	3	2 225	6 675
244	837	242-312-0404 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	113 657	340 971
245	841	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	21	7 577	159 117
246	844	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	9	13 175	118 575
247	845	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	18 759	225 108
248	848	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	8 512	42 560
249	849	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 438	15 438
250	852	242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	2	38 802	77 604

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
251	854	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	8 512	42 560
252	855	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 438	15 438
253	856	245-505-0135 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, модель CV 316 GG, типа IMI	шт.	2	114 472	228 944
254	857	245-505-0137 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, модель CV 316 GG, типа IMI	шт.	1	123 298	123 298
255	858	245-505-0139 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 316 GG, типа IMI	шт.	2	141 231	282 462
256	859	245-505-0140 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75 фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65, модель CV 316 GG, типа IMI	шт.	1	245 131	245 131
257	860	245-602-0301 РСНБ РК 2022	Сервопривод нормально открыт, 230 В	шт.	6	8 023	48 138
258	866	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8 512	25 536
259	867	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	15 438	15 438
260	868	242-304-0604 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	8 364	16 728
261	869	242-304-1101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	64 401	64 401
262	870	242-304-1102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	67 128	134 256
263	871	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	75 365	75 365
264	876	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов воздушных	шт.	14	733	10 262
265	878	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	14	4 549	63 686

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
266	886	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	8.899	87 175	775 770
267	887	234-201-0301 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 /URSA TERRA/	м3	8.899	16 436	146 264
268	888	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	95	248	23 560
269	889	6111-0501-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	190	267	50 730
			Подраздел: Трубопроводы медные				
270	904	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	336	1 806	606 816
271	905	234-303-0301 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 10 мм	м	226.6	278	62 995
272	906	234-303-0302 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 12 мм	м	30.8	282	8 686
273	907	234-303-0303 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 15 мм	м	81.4	302	24 583
274	908	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	30.8	316	9 733
			Итого по подразделу: Трубопроводы медные				**712 813**
			Итого по разделу: Магистральные трубопроводы системы теплоснабженияПВ1-ПВ2, П1-П5 и Тепловых завес				**4 086 828**
			Итого по локальной смете: Отопление. Вентиляция				**40 401 487**
			ИТОГО по акту:				**40 401 487**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	24382872.355 x 8.10%	1 975 012
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	40401487.355 + 1975012.754	42 376 500
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	24382872.355 x 0.05409035%	1 318 878
	Сметная прибыль, (5.00%)	26357885.109 x 5.00%	1 317 894
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(42376500.109 + 1318878.030) x 5.000%	2 184 768
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		47 198 041
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	47198041.301 x 1.0557	49 826 972
	НДС (12%)	49826972.201 x 12%	5 979 236
	Итого с НДС	49826972.201 + 5979236.664	55 806 208

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:28
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:13
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:54
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:38
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:53
Представители заказчика		
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:44
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:52
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:28 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:51

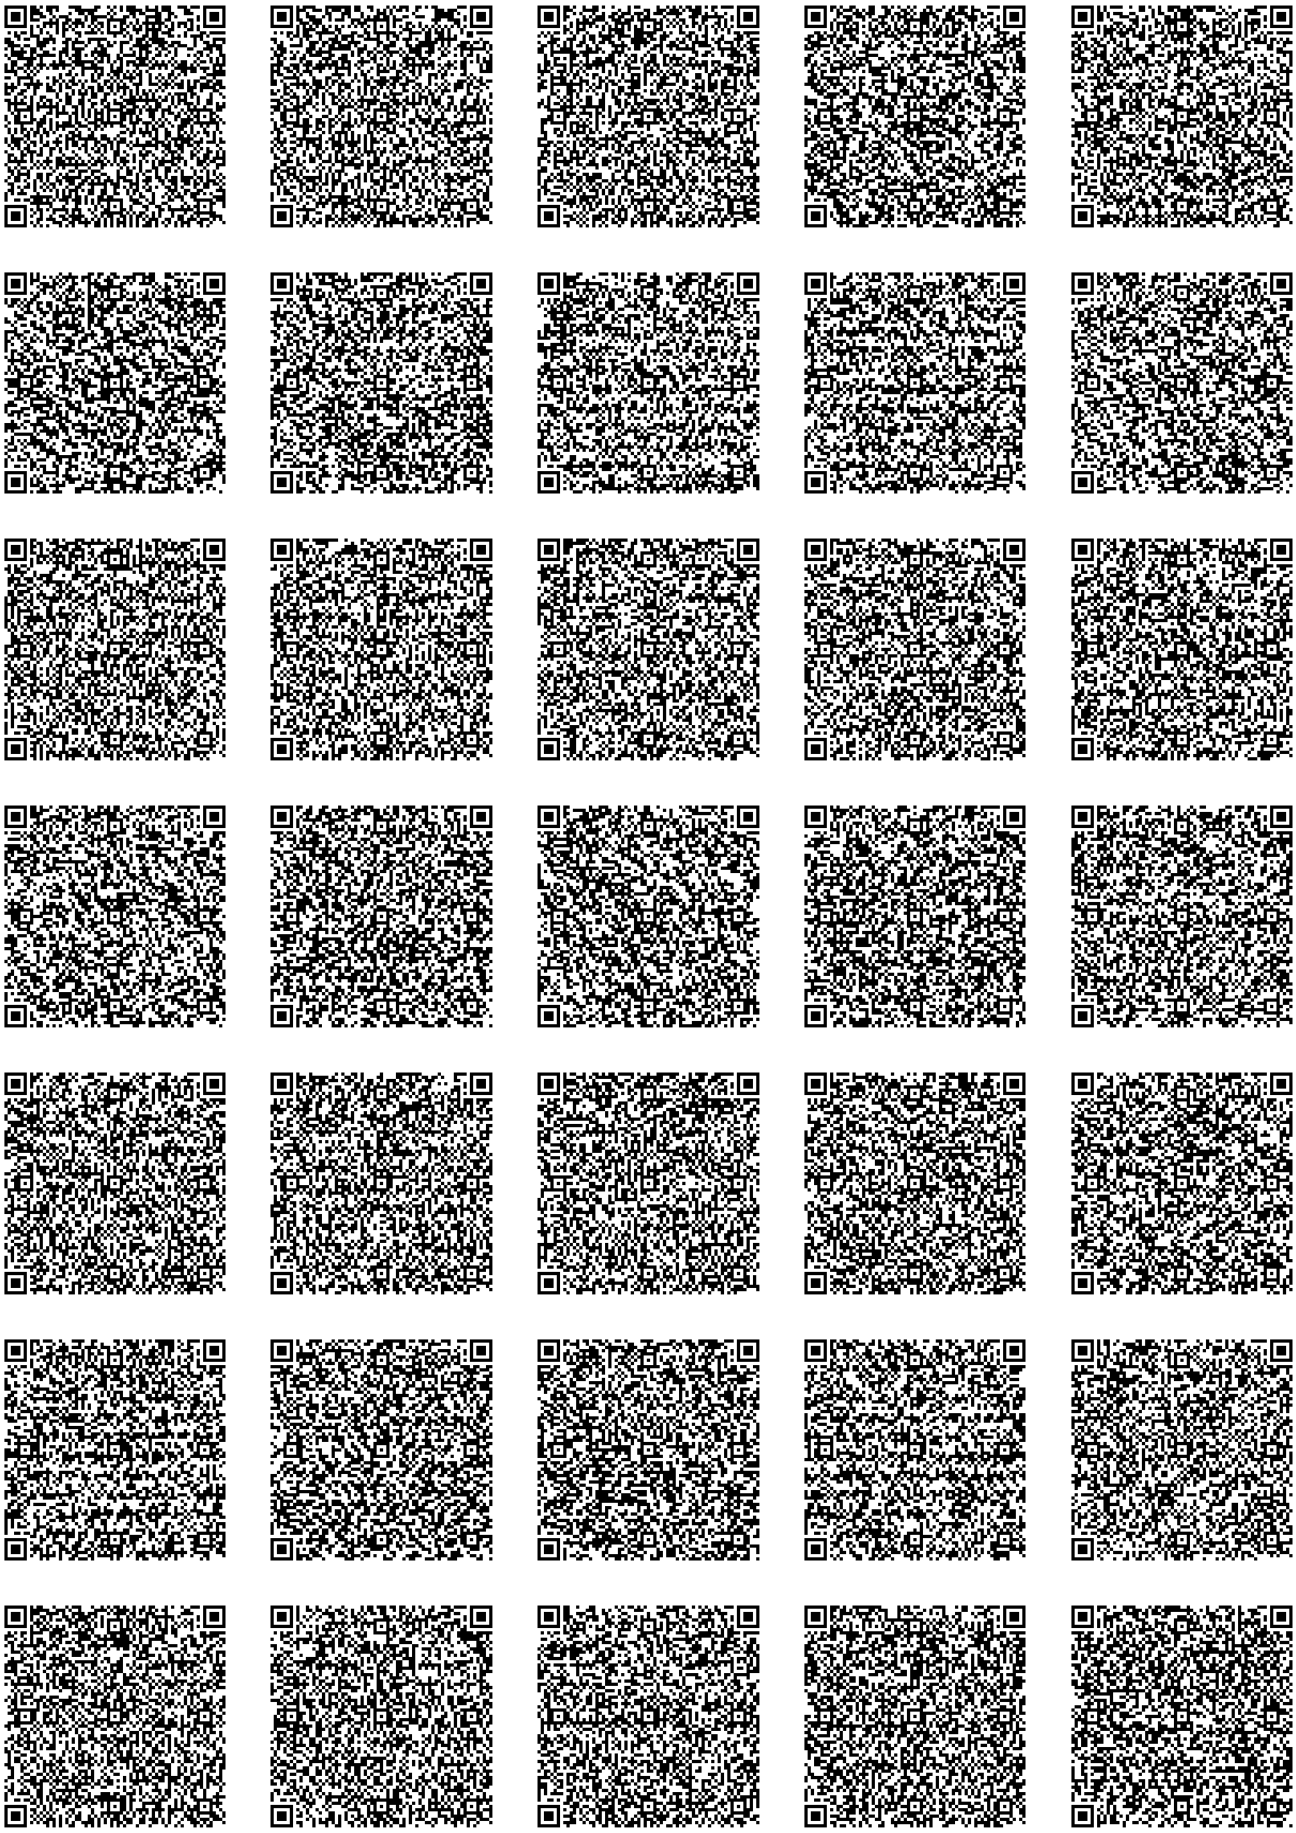

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Внутриплощадочные сети водоснабжения и каанализации				
			Раздел: Водоснабжение В1				
			Подраздел: Трубопроводы				
1	14	1125-0210-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0.0466	405 448	18 894
2	15	1125-0210-0201РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0.0728	1 351 497	98 389
3	16	1125-0210-0202РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 125 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0.1265	1 592 561	201 459
			Итого по подразделу: Трубопроводы				**318 742**
			Подраздел: Фитинги				
4	34	1134-0201-0804РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	2 696	5 392
5	35	261-401-0327РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель ПГ/	100 шт.	0.02	152 037	3 041
			Итого по подразделу: Фитинги				**8 433**
			Итого по разделу: Водоснабжение В1				**327 175**
			Итого по локальной смете: Внутриплощадочные сети водоснабжения и каанализации				**327 175**
			ИТОГО по акту:				**327 175**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				327175.000 x 8.10%	26 501
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				327175.000 + 26501.176	353 676
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				327175.000 x 0.05409035%	17 697
		Сметная прибыль, (5.00%)				353676.176 x 5.00%	17 683
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(353676.176 + 17697.009) x 5.000%	18 568
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					407 625

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				407625.654 x 1.0557	430 330
		НДС (12%)				430330.403 x 12%	51 639
		Итого с НДС				430330.403 + 51639.648	481 970

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:28
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:55
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:13
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:39
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:53
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:44
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:53
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:53

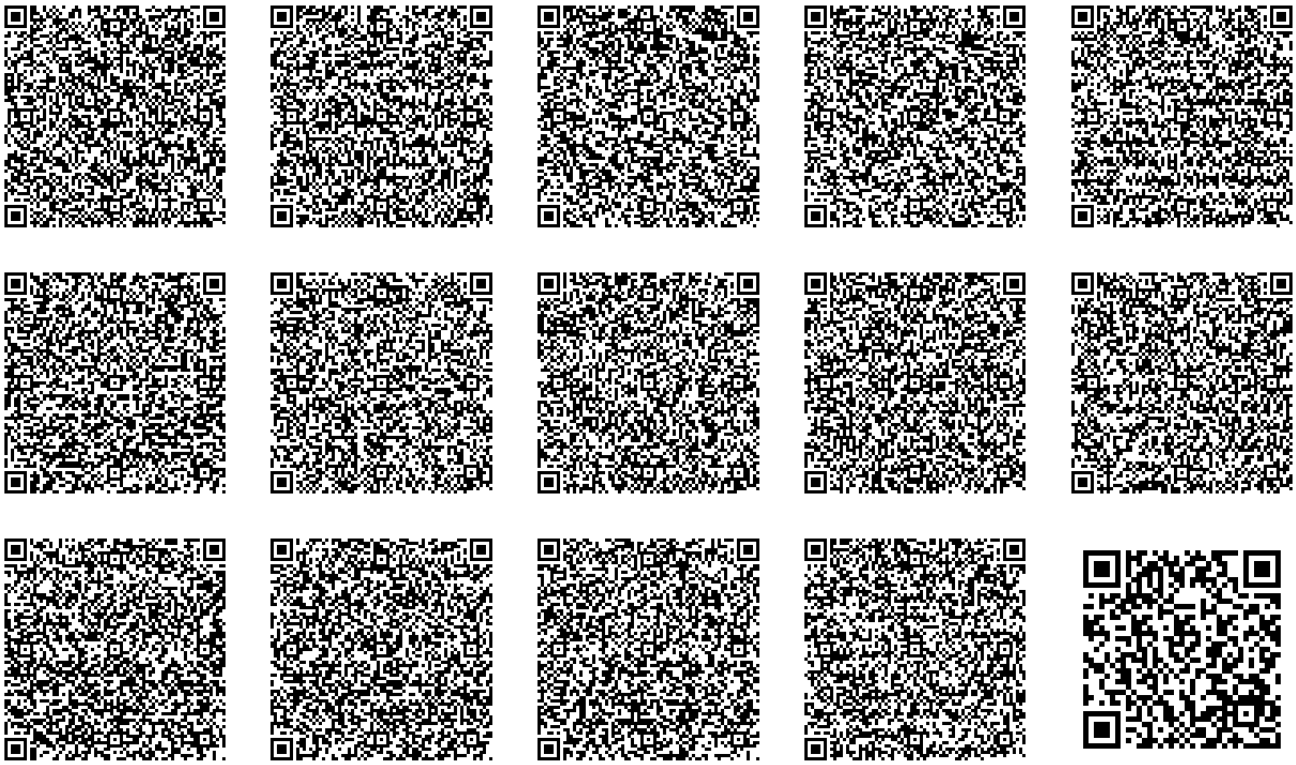

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные газопроводы				
			Раздел: Резервуарная установка				
			Подраздел: Знаки				
1	5	1134-0201-0804РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	2 696	10 784
2	6	251-101-0401РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0.597325	25 844	15 437
3	7	242-207-3801РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	320	640
			Итого по подразделу: Знаки				**26 861**
			Итого по разделу: Резервуарная установка				**26 861**
			Раздел: Газопровод среднего давления				
			Подраздел: Опознавательные знаки				
4	91	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	16 918	33 836
5	92	222-525-0301РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01824	1 184 085	21 598
6	93	222-525-0401РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.0014915	1 131 374	1 687
7	94	217-101-0101РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.1968	1 092	215
8	95	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	0.03	38 603	1 158
			Итого по подразделу: Опознавательные знаки				**58 494**
			Подраздел: Табличный знак				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	96	1134-0201-0804РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	2 696	2 696
10	97	251-101-0401РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	м2	0.28	25 844	7 236
			Итого по подразделу: Табличный знак				**9 932**
			Подраздел: Контроль сварных соединений				
11	111	1339-0301-0201РСНБ РК 2022	Конструкции и оборудование, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на растяжение	образец	2	6 204	12 408
12	112	1339-0301-0208РСНБ РК 2022	Конструкции и оборудование, сталь перлитная, толщина стенки до 12 мм. Испытания механические на изгиб	образец	2	5 342	10 684
			Итого по подразделу: Контроль сварных соединений				**23 092**
			Подраздел: Испытания /лист-3 ВР/				
13	114	1125-0211-0101РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	7	24 799	173 593
14	115	1125-0211-0101РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	49 597	49 597
15	116	1125-0211-0104РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	66 329	66 329
16	117	1339-0201-0502РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	63	2 338	147 294
17	118	1339-0201-0510РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4 637	4 637
			Итого по подразделу: Испытания /лист-3 ВР/				**441 450**
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления				**532 968**
			Раздел: Строительные работы				
			Подраздел: Фундаментная плита Фм-3				
18	135	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	0.2813	492	138
			Итого по подразделу: Фундаментная плита Фм-3				**138**
			Итого по разделу: Строительные работы				**138**
			Итого по локальной смете: Наружные газопроводы				**559 967**
			ИТОГО по акту:				**559 967**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				559967.000 x 8.10%	45 357
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				559967.000 + 45357.329	605 324
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				559967.000 x 0.05409035%	30 288
		Сметная прибыль, (5.00%)				605324.329 x 5.00%	30 266
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(605324.329 + 30288.809) x 5.000%	31 780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					697 660
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				697660.012 x 1.0557	736 519
		НДС (12%)				736519.675 x 12%	88 382
		Итого с НДС				736519.675 + 88382.361	824 902

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:27
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:55
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:13
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:39
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:53
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:45
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:53
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:54

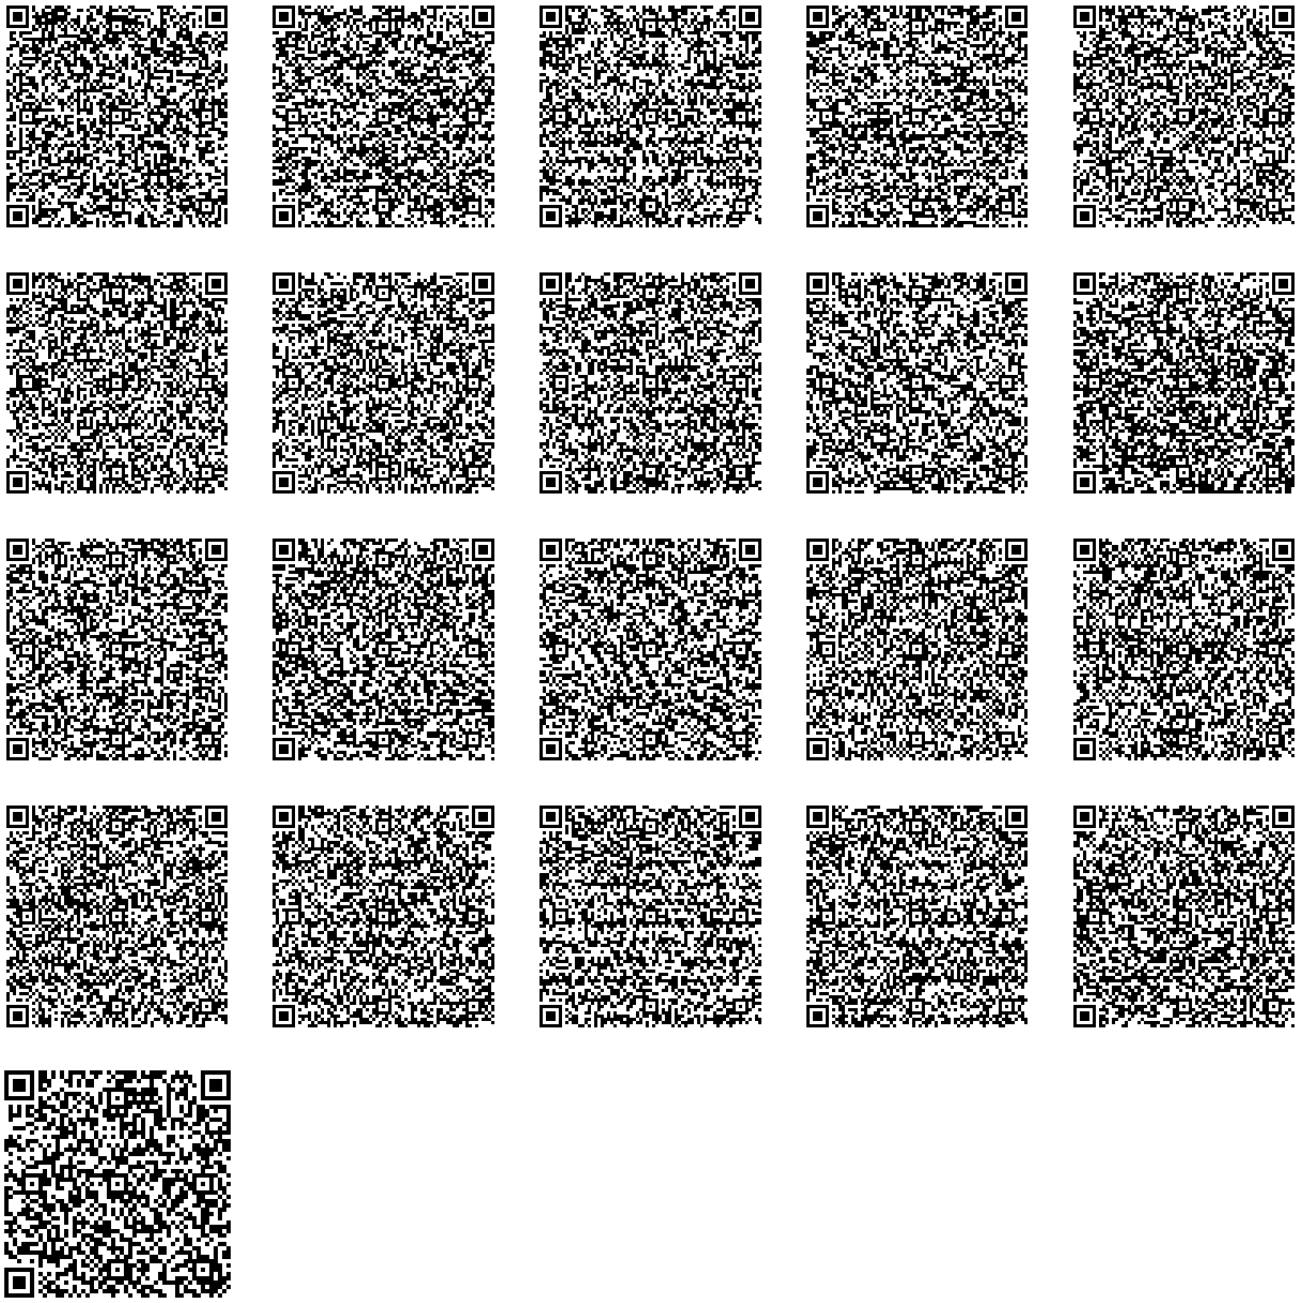

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна (листы АР-5.1...5.4)				
1	16	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2. /ОК-11/	шт.	3	5 938	17 814
2	17	246-304-0623 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами /300х1200 мм/	шт.	3	21 948	65 844
			Итого по подразделу: Окна (листы АР-5.1...5.4)				**83 658**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				
3	23	241-105-0103 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 15х1,0 мм	м	92.7	1 115	103 360
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1...ВН-16 (листы АР-5.5...5.7)				**103 360**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				
4	35	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка дверных доводчиков	шт.	25	5 110	127 750
5	36	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	25	5 650	141 250
6	37	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	25	4 853	121 325
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1...ВВ-13 (листы АР-5.8...5-11)				**390 325**
			Подраздел: Замки и доводчики				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	48	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	17	4 853	82 501
			Итого по подразделу: Замки и доводчики				**82 501**
			Итого по разделу: Проемы				**659 844**
			Раздел: Полы				
			Подраздел: Тип 7				
8	97	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	101.28	513	51 957
9	98	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	102.2928	179	18 310
			Итого по подразделу: Тип 7				**70 267**
			Подраздел: Тип 8				
10	117	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	22.06	513	11 317
11	118	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	22.2806	179	3 987
			Итого по подразделу: Тип 8				**15 305**
			Подраздел: Тип 12				
12	182	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	30.28	513	15 534
13	183	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	30.5828	179	5 474
			Итого по подразделу: Тип 12				**21 008**
			Подраздел: Тип 22 (лист АР-2.5)				
14	421	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м2	128.4	2 631	337 820
15	422	233-202-0603 СпрСЦ 05.2024	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м2	130.968	12 837	1 681 236
16	423	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	62.2	513	31 909
17	424	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	62.822	179	11 245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 22 (лист АР-2.5)				**2 062 210**
			Подраздел: Тип 32				
18	605	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	33.88	513	17 380
19	606	233-204-0102 РСНБ РК 2022	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	34.2188	179	6 125
			Итого по подразделу: Тип 32				**23 505**
			Итого по разделу: Полы				**2 192 295**
			Раздел: Перегородки сан.узлов(лист 32)				
20	794	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	68	601	40 868
21	795	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	34	768	26 112
22	796	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	34	3 217	109 378
			Подраздел: Поручень в сан.узлах(29.2)				
23	798	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	12	1 497	17 964
24	799	222-503-0301 РСНБ РК 2022	Поручень высотой до 1200 мм	м	13	26 342	342 446
			Итого по подразделу: Поручень в сан.узлах(29.2)				**360 410**
			Итого по разделу: Перегородки сан.узлов(лист 32)				**536 768**
			Раздел: Подъемные устройства (лифты) /лист АР 1.7/				
			Подраздел: Подъемник вертикальный электрический для ММГН /лист АР 1.7/				
25	1287	6120-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	подъемник	2	197 504	395 008
26	1288	516-201-0102 РСНБ РК 2022	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект	2	2 316 543	4 633 086
			Итого по подразделу: Подъемник вертикальный электрический для ММГН /лист АР 1.7/				**5 028 094**
			Итого по разделу: Подъемные устройства (лифты) /лист АР 1.7/				**5 028 094**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть				**8 417 001**
			ИТОГО по акту:				**8 417 001**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				3783915.000 x 8.10%	306 497
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				8417001.000 + 306497.129	8 723 498
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				3783915.000 x 0.05409035%	204 673
		Сметная прибыль, (5.00%)				4090412.129 x 5.00%	204 520
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(8723498.129 + 204673.276) x 5.000%	446 408
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					9 579 100
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				9579100.582 x 1.0557	10 112 656
		НДС (12%)				10112656.484 x 12%	1 213 518
		Итого с НДС				10112656.484 + 1213518.778	11 326 175
		Итого со скидкой				11326175.263 - 1533951.000	9 792 224

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:27
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:14
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:55
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:40
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:54
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:46
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:52
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:54

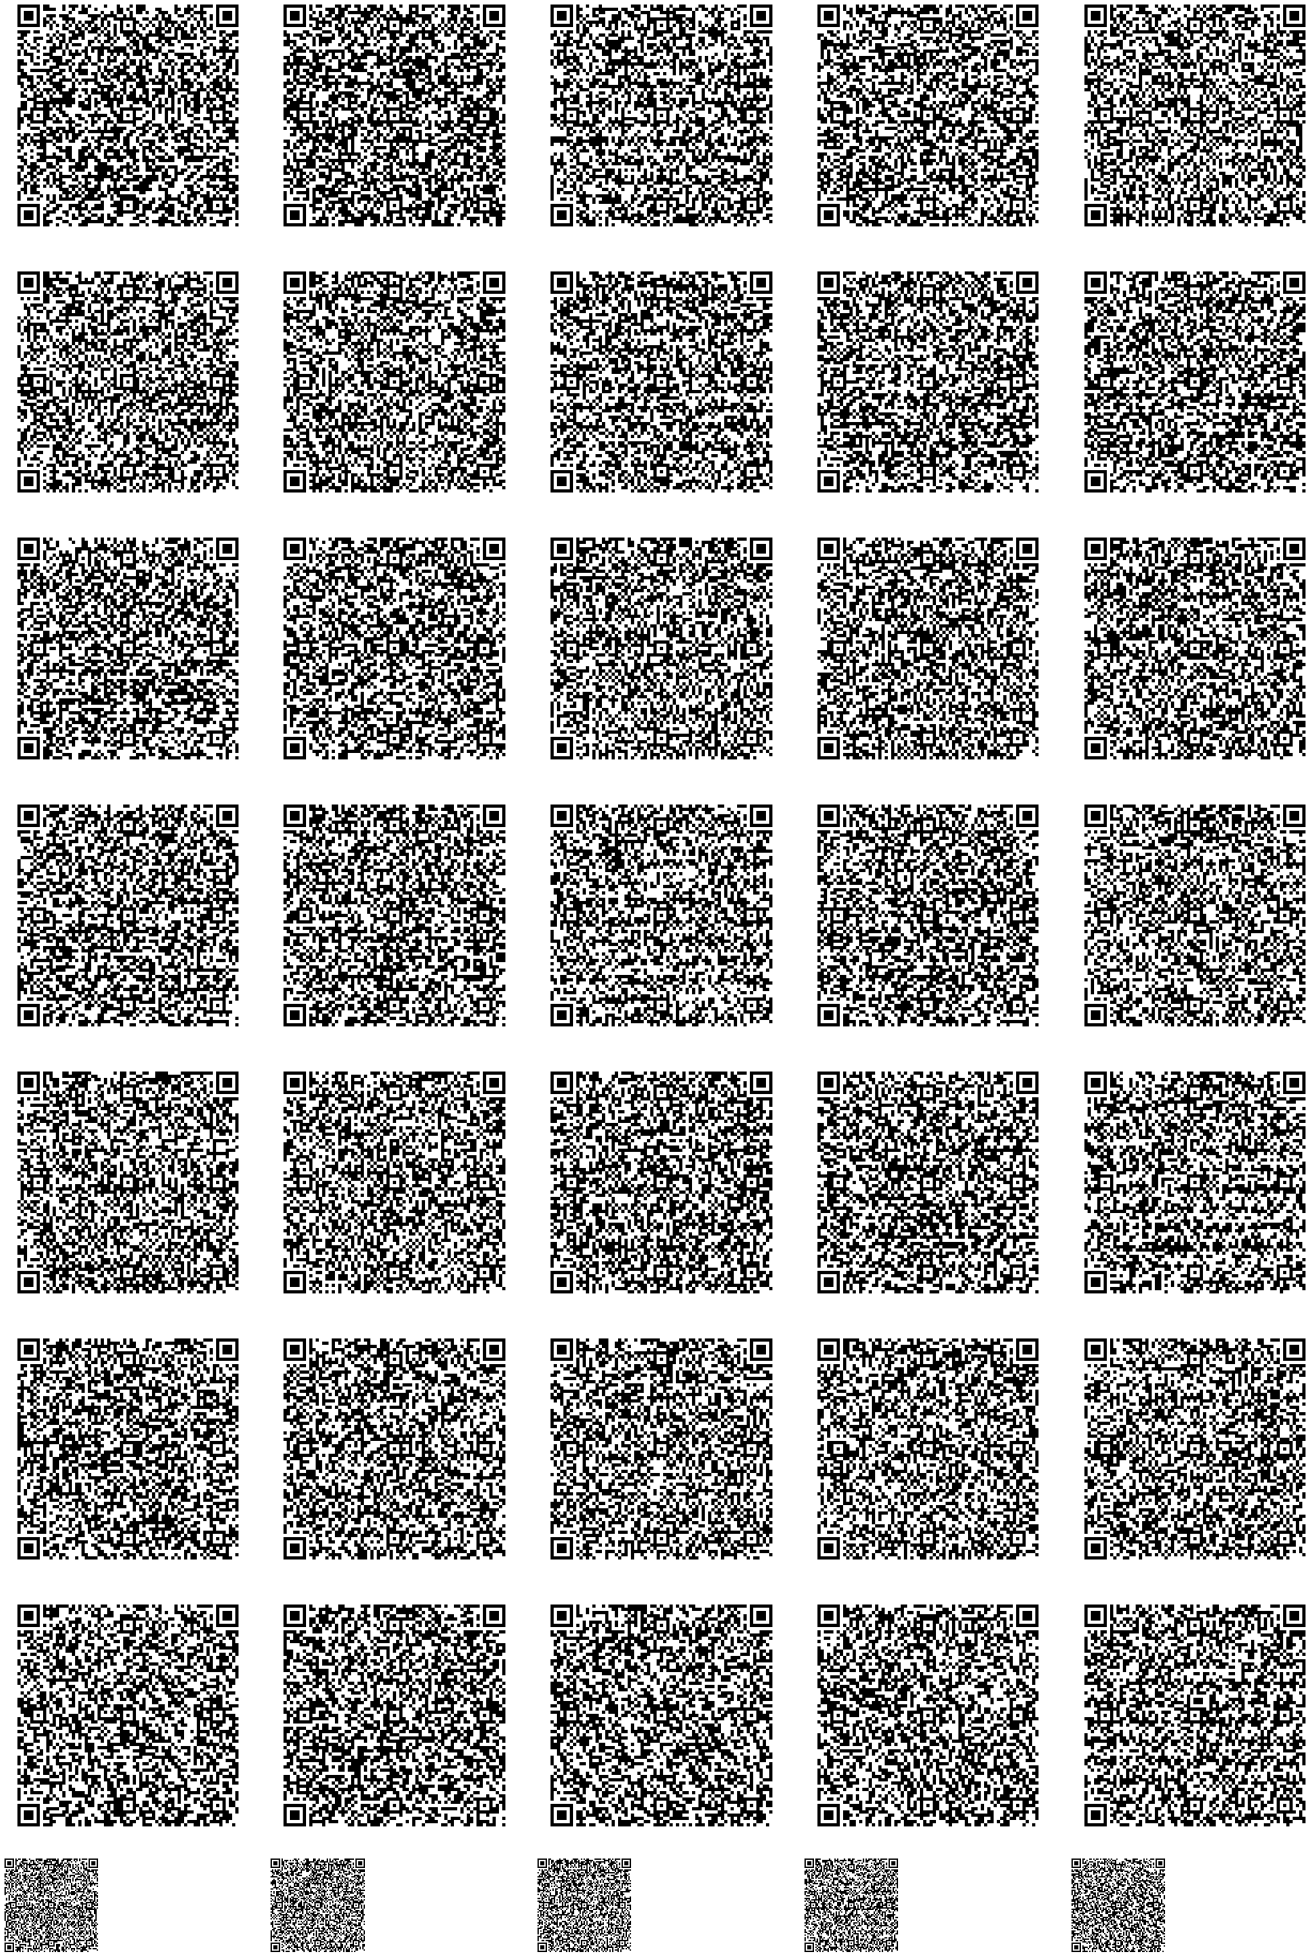

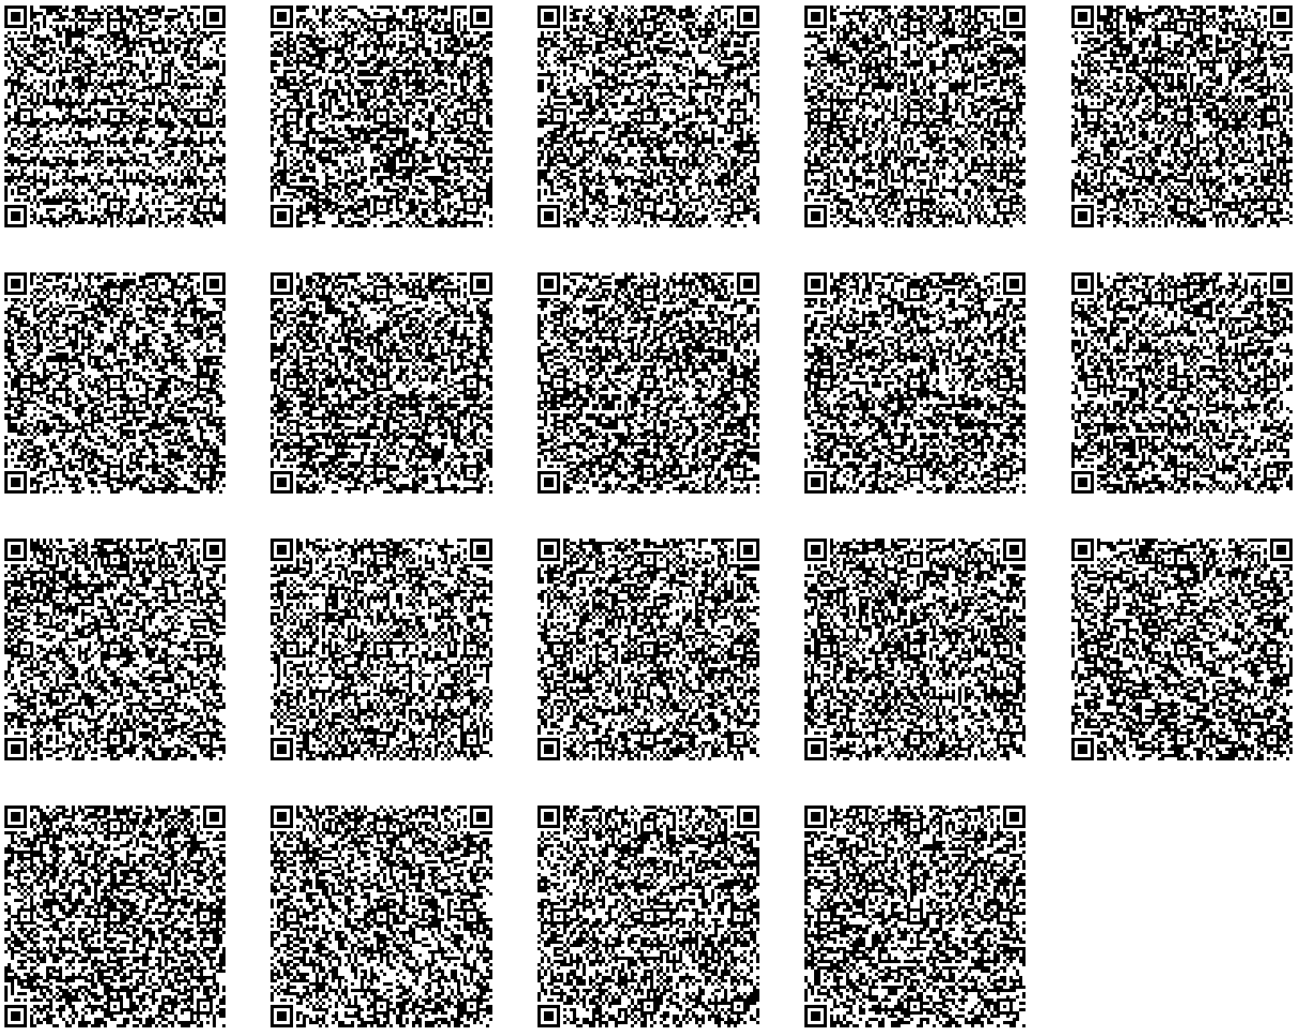

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные /добавляемые работы/				
1	1	6106-0302-0112ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.50246	63 710	32 012
2	2	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.50246	421 739	211 907
3	3	6106-0302-0401ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.60869	100 375	61 097
4	4	214-205-0103РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0.60869	421 739	256 708
5	5	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.23628	1 485 776	351 059
6	6	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	32.22335	248	7 991
7	7	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	32.22335	385	12 406
8	8	1106-0801-0102РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	2.5	97 402	243 505
9	9	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.5375	30 366	77 054
10	10	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0594	387 658	23 027
11	11	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.26174	339 177	88 776
12	12	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.230156	239 421	55 104
13	13	214-205-0102РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.230156	438 481	100 919
14	14	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	20.736	385	7 983

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные /добавляемые работы/				**1 529 548**
			ИТОГО по акту:				**1 529 548**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				1529548.000 x 8.10%	123 893
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1529548.000 + 123893.394	1 653 441
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				1529548.000 x 0.05409035%	82 734
		Сметная прибыль, (5.00%)				1653441.394 x 5.00%	82 672
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(1653441.394 + 82733.782) x 5.000%	86 809
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 905 656
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				1905656.005 x 1.0557	2 011 801
		НДС (12%)				2011801.044 x 12%	241 416
		Итого с НДС				2011801.044 + 241416.125	2 253 217

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:27
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:14
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:55
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:40
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:53
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:46
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:33 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:52
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:46 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:54

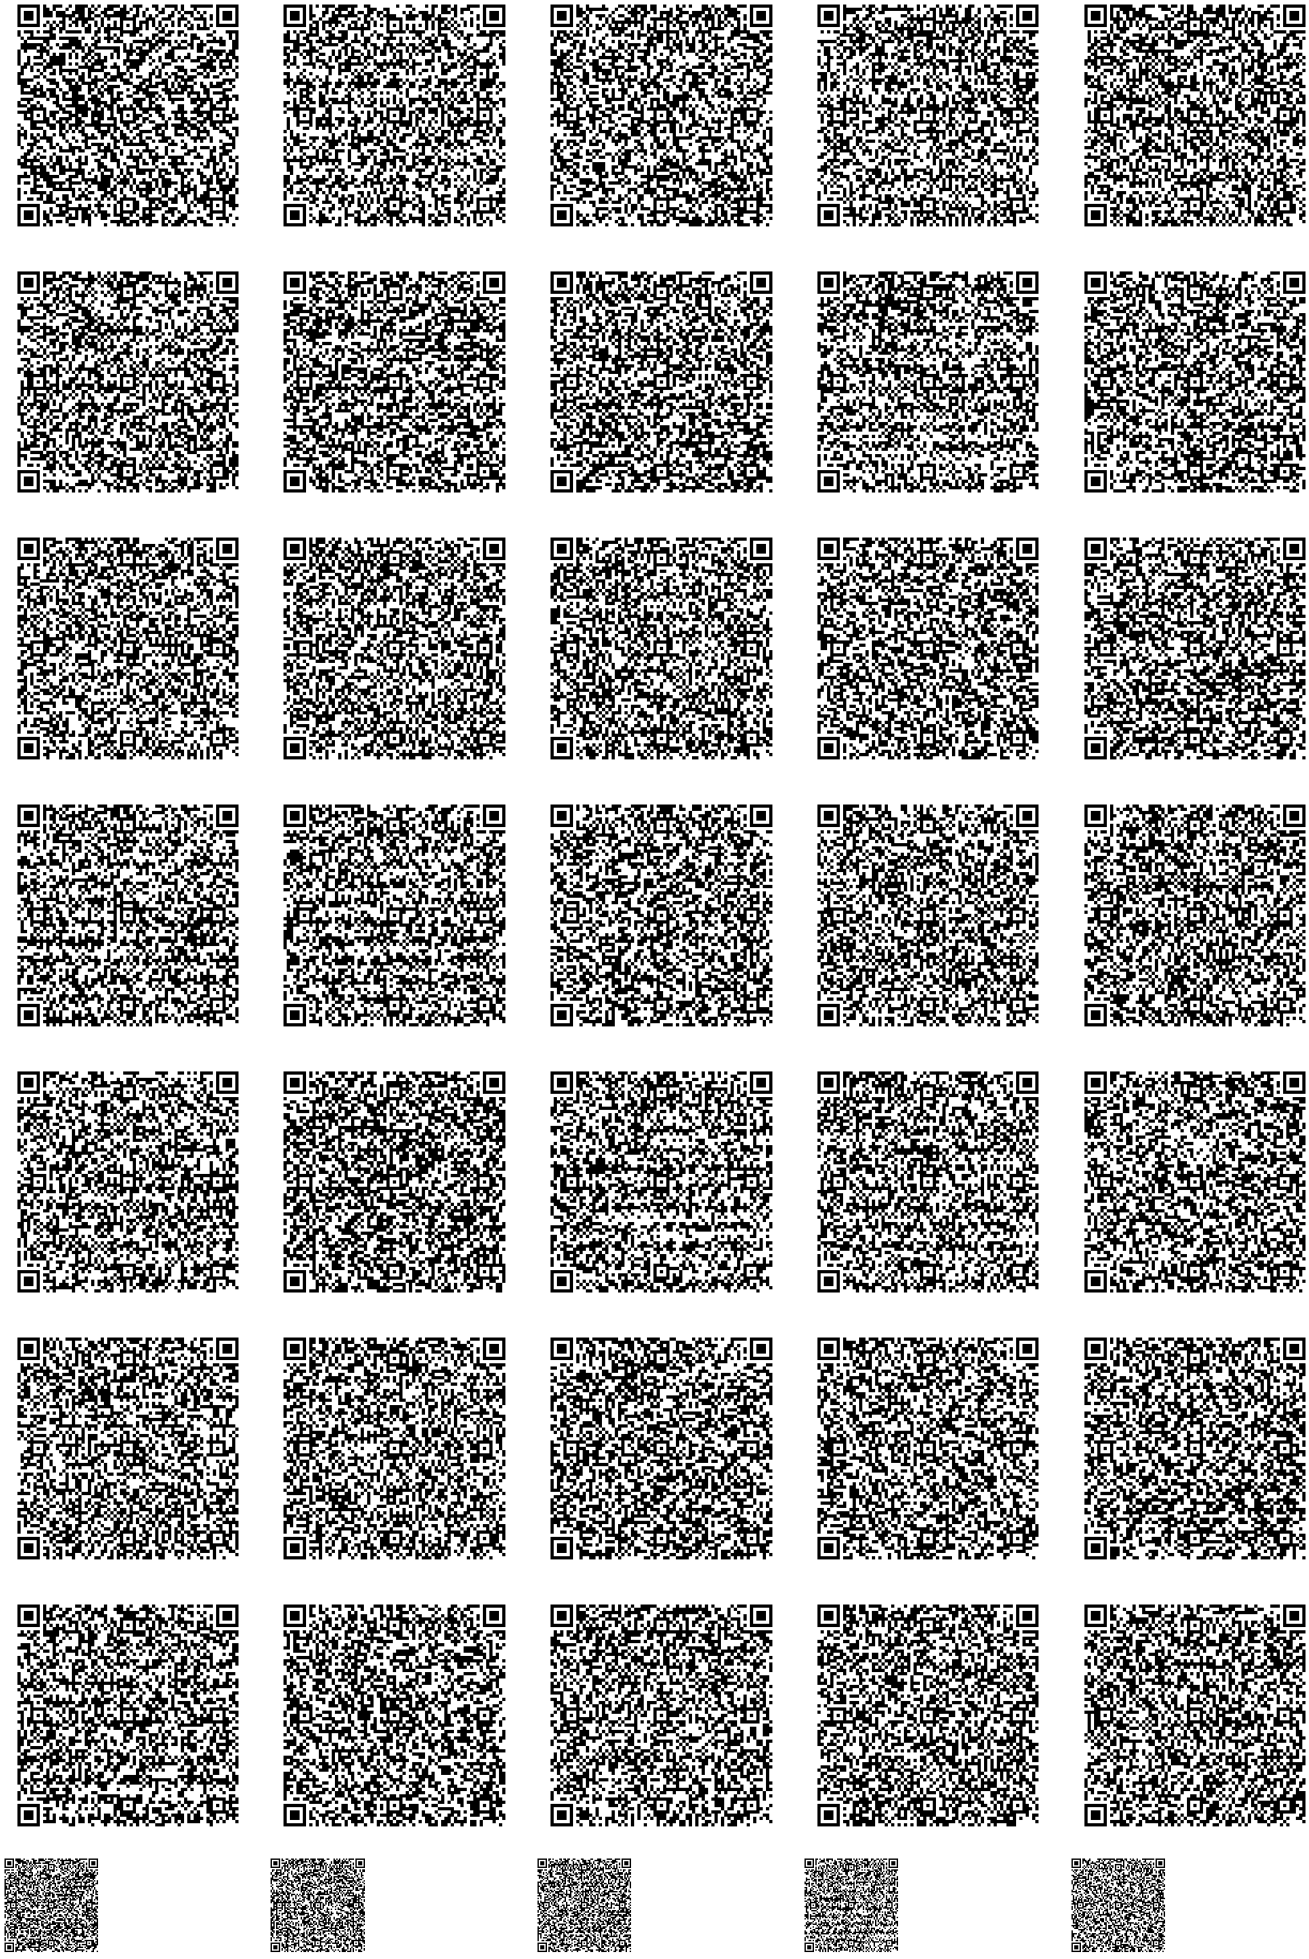

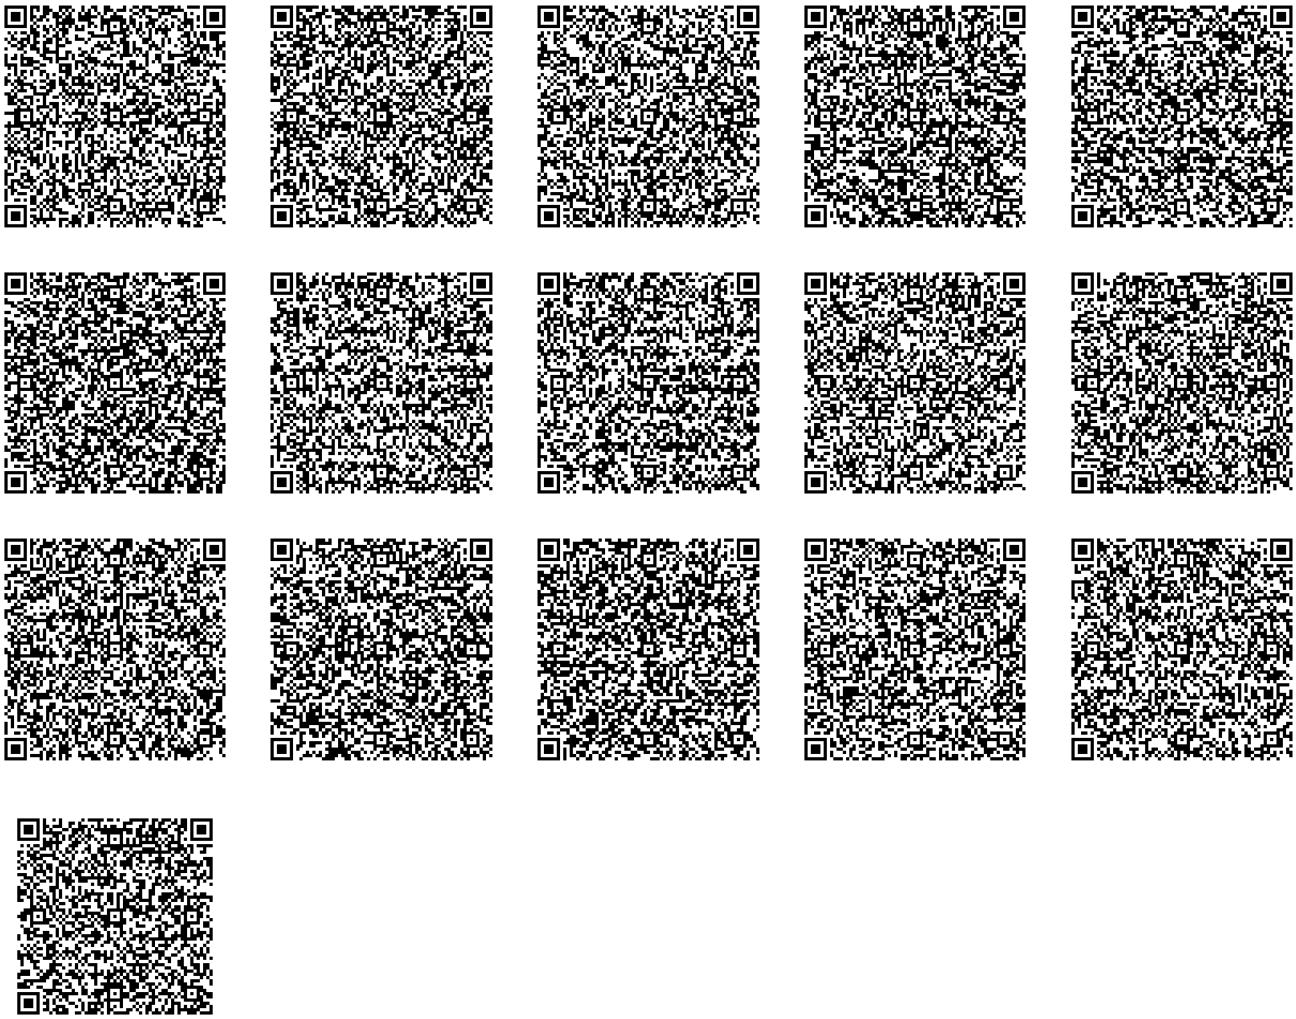

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические /добавляемые работы/				
			Раздел: Металлические конструкции блока 5				
			Подраздел: Окраска				
1	1	6111-0501-0601ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	1265.27	5 089	6 438 959
			Итого по подразделу: Окраска				**6 438 959**
			Итого по разделу: Металлические конструкции блока 5				**6 438 959**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические /добавляемые работы/				**6 438 959**
			ИТОГО по акту:				**6 438 959**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	6438959.000 x 8.10%	521 556
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	6438959.000 + 521555.704	6 960 515
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	6438959.000 x 0.05409035%	348 286
	Сметная прибыль, (5.00%)	6960514.704 x 5.00%	348 026
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(6960514.704 + 348285.528) x 5.000%	365 440
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 022 266
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	8022265.978 x 1.0557	8 469 106
	НДС (12%)	8469106.193 x 12%	1 016 293
	Итого с НДС	8469106.193 + 1016292.743	9 485 399

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:27
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:14
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 03:56
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:41
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:52
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:47
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:35 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:53
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:44 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:56

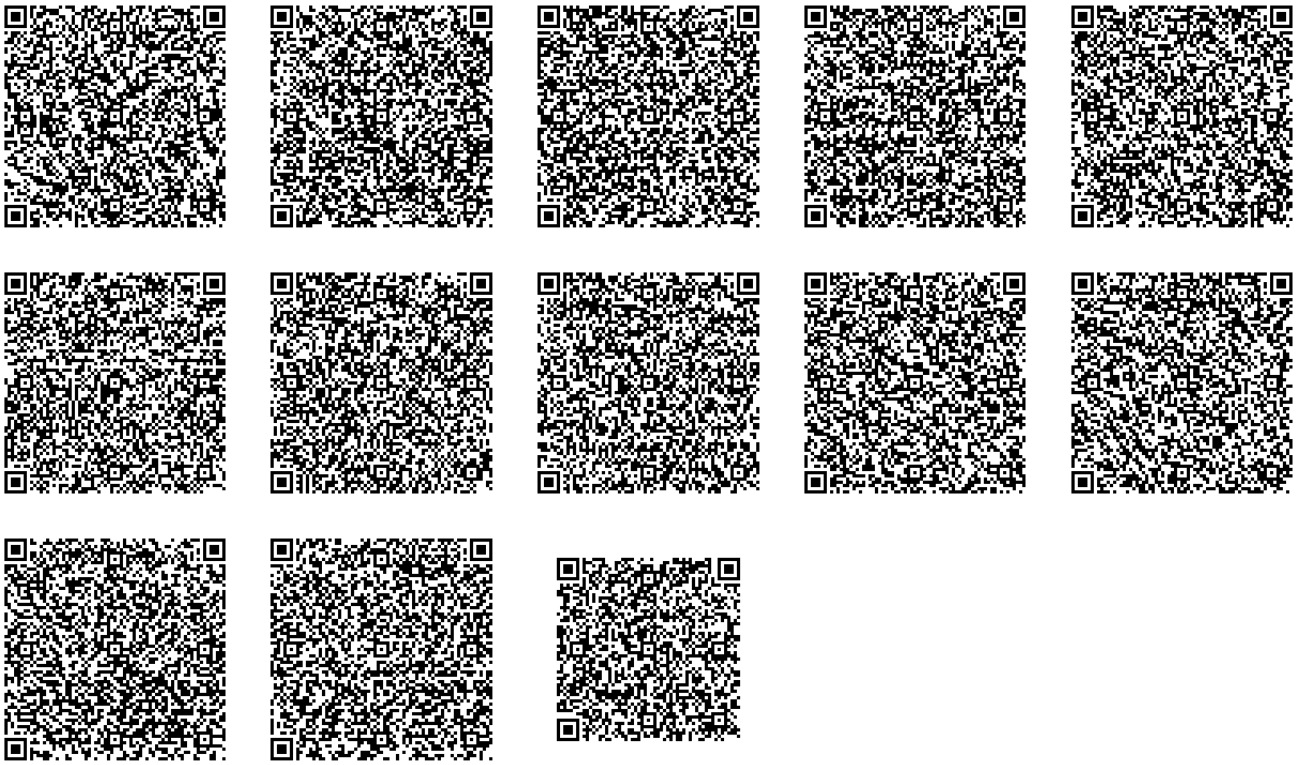

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительная часть /добавляемые работы/				
			Раздел: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				
1	1	6112-0302-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, клеевая набивка фриза по трафарету	м2	231	12 044	2 782 164
			Итого по разделу: Внутренняя отделка (лист АР-3.1; -3.8)				**2 782 164**
			Раздел: Кровля				
			Подраздел: Парапет /фартук/				
2	2	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	485.02	4 491	2 178 225
3	3	224-104-0309РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	485.02	4 515	2 189 865
			Итого по подразделу: Парапет /фартук/				**4 368 090**
			Подраздел: Тип 2				
4	4	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	834.6	472	393 931
5	5	217-203-0304РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м	м2	918.06	405	371 814
6	6	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	312	743	231 816
7	7	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Накладной алюминиевый профиль деформационного шва для стен и потолков	м	312	3 974	1 239 769
			Итого по подразделу: Тип 2				**2 237 330**
			Подраздел: Откосы				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	200.75	1 659	333 044
9	9	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	200.75	892	179 069
10	10	6112-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	200.75	371	74 478
			Итого по подразделу: Откосы				**586 591**
			Итого по разделу: Кровля				**7 192 011**
			Раздел: Перегородки сан.узлов(лист 32)				
11	11	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей, отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой	м2	82.72	2 900	239 888
12	12	215-303-0201РСНБ РК 2022	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007 марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта	100 м2	0.8272	142 476	117 856
			Итого по разделу: Перегородки сан.узлов(лист 32)				**357 744**
			Раздел: Ограждение лестничных клеток Лк1-Лк4				
			Подраздел: Элементы лестничных ограждений ЛК-1 /ОГ1-ОГ6/(АР-39.4)				
13	13	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	130.7	8 987	1 174 601
			Итого по подразделу: Элементы лестничных ограждений ЛК-1 /ОГ1-ОГ6/(АР-39.4)				**1 174 601**
			Подраздел: РОтмостка				
14	14	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	398	1 625	646 750
15	15	255-102-0605РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	398	1 270	505 460
			Итого по подразделу: РОтмостка				**1 152 210**
			Итого по разделу: Ограждение лестничных клеток Лк1-Лк4				**2 326 811**
			Раздел: Узлы 2-5, 6-9 (лист 47.2)				
16	16	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка стальным профилированным листом	м2	206.2	1 477	304 557
17	17	224-104-0303РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	м2	206.2	2 166	446 629
			Подраздел: Кракас парапета из металлических труб крылец Кр1-Кр7				
18	18	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением /каркас под парапеты крылец Кр1-Кр7/	т	2.57508	237 208	610 830

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.57508	1 146 761	2 953 001
20	20	217-101-0301РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	483	33	15 939
21	21	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	88.32	248	21 903
22	22	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	88.32	385	34 003
			Итого по подразделу: Кракас парапета из металлических труб крылец Кр1-Кр7				**3 635 676**
			Итого по разделу: Узлы 2-5, 6-9 (лист 47.2)				**4 386 862**
			Раздел: Входная группа ВГ-1/узлы Н-1,Н-2				
			Подраздел: Навес НВ-1, НВ-2, НВ-3 (лист 48.4)				
23	23	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	7.45	2 029	15 116
24	24	224-204-0102РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	7.45	1 087	8 098
25	25	224-204-0112РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	15	588	8 820
26	26	241-208-3603РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382	1 146
27	27	224-204-0106РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	3	2 218	6 654
			Итого по подразделу: Навес НВ-1, НВ-2, НВ-3 (лист 48.4)				**39 834**
			Итого по разделу: Входная группа ВГ-1/узлы Н-1,Н-2				**39 834**
			Раздел: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				
			Подраздел: Навес НВ-1, НВ-2, НВ-3 (лист 50.4,50.5)				
28	28	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка потолка металлосайдингом с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	148.84	4 998	743 902
29	29	231-303-0101РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м2	156.282	2 895	452 436
			Итого по подразделу: Навес НВ-1, НВ-2, НВ-3 (лист 50.4,50.5)				**1 196 338**
			Итого по разделу: Входная группа ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3				**1 196 338**
			Раздел: Крыльцо. Навес				
			Подраздел: Навес Н-1-Н3,Н-5-Н7(лист 57.3,-57.4)				
30	30	1112-0101-2202 РСНБ РК 2022	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	217.25	2 029	440 800

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	224-204-0102РСНБ РК 2022	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	217.25	1 087	236 151
32	32	224-204-0112РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	30	588	17 640
33	33	241-208-3603РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382	2 292
34	34	224-204-0106РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	6	2 218	13 308
			Итого по подразделу: Навес Н-1-Н3,Н-5-Н7(лист 57.3,-57.4)				**710 191**
			Итого по разделу: Крыльцо. Навес				**710 191**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительная часть /добавляемые работы/				**18 991 955**
			ИТОГО по акту:				**18 991 955**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	18991955.000 x 8.10%	1 538 348
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	18991955.000 + 1538348.427	20 530 303
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	18991955.000 x 0.05409035%	1 027 281
	Сметная прибыль, (5.00%)	20530303.427 x 5.00%	1 026 515
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(20530303.427 + 1027281.439) x 5.000%	1 077 879
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		23 661 979
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	23661979.281 x 1.0557	24 979 952
	НДС (12%)	24979951.527 x 12%	2 997 594
	Итого с НДС	24979951.527 + 2997594.183	27 977 546

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:26
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:15
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:00
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:41
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:54
Представители заказчика		
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:47
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:36 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:54
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:43 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:56

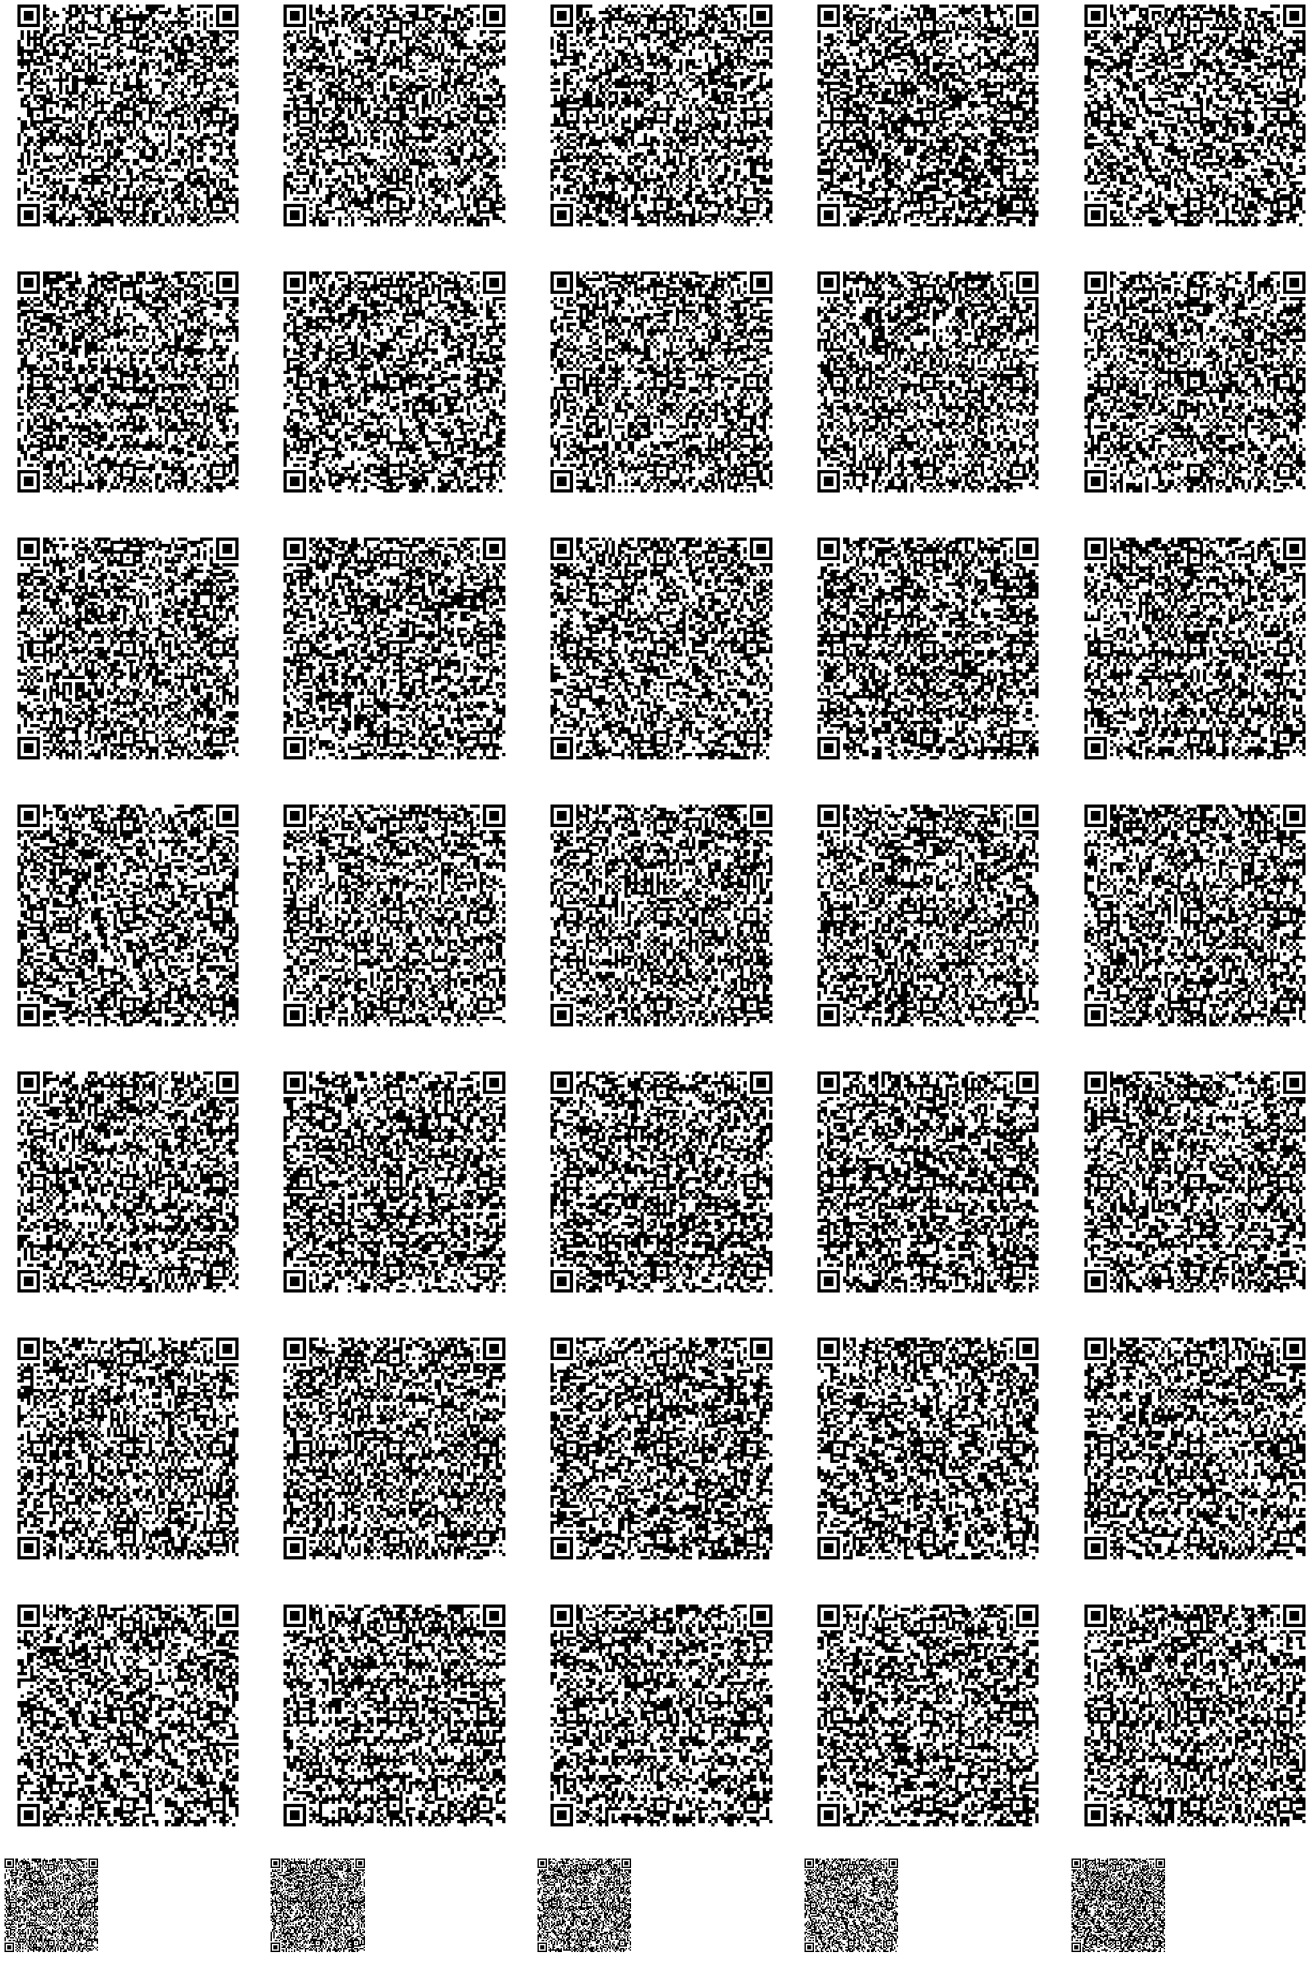

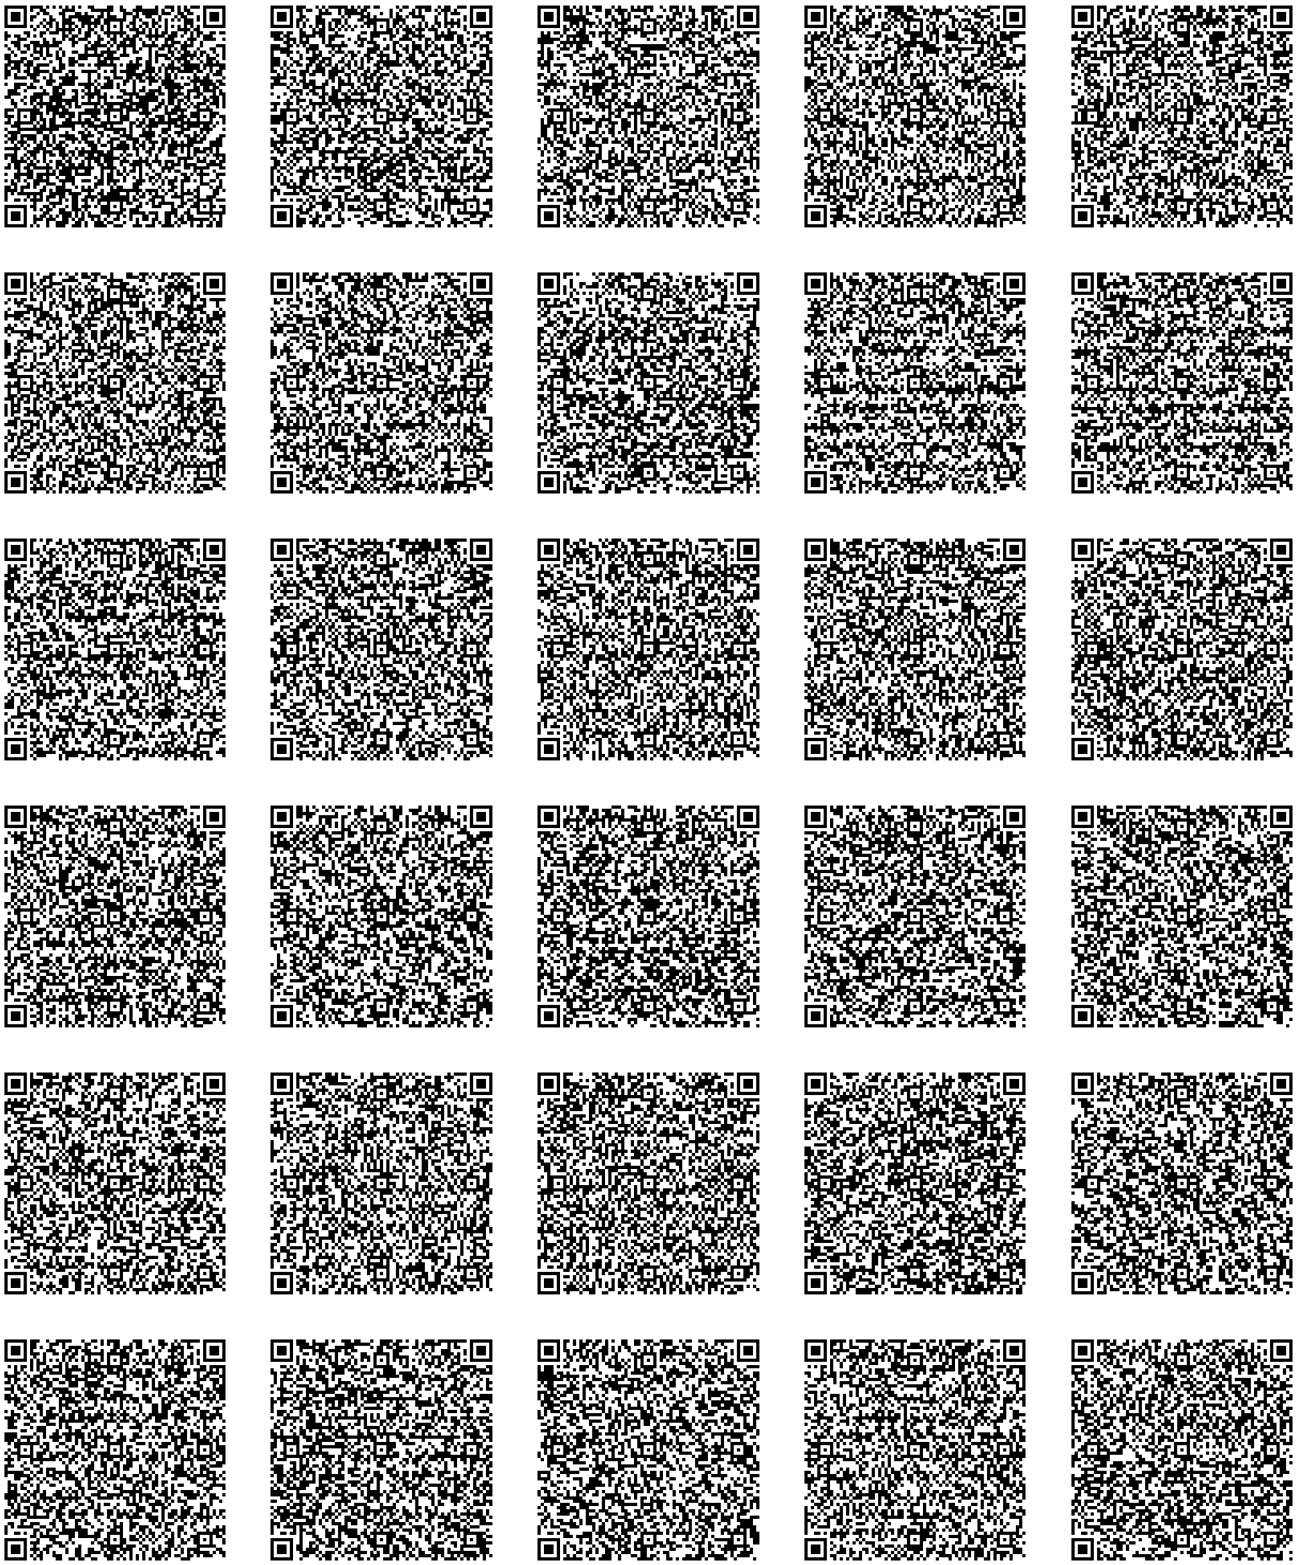

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Водопровод. Канализация /добавляемые работы/				
			Раздел: ВОДОПРОВОД				
			Подраздел: Водомерный узел1 /лист 6и/				
1	1	6114-0103-0302ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	219	6 009	1 315 971
2	2	241-205-2201РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	219	362	79 278
3	3	6114-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	219	339	74 241
			Итого по подразделу: Водомерный узел1 /лист 6и/				**1 469 490**
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				**1 469 490**
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
			Подраздел: Канализация бытовая К1				
4	4	6114-0103-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	232	3 090	716 880
5	5	241-203-0406РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	231.536	899	208 151
			Итого по подразделу: Канализация бытовая К1				**925 031**
			Подраздел: Канализация производственная К3 (столовая)				
6	6	6114-0103-0101ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	38	3 214	122 132
7	7	241-203-0401РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	37.924	463	17 559
8	8	6114-0103-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	50	3 090	154 500
9	9	241-203-0406РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	49.9	899	44 860

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Канализация производственная К3 (столовая)				**339 051**
			Подраздел: Внутренний водосток К2				
10	10	6114-0701-0103ЕСЦ РСНБ РК 2024	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	26	4 017	104 442
11	11	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кровельная воронка НРН110х450 с обогревом	шт	26	29 295	761 661
12	12	6114-0103-0102ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	142	3 090	438 780
13	13	241-203-0406РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	141.716	899	127 403
			Итого по подразделу: Внутренний водосток К2				**1 432 286**
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				**2 696 368**
			Итого по локальной смете: Водопровод. Канализация /добавляемые работы/				**4 165 858**
			ИТОГО по акту:				**4 165 858**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	4165858.000 x 8.10%	337 435
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4165858.000 + 337434.514	4 503 293
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	4165858.000 x 0.05409035%	225 333
	Сметная прибыль, (5.00%)	4503292.514 x 5.00%	225 165
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(4503292.514 + 225332.705) x 5.000%	236 431
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 190 221
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	5190221.106 x 1.0557	5 479 316
	НДС (12%)	5479316.422 x 12%	657 518
	Итого с НДС	5479316.422 + 657517.971	6 136 834

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:02
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:17
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:03
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:43
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:56
Представители заказчика		
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:39 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:49
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:56
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:41 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:59

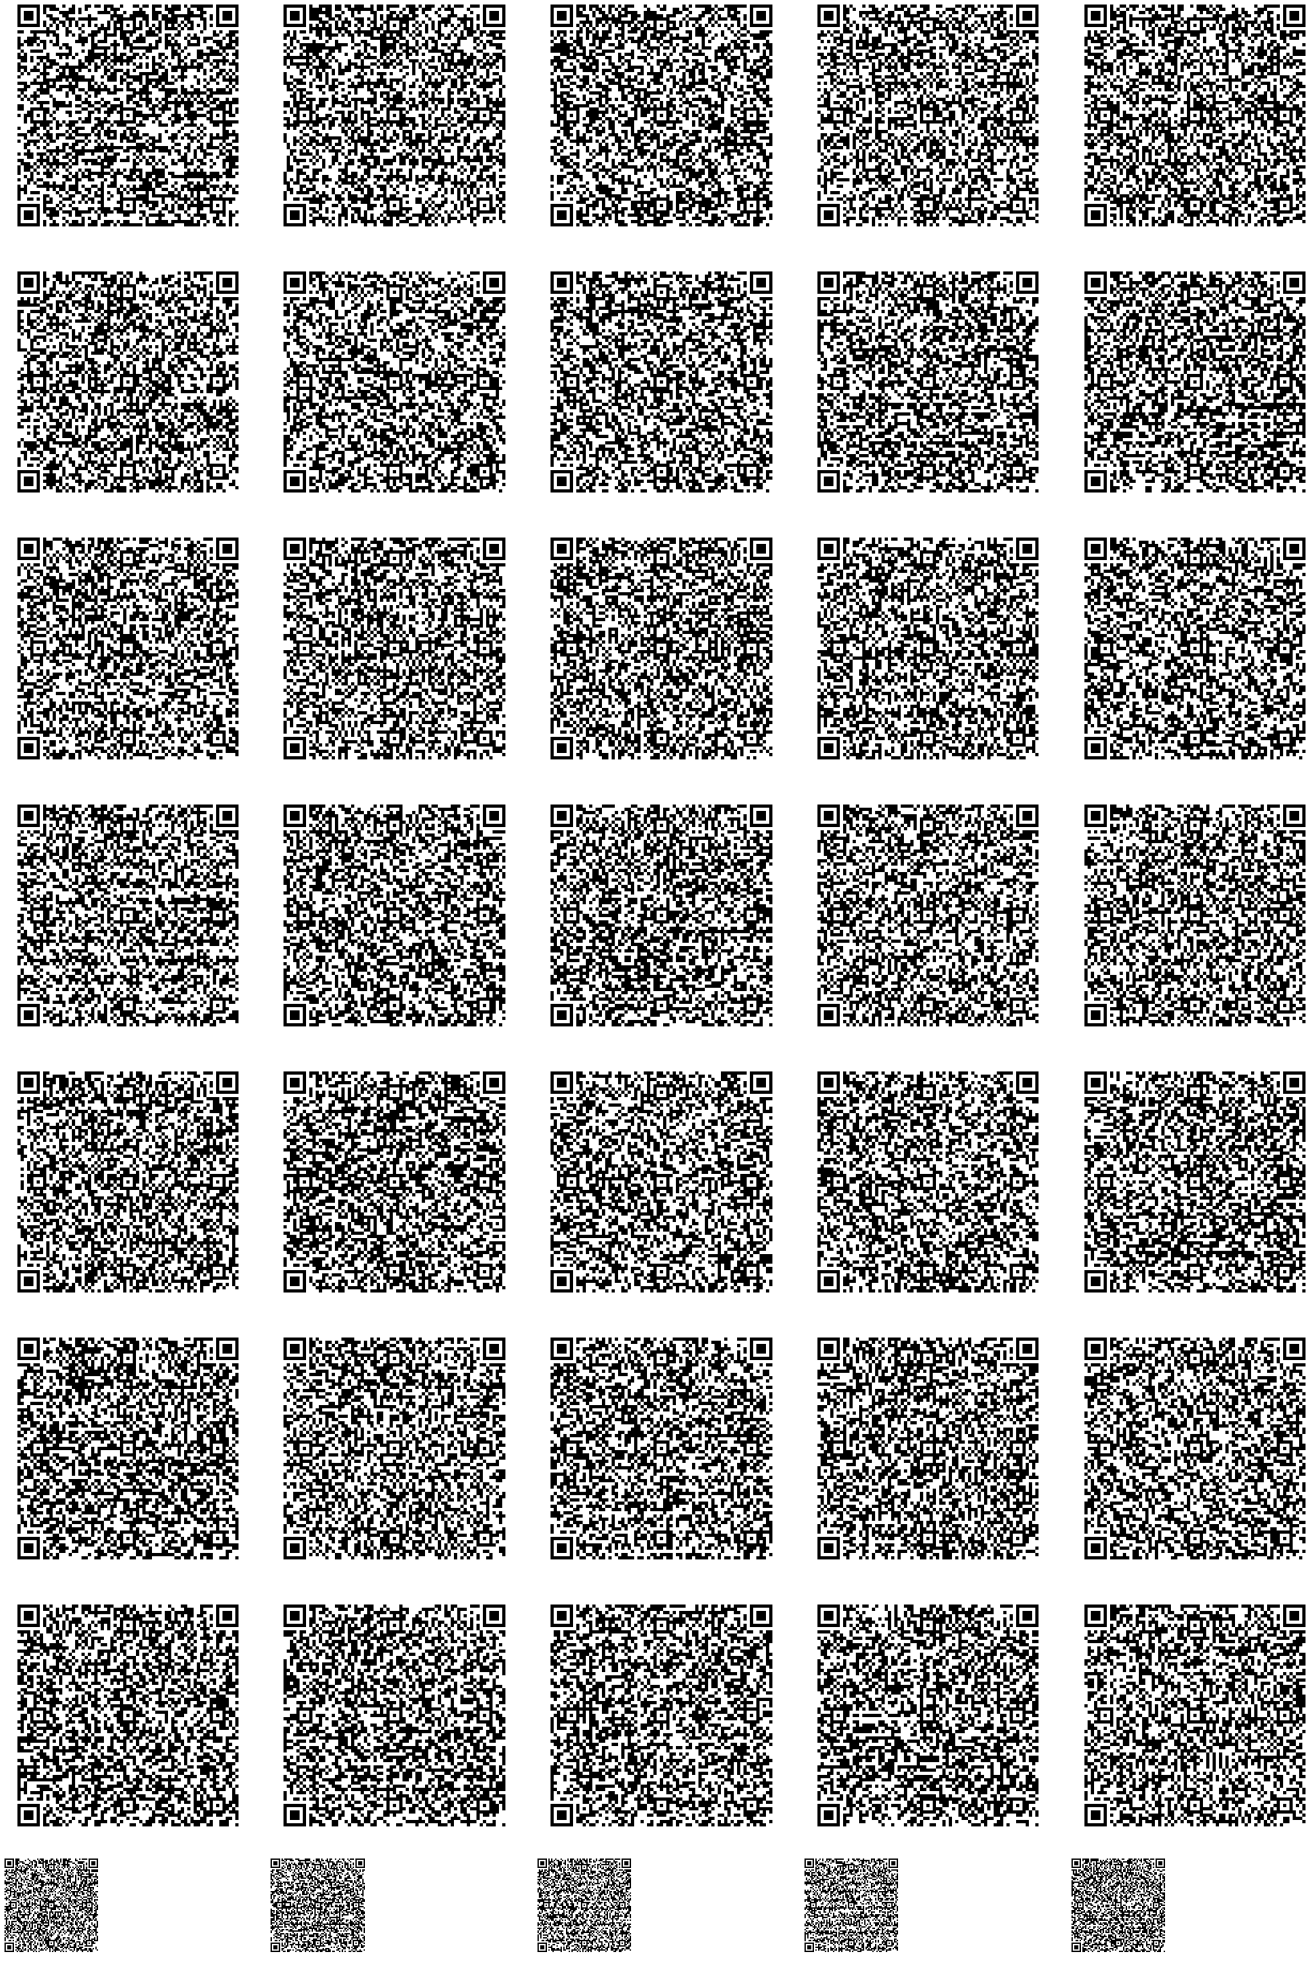

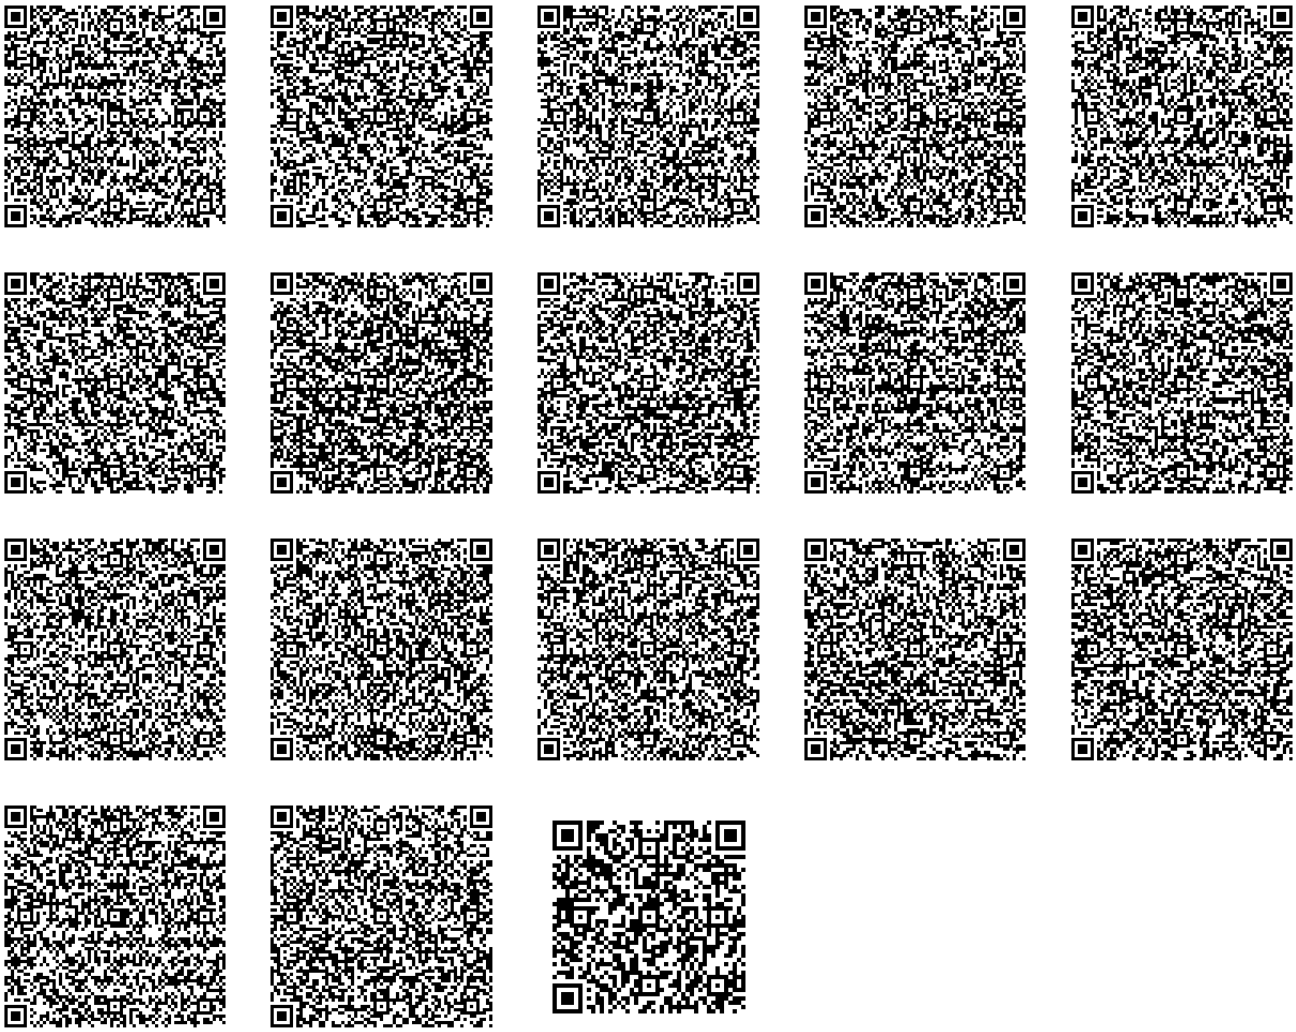

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление. Вентиляция /добавляемые работы/				
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	6114-0103-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1745	4 554	7 946 730
2	2	6114-0103-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	781	4 854	3 790 974
3	3	6114-0103-0314 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	86	5 229	449 694
4	4	241-205-2301РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	1727.55	198	342 055
5	5	241-205-1202РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	773.19	411	317 781
6	6	241-205-1203РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	85.14	672	57 214
			Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				**12 904 448**
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			Подраздел: Кондиционирование				
7	7	6118-0506-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка наружного блока системы мультизональной, мощность до 15 кВт	шт.	9	46 871	421 839
8	8	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кондиционер настенный Gree-18: Bora R410A класс A GWH18AACXD-K3NNA1B, производительность по холоду 4,8 кВт, по теплу 5,158 кВт	шт	2	310 364	620 728
9	9	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кондиционер настенный Gree-24: Pular NEW R410A - GWH24AGDXE-K3NNA4B, производительность по холоду 6,155 кВт, по теплу 6,7 кВт	шт	1	407 918	407 918
10	10	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кондиционер настенный Gree-12: Fairy Cold Plasma R410A - GWH12ACBXB-K3NNA1B, производительность по холоду 3,25кВт, по теплу 3,4 кВт	шт	1	177 350	177 350

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кондиционер KENTATSU серия ICHI R410A 3.4кВт KSGI35HFAN1/ KSRI35HFAN1, производительность по холоду 3,25кВт, по теплу 3,4 кВт	шт	2	232 634	465 268
12	12	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кондиционер KENTATSU серия ICHI R410A 3.4кВт KSGI35HFAN1/ KSRI35HFAN1, производительность по холоду 7,03 кВт, по теплу 7,327 кВт	шт	2	563 491	1 126 982
13	13	СТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Кондиционер KENTATSU серия ICHI R410A 2.7кВт KSGI26HFAN1/ KSRI26HFAN1, производительность по холоду 2,638 кВт, по теплу 2,784 кВт	шт	1	195 800	195 800
			Итого по подразделу: Кондиционирование				**3 415 885**
			Итого по разделу: ВЕНТИЛЯЦИЯ				**3 415 885**
			Итого по локальной смете: Отопление. Вентиляция /добавляемые работы/				**16 320 333**
			ИТОГО по акту:				**16 320 333**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	16320333.000 x 8.10%	1 321 947
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	16320333.000 + 1321947.035	17 642 280
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	16320333.000 x 0.05409035%	882 772
	Сметная прибыль, (5.00%)	17642280.035 x 5.00%	882 114
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(17642280.035 + 882772.477) x 5.000%	926 253
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		20 333 419
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	20333419.140 x 1.0557	21 465 991
	НДС (12%)	21465990.586 x 12%	2 575 919
	Итого с НДС	21465990.586 + 2575918.870	24 041 909

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:14
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:05
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:02
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:41
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:54
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:40 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:55
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:56
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:48
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:42 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета

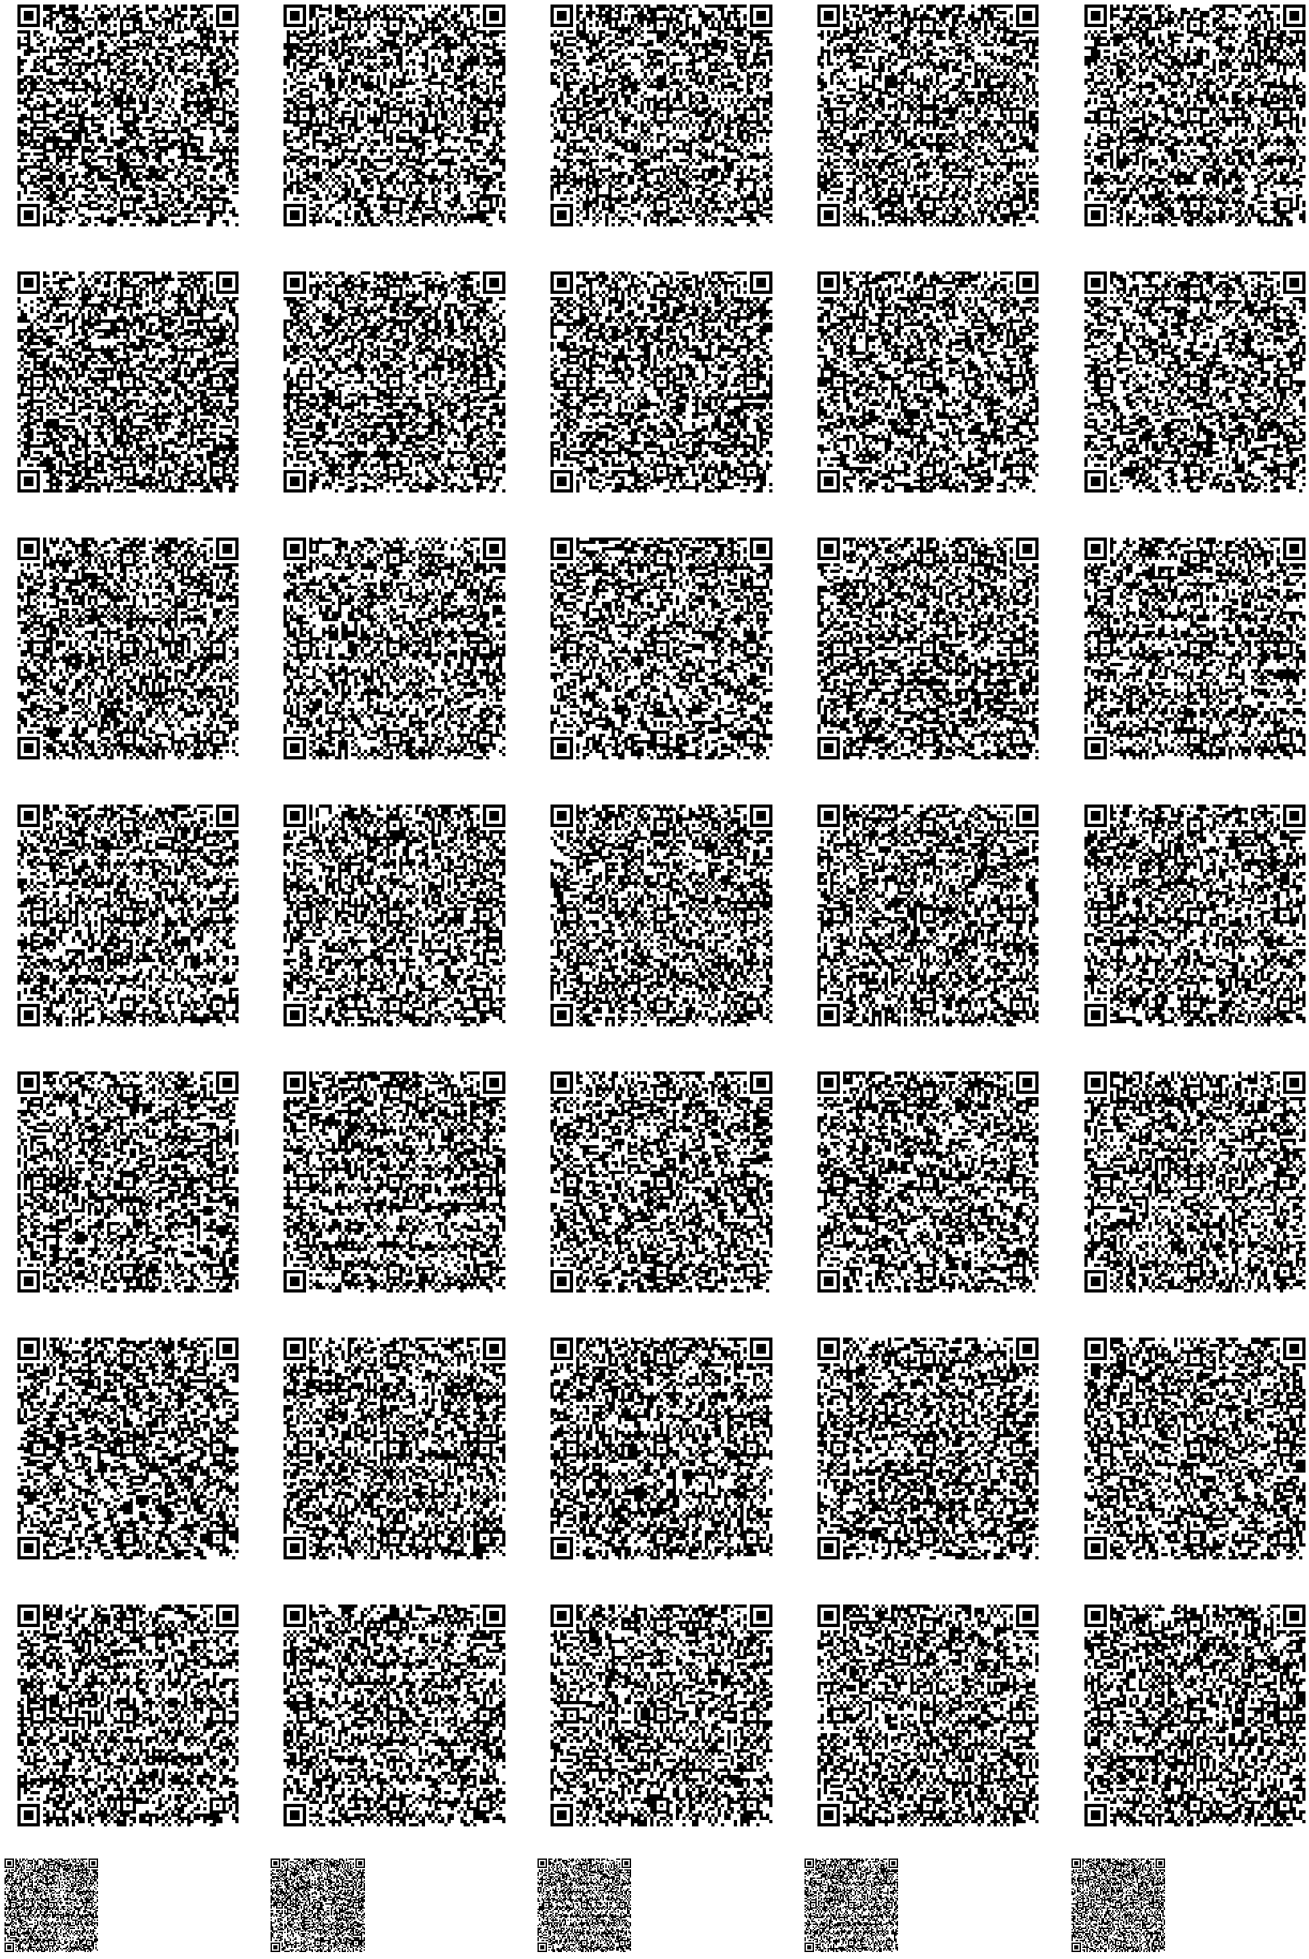

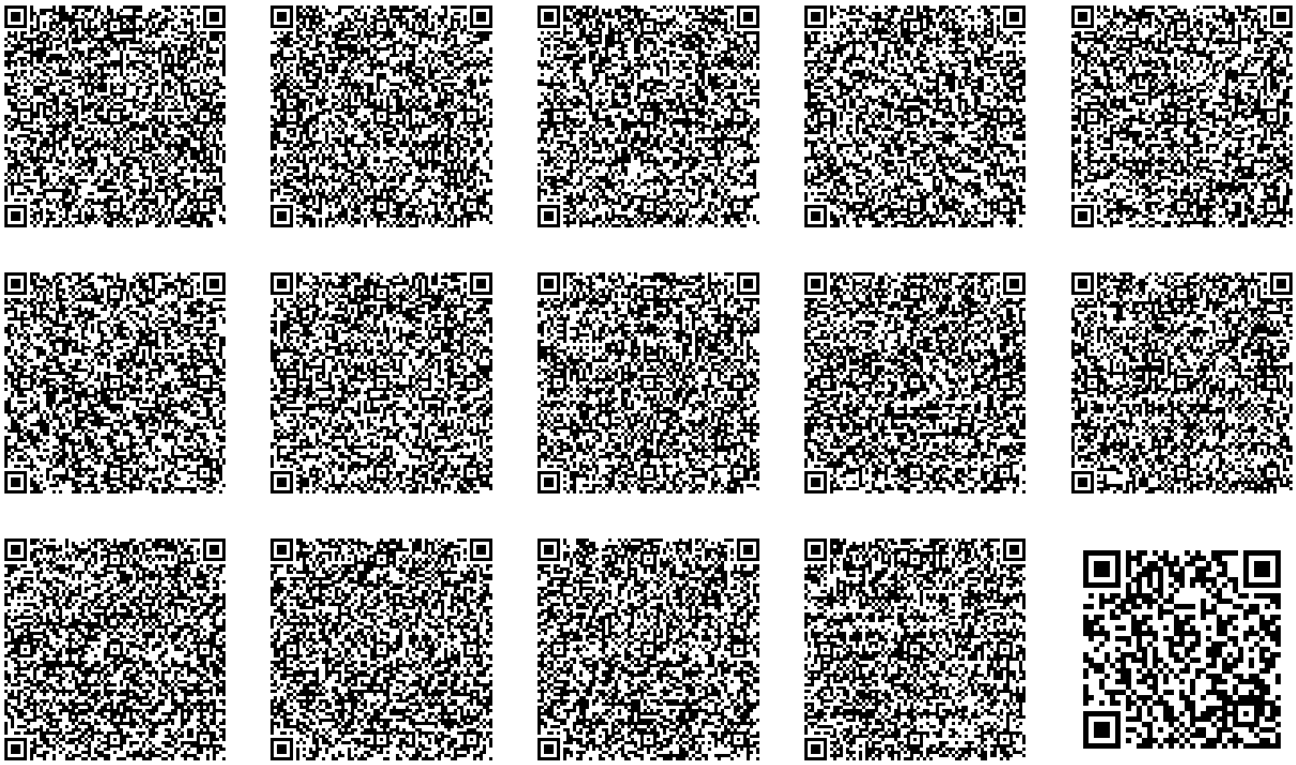

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация /добавляемые работы/				
			Раздел: Система СКС				
			Подраздел: ШТК1				
1	1	6125-0301-0104ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка на готовом месте стойки платы дополнительной	шт.	1	9 052	9 052
2	2	ТКПЕСЦ РСНБ РК 2024	Сервер HP P55278-421 HPE DL380 G10+ 4309Yx2 MR416i-p/32GB/1.2TBSASx2 NC EU	шт.	1	2 291 875	2 291 875
			Итого по подразделу: ШТК1				**2 300 927**
			Итого по разделу: Система СКС				**2 300 927**
			Итого по локальной смете: Структурированная кабельная сеть. Электрочасофикация /добавляемые работы/				**2 300 927**
			ИТОГО по акту:				**2 300 927**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	9052.000 x 8.10%	733
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	2300927.000 + 733.212	2 301 660
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	9052.000 x 0.05409035%	490
	Сметная прибыль, (5.00%)	9785.212 x 5.00%	489
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(2301660.212 + 489.626) x 5.000%	115 107
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		2 417 747
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	2417746.590 x 1.0557	2 552 415
	НДС (12%)	2552415.075 x 12%	306 290
	Итого с НДС	2552415.075 + 306289.809	2 858 705

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:14
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 07:42
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:16
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:02
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:54
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:41 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:48
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:55
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:40 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 14:58

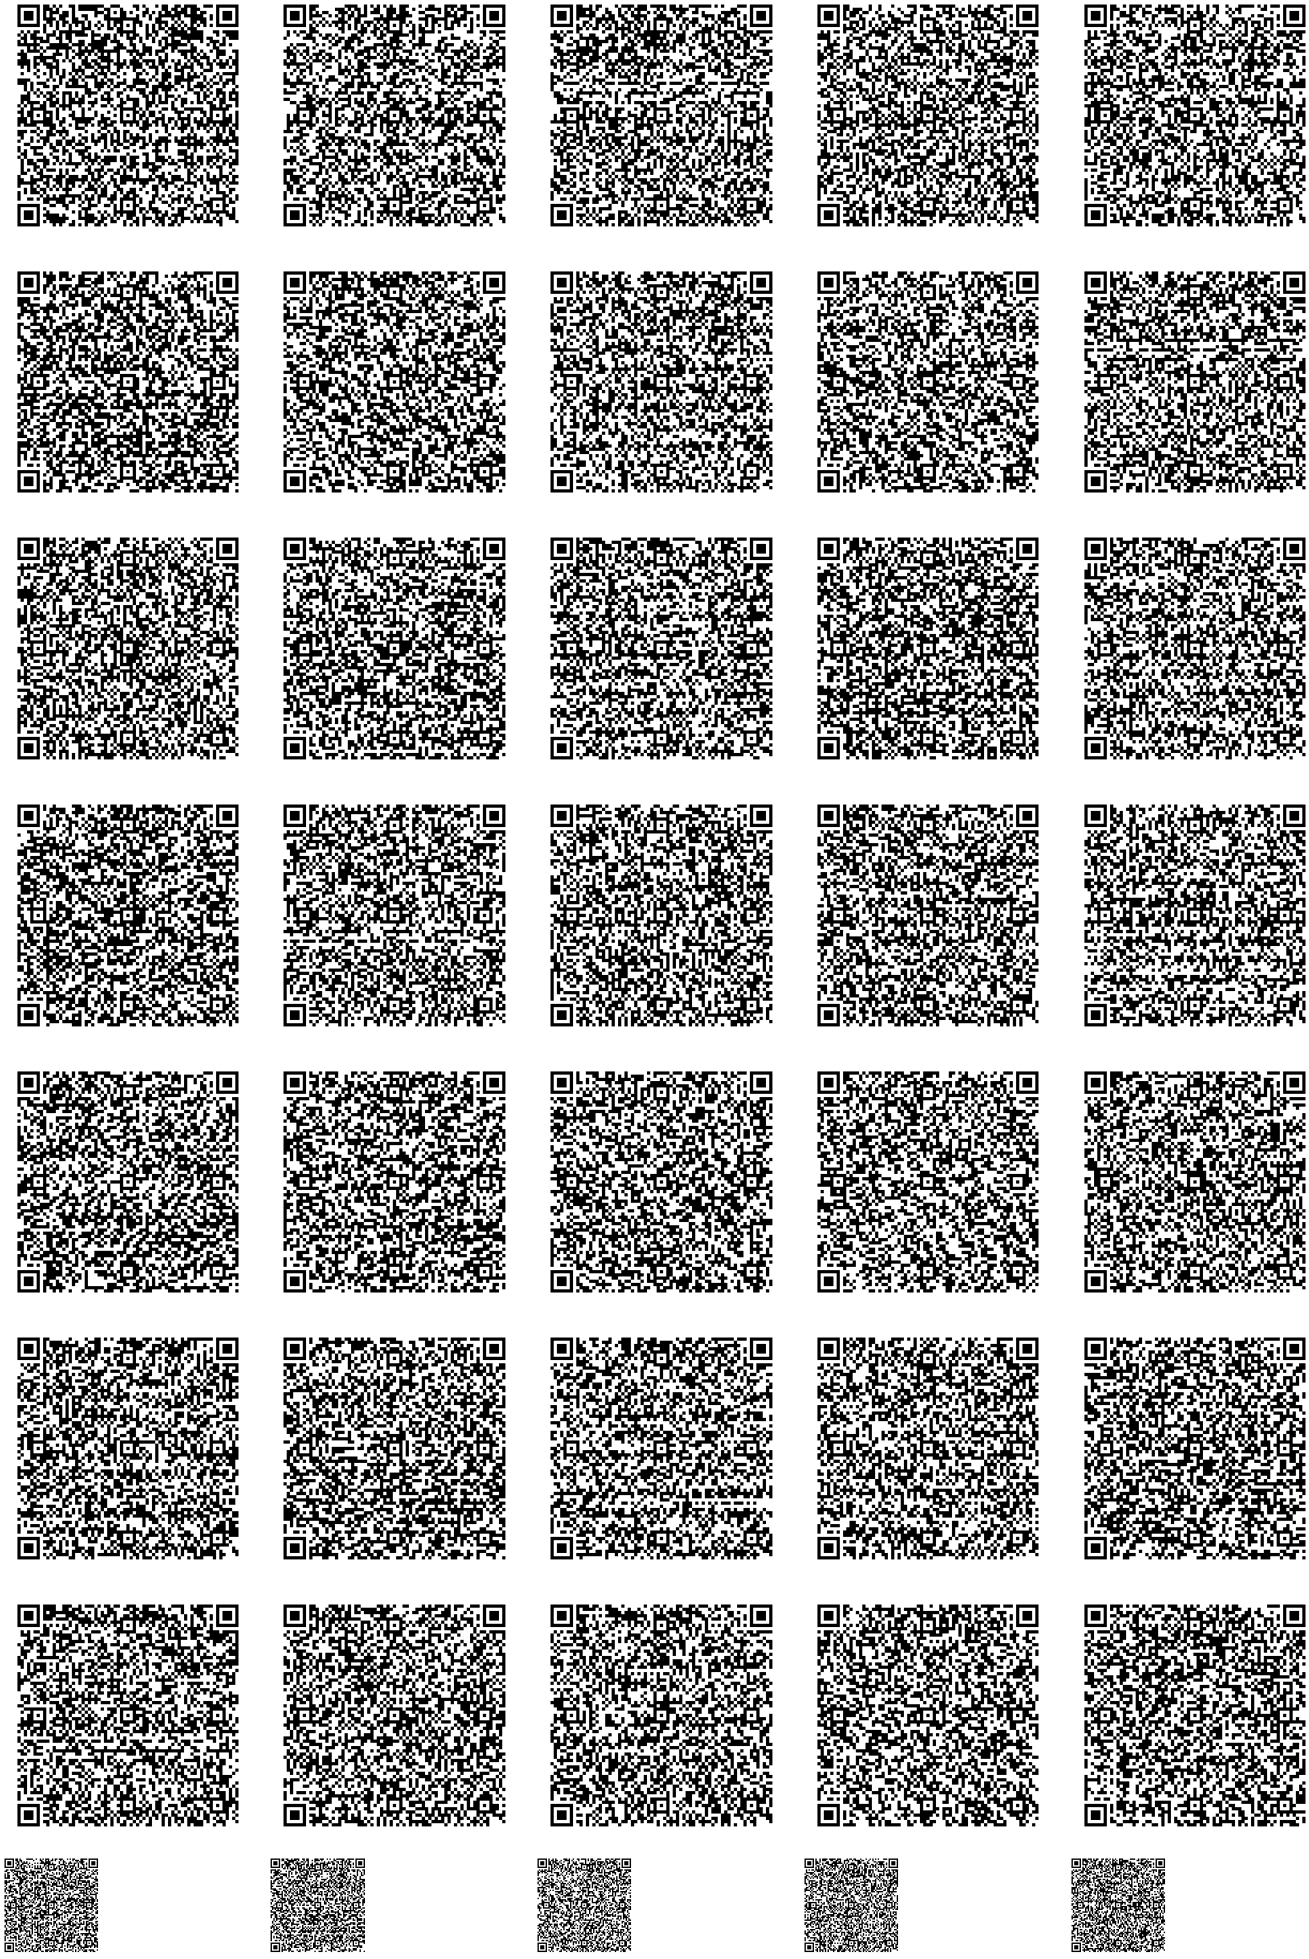

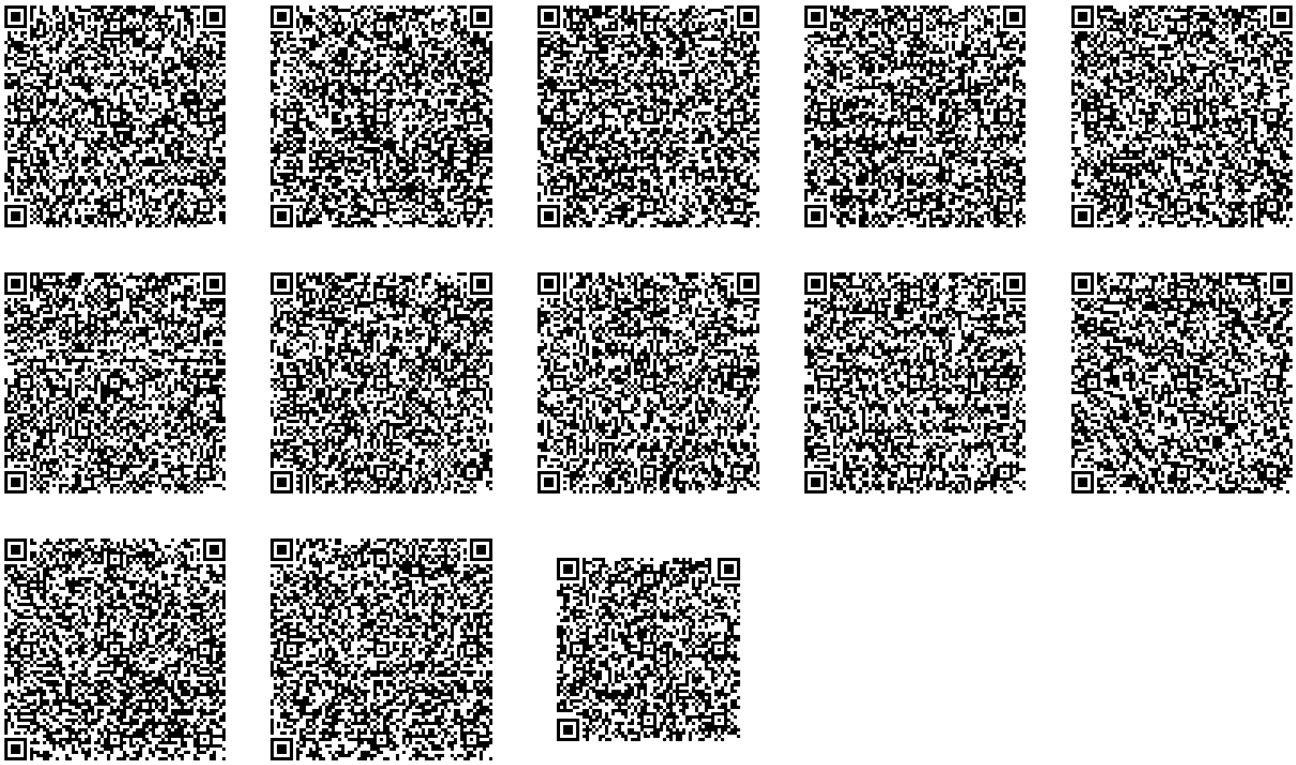

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование /Добавляемые работы/				
1	1	ТПрайс	Металлический шкаф локер для одежды 5-ти секционный 1500x400x1450мм	шт	25	125 010	3 125 250
2	2	ТПрайс	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500x800x750мм. Материал HPL 16	шт	1	116 317	116 317
3	3	ТПрайс	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500x800x750мм. Материал HPL 16	шт	1	116 317	116 317
4	4	ТПрайс	Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 211 S	шт	2	818 527	1 637 054
5	5	ТПрайс	Камера охлаждения POLAIR KXH-4,41	шт	3	861 607	2 584 821
6	6	ТПрайс	Сплит-система POLAIR SM 113 S	шт	1	706 518	706 518
7	7	ТПрайс	Пульт дистанционного управления Dixell XW60K	шт	3	95 638	286 915
8	8	ТПрайс	Зимний комплект до -30 градусов	шт	3	105 978	317 933
9	9	ТПрайс	Металлический шкаф локер для одежды 5-ти секционный 1500x400x1450мм	шт	15	125 010	1 875 150
10	10	ТПрайс	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте и наклону столешницы, ПВХ кромка. Столешница ЛДСП 22мм, основаниеметаллокаркас. Размер столешницы 600x500x460/520/580мм.	шт	2	31 879	63 759
11	11	ТПрайс	Стул ученический регулируемый по высоте,основание металлокаркас, сиденье и спинка из полипропилена путем выдувногоформования (размер сиденья 380x375x340/380/420мм и спинки 440x260мм).	шт	2	21 109	42 219
12	12	ТПрайс	Стол демонстрационный лабораторный без раковины со встроенными тумбами и двумя розетками. Столешница HPL 16 мм, основание металлокаркас, размер 1800x750x900мм.	шт.	1	273 991	273 991
13	13	ТПрайс	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница HPL 16 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200x600x750мм.	шт.	13	117 008	1 521 104
14	14	ТПрайс	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница HPL 16 мм, основание металлокаркас, размер 1800x750x900	шт.	1	171 115	171 115
15	15	ТПрайс	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница HPL 16 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200x600x750мм.	шт.	13	170 977	2 222 701
16	16	ТПрайс	3D Принтер FlashforgeAdventure 5 M pro	шт	1	336 497	336 497
17	17	ТПрайс	Шкаф металлический инструментальный	шт	1	155 089	155 089
18	18	ТПрайс	Кабина примерочная прямоугольная с занавесом	шт	1	60 312	60 312

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	ТПрайс	300х300 Тактильная плитка ПВХ "Конус риф" шахматный цвет желтый	шт	318	560	178 093
20	20	ТПрайс	300х300 Тактильная плита ПВХ "Прямой риф" цвет желтый	шт	1117	560	625 565
21	21	ТПрайс	Пиктограмма тактильная ПВХ 150х150 мм (СП 18) "Туалет для инвалидов"	шт	8	1 524	12 193
22	22	ТПрайс	Пиктограмма тактильная ПВХ 150х150 мм (СП 09) "Вход в помещения"	шт	54	1 524	82 306
23	23	ТПрайс	Пиктограмма тактильная ПВХ 150х150 мм (СП 10) "Выход из помещения"	шт	54	1 524	82 306
24	24	ТПрайс	Пиктограмма тактильная ПВХ 150х150 мм "Лифт"	шт	2	1 524	3 048
25	25	ТПрайс	Пиктограмма тактильная ПВХ 150х150 мм "Подъем/спуск"	шт	8	1 524	12 193
26	26	ТПрайс	Контурный круг 150 мм	шт	16	215	3 446
27	27	ТПрайс	Пиктограмма тактильная ПВХ 150х150 (А02) "Кнопка вызова помощи"	шт.	9	1 524	13 718
28	28	ТПрайс	Звонок вызова	шт	9	4 265	38 385
29	29	ТПрайс	Клей Юнион Полимер для ПВХ/ТПУ	шт	12	33 172	398 063
30	30	ТПрайс	Металлический шкаф локер для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450мм	шт	4	125 010	500 040
31	31	ТПрайс	Металлический шкаф локер для одежды 5-ти секционный 1500х400х1450мм	шт	16	125 010	2 000 160
32	32	ТПрайс	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500х800х750мм. Материал HPL 16	шт	3	116 317	348 951
33	33	ТПрайс	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница HPL 16 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	7	117 008	819 056
34	34	ТПрайс	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500х800х750мм. Материал HPL 16	шт	1	116 317	116 317
35	35	ТПрайс	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500х800х750мм. Материал HPL 16	шт	1	116 317	116 317
36	36	ТПрайс	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница HPL 16 мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900	шт.	1	171 115	171 115
37	37	ТПрайс	Стол демонстрационный лабораторный с раковиной, смесителем и розетками. Столешница HPL 16 мм, основание металлокаркас, размер 1800х750х900	шт.	1	171 115	171 115
38	38	ТПрайс	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница HPL 16 мм. Основание металлокаркас, размер стола 1200х600х750мм.	шт.	13	170 977	2 222 701
39	39	ТПрайс	Микроволновая печь LG	шт.	1	30 156	30 156
40	40	ТПрайс	Холодильник LG GC-B399SQCL	шт.	1	86 000	86 000
41	41	ТПрайс	Стол демонстрационный. Размеры не менее 1500х800х750мм. Материал HPL 16	шт	1	116 317	116 317
42	42	ТПрайс	Скамья гардеробная	шт	3	53 850	161 551
43	43	ТПрайс	Световой прибор PROFILE LED-200	шт.	1	258 482	258 482
44	44	ТПрайс	Контроллер DMX-512	шт.	1	86 161	86 161
45	45	ТПрайс	Световой прибор WASH-3603	шт.	2	146 473	292 946
46	46	ТПрайс	Световой прибор WASH-740	шт.	4	260 205	1 040 821
47	47	ТПрайс	Кронштейн на ферму Clamp 50 mm	шт.	13	4 308	56 005
48	48	ТПрайс	Алюминиевая ферма 3 м	шт	1	316 210	316 210

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	ТПрайс	Алюминиевая ферма 1 м	шт	1	105 978	105 978
50	50	ТПрайс	PROCAB Кабель MC405/5	м	30	862	25 848
51	51	ТПрайс	LED экран P2,5 350x1920 мм	шт.	1	1 807 973	1 807 973
52	52	ТПрайс	Рабочее место оператора звука/света	шт.	1	125 395	125 395
53	53	ТПрайс	Принтер А3 цветной Xerox VersaLink C7100	шт.	1	1 747 022	1 747 022
54	54	ТПрайс	Решетка настенная реечная для экспозиций	шт.	2	43 080	86 161
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование /Добавляемые работы/				**29 871 176**
			ИТОГО по акту:				**29 871 176**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	0.000 x 8.10%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	29871176.000 + 0.000	29 871 176
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	0.000 x 0.05409035%	0
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(29871176.000 + 0.000) x 5.000%	1 493 559
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		31 364 735
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	31364734.800 x 1.0557	33 111 751
	НДС (12%)	33111750.528 x 12%	3 973 410
	Итого с НДС	33111750.528 + 3973410.063	37 085 161

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:00
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 10:45
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:03
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:32
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:56
Представители заказчика		
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:38 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:42 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:56
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 15:03
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:49

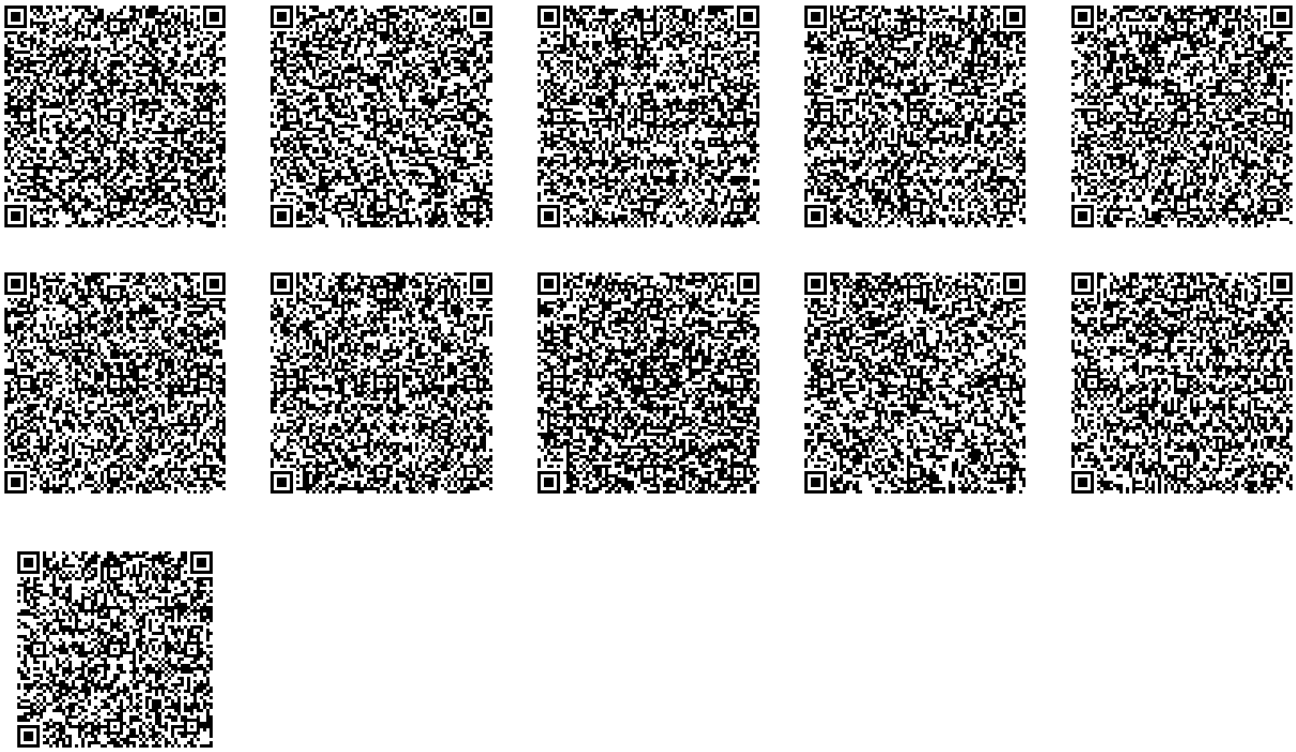

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электросила.Наружные электрические сети КЛ-0,4 кВ /добавляемые работы/				
1	1	1313-1201-0220 РСНБ РК 2022	Оборудование дизель-генераторной: насос, блок насосов, поставляемый на раме с электродвигателем в собранном виде, масса 0,36 т. Монтаж оборудования	т	1	1 300 466	1 300 466
2	2	ТКПРСНБ РК 2022	Дизельный генератор 120 кВт ZHL-120KW	шт.	1	3 248 259	3 248 259
			Итого по локальной смете: Электросила.Наружные электрические сети КЛ-0,4 кВ /добавляемые работы/				**4 548 725**
			ИТОГО по акту:				**4 548 725**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)				1300466.000 x 8.10%	105 338
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4548725.000 + 105337.751	4 654 063
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)				1300466.000 x 0.05409035%	70 343
		Сметная прибыль, (5.00%)				1405803.751 x 5.00%	70 290
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				(4654062.751 + 70342.657) x 5.000%	236 220
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 030 916
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				5030915.866 x 1.0557	5 311 138
		НДС (12%)				5311137.880 x 12%	637 337
		Итого с НДС				5311137.880 + 637336.546	5 948 474

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 16:00
Представители технического надзора		
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:28
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 10:46
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:04
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:57
Представители заказчика		
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:38 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 15:01
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:43 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:49
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:57

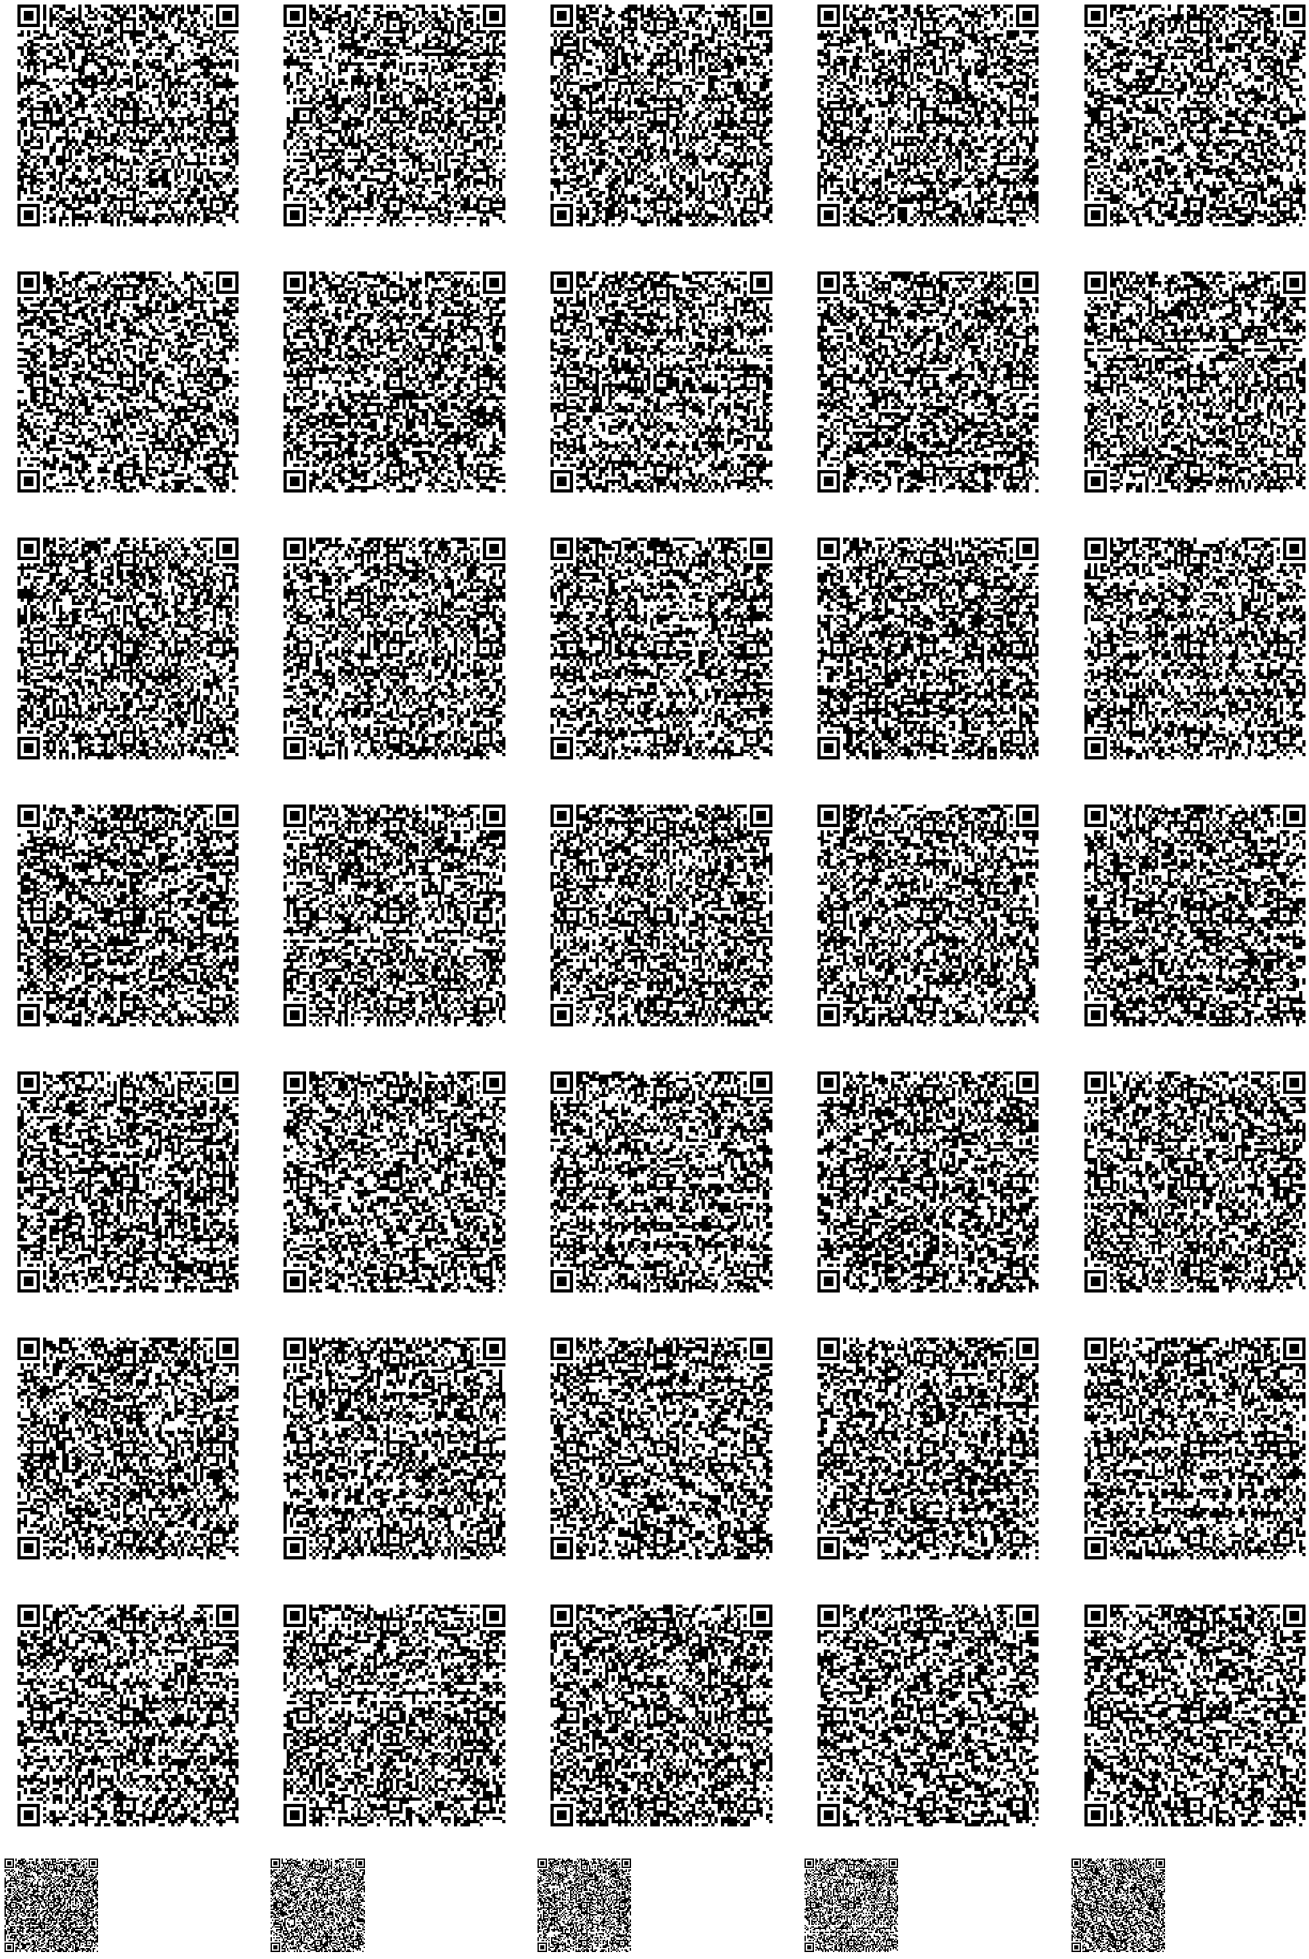

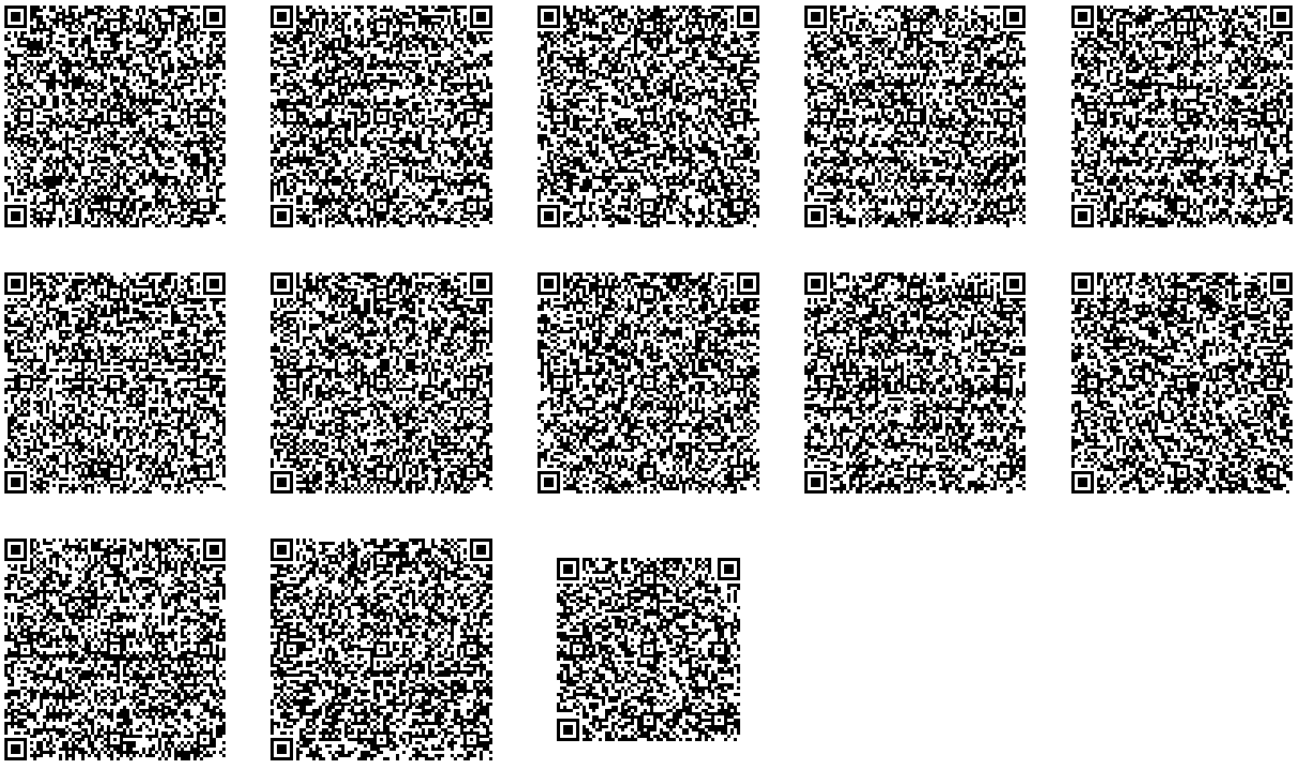

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060840008183 - ТОО "АЛТЫН АЙДАРЛЫ"**

Стройка: **Строительство школы в селе Жанарык Жанарыкского сельского округа, Жанакорганском районе Кызылординской области на 300 мест**

Договор подряда (контракт) №: **96 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Апрель 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство /добавляемые работы/				
			Раздел: Покрытие (участок школы)				
			Подраздел: Тип 2а. Покрытие тротуаров из плитки				
1	1	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	141.27	5 922	836 601
2	2	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	141.27	4 579	646 875
3	3	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	178.0002	3 790	674 621
4	4	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1412.7	3 699	5 225 577
5	5	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1390.0968	3 912	5 438 059
			Итого по подразделу: Тип 2а. Покрытие тротуаров из плитки				**12 821 733**
			Подраздел: Тип 4. Покрытие футбольного поля				
6	6	1111-0101-3607 РСНБ РК 2022	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем /прим./	м2 покрытия	2400	1 840	4 416 000
7	7	СТпрайсРСНБ РК 2022	Газон искусственный 40 мм	м2	2400	2 064	4 953 600
			Итого по подразделу: Тип 4. Покрытие футбольного поля				**9 369 600**
			Подраздел: Тип 6. Покрытие резиновое				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	215.634	5 922	1 276 985
9	9	7101-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /фракции 20-40 мм/	м3	143.756	4 579	658 259
10	10	211-201-0406 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	181.13256	3 790	686 492
11	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	м3	143.756	44 298	6 368 103
12	12	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	2.084462	59 456	123 934
13	13	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.084462	415 660	866 427
14	14	1147-0402-0102 РСНБ РК 2022	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	4167.56	10 845	45 197 188
			Итого по подразделу: Тип 6. Покрытие резиновое				**55 177 388**
			Подраздел: Бортовой камень БР 100.20.08				
15	15	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	871	4 225	3 679 975
16	16	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	871	1 508	1 313 468
			Итого по подразделу: Бортовой камень БР 100.20.08				**4 993 443**
			Подраздел: Ограждение спортивной площадки				
17	17	8601-0602-0605 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, спиральным барьером безопасности и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,43 м	секция	131.37	84 731	11 131 111
18	18	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	137 315	137 315
			Итого по подразделу: Ограждение спортивной площадки				**11 268 426**
			Подраздел: МАФы - полоса препятствий				
19	19	8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	1	170 759	170 759
20	20	ТСТпрайс УСН РК 8.02-03-2023	Забор с наклонной доской 4000х2870х2000 мм	шт	1	497 578	497 578

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	ТСТпрайс УСН РК 8.02-03-2023	Разрушенная лестница 5400х2000х1740 мм	шт	1	479 484	479 484
22	22	ТСТпрайс УСН РК 8.02-03-2023	Стена с проломом 2400х400х1100 мм	шт	1	389 016	389 016
23	23	ТСТпрайс УСН РК 8.02-03-2023	Скалодром 1380х80х2450 мм	шт	1	226 172	226 172
			Итого по подразделу: МАФы - полоса препятствий				**1 763 009**
			Итого по разделу: Покрытие (участок школы)				**95 393 599**
			Итого по локальной смете: Благоустройство /добавляемые работы/				**95 393 599**
			ИТОГО по акту:				**95 393 599**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (8.100%)	95393599.000 x 8.10%	7 726 882
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	95393599.000 + 7726881.883	103 120 481
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, (0.05409035%)	95393599.000 x 0.05409035%	5 159 873
	Сметная прибыль, (5.00%)	103120480.883 x 5.00%	5 156 024
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	(103120480.883 + 5159872.885) x 5.000%	5 414 018
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		118 850 396
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	118850395.500 x 1.0557	125 470 363
	НДС (12%)	125470362.530 x 12%	15 056 444
	Итого с НДС	125470362.530 + 15056443.504	140 526 806

Лист согласования
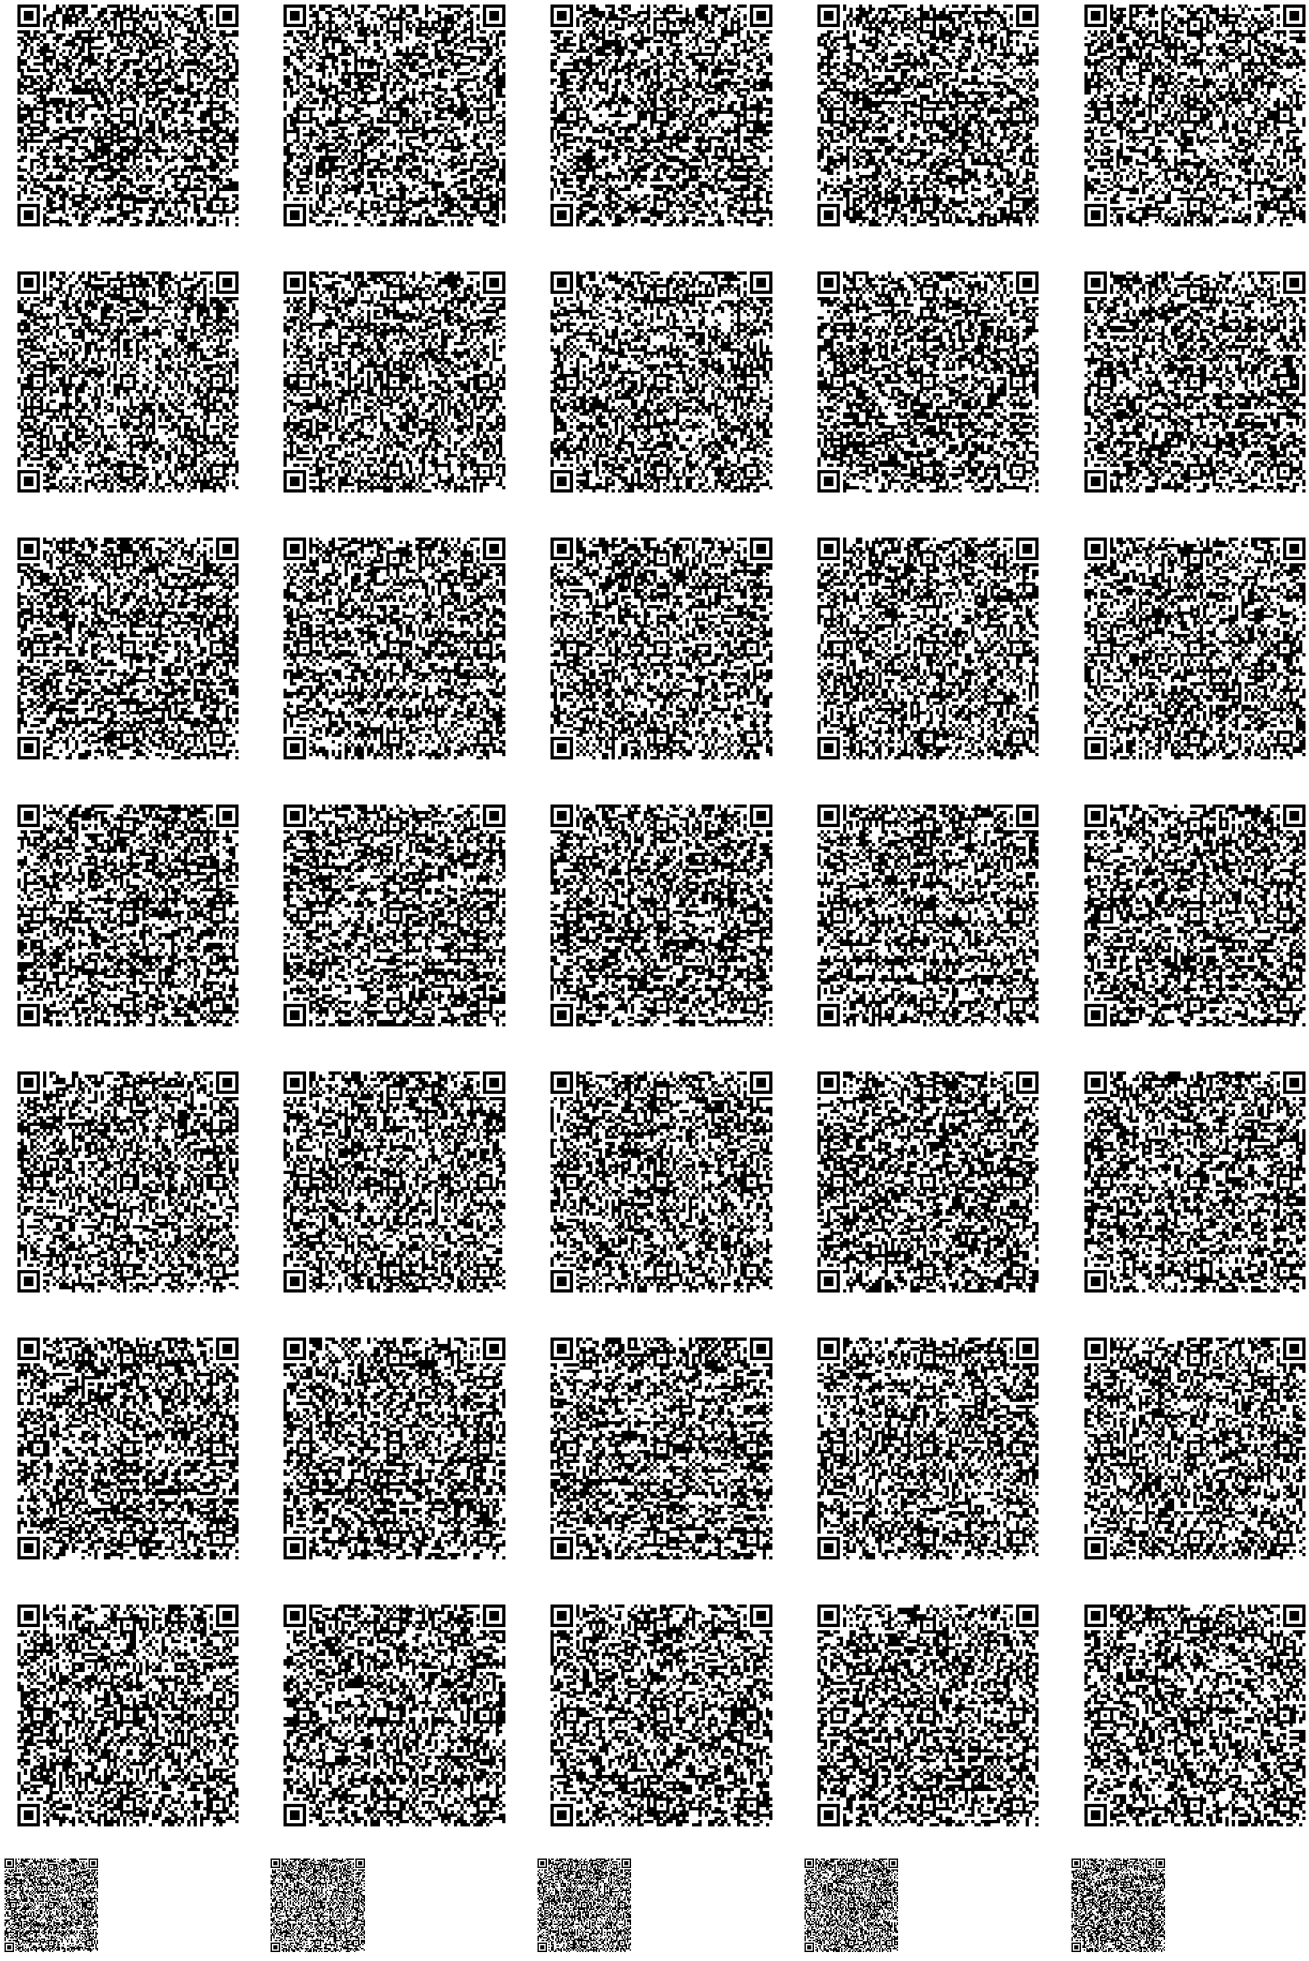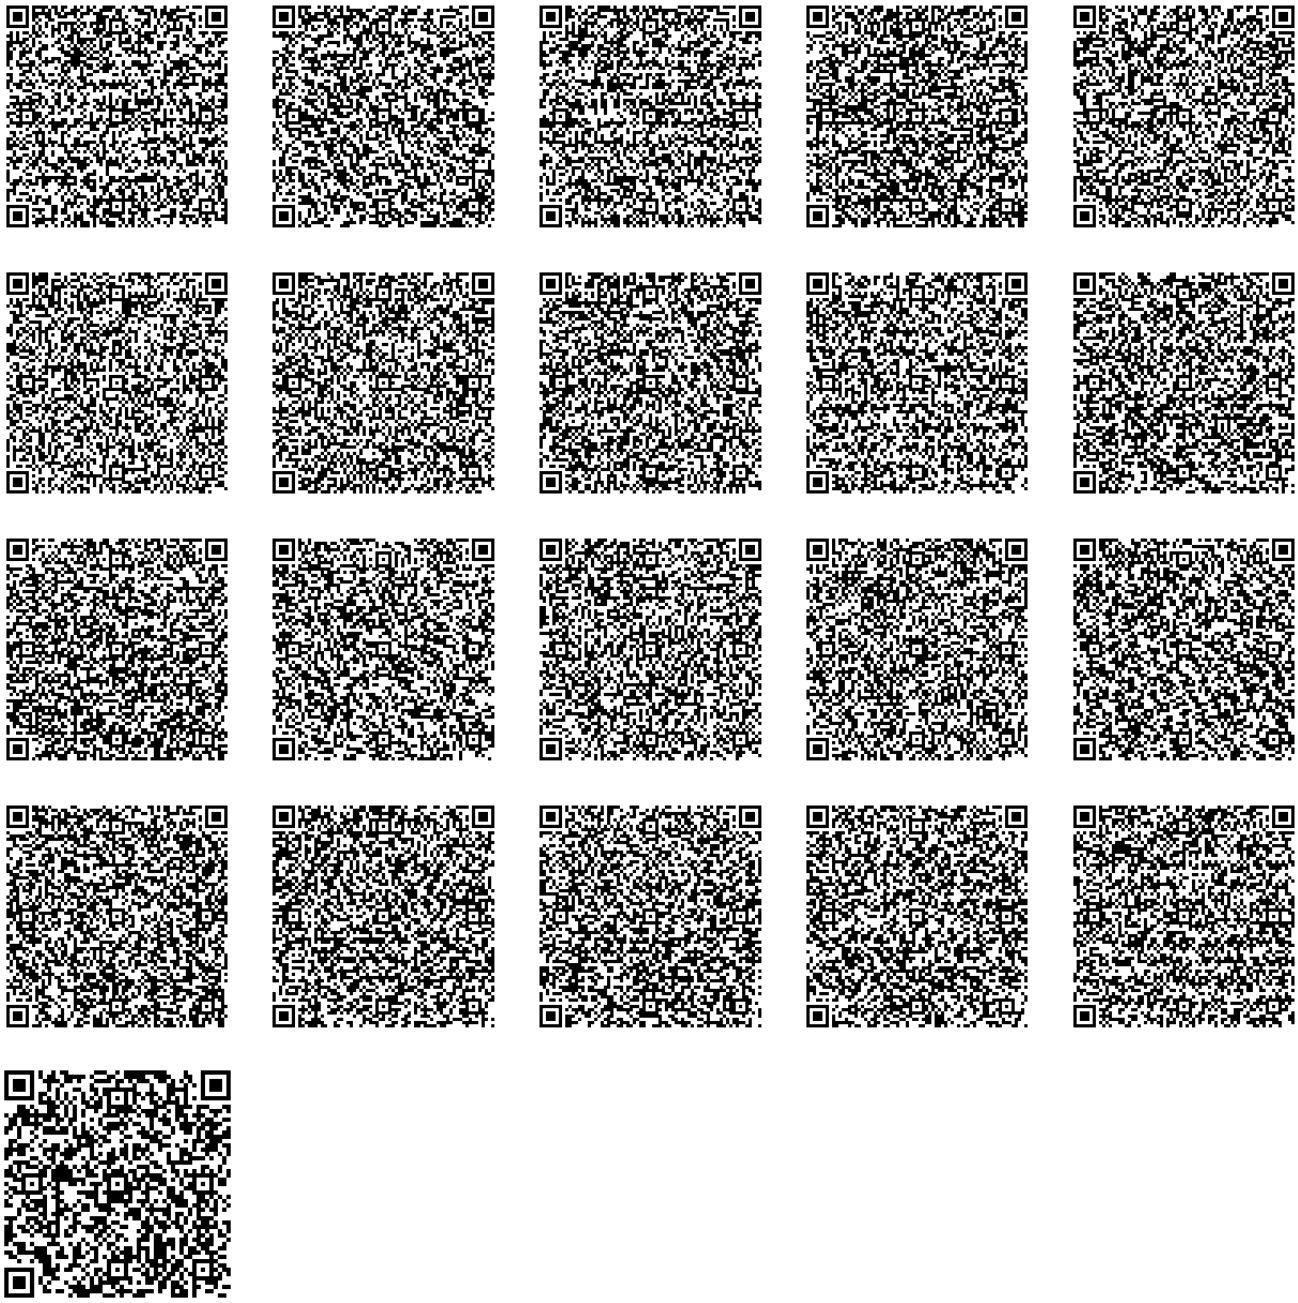
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
841020300204 - ЕГІЗБАЙҰЛЫ ЕРҒАЛИ null	Директор	07.04.2025 15:59
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	Заместитель директора	08.04.2025 10:46
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Эксперт технического надзора	08.04.2025 04:04
570805301180 - ЖУМАНОВ АБСАТТАР АПБАСОВИЧ	Эксперт технического надзора	07.04.2025 21:28
Представители авторского надзора		
570124300140 - АЛИБАЕВ СЕРИК ЕРЕЖЕПОВИЧ	Эксперт авторского наздора	07.04.2025 18:57
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	08.04.2025 11:44 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
910813400541 - АРАЛБАЕВА МОЛДИР СОВЕТОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	08.04.2025 12:37 Комментарий: Согласовано согласно протоколу технического совета
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городу Астана, Шымкент, по Кызылординской и Туркестанской областям	08.04.2025 15:02
800816301735 - АНАСОВ РАХАТ ЕСКЕЛДИЕВИЧ	Ведущий специалист (Куратор объекта)	08.04.2025 09:50
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	08.04.2025 11:57
