Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 11 2024 года

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО», 060140003830, 8(7232)262730, 070004, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27, руководитель Кенесбаев Д.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон- для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «26» 11 2024 года ТОО «QK SUNQAR», Берлибаев А.Т., ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова, 39/2, БИН 040140008686, 8 777 855 79 14**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) работ **от «26» 11 2024 года ТОО «ВЕХИ», эксперт Шаймарданова Д.Ш. № KZ83VJE00044390 от 07.02.2019 г., БИН 000540006264, 87055714200**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «26» 11 2024 года ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», руководитель Урунтаев М.Ж., в лице руководителя группы авторского надзора Герсонский Г.Э. по приказу №2 от 03.01.2024 г., БИН 050740006409, 87773566776**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района ВКО. Корректировка», уровень ответственности–II, нормальный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **ВКО, Тарбагатайский район, Куйганский с.о., с.Жамбыл**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «26» 11 2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа **Решение акимата Куйганского сельского округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области №26 от 16.11.22 г. на право временного безвозмездного землепользования (аренда) сроком на 3 года, площадью 0,2 га (кадастровый номер 05-078-008-461); ЗКП от 14.11.2022 на земельный участок площадью 0.20 га, с кадастровым номером 05-078-008-461.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 2024 года № _____ наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО» уведомление KZ25REA00393657 от 30.05.2024 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», рабочий проект № 1221-52К

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й):**ГУ «Управление строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» п/з №241 от 28.12.2023 г.**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2024 года**;

окончание работ: **ноябрь 2024 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3;**

фактически, месяц: **6;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Мощность (количество посетителей)	чел/смену	25	25	25	25
Этажность	эт.	1	1	1	1
Расчетная площадь	кв.м	110,39	110,39	110,39	110,39
Общая площадь здания	кв.м	154,70	154,70	154,70	154,70
Полезная площадь	кв.м.	138,87	138,87	138,87	138,87
Строительный объем здания	кв.м	599,65	599,65	599,65	599,65
Площадь застройки	кв.м.	195,38	195,38	195,38	195,38
Продолжительность строительства	мес.	3	3	6	6

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание медицинского пункта запроектировано в одноэтажном исполнении, прямоугольной формы в плане, размерами в осях 13,0х12,2 м. Высота этажа – 3,0 м. Конструктивная схема здания – стеновая, с несущими продольными кирпичными стенами.

Фундамент – ленточный монолитный.

Стены - кирпичные толщиной 380мм из полнотелого керамического кирпича. Перегородки - кирпичные из кирпича. Перемычки - монолитные железобетонные.

Наружная отделка: стены – металлосайдинг.

Внутренняя отделка предусмотрена из негорючих и трудносгораемых материалов: потолки – штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской; стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка; полы – линолеум, плитка керамическая.

Покрытие - из сборных железобетонных многопустотных плит толщиной 220 мм. Крыша – бесчердачная, односкатная, вентилируемая, с неорганизованным водостоком. Кровля - совмещенная вентилируемая.

Окна – металлопластиковые, с двойным остеклением.

Двери – внутренние деревянные, наружные – металлические утепленные.

Для доступа в здание маломобильных групп населения предусматривается устройство пандуса.

По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм по уплотненному с гравием грунту с уклоном в поперечном направлении 0.03.

Отопление

Отопление электрическая. В качестве нагревательных приборов предусмотрены инфракрасные обогреватели в комплекте с терморегуляторами.

Вентиляция

Вентиляция предусмотрена вытяжная с механическим побуждением, приток неорганизованный. Воздух удаляется системами естественной вентиляции через решетки в приставных каналах. Воздуховоды выводятся выше кровли и оборудуются шахтами с зонтами. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали.

Наружные сети канализации

Наружное пожаротушение предусматривается при помощи автонасосов из существующего пожарного гидранта, размещенного на существующей сети.

Отвод бытовых сточных вод от медицинского пункта предусматривается самотеком, по запроектированным выпускам в проектируемый *резервуар* для стоков емкостью 2 м.куб. Бытовая канализационная самотечная сеть принимается из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб с раструбами и уплотнительными кольцами, диаметром 160 мм.

Водоснабжение и канализация

Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается на привозной воде. Запас воды хранится в баке для питьевой воды емкостью 0,5 м.куб.

Внутреннее пожаротушение здания не предусматривается. Сети системы водоснабжения принимается из стальных оцинкованных водогазопроводных труб, диаметром 42,3х3,2 мм, а также напорных полипропиленовых труб (питьевая) диаметром 20х1,9 – 40х3,7 мм.

Система горячего водоснабжения предусматривается от электроводонагревателя, объемом 50 л и мощностью 1,5 кВт.

Отвод бытовых стоков осуществляется по запроектированному выпуску, самотеком, в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. Бытовая канализационная самотечная сеть принимается из полиэтиленовых канализационных труб на резиновых уплотнительных кольцах, диаметром 50-100 мм.

Электротехнические решения

Рабочий ввод электроснабжения 0,4 кВ предусмотрен от опоры РУ-0,4кВ, КТП-3-5-17, выполнен воздушной линией ВЛИ-0,4 кВ (совместная подвеска по существующим опорам ВЛ-0,4кВ). Резервный ввод электроснабжения 0,4 кВ предусмотрен от проектируемой дизельной электростанции мощностью 44кВА/35,2 кВт. Длина кабеля – 13м. Длина ВЛИ 0,4кВ – 306 м.

В здании предусмотрено рабочее, аварийное и ремонтное освещение. Освещение принято светодиодное. Аварийное освещение предусмотрено по путям эвакуации в коридоре, в процедурной, в физиотерапевтическом кабинете.

Пожарная сигнализация

Предусмотрен прибор, передающий сообщения через встроенный модем на телефоны пользователей или пульт централизованной охраны, также дымовые пожарные извещатели на потолке. Система оповещения принята второго типа. Для оповещения используются свето-звуковые оповещатели «ВЫХОД» и звуковые оповещатели.

Системы связи

Подключение к внешней сети телефонизации и сети интернет осуществляется по сотовой связи. Для здания предусмотрена система видеонаблюдения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **198,755 млн. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **126,646 млн.тенге**, оборудование **42,670 млн.тенге**; прочие **29,439 млн.тенге**.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **186 334 489,68 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **122 013 699,83 тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **39 918 937 тенге**; прочие **21 932 562,85 тенге**.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____ % и фактически применено ____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания высокий;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-смет документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитекту градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик: **Заместитель руководителя ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» Тойкенов Саят Ерланович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «ВЕХИ» руководитель Алмаскан Д.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестационного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Шаймарданова Д.Ш. по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций ;**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ» директор Урунтаев М.Ж.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **руководитель группы авторского надзора Герсонский Г.Э. п/з № 2 от 03.01.2024 г.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «QK SUNQAR», Берлибаев А.Т. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

_____ подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)
«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»	1		15	195,38	599,65	154,70				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Благоустройство					
фундамент	стены	кровля	Вид отопления	электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточный монолитный	Кирпичные	бесчердачная, односкатная, вентилируемая, с неорганизованным водостоком	электрическая	Рабочий ввод от опоры РУ-0,4кВ, КТП-3-5-17, Резервный ввод от ДЭС	привозной	от электроводонагревателей	резервуар для стоков	нет

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в	в	в	в бара	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

мансардах	подвалах	этажах	ках					

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: прилагается
2. Экспликация к поэтажным планам: прилагается

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2000						

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в то			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживани	Организаций и учреждени управления,

квартирах				сооружений			я	научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Ленточный монолитный
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			толщиной 380мм из полнотелого керамического кирпича
	2) перегородки			кирпичные
3	Перекрытия	чердачное		бесчердачная
		междуэтажное		из сборных железобетонных многопустотных плит
4	Крыша			бесчердачная, односкатная, вентилируемая, с неорганизованным водостоком
5	Полы	1-го этажа		линолеум, плитка керамическая.
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		металлопластиковые, с двойным остеклением
		двери		внутренние деревянные, наружные – металлические утепленные
7	Отделочные работы	внутренние		потолки – штукатурка с последующей водоэмульсионной покраской; стены – штукатурка, водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка; полы – линолеум, плитка керамическая.
		наружные		металлосайдинг
8	Горячее водоснабжение			от электроводонагревателя
9	Водопровод			от существующего водопровода диаметром 110 мм; Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается на привозной воде
10	Канализация			резервуар для стоков
11	Электроосвещение			рабочее, аварийное и ремонтное освещение
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	электрическая	инфракрасные обогреватели
17			на твердом	

			топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			бетонная отмостка шириной 1000 мм, устройство пандуса

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		

Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» Тойкенов Саят Ерланович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор
ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», руководитель группы авторского надзора Герсонский Г.Э. по приказу №2 от 03.01.2024 г.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)
«Строительство медицинского пункта в селе Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4кВ**	**километр (далее – км)**	**0,0357**
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	$м^2$	
6	**Опоры:**		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	**шт**	**1**
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	**км**	**0,357**
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-0,66**	**км**	**0,00714**

	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	**км**	**0,02856**
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	4
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик

Заместитель руководителя ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО» Тойкенов Саят Ерланович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати

Авторский надзор

ТОО «ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ», руководитель группы авторского надзора Герсонский Г.Э. по приказу №2 от 03.01.2024 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати

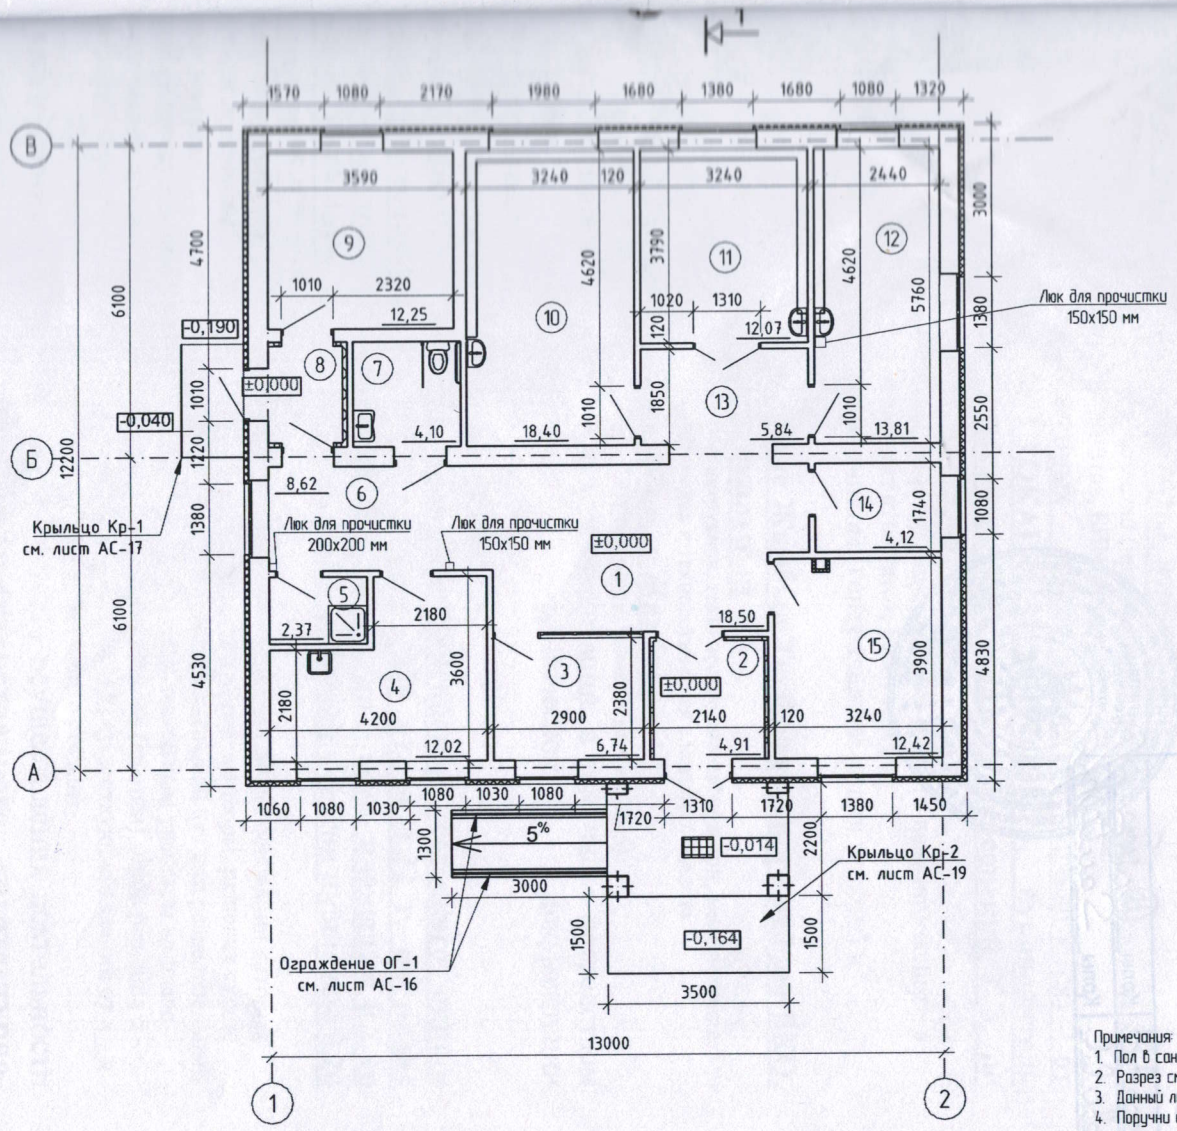

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
1	Вестибюль	18,50	Д
2	Тамбур	4,91	Д
3	Справочная	6,74	Д
4	Хозяйственно-бытовое помещение	12,02	Д
5	Помещение уборочного инвентаря	2,37	Д
6	Коридор	8,62	Д
7	Универсальный санузел	4,10	Д
8	Тамбур	2,70	Д
9	Техническое помещение	12,25	Г
10	Физиотерапевтический кабинет	18,40	Д
11	Процедурная	12,07	Д
12	Кабинет среднего медперсонала	13,81	Д
13	Коридор	5,84	Д
14	Помещение хранения дезинфицирующих средств	4,12	Д
15	Аптечный пункт	12,42	Д
	Итого:	138,87	

Примечания:
1. Пол в санузле, ПУИ выполнить ниже отм. пола на 20 мм;
2. Разрез смотри лист АР-14;
3. Данный лист смотри совместно в листом АР-12 "Маркировочный план на отм. 0,000";
4. Поручни ограждения пандуса и площадок выполнить на отм.+0,70м и +0,90м.

"ВОСТОК АГРОПРОМ ПРОЕКТ"
Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ТОО "Востокагропромпроект"

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Выполнил		Огрцов Н.			11.23
Проверил		Рахимов Т.			11.23
Н. контроль		Архатова С.			11.23

1221-52К-1-АР

Строительство медицинского пункта в с. Жамбыл Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка.

Медицинский пункт

Стадия	Лист	Листов
РП	9	20

План этажа на отм.0,000

ТОО "Востокагропромпроект" г. Усть-Каменогорск

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША ТАРБАҒАТАЙ АУДАНЫНЫҢ БӨЛІМІ

2024ж. «04» желтоқсан тіркелді

БСН тір

БЕРІЛДІ

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалының жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Тарбағатай ауданының бөлімі

Өтініш № 00226530466I

Тіркеу ісі №

Кадастрлық № 05-078-008-461

Тіркелген күні 05.12.24

Тіркелген уақыты 14:05

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:

с. Жалбай, ул. Тогаса 13

Тіркеуші (маман) Маликов А.Ж. Қолы

Бөлім басшысы Сексенова С.С. Қолы

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ___ листов

Подпись

М.П
