Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" 10 2023 г.

Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», БИН 060240010430 тел. 8(7187)-34-72-15, почтовый индекс: 141200, Палодарская область, город Экибастуз, улица Энергетиктер, 62;

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«18» 10 2023 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», лицензия на строительно-монтажные работы 14012175 от 20.08.2014 года, директор – Парманов Баглан Берикбаевич, г.Шымкент, улица Г.Орманова, здание 15/2, БИН 090140003876, тел.8(7252)322-930;**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«18» 10 2023 год, Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление капитальным строительством-ПВ», БИН 070340002940, эксперт технического надзора Джуматаев Ерсин Александрович, аттестат № KZ45VJE00073883 от 22.04.2022г.; № KZ88VJE00073885 от 22.04.2022г.,тел.8(7187)22-82-96;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от от **«18» 10 2023 года, Индивидуальный предприниматель «МОДУЛОР-ЭК», Нурпеисов Сайлау Кездекпаевич, приказ №1-23 от 03.05.2023г, ИИН 630709400705, тел. 8(718)734-09-06;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «**Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь»;**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, Торткудукский сельский округ, село Бозшаколь;**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документациионодтверждает, в том числе:посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____202__года, ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: правоустанавливающего документа на земельный участок: Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано постановление акимата города Экибастуза Павлодарской области от 10.02.2022 года, №0411929;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года наименование органа, вынесшего решение;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудование

""_____23года№;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области", талон: KZ07REA00331998 от 17.05.2023; KZ44REA00356843 от 13.10.2023;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **Индивидуальный предприниматель «Модулор-ЭК», №26-20.ЭС;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Приказом **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», №107 от 20.04.2022 год**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с 17 мая 2023 года**;

месяц, год

окончание работ **по 13 октября 2023 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **2**;

фактически **5 месяцев** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-25-40 кВА	шт	1	1	1	1
Трансформатор ТМ-25/6(10) 0,4кВА	шт	1	1	1	1
РеклоузерRec15_A/1	шт	1	1	1	1
РазъединительРЛНД-1	шт	1	1	1	1

Протяженность ВЛ-10 кВА	км	0,91	0,91	0,91	0,91
Протяженность ВЛИ-0,4кВА	км	0,12	0,12	0,12	0,12
Опора ВЛ-10 кВА	шт	17	17	17	17
Опора ВЛИ-0,4 кВА	шт	4	4	4	4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство ВЛ-10кВ осуществлялось от точки подключения (опоры №7) до КТПН-25 10/0,4кВ УХЛ1. На существующей опоре для подключения установлено устройство УОК.

На первой отпаечной опоре установлено устройство разъединителя РЛНД10-400. На второй отпаечной опоре предусмотрено устройство линейного реклоузера типа РВА-TEL с шкафом учета в комплекте с счетчиком электроэнергии и системой АСКУЭ.

Выполнено монтаж комплектной трансформаторной подстанции с воздушным вводом и выводом, масляным трансформатором ТМ-25кВА 10/0,4кВ. В качестве фундамента для КТПН установлены два фундаментных блока типа ФБС. Ограждение КТПН выполнили из сетки «Рабица».

От КТПН к зданиям объекта протягивается провод СИП4 на типовых железобетонных опорах.

Выполнено устройство заземление реклоузера с разъединителем, опор, КТПН, в соответствии с нормами Правил устройства электроустановок РК 2015.

Для заземления остальных опор устраивали контур из стали круглой ⌀10мм (горизонтальный заземлитель) длиной 10м., в количестве 2 штуки. Сопротивление заземления не более 30 Ом.

Для заземления КТПН с конечной опорой ВЛ-10кВ выполнили устройство контура заземления, сопротивлением не более 4 Ом. Контур заземления состоит из горизонтального заземлителя, выполненного из полосовой стали 63х6мм и вертикальных заземлителей, выполненных из круглой стали, в количестве 12шт.

Для заземления реклоузера с разъединителем выполнить устройство контура заземления, сопротивлением не более 10 Ом. Контур заземления состоит из горизонтального заземлителя, выполненного из полосовой стали 40х4мм и вертикальных заземлителей, выполненных из угловой стали 40х40х4мм, в количестве 4 шт.

Все работы выполнить согласно действующих ПУЭ РК 2015, СН и СП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячеводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **16 280,430** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **5 550,716** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 985,382** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **15 466, 40827** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **5 273,180** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **8 536,113** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 75 % (на объектах, финансируемых за счетгосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания высокий, соответствует требованиям СН РК 2.04-21-2004* «Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий».

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «**Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь»;**

наименование объекта(комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза», в лице руководителя Амерханова Архата Николаевича;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

18.10.23.

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление капитальным строительством-ПВ» эксперт технического надзора Джуматаев Ерсин Александрович;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись 18.10.23

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Управление капитальным строительством-ПВ» Свидетельство об аккредитации №KZ28VWC00016484 от 20.09.2023 г. в лице директора Шайпранова Даулета Тасбулатовича;** 18.10.23

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) Авторский надзор **Индивидуальный предприниматель «МОДУЛОР-ЭК», в лице директора Сартовой Санмгуль Кездикбаевны;** 18.10.23

(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата и подпись Нурпеисов Байдаулет Кездикбаевич

Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоҚұрылыс», в лице директора Парманова Баглана Берикбаевича;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

Место печати (при наличии) 18.10.23

Субподряд: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Центр-Turkistan"

в лице **директора – Байымбетова Мухтара Махсутулы;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя

18.10.23

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№	Наименование	Ед.измер.	Количество
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	километр	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	0,91
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры: 1) металлические	шт	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	21
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода: 1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	2,73
8	Кронштейны для светильников: 1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения: 1)светильники с лампами накаливания		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Провода:		
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4	км	0,12
11	Траверса: 1)Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1
	2) Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	2
	3)Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	13
12	Заземлители: 1) заземлитель вертикальный	шт	58
	2)заземлитель горизонтальный	м	150
13	Устройства грозозащиты	шт	
14	Дорожные покрытия кабельных сетей: 1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	
15	КТПН-25-40 кВА	шт	1
16	Трансформатор ТМ-25/6(10) 0,4 кВА	шт	1
17	Реклоузер Rec15_A/1	шт	1
18	Разъединитель РЛНД-1	шт	1

Заказчик **Амерханов Архат Николаевич** 18.10.23
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Нурпеисов Сайлаубек Кездыкбаевич** 18.10.23
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Утверждаю Директор ТОО "Стройпроект-ЭК"
Лапушко А.Н.

Исполнительная схема выноса в натуру проекта ВЛ 10кВ электроснабжения крестьянского хозяйства"Ербол", расположенного в г. Экибастуз, Торткудукский сельский округ, село Бозщаколь, учетный квартал 148, земельный участок198.

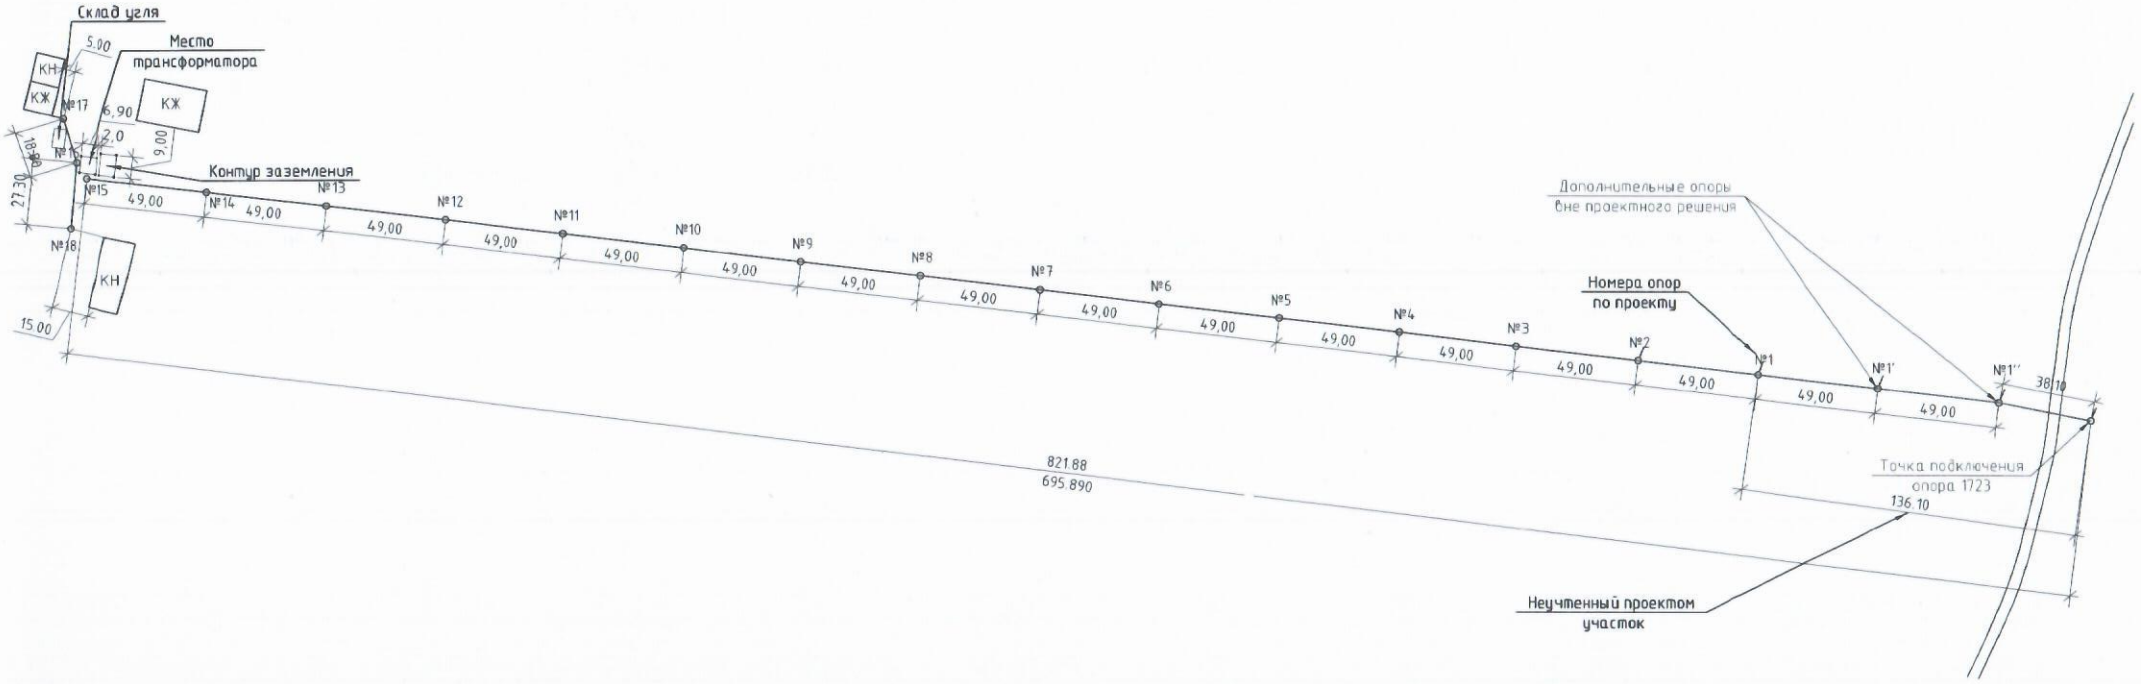

Примечание: 20.0 Фактический размер в м.
28.0 Проектный размер в м.

Выполнил: геодезист Дмитриев М.Н.
