Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«18» 10 2023год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЖолЭнергоКурылыс», г. Шымкент, Г.Орманова, здание 15/2;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Парманов Баглан Берикбаевич;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Электроснабжение крестьянского хозяйства «Ербол» по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, село Бозшаколь»;**

наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза, в лице руководителя Амерханова Архата Николаевича;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй Центр-Turkistan» лицензия ГСЛ № 014996 от 17.04.2020 года;**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора – Байымбетова Мухтара Махсутулы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «Модулор-ЭК», №26-20.ЭС;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **Государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Экибастуза» №107 от 20.04.2022 года ;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих

мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КТПН-25-40 кВА	шт	1	1	1	1
Трансформатор ТМ-25/6(10) 0,4 кВА	шт	1	1	1	1
Реклоузер Rec15_A/1	шт	1	1	1	1
Разъединитель РЛНД-1	шт	1	1	1	1
Протяженность ВЛ-10 кВА	км	0,91	0,91	0,91	0,91
Протяженность ВЛИ-0,4кВА	км	0,12	0,12	0,12	0,12
Опора ВЛ-10 кВА	шт	17	17	17	17
Опора ВЛИ-0,4 кВА	шт	4	4	4	4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом электроснабжения предусмотрено строительство ВЛ-10кВ со сталеалюминевыми проводами (марки АС). Сечение провода выбрано исходя из расчетной нагрузки по нагреву и допустимым потерям напряжения. Сооружение проектируемой линии предусмотрено на вновь устанавливаемых типовых железобетонных опорах.

Строительство ВЛ-10кВ осуществляется от точки подключения (опоры №7) до проектируемой КТПН-25 10/0,4кВ УХ/11. На существующей опоре для подключения установить устройство УОК.

На первой отпаечной опоре установлено устройство разъединителя РЛНД10-400. На второй отпаечной опоре предусмотрено устройство линейного реклоузера типа PBATEL с шкафом учета в комплекте с счетчиком электроэнергии и системой АСКУЭ. Выполнен монтаж комплектной трансформаторной подстанции с воздушным вводом и выводом, масляным трансформатором ТМ-25кВА 10/0,4кВ. В качестве фундамента для КТПН установлены два фундаментных блока типа ФБС. Ограждение КТПН выполнили из сетки «Рабица». От КТПН к зданиям объекта протягивается провод СИП4 на типовых железобетонных опорах. Выполнено устройство заземление реклоузера с разъединителем, опор, КТПН, в соответствии с нормами Правил устройства электроустановок РК 2015г. Для заземления остальных опор устроили контур из стали круглой 010мм (горизонтальный заземлитель) длиной 10 м., в количестве 2 штуки. Сопротивление заземления не более 30 Ом. Для заземления КТПН с конечной опорой ВЛ-10кВ выполнили устройство контура заземления, сопротивлением не более 4 Ом. Контур заземления состоит из горизонтального заземлителя, выполненного из полосовой стали 63х6мм и вертикальных заземлителей, выполненных из угловой стали 63х63х6мм, в количестве 12шт. Для заземления реклоузера с разъединителем выполнили устройство контура заземления, сопротивлением не более 10 Ом. Контур заземления состоит из горизонтального заземлителя, выполненного из полосовой стали 40х4мм и вертикальных заземлителей, выполненных из угловой стали 40х40х4мм, в количестве 4шт.

Все работы выполнить согласно действующих ПУЭ РК 2015, СН и СП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **с 17 мая 2023 года**;
месяц, год

окончание работ **по** октябрь **2023 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;

фактически: _ месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: **Да**;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансОйл»

Согласовано АО "КазТрансОйл"
Главный инженер Аснов С.Т.
И.о начальника СЭЭ Мамухин К.В
Главный энергетик Валиев Р.Р.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение **не требуются**);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуются;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»** считает объект «**Электроснабжение крестьянского хозяйства «Ербол» по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, село Бозшаколь»**

готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЖолЭнергоҚұрылыс»**
директор – Парманов Баглан Берикбаевич;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподряд: (субподрядчик) **ТОО «Строй Центр-Turkistan»**
директор – Байымбетов Мухтар Махсутулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Утверждаю Директор ТОО "Стройпроект-ЗК"
Лапушко А.Н.

Исполнительная схема выноса в натуру проекта ВЛ 10кВ электроснабжения крестьянского хозяйства"Ербол", расположенного в г. Экибастуз, Торткудукский сельский округ, село Бозщаколь, учетный квартал 148, земельный участок198.

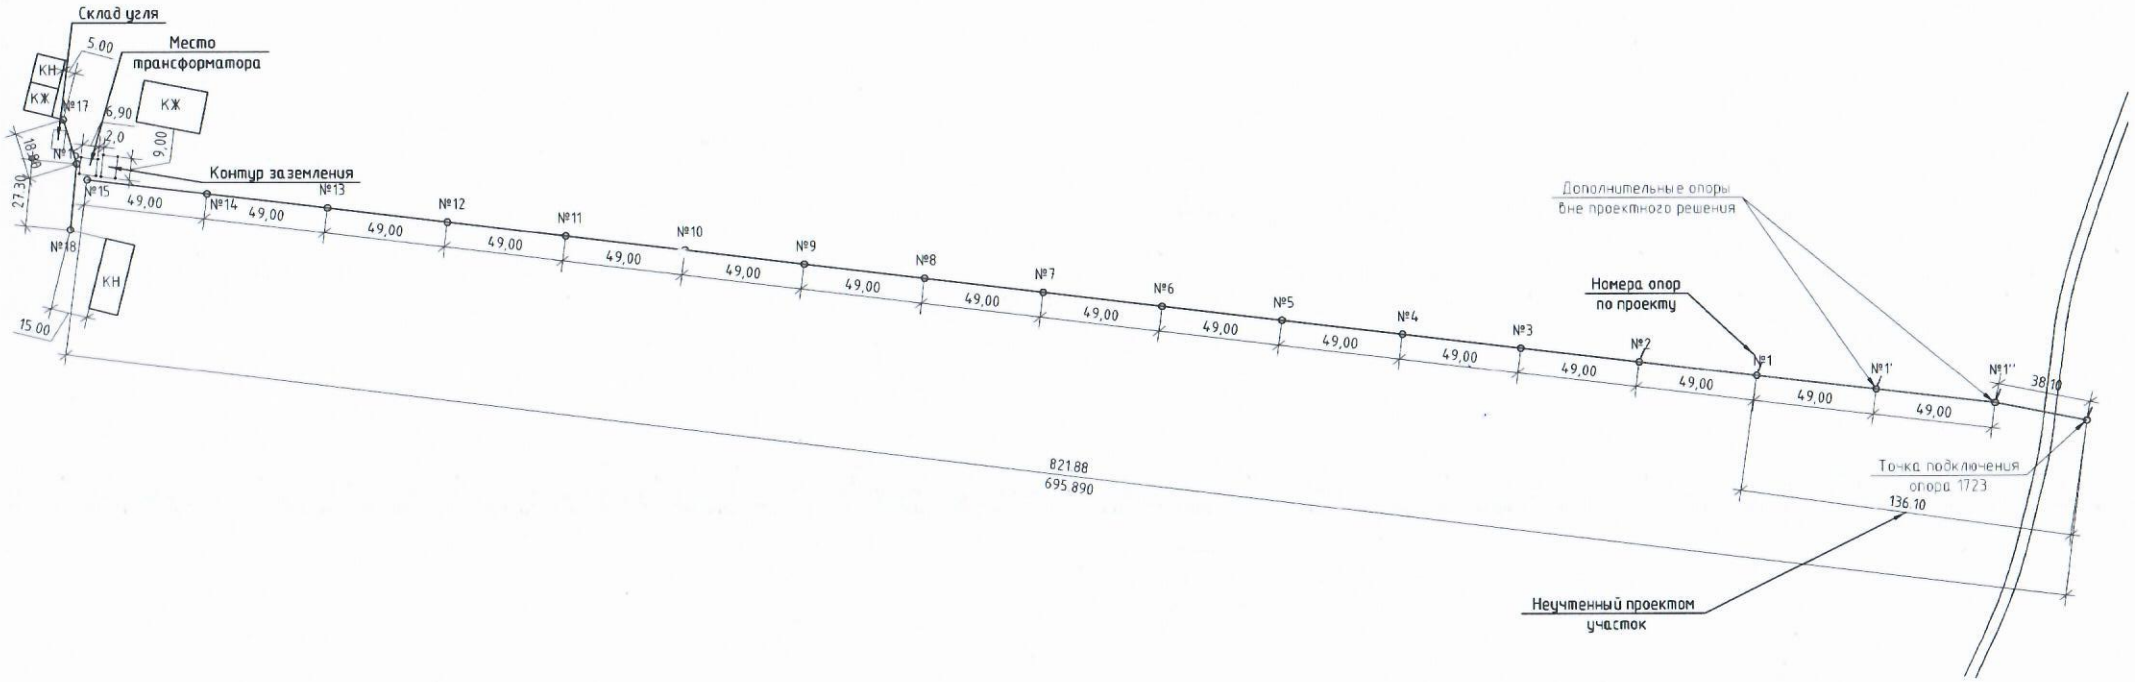

Примечание: 20.0 / 28.0 — Фактический размер в м. / Проектный размер в м.

Выполнил: геодезист Дмитриев М.Н.
