Страница 1 из 2

Подписано через ЭСФ.KZ (#c0e9107070-5114-4c52-b8d2-d2e31d1d1444)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажимеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы по улице Байтурсынова район дома №9 в городе Астана "под ключ"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	001140004068			**196**	**от 29.08.23 г.**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.23 г.; №2 от 30.01.24 г.; №3 от 28.02.24 г., № 4 от 16.04.2024г., № 5 от 31.07.2024г., № 6 от 15.08.2024г.,			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	**3 247 971 467**	**3 247 971 467**	**2 899 974 524,11**				**347 996 942,89**	**3 247 971 467**
в том числе: за октябрь месяц 2024 года	**508 832 279**	**508 832 279**	**454 314 534,82**				**54 517 744,18**	**508 832 279**

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Саттаров А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор / решение от 21.08.2023 г./ ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Руководитель управления ТОО "Engineering Services", БИН 130440013597** **Садвакасов Д.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Страница 2 из 5
Подписано через EQURYLYS.KZ (#c0e10707-21ff-41c2-b682-45e3fbfdf446)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы по улице Байтурсынова район дома №9 в городе Астана "под ключ"

Реестр актов выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 27	Архитектурно-строительные решения (АС)	28 348 248
2	Акт № 28	Архитектурные решения	154 602 067
3	Акт № 29	Благоустройство и озеленение территории	325 881 964
		ИТОГО	**508 832 279**

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Саттаров А.С.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Технический надзор: **Руководитель управления ТОО "Engineering Services", БИН 130440013597** **Садвакасов Д.Б.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 910221350048 - КВОН АНТОН null	Директор	Подписано: 18.10.2024 10:22
Технический надзор: ИИН 861106350093 - САДВАКАСОВ ДАУРЕН null	Руководитель управления	Подписано: 18.10.2024 11:06
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник отдела смет и ценообразования	Подписано: 18.10.2024 11:23
Заказчик: ИИН 820214350952 - САТТАРОВ АМАНГЕЛЬДЫ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию – член Правления	Подписано: 18.10.2024 11:51

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

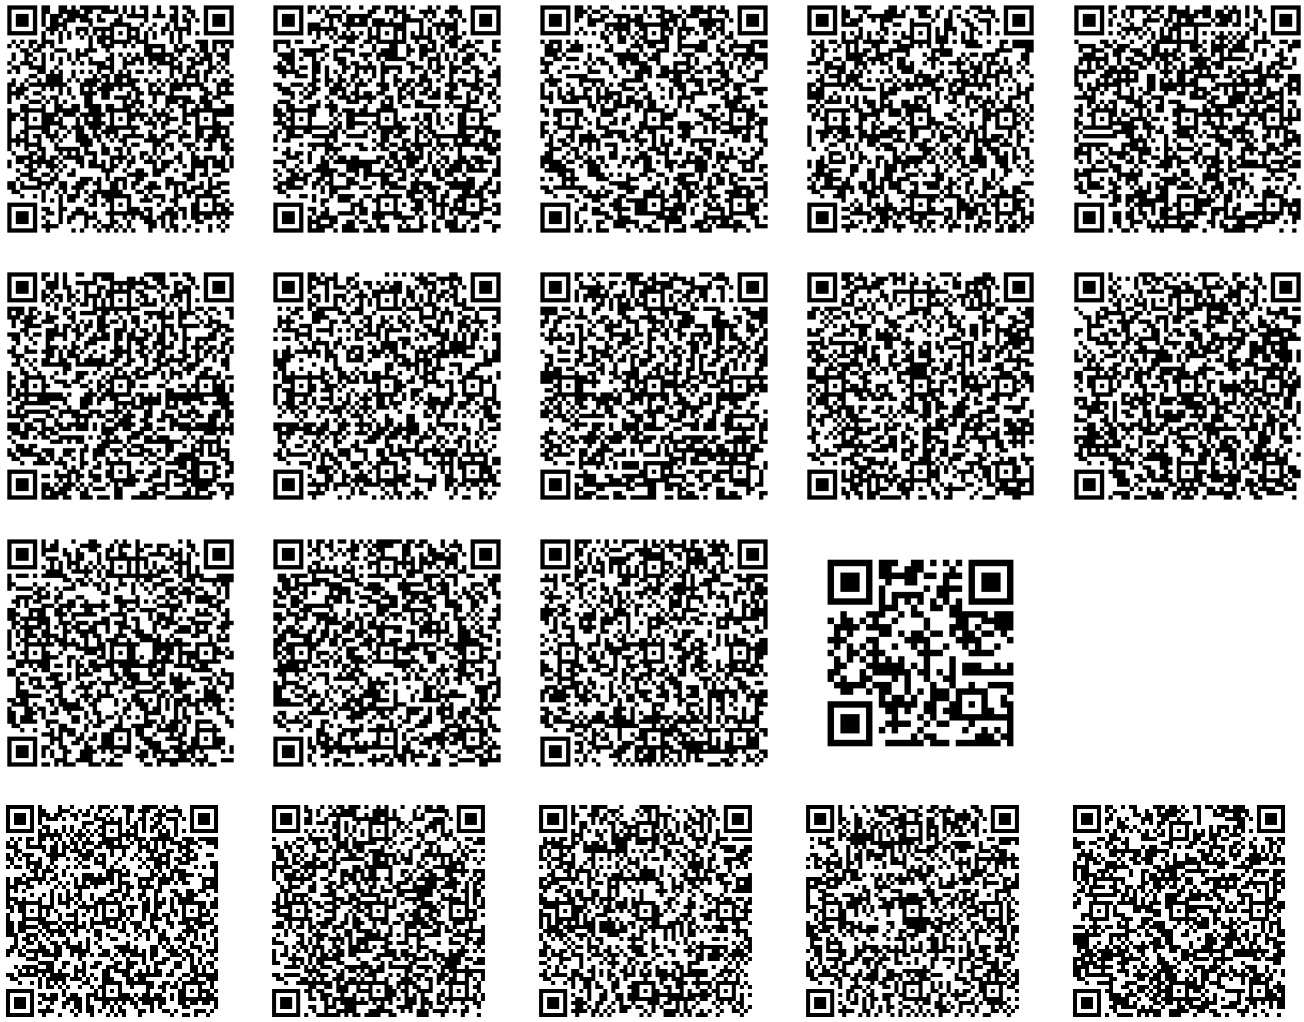

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c0e10707-21ff-4fc2-b682-45e3fdfdf446)

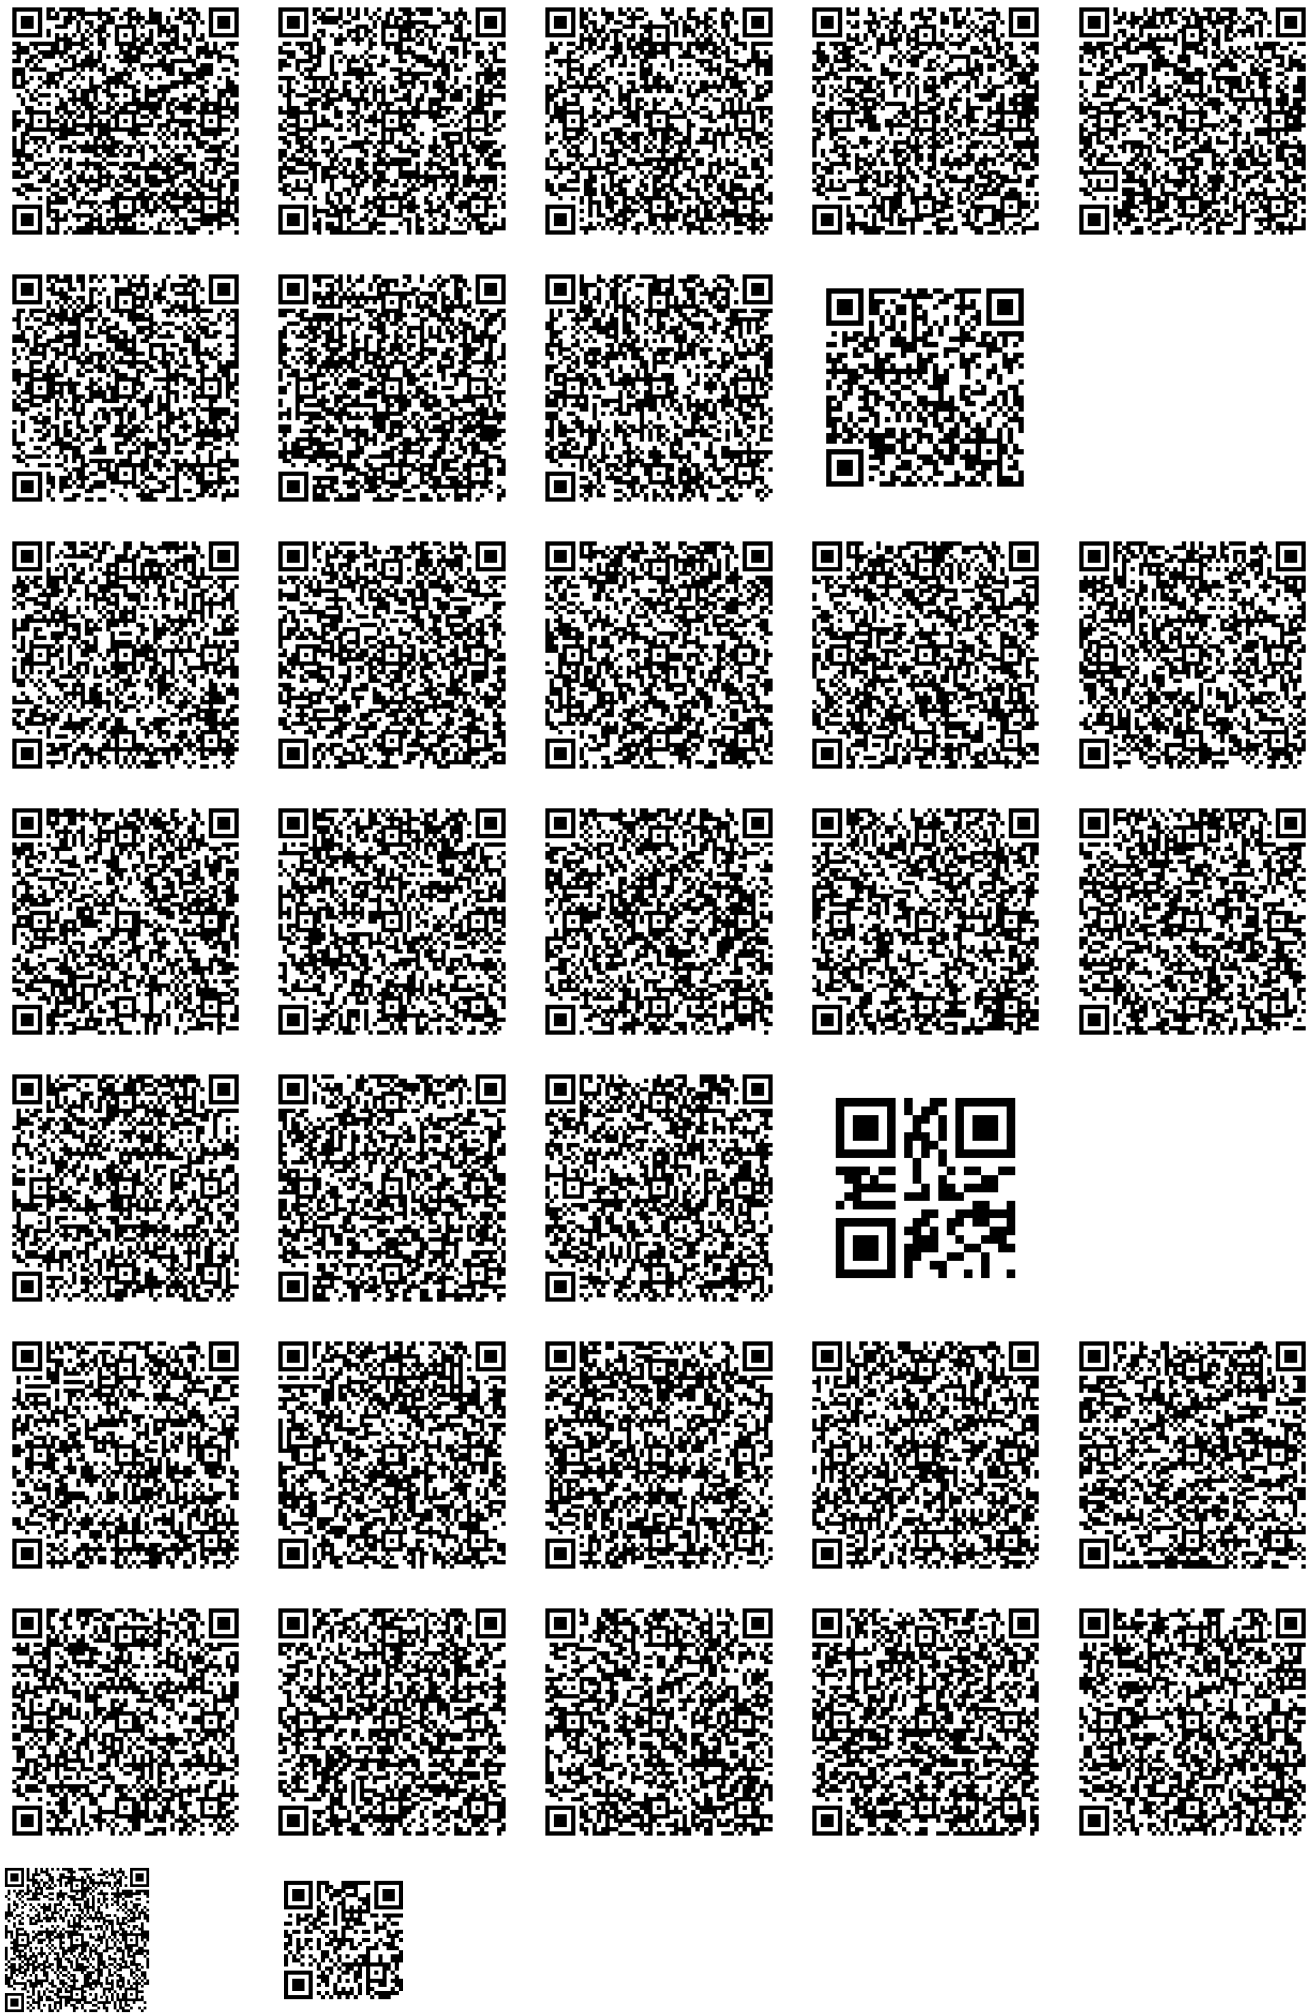

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c0e10707-21ff-4fc2-b682-45e3fdfdf446)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c0e10707-21ff-4fc2-b682-45e3fdfdf446)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы по улице А. Байтурсынова в районе дома № 9 в районе Алматы города Астана на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **196 от 29.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурно-строительные решения (АС)				
			Раздел: Подвал				
			Подраздел: Деформационные швы				
1	7	6104-0802-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	21.5	3 592	77 228
2	8	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.04228	13 002	550
			Итого по подразделу: Деформационные швы				**77 778**
			Подраздел: Приямок Прмк-1 (9 шт.)(АС-2,7)				
3	9	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.79	10 251	28 600
4	10	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	3.2085	4 832	15 503
5	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	2.34	11 133	26 051
6	12	212-101-0414РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	2.3868	21 032	50 199
7	13	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15.21	57 073	868 080
8	14	212-101-0614РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	15.43815	22 702	350 477
9	15	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.1817	440 050	520 007

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	16	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08568	345 153	29 573
11	26	1115-0504-0102 РСНБ РК 2022	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2 поверхности козырька	26.82	5 998	160 866
12	27	217-206-0111РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 8 мм	м2	27.3564	3 733	102 121
			Итого по подразделу: Приямок Прмк-1 (9 шт.)(АС-2,7)				**2 151 477**
			Итого по разделу: Подвал				**2 229 255**
			Раздел: Перемычки. Стойки.				
			Подраздел: Деформационные швы (АС-3)				
13	64	6104-0802-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	36	3 592	129 312
14	65	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.2073	13 002	2 695
			Итого по подразделу: Деформационные швы (АС-3)				**132 007**
			Подраздел: Деформационные швы (АС-4)				
15	73	6104-0802-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	54	3 592	193 968
16	74	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.2519	13 002	3 275
			Итого по подразделу: Деформационные швы (АС-4)				**197 243**
			Подраздел: Деформационные швы (АС-5)				
17	82	6104-0802-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	25.2	3 592	90 518
18	83	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.0144	13 002	187
			Итого по подразделу: Деформационные швы (АС-5)				**90 705**
			Подраздел: Деформационные швы (АС-6)				
19	91	6104-0802-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационного вертикального шва в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	21.6	3 592	77 587
20	92	234-101-0201РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.1296	13 002	1 685
			Итого по подразделу: Деформационные швы (АС-6)				**79 272**
			Итого по разделу: Перемычки. Стойки.				**499 227**
			Раздел: Конструкции металлические.				
			Подраздел: Профилированный настил в осях К-П-4-19 (АС-14,15)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	339	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	782.9	2 515	1 968 993
22	340	224-103-1117РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	968.403	6 745	6 531 878
			Итого по подразделу: Профилированный настил в осях К-П-4-19 (АС-14,15)				**8 500 871**
			Итого по разделу: Конструкции металлические.				**8 500 871**
			Раздел: Лестницы выхода на кровлю				
			Подраздел: Стремянка С-1 (АС-22)				
23	357	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.09957	290 069	28 882
24	358	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.09957	1 146 761	114 183
25	359	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.28581	288	945
26	360	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	3.28581	530	1 740
			Итого по подразделу: Стремянка С-1 (АС-22)				**145 752**
			Подраздел: Стремянка С-2 (АС-23)				
27	361	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.09588	290 069	27 812
28	362	222-503-0201РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.09588	1 146 761	109 951
29	363	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3.16404	288	911
30	364	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	3.16404	530	1 677
			Итого по подразделу: Стремянка С-2 (АС-23)				**140 351**
			Итого по разделу: Лестницы выхода на кровлю				**286 103**
			Раздел: Вход в подвал Вх-1 (АС-2,24,31)				
			Подраздел: Пм-1, Лм-1 (АС-24)				
31	365	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	5.62	10 251	57 611
32	366	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	6.463	4 832	31 228

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	367	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	5.52	11 133	61 454
34	368	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.6304	20 078	113 047
35	369	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	12.15	34 217	415 737
36	370	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.33225	21 664	267 166
37	371	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00506	498 782	2 524
			Итого по подразделу: Пм-1, Лм-1 (АС-24)				**948 768**
			Подраздел: Деформационный шов (АС-24 п.прим.6)				
38	372	6111-0201-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м3	0.08	158 289	12 663
39	373	234-102-0302РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0.0784	35 441	2 779
			Итого по подразделу: Деформационный шов (АС-24 п.прим.6)				**15 442**
			Подраздел: Подпорная стена ПС-1 1 шт. (АС-24,25)				
40	374	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.08	10 251	820
41	375	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0.092	4 832	445
42	376	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.04	11 133	445
43	377	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.0408	20 078	818
44	378	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.8	69 288	55 430
45	379	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.812	22 737	18 462
46	380	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0604	326 979	19 750
47	381	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00563	345 153	1 943
			Итого по подразделу: Подпорная стена ПС-1 1 шт. (АС-24,25)				**98 114**
			Подраздел: Подпорная стена ПС-2 1 шт. (АС-24,25)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	383	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.16	10 251	11 891
49	384	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	1.334	4 832	6 446
50	385	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1.06	11 133	11 801
51	386	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.0812	20 078	21 708
52	387	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	3.26	69 288	225 879
53	388	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.3089	22 737	75 234
54	389	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.09064	339 262	30 751
55	390	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.20672	326 979	67 593
56	391	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02063	345 153	7 121
			Итого по подразделу: Подпорная стена ПС-2 1 шт. (АС-24,25)				**458 424**
			Подраздел: Изделия металлические				
57	395	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0.18984	204 268	38 778
58	396	214-201-0302РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0.06317	375 518	23 721
59	397	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.12667	375 091	47 513
60	398	СТССЦРСНБ РК 2022	Надбавка за марку стали С245	тн	0.18984	7 791	1 479
61	399	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6.70813	288	1 932
62	400	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6.70813	434	2 911
63	401	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ЗД-2. Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.01593	364 681	5 809
64	402	214-203-0502РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0.01593	591 456	9 422

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	403	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.70092	288	202
66	404	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.85272	434	370
67	405	217-101-0107РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный (М6х25)	т	0.00056	954 056	534
68	406	217-101-0303РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	6	104	624
69	407	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ст-1.Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.1854	71 960	13 341
70	408	214-205-0102РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.07112	363 920	25 882
71	409	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.11428	335 983	38 396
72	410	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.0788	288	1 175
73	411	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.0788	434	1 770
74	412	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	9.126	2 515	22 952
75	413	224-103-1117РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	15.97	6 745	107 718
			Итого по подразделу: Изделия металлические				**344 529**
			Итого по разделу: Вход в подвал Вх-1 (АС-2,24,31)				**1 865 277**
			Раздел: Воздухозаборные шахты				
			Подраздел: Фундамент ленточный Фм-1				
76	414	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.4	10 251	4 100
77	415	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0.46	4 832	2 223
78	416	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.3	11 133	3 340
79	417	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.306	20 078	6 144

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	418	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1	32 936	32 936
81	419	212-101-2303РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1.015	26 044	26 435
82	420	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.0348	339 262	11 806
83	421	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.03929	326 979	12 847
84	422	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02616	345 153	9 029
			Итого по подразделу: Фундамент ленточный Фм-1				**108 860**
			Подраздел: Фундамент ленточный Фм-1				
85	440	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.4	10 251	4 100
86	441	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0.46	4 832	2 223
87	442	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.4	11 133	4 453
88	443	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.408	20 078	8 192
89	444	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1.2	32 936	39 523
90	445	212-101-2303РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1.218	26 044	31 722
91	446	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.03828	339 262	12 987
92	447	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04592	326 979	15 014
93	448	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02958	345 153	10 210
			Итого по подразделу: Фундамент ленточный Фм-1				**128 425**
			Подраздел: Фундамент ленточный Фм-1				
94	466	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.3	10 251	3 075
95	467	211-201-0408РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	0.345	4 832	1 667
96	468	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.3	11 133	3 340

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	469	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.306	20 078	6 144
98	470	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	0.8	32 936	26 349
99	471	212-101-2303РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	0.812	26 044	21 148
100	472	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02436	339 262	8 264
101	473	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.03361	326 979	10 990
102	474	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02161	345 153	7 459
			Итого по подразделу: Фундамент ленточный Фм-1				**88 436**
			Итого по разделу: Воздухозаборные шахты				**325 721**
			Раздел: Подпорные стены (АС-31)				
			Подраздел: Подпорная стена ПС-1 (1 шт.)				
103	504	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7.3	10 251	74 832
104	505	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8.395	5 034	42 260
105	506	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	3.02	11 133	33 622
106	507	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.0804	20 078	61 848
107	508	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	14.4	69 288	997 747
108	509	212-101-0708РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	14.616	23 420	342 307
109	510	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.41221	440 050	181 393
110	511	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.13858	339 262	47 015
111	512	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06416	345 153	22 145
			Итого по подразделу: Подпорная стена ПС-1 (1 шт.)				**1 803 169**
			Подраздел: Подпорная стена ПС-2 (1 шт.)				
112	516	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.56	10 251	46 745

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	517	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5.244	5 034	26 398
114	518	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1.88	11 133	20 930
115	519	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.9176	20 078	38 502
116	520	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	8.93	69 288	618 742
117	521	212-101-0708РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	9.06395	23 420	212 278
118	522	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2553	440 050	112 345
119	523	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.08582	339 262	29 115
120	524	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03973	345 153	13 713
			Итого по подразделу: Подпорная стена ПС-2 (1 шт.)				**1 118 768**
			Подраздел: Подпорная стена ПС-3 (2 шт.)				
121	528	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8.44	10 251	86 518
122	529	211-201-0406РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9.706	5 034	48 860
123	530	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	3.48	11 133	38 743
124	531	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.5496	20 078	71 269
125	532	6103-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	27.52	69 288	1 906 805
126	533	212-101-0708РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	27.9328	23 420	654 186
127	534	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.47206	440 050	207 730
128	535	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.1587	339 262	53 841
129	536	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07348	345 153	25 362
			Итого по подразделу: Подпорная стена ПС-3 (2 шт.)				**3 093 315**
			Подраздел: Лестница Лм-1 (АС-31)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	540	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.82	10 251	28 907
131	541	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3.243	4 960	16 085
132	542	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	2.63	11 133	29 280
133	543	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2.6826	20 078	53 861
134	544	6103-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	3.74	34 217	127 972
135	545	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.7961	21 664	82 239
136	546	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00517	498 782	2 579
			Итого по подразделу: Лестница Лм-1 (АС-31)				**340 924**
			Подраздел: Площадка Пм-1 (АС-31)				
137	547	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.12	10 251	42 234
138	548	211-201-0407РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4.738	4 960	23 500
139	549	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	1.82	11 133	20 262
140	550	212-101-0401РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8564	20 078	37 273
141	551	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3.2	15 534	49 709
142	552	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.248	21 664	70 365
143	553	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0142	498 782	7 083
			Итого по подразделу: Площадка Пм-1 (АС-31)				**250 426**
			Итого по разделу: Подпорные стены (АС-31)				**6 606 602**
			Итого по локальной смете: Архитектурно-строительные решения (АС)				**20 313 056**
			ИТОГО по акту:				**20 313 056**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				20313056.344 x 7.30%	1 482 853
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				20313056.344 + 1482853.152	21 795 909

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, 5.00%				21795909.495 x 5.00%	1 089 795
		Непредвиденные расходы, 5.000%				21795909.495 x 5.000%	1 089 795
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					23 975 500
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, III квартал 2024 г., , к = 1.0557				23975500.445 x 1.0557	25 310 935
		НДС (12%)				25310935.820 x 12%	3 037 312
		Итого с НДС				25310935.820 + 3037312.298	28 348 248

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	15.10.2024 05:07
Представители технического надзора		
980218351290 - КАУКЕНОВ ЖАНДАУЛЕТ АЛМАСҰЛЫ	Технадзор	16.10.2024 12:22
Представители авторского надзора		
631130350235 - КОЙЛАНОВ ИБИРАИМ ЭСЕНОВИЧ	Авторский надзор	16.10.2024 12:04
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	18.10.2024 04:59
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	17.10.2024 03:58
830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД ТАБЫЛДЕЕВИЧ		18.10.2024 06:15
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	17.10.2024 12:19

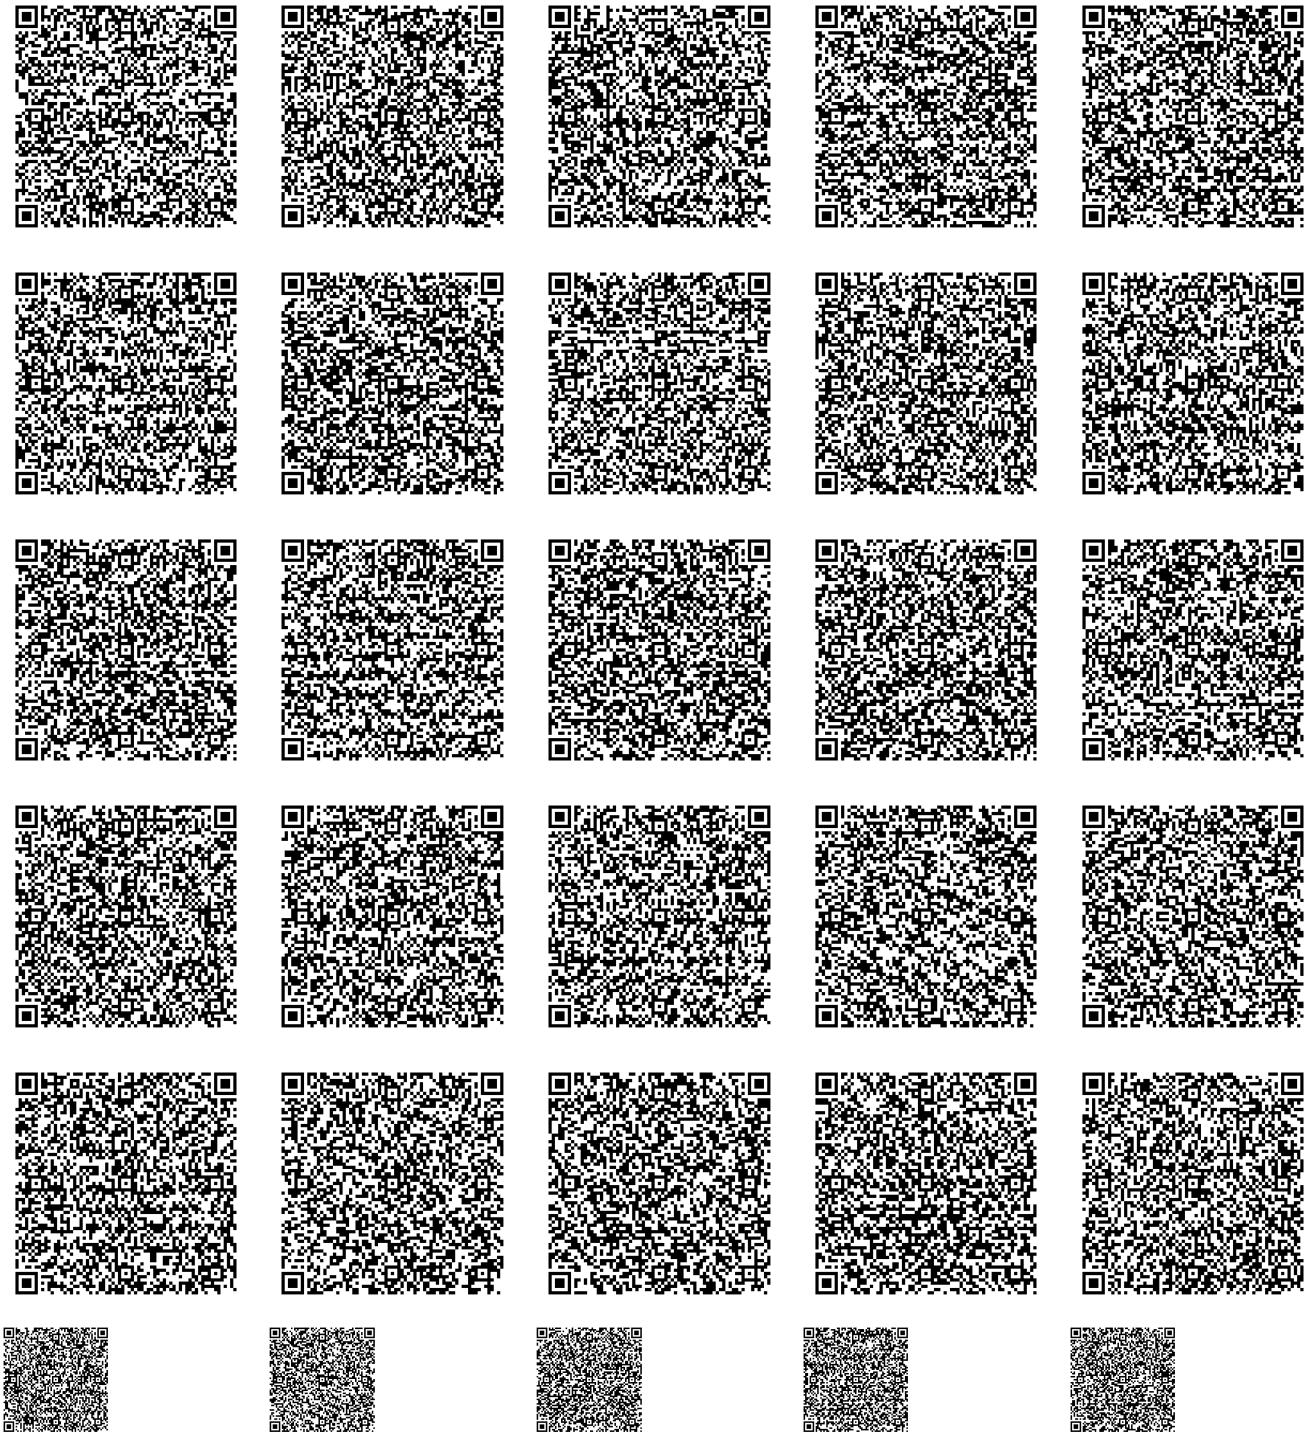

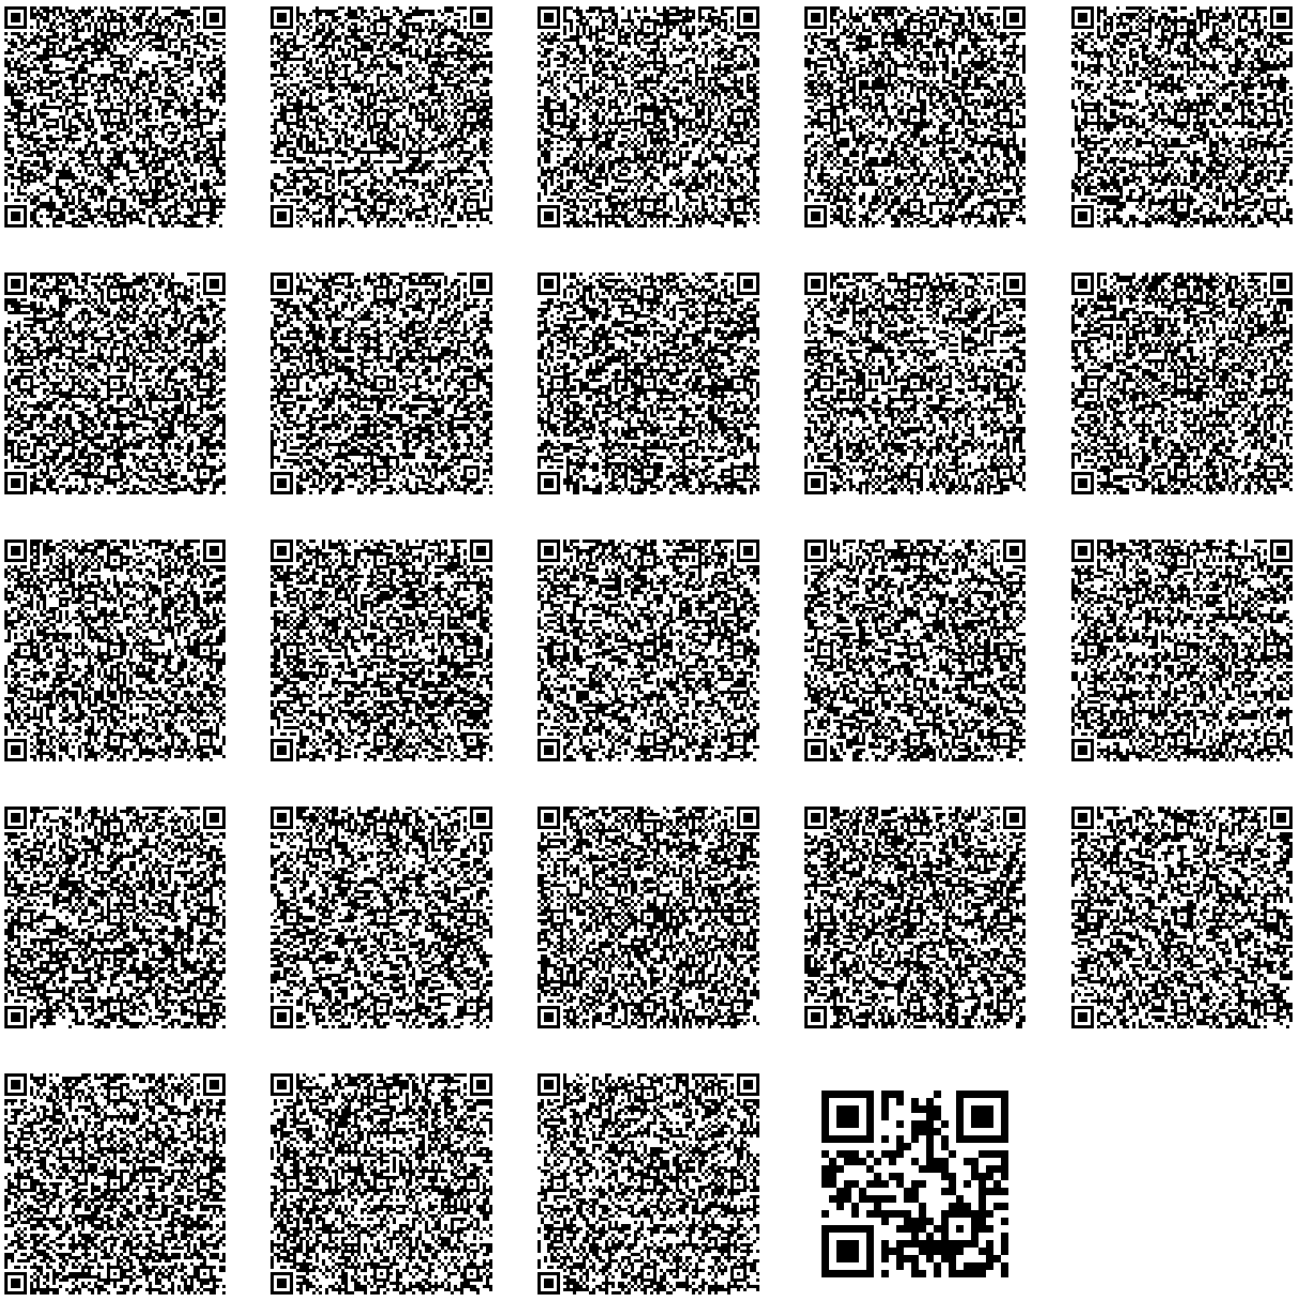

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы по улице А. Байтурсынова в районе дома № 9 в районе Алматы города Астана на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **196 от 29.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения				
			Раздел: Наружные и внутренние стены и перегородки (АР-62)				
1	3	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство /сантехнической/ перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса (с учетом дверей)	м2 перегородок (за вычетом проемов)	135.6	4 198	569 249
2	4	232-105-0201 СпрСЦ 03.2024	/Сантехническая перегородка/ (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	м2	135.6	2 796	379 138
			Итого по разделу: Наружные и внутренние стены и перегородки (АР-62)				**948 387**
			Раздел: Наружная отделка (АР-56)				
3	10	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов /стена тип 5, козырьки подвала, козырьки 1-го этажа/	м2	195.7	8 080	1 581 256
4	11	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	20.35	3 353	68 234
5	12	224-102-0909 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм	м2	1.725	5 354	9 236
6	13	231-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм	м2	80.06	9 282	743 117
7	17	222-528-0201 РСНБ РК 2022	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень	м2	274.02	7 338	2 010 759
8	21	224-104-0308 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	292	3 353	979 075
			Итого по разделу: Наружная отделка (АР-56)				**5 391 678**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля (АР-27,30)				
9	28	6110-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	5	3 752	18 760
10	29	6110-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к водосточным воронкам (ар-87.2 узел 6/52,29)	воронка	5	2 068	10 340
			Подраздел: Тип Б (по КМ Актового зала, Спортзала)				
11	47	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных /ЦСП т.10 мм в 2 слоя	м2	989.6	4 992	4 940 083
12	48	232-104-0102 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 10 мм	м2	2032.6384	2 170	4 410 825
13	51	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых т.100 мм+первый слой	м2	989.6	1 582	1 565 547
14	52	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых т.100 мм+второй слой	м2	989.6	1 582	1 565 547
15	53	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	101.9288	63 122	6 433 950
16	55	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	989.6	2 515	2 488 844
17	59	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	1092.3	1 088	1 188 422
18	61	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	1033.6	428	442 381
			Итого по подразделу: Тип Б (по КМ Актового зала, Спортзала)				**23 035 599**
			Итого по разделу: Кровля (АР-27,30)				**23 064 699**
			Раздел: Двери (АР-68)				
			Подраздел: Двери металлические				
19	88	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	13.02	13 750	179 025
20	90	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	13.02	33 823	440 375
			Итого по подразделу: Двери металлические				**619 400**
			Подраздел: Двери металлические противопожарные				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	91	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	16.8	17 295	290 556
22	92	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	36.1	18 807	678 933
23	93	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	16.8	52 373	879 866
24	94	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный	м2	36.1	58 080	2 096 688
25	95	6108-0204-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверных доводчиков	шт.	20	11 643	232 860
			Итого по подразделу: Двери металлические противопожарные				**4 178 903**
			Подраздел: Двери деревянные				
26	101	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	378.12	7 203	2 723 598
27	102	223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	31.56	12 734	401 885
28	103	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	33.88	13 805	467 713
29	104	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	222.81	12 298	2 740 117
30	105	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	32	14 666	469 312
31	106	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	440	601	264 440
32	107	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	220	3 380	743 600
33	108	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	194	3 410	661 540
34	109	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1003.2	899	901 877
			Итого по подразделу: Двери деревянные				**9 374 082**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Двери (АР-68)				**14 172 385**
			Раздел: Окна (АР-69,70)				
35	110	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	11.7152	10 017	117 351
36	111	223-102-0309 РСНБ РК 2022	ОК-1;ОК-6_Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	11.7152	46 971	550 274
37	112	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	116.6868	8 696	1 014 708
38	113	223-102-0209 РСНБ РК 2022	ОК-2;ОК-7_Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	116.6868	49 806	5 811 702
39	114	6108-0102-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	57.09	9 635	550 062
40	115	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	30.1	13 704	412 490
41	116	223-102-0106 РСНБ РК 2022	ОК-3;ОК-5;ОК-8_Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м2	68.21	56 729	3 869 485
42	117	223-102-0105 РСНБ РК 2022	ОК-4_Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	18.98	51 457	976 654
43	118	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	2.76	13 704	37 822
44	119	223-102-0102 РСНБ РК 2022	ОК-10_Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	2.76	49 937	137 826
45	120	6108-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	2.6	9 227	23 990
46	121	223-102-0101 РСНБ РК 2022	ОК-9_Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	2.6	33 599	87 357
			Подраздел: Доски подоконные				
47	122	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	480.2	4 577	2 197 875
48	123	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	480.2	1 304	626 181

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	124	6108-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора, оконный (АР-73.4)	комплект	151	2 630	397 130
50	125	223-503-0501 РСНБ РК 2022	Блокиратор оконный	шт.	151	2 259	341 109
			Итого по подразделу: Доски подоконные				**3 562 295**
			Итого по разделу: Окна (АР-69,70)				**17 152 020**
			Раздел: Ограждение окон в спортивном зале (АР-73.2)				
			Подраздел: Капроновая сетка (АР-73.2)				
51	135	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.25776	1 534 238	395 465
52	136	522-101-1091001 СпрСЦ 03.2024	Сетка заградительная, размер ячейки 100 х 100 мм RAC-100	м2	178.1	5 181	922 914
			Итого по подразделу: Капроновая сетка (АР-73.2)				**1 318 379**
			Подраздел: Декоративный экран (АР-73.3)				
53	137	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0.07	267 100	18 697
54	138	6107-0102-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	163.26	6 699	1 093 679
55	139	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.10854	1 534 238	166 526
56	140	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6	33	198
			Итого по подразделу: Декоративный экран (АР-73.3)				**1 279 100**
			Итого по разделу: Ограждение окон в спортивном зале (АР-73.2)				**2 597 479**
			Раздел: Устройство полов				
			Подраздел: Тип 10				
57	212	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м2	110.71	419	46 387
58	213	6109-0308-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на мастике	м2	110.71	12 026	1 331 398
59	214	6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тип-3_Устройство плинтуса деревянного/МДФ/	м	58.16	1 942	112 947

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 10				**1 490 732**
			Подраздел: Тип 14				
60	298	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м2	33.11	1 718	56 883
61	299	233-201-0502 СпрСЦ 03.2024	Ламинат IDEAL FLOOR класс 33, толщиной 12 мм	м2	34.4344	14 133	486 661
			Итого по подразделу: Тип 14				**543 544**
			Итого по разделу: Устройство полов				**2 034 276**
			Раздел: Внутренняя отделка				
			Подраздел: Потолок 1 этажа(АР-1.3)				
62	402	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	586.57	10 499	6 158 398
			Итого по подразделу: Потолок 1 этажа(АР-1.3)				**6 158 398**
			Подраздел: Потолок 2 этажа(АР-1.3)				
63	418	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	747.9	10 499	7 852 202
			Итого по подразделу: Потолок 2 этажа(АР-1.3)				**7 852 202**
			Подраздел: Потолок 3 этажа(АР-1.3)				
64	426	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	792.96	10 499	8 325 287
			Итого по подразделу: Потолок 3 этажа(АР-1.3)				**8 325 287**
			Подраздел: Потолок 4 этажа(АР-1.3)				
65	430	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	666.4	10 499	6 996 534
			Итого по подразделу: Потолок 4 этажа(АР-1.3)				**6 996 534**
			Итого по разделу: Внутренняя отделка				**29 332 421**
			Раздел: Элементы крылец (АР-81)				
			Подраздел: Ограждение ОГ1				
66	514	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	166	36 874	6 121 084
			Итого по подразделу: Ограждение ОГ1				**6 121 084**
			Подраздел: Отделка крылец				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	515	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	251.02	11 998	3 011 738
68	516	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	76.8774	15 753	1 211 050
69	517	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	179.163	18 095	3 241 954
			Итого по подразделу: Отделка крылец				**7 464 742**
			Итого по разделу: Элементы крылец (АР-81)				**13 585 826**
			Раздел: Лестница ЛН-1(2 шт.) (АР-85)				
70	518	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	13.74	11 998	164 853
71	519	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	3.9576	15 753	62 344
72	520	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	10.0572	18 095	181 985
73	521	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	38.3	31 087	1 190 632
74	522	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	34.3198	15 753	540 640
75	523	231-201-0308 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012 пиленая, термообработанная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 20 мм	м2	4.3632	18 602	81 164
76	524	6106-0304-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев	м	5.1	9 411	47 996
			Подраздел: Устройство дренажа				
77	525	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	3.6363636	2 151	7 822
78	526	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	3.6363636	979	3 560
79	527	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1	16 177	16 177

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	528	6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4	3 972	15 888
81	529	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	4	463	1 852
82	530	6115-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трапов, диаметр 100 мм.	комплект	2	44 050	88 100
			Итого по подразделу: Устройство дренажа				**133 399**
			Итого по разделу: Лестница ЛН-1(2 шт.) (АР-85)				**2 403 013**
			Раздел: Дефформационные швы (АР-49,50,51,52)				
83	531	6111-0401-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели герметизирующей нетвердеющей мастикой	м	30	6 474	194 220
84	532	234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	0.48	13 002	6 241
			Итого по разделу: Дефформационные швы (АР-49,50,51,52)				**200 461**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения				**110 882 646**
			ИТОГО по акту:				**110 882 646**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				109959732.829 x 7.30%	8 027 060
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				110882646.829 + 8027060.706	118 909 707
		Сметная прибыль, 5.00%				117986793.535 x 5.00%	5 899 339
		Непредвиденные расходы, 5.000%				118909707.535 x 5.000%	5 945 485
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					130 754 532
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, III квартал 2024 г. , к = 1.0557				130754532.588 x 1.0557	138 037 560
		НДС (12%)				138037560.053 x 12%	16 564 507
		Итого с НДС				138037560.053 + 16564507.206	154 602 067

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	16.10.2024 14:13
Представители технического надзора		
980218351290 - КАУКЕНОВ ЖАНДАУЛЕТ АЛМАСҰЛЫ	Технадзор	16.10.2024 15:05
Представители авторского надзора		
631130350235 - КОЙЛАНОВ ИБИРАИМ ЭСЕНОВИЧ	Авторский надзор	17.10.2024 04:24
Представители заказчика		
830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД ТАБЫЛДЕЕВИЧ		18.10.2024 06:14
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	17.10.2024 05:29
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	17.10.2024 12:43
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	18.10.2024 05:02

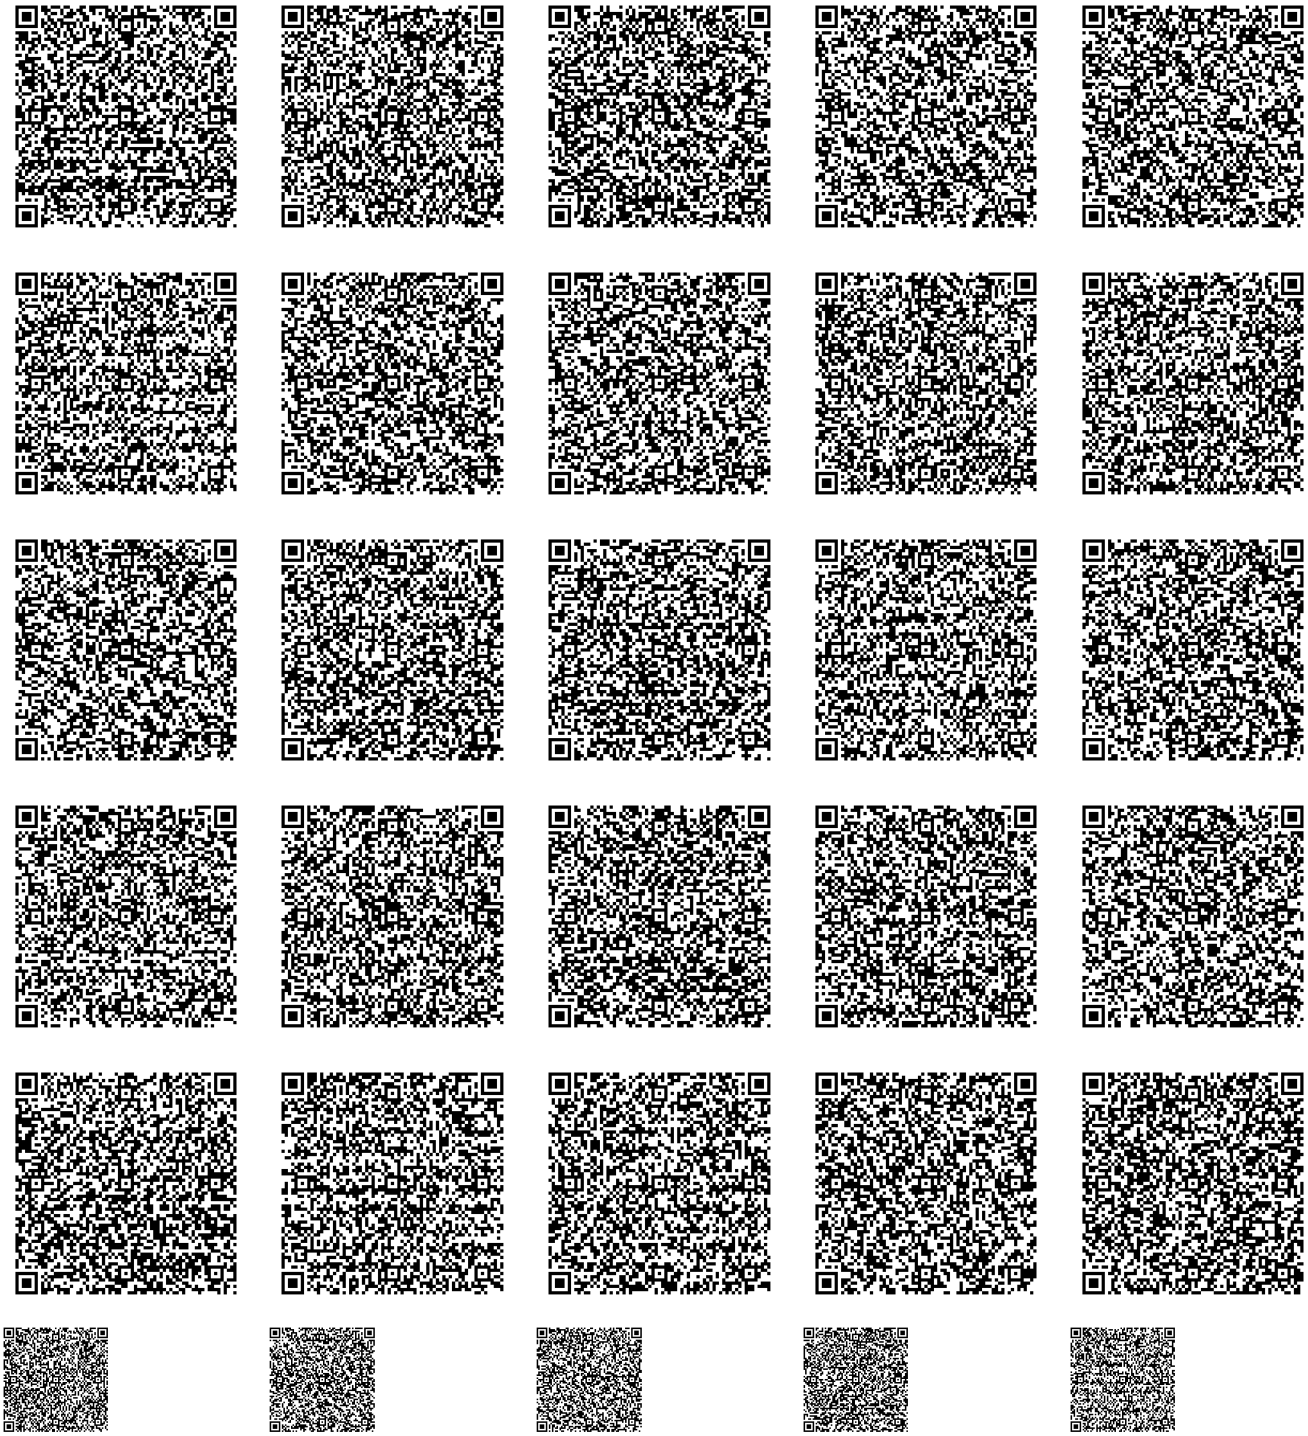

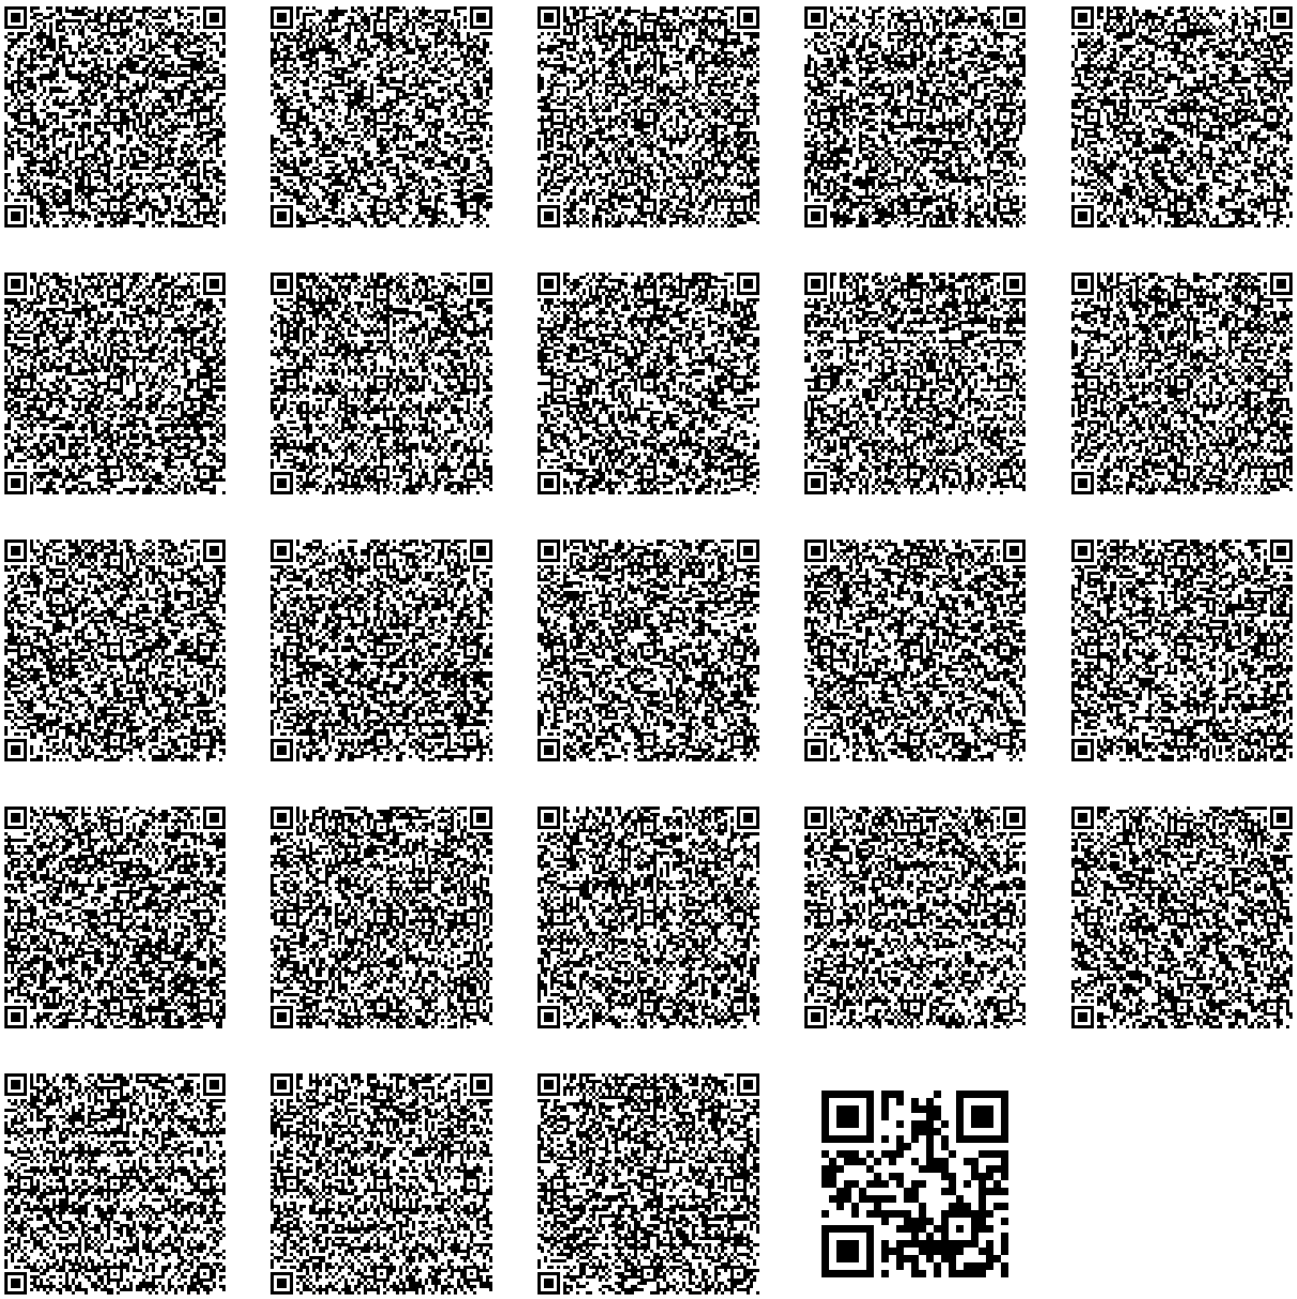

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы по улице А. Байтурсынова в районе дома № 9 в районе Алматы города Астана на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **196 от 29.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Благоустройство и озеленение территории				
			Раздел: Вертикальная планировка (ГП-4)				
1	1	6101-0103-0240 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 2	м3	424.81	306	129 992
2	2	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	11151.2625	61	680 227
3	3	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	424.81	84	35 684
4	4	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3 (выемка)	м3	3336.14	569	1 898 263
5	5	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	3336.14	84	280 236
6	6	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3 (насыть)	м3	30528.3	569	17 370 603
7	7	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	30528.3	84	2 564 377
8	8	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	37776.01	284	10 728 387
9	9	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	37776.01	99	3 739 825

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Вертикальная планировка (ГП-4)				**37 427 595**
			Раздел: Покрытия				
			Подраздел: Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов (ГП-6,8)				
10	10	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2336	1 823	4 258 527
11	11	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203, до 20 см	м2	2336	464	1 083 904
12	12	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	2336	1 821	4 253 856
13	13	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	1.8688	212 170	396 503
14	14	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2336	2 771	6 473 056
15	15	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306, до 6 см	м2	2336	1 135	2 651 360
16	16	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2336	3 084	7 204 224
17	17	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301, до 5 см	м2	2336	655	1 530 080
			Итого по подразделу: Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проездов (ГП-6,8)				**27 851 511**
			Подраздел: Установка бортового камня БР 100.30.15				
18	18	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	39.585	16 177	640 366
19	19	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	754	5 492	4 140 968
20	20	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	754	2 482	1 871 428
			Итого по подразделу: Установка бортового камня БР 100.30.15				**6 652 762**
			Подраздел: Тип 2. Покрытие по тротуарам (брусчатка)				
21	21	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.50 мм	м3	180.977	7 371	1 333 981

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	3619.54	1 814	6 565 845
23	23	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203, до 12 см	м2	3619.54	-280	-1 013 472
24	24	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	3619.54	4 575	16 559 395
25	25	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	3561	4 845	17 253 045
			Итого по подразделу: Тип 2. Покрытие по тротуарам (брусчатка)				**40 698 796**
			Подраздел: Установка бортового камня БР 100.20.8				
26	26	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	9.63	16 177	155 785
27	27	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	535	5 306	2 838 710
28	28	255-101-0106 РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	535	1 297	693 895
			Итого по подразделу: Установка бортового камня БР 100.20.8				**3 688 390**
			Подраздел: Отмостка				
29	29	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина /15/ см	м2	220	1 503	330 660
30	30	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской, т.80-100 мм	м3	19.8	37 523	742 955
31	31	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Вр5 100х100)	т	0.605	383 139	231 799
32	33	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	220	4 575	1 006 500
33	34	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	220	4 845	1 065 900
			Итого по подразделу: Отмостка				**3 377 814**
			Подраздел: Тип 3. Покрытие тартановое детских и спортивных площадок				
34	35	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.50 мм	м3	79.45	7 371	585 626

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	36	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м2	1589	527	837 403
36	37	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	1589	1 829	2 906 281
37	38	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203, до 12 см	м2	1589	-283	-449 687
38	39	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской, В20	м3	158.9	38 612	6 135 447
39	40	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Вр5 100х100)	т	4.36975	383 139	1 674 222
40	41	1147-0402-0102 РСНБ РК 2022	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 15 мм для детских и спортивных площадок. Устройство (с учетом необходимого рисунка)	м2	1589	11 015	17 502 835
			Итого по подразделу: Тип 3. Покрытие тартановое детских и спортивных площадок				**29 192 127**
			Подраздел: Тип 3. Покрытие игровых площадок бетонное				
41	42	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.50 мм	м3	18.2	7 371	134 152
42	43	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	м2	364	527	191 828
43	44	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	54.6	7 371	402 457
44	45	7101-0403-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	364	1 829	665 756
45	46	7101-0403-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203, до 12 см	м2	364	-283	-103 012
46	47	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской, В20	м3	36.4	38 612	1 405 477
47	48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (Вр5 100х100)	т	1.001	383 139	383 522
			Итого по подразделу: Тип 3. Покрытие игровых площадок бетонное				**3 080 180**
			Подраздел: Тип 4. Покрытие спортивных площадок. Искусственный газон.				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	51	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см	м3	90	7 371	663 390
49	52	7101-0403-1301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное /щебеночное/ покрытие	м2	600	603	361 800
50	53	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см/100мм+50 мм/	м2	600	1 745	1 047 000
51	55	254-105-0201 РСНБ РК 2022	Газон рулонный /искусственный газон/	м2	600	2 859	1 715 400
			Итого по подразделу: Тип 4. Покрытие спортивных площадок. Искусственный газон.				**3 787 590**
			Подраздел: Тактильная плитка (ГП-7 Рельефные информационные плиты)				
52	56	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	46.62	4 374	203 916
53	57	251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	46.62	8 153	380 093
			Итого по подразделу: Тактильная плитка (ГП-7 Рельефные информационные плиты)				**584 009**
			Итого по разделу: Покрытия				**118 913 181**
			Раздел: Озеленение (ГП-5)				
			Подраздел: Устройство газонов				
54	58	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ДЭС±10 см//Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	178.535	4 132	737 707
55	59	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	196.3885	3 490	685 396
56	60	6113-0112-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	м2	1785.35	2 016	3 599 266
57	61	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1785.35	271	483 830
58	62	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	1785.35	811	1 447 919
59	63	6113-0214-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разбрасывание с механизированной загрузкой удобрения минерального	га	0.178535	17 869	3 190
60	64	261-501-0101 РСНБ РК 2022	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0.071414	46 258	3 302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Устройство газонов				**6 960 611**
			Подраздел: Деревья и кустарники с комом земли 0,8х0,8х0,6;				
61	65	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ДЭС±30 см//Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	127.449	4 132	526 619
62	66	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	140.1939	3 490	489 277
63	67	6113-0102-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	яма	117.6	15 630	1 838 088
64	68	6113-0102-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,8х0,8х0,5 м, вручную, добавление растительной земли до 50%	яма	29.4	24 979	734 383
65	69	6113-0103-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,8х0,8х0,5 м	шт.	147	23 605	3 469 935
66	70	254-101-0802 РСНБ РК 2022	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	14	15 393	215 502
67	71	254-103-3802 РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	133	9 731	1 294 223
			Итого по подразделу: Деревья и кустарники с комом земли 0,8х0,8х0,6;				**8 568 027**
			Подраздел: Деревья и кустарники с комом земли 0,5х0,4х0,4;				
68	72	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ДЭС±30 см//Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	91.476	4 132	377 979
69	73	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	100.6236	3 490	351 176
70	74	6113-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%	яма	201.6	10 629	2 142 806
71	75	6113-0102-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м, вручную, добавление растительной земли до 50%	яма	50.4	18 214	917 986
72	76	6113-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м	шт.	252	15 461	3 896 172
73	77	254-104-1203 РСНБ РК 2022	Жимолость с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	252	15 707	3 958 164
			Итого по подразделу: Деревья и кустарники с комом земли 0,5х0,4х0,4;				**11 644 283**
			Итого по разделу: Озеленение (ГП-5)				**27 172 921**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ограждение территории по периметру (ГП-9)				
74	100	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	188.8	264 822	49 998 394
			Итого по разделу: Ограждение территории по периметру (ГП-9)				**49 998 394**
			Итого по локальной смете: Благоустройство и озеленение территории				**233 512 091**
			ИТОГО по акту:				**233 512 091**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				233512091.261 x 7.30%	17 046 383
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				233512091.261 + 17046383.107	250 558 474
		Сметная прибыль, 5.00%				250558474.369 x 5.00%	12 527 923
		Непредвиденные расходы, 5.000%				250558474.369 x 5.000%	12 527 923
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					275 614 321
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, III квартал 2024 г. , к = 1.0557				275614321.806 x 1.0557	290 966 039
		НДС (12%)				290966039.530 x 12%	34 915 924
		Итого с НДС				290966039.530 + 34915924.744	325 881 964

Лист согласования
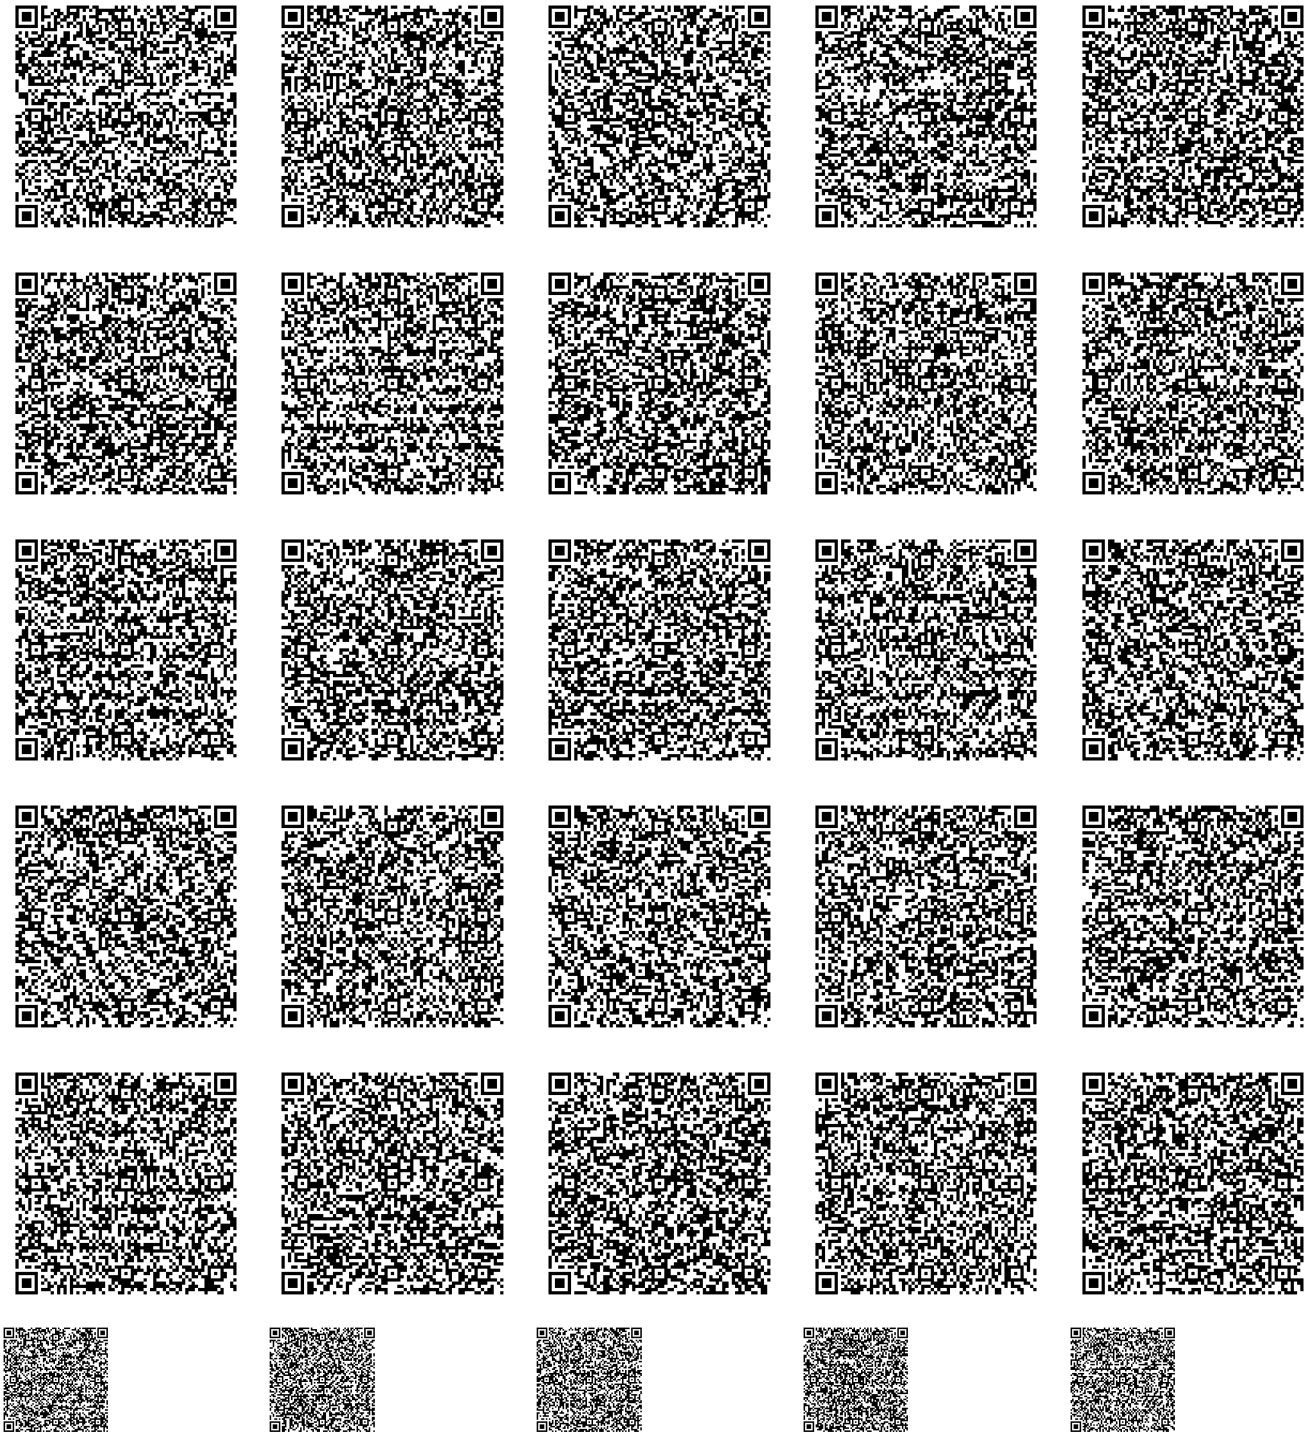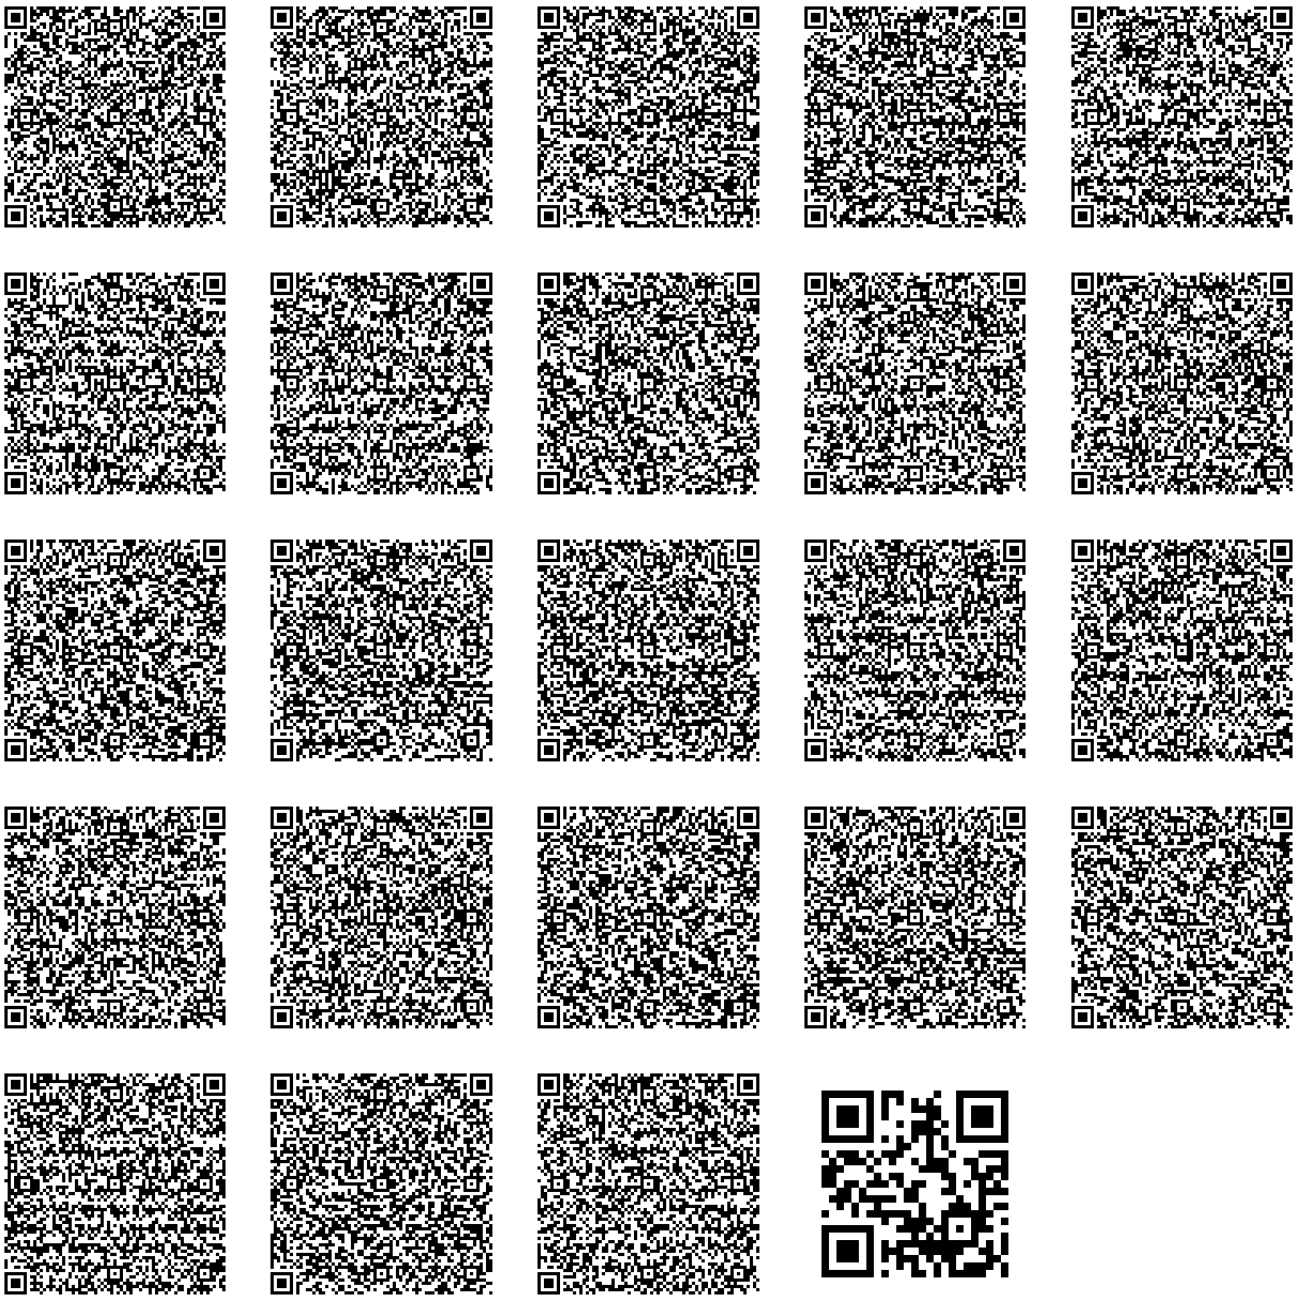
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	17.10.2024 13:13
Представители технического надзора		
980218351290 - КАУКЕНОВ ЖАНДАУЛЕТ АЛМАСҰЛЫ	Технадзор	17.10.2024 17:12
Представители авторского надзора		
631130350235 - КОЙЛАНОВ ИБИРАИМ ЭСЕНОВИЧ	Авторский надзор	17.10.2024 15:57
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	18.10.2024 05:04
910115350081 - КОЖАМЖАРОВ ДАМИР КАЙРАТОВИЧ	Ведущий специалист	18.10.2024 03:46
820201401995 - ШУЛАКОВА ДИАНА РАШИДОВНА	Ведущий специалист	18.10.2024 04:21
830905301328 - КУАНЫШЕВ ЭДУАРД ТАБЫЛДЕЕВИЧ		18.10.2024 04:22
