Приложение 2
Приказ Министра индустрии
И инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «9» августа 2019 года
№632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

# Декларация о соответствии

«19» октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***ТОО «Азамат құрылыс», Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, Ашим Арзиев, дом № 151/1, БИН/ИИН 050340002411***
наименование организации, юридический адрес

***в лице руководителя Аменова Тимура Ермаковича.***
фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту ***«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №3 "Динара" г. Шымкент»***
наименование, местонахождение объекта

Заказчиком которого является: ***Заведующая ГККП «Ясли-сад №3 «Динара» управления образования города Шымкент» Саликбаева Раушан Ауезхановна, г.Шымкент, ТОЛЕГЕН АЙБЕРГЕНОВ, 5/6***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

**-ТОО «Dream Capital» ГСЛ №09638 от 07.04.2023 г. В лице директора Гайбулаев М.Б.**
наименование организации, № лицензии и дата получения. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**-ТОО«DK Capital» ГСЛ № 000970 от 29.03.2023 г. В лице директора Мелдеев Ж.Ж.**
наименование организации, № лицензии и дата получения. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**-ТОО«DK BUILDING» ГСЛ №0016873 от 10.05.2023 г. В лице директора Сариева К.**
наименование организации, № лицензии и дата получения. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**-ТОО «Адина-СтройПроект» ГСЛ №002005 от 23.12.2011 г. в лице Ахметов Ж.М.**
наименование организации, № лицензии и дата получения. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**-ТОО «САҚ-ҚҰРЫЛЫС» ГСЛ №000219 от 21.07.2023 г. в лице директора Бухарбаев Е.Е.**
наименование организации, № лицензии и дата получения. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

**-ТОО «Радикон» ГСЛ №011889 от 01.08.2023 г. в лице директора Анварбекова Д.Н.**
наименование организации, № лицензии и дата получения. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация ***ТОО «МПК-Проект»,№43-2021***
наименование проектной организации, номер проекта Сариева К.

утвержден (а) ***Филиалом РГП «Госэкспертиза» по Южному региону, заключение № № 19-0024/22 от 17.02.2022 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди | Общая (с учетом ранее принятых) | В том числе пускового комплекса или очереди |
| Вместимость | | | | | |

Здание ясли-сада имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | 971,38 | 971,38 |
| Число этажей | этаж | 2 | 2 |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | 9033,83 | 9033,83 |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, м2 | | Число квартир | Площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: 1-комнатных, 2-комнатных 3-комнатных, 4-комнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Яси-сад представляет собой «Т» образную форму, двухэтажное здание, без подвала, с чердачной крышей, с размером по наружности стен 54,85х20,1 м.

Продольные оси здания ориентированы в направлениях на восток.

Конструктивный тип здания с несущими стенами. Конструктивные системы здания поперечностеновая. Конструктивные схемы жесткие. Высота помещений 1-2-го этажа от пола до потолка 3,0 м. Высота цоколя местами 0,3 м.

Фундамент -ленточный из бетона с толщиной 400 мм.

Несущие стены- из жженного кирпича с толщиной 380 мм.

Перегородки- из жженного кирпича с толщиной 120 мм. Перемычки в оконных и дверных проемах из железобетона.

Перекрытия- из сборных многопустотных железобетонных плит.
Покрытия- из сборных многопустотных железобетонных плит.
Конструкций крыши -деревянные.
Кровельное покрытие- из металлочерепицы по деревянным обрешеткам
Оконные блоки- из ПВХ.
Дверные блоки- деревянные.
Покрытия пола-в коридорах из напольных керамических плит, в группах дощатые и местами из линолеума.
Лестничный марш и площадка из железобетона.
Внутренняя отделка
Внутренние стены и перегородки – улучшенная штукатурка, шпатлевка «Алинекс», водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.
Потолки – затирка, шпатлевка «Алинекс», окраска водоэмульсионной окраской;
Откосы - шпатлевка «Алинекс», водоэмульсионная окраска;
Наружная отделка
Фасад – облицовка металлосайдингом и теплоизоляционным слоем;
Цоколь – плитка керамическая глазурованная для фасадной облицовки стен;
Вокруг здания- отмостка.
Инженерные сети - от существующих городских инженерных сетей.
Инженерное обеспечение, сети и системы:
1) замена электроосветительных приборов (светильники) и к ним прилагающие электроустановочные изделия электропроводки;
2) пожарная сигнализация;
3) замена системы водоснабжения и канализации, установка санитарных приборов;
Наружные сети:
1) Наружные сети электроснабжения;
2) Наружные сети канализации;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ : апрель, 2023 года
месяц, год
окончание работ: октябрь, 2023 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***7 месяцев;*** по норме или по проекту организации строительства ***7 месяцев;***
фактически ***7 месяцев;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 99% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Қуатжылуорталық – 3".

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №3 "Динара" г. Шымкент»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):***ТОО «Азамат құрылыс»***
***директор Аменов Т.Е.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

«19» октября 2023 г.

подпись, дата

М.П.

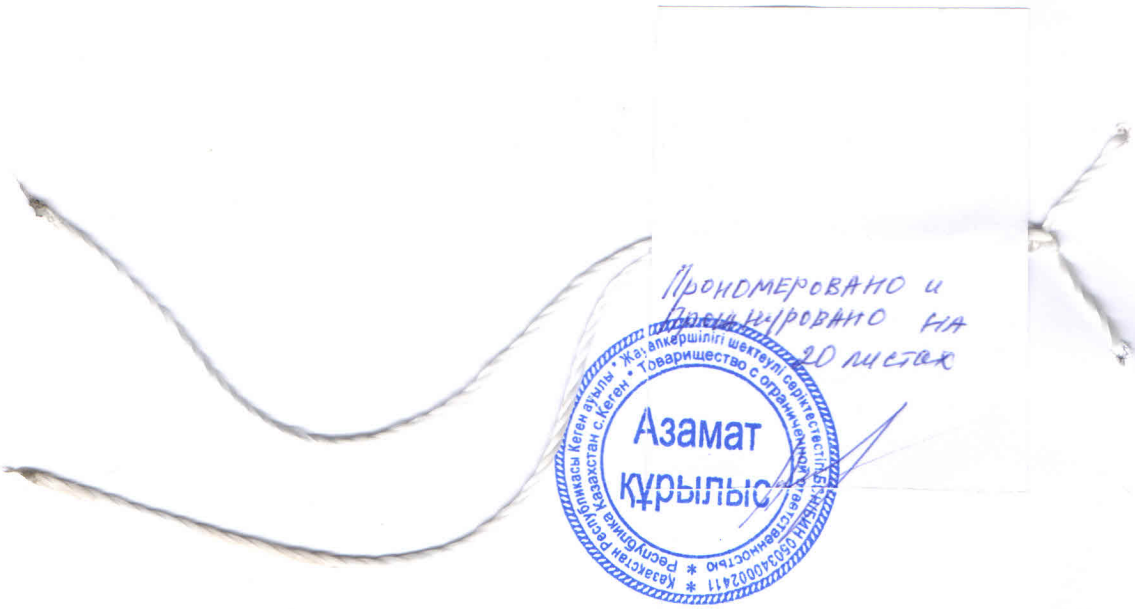
Пронумеровано и
прошнуровано на
20 листах
Азамат
құрылыс
