Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроснабжение и наружное электроосвещение. Внутриплощадочные сети				
			Раздел: НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ				
			Подраздел: 2КТПБ-630/10-0,4кВ /ЭСН. АС. Лист 1-3/				
1	1	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	88.464	467	41 313
2	2	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	2.736	5 300	14 501
3	3	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	21.888	76	1 663
4	4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	5.472	3 286	17 981
5	5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	21.888	576	12 607
6	6	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	3.7	29 762	110 119
7	7	6104-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	40	5 267	210 680
8	8	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	28	11 500	322 000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	29.555	52 815	1 560 947
10	10	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	1.3	43 463	56 502
11	17	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.1456	1 421 709	207 001
12	21	6124-0101-1302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А	шт.	1	355 591	355 591
13	22	515-102-0718 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов типа 2КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	комплект	1	37 924 786	37 924 786
14	23	515-101-0507 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ. типа ТМГэ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-95	шт.	2	6 377 072	12 754 144
			Итого по подразделу: 2КТПБ-630/10-0,4кВ /ЭСН. АС. Лист 1-3/				**53 589 835**
			Подраздел: ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР /ЭСН. АС. Лист 4/				
15	24	6101-0102-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	2.328	467	1 087
16	25	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	0.072	5 300	382
17	26	6101-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	0.576	76	44
18	27	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0.144	3 286	473
19	28	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	0.576	576	332
20	29	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	18	4 410	79 380
21	30	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.9	30 382	27 344
22	31	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3	35 874	107 622

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	32	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.131	339 177	44 432
			Итого по подразделу: ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР /ЭСН. АС. Лист 4/				**261 096**
			Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4кВ				**53 850 931**
			Итого по локальной смете: Электроснабжение и наружное электроосвещение. Внутриплощадочные сети				**53 850 931**
			ИТОГО по акту:				**53 850 931**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)				3172001.000 x 6.60%	209 352
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				53850931.000 + 209352.063	54 060 283
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.04985407				3172001.000 x 0.04985407	158 137
		Сметная прибыль, 5.00%				3381353.063 x 5.00%	169 067
		Непредвиденные расходы, 2.000%				(54060283.063 + 158137.172) x 2.000%	1 084 368
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					55 471 856
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				55471856.292 x 1.0182	56 481 444
		НДС (12%)				56481444.077 x 12%	6 777 773
		Итого с НДС				56481444.077 + 6777773.289	63 259 217

Лист согласования
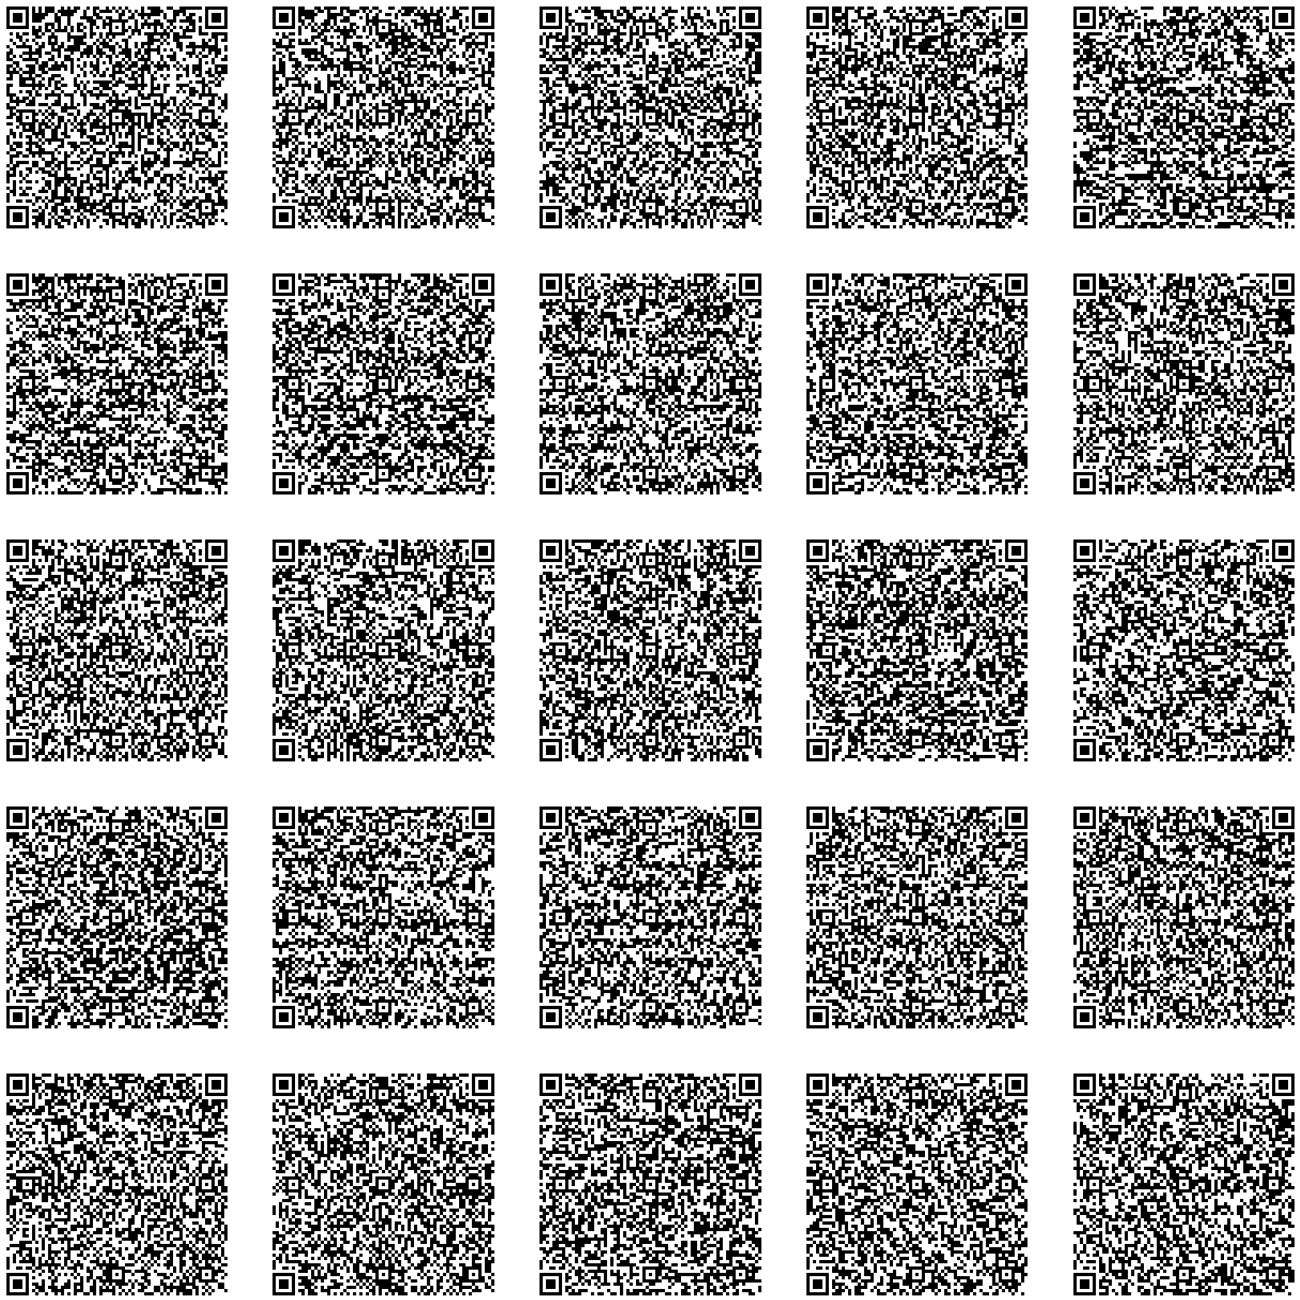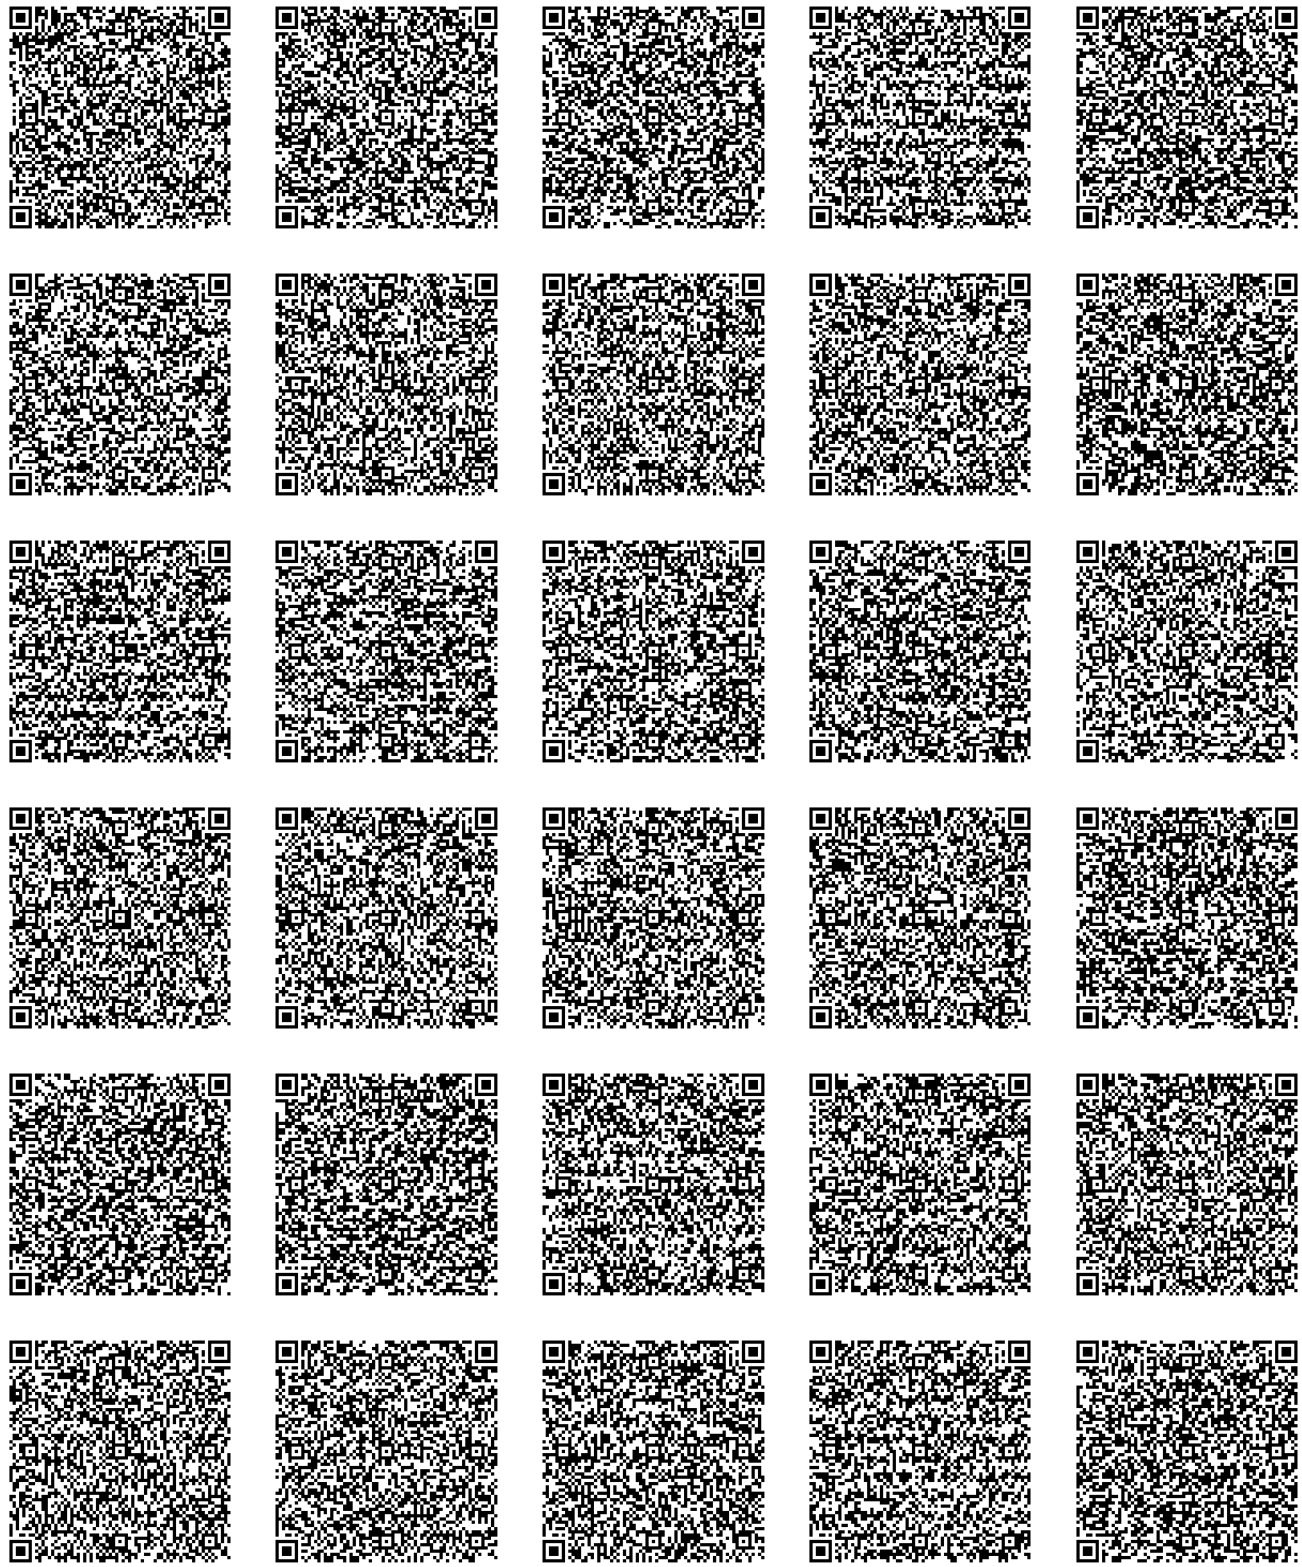
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	27.11.2024 06:47
Представители технического надзора		
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	27.11.2024 10:22
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	27.11.2024 12:58
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	27.11.2024 13:43
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	27.11.2024 10:22
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 07:06
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 05:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	28.11.2024 05:26
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	28.11.2024 06:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
