Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Блочно-модульная котельная				
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД БМК /АС. Лист 2,3/				
			Подраздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0101-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	97	365	35 405
2	2	6101-0201-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	3	5 300	15 900
3	3	6101-0106-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	56	51	2 856
4	4	6101-0206-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	14	3 286	46 004
5	5	6101-0107-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	56	576	32 256
			Итого по подразделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**132 421**
			Подраздел: ФУНДАМЕНТЫ				
6	6	6109-0301-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	88	4 430	389 840
7	7	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	8.4	30 382	255 209
8	8	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	32	35 874	1 147 968
9	9	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1.5166	338 778	513 791
10	10	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.1278	1 421 709	181 694
11	11	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12.1	4 097	49 574
			Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТЫ				**2 538 076**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ФМ-1				
12	13	6103-0701-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.5	30 382	15 191
13	14	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	8.8	35 874	315 691
14	15	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.2485	338 778	84 186
15	16	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14.4	4 097	58 997
			Итого по подразделу: ФМ-1				**474 065**
			Подраздел: КП-1				
16	17	6104-0802-0403ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0.0364	1 468 102	53 439
			Итого по подразделу: КП-1				**53 439**
			Подраздел: ЗД-2				
17	18	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.4164	1 421 709	592 000
			Итого по подразделу: ЗД-2				**592 000**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТ ПОД БМК /АС. Лист 2,3/				**3 790 001**
			Раздел: УСТАНОВКА БМК				
18	28	1125-0130-0101РСНБ РК 2022	Здания из многобоксовых блоков. Установка	т блок-боксов	8.45	159 551	1 348 206
19	29	РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная на газообразном и жидком топливе типа ART Boilers с двумя котлами, тепловая мощность 2х696 кВт	комплект	1	45 024 697	45 024 697
			Итого по разделу: УСТАНОВКА БМК				**46 372 903**
			Итого по локальной смете: Блочно-модульная котельная				**50 162 904**
			ИТОГО по акту:				**50 162 904**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	5138207.000 x 6.60%	339 121
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	50162904.000 + 339121.657	50 502 025
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.04985407	5138207.000 x 0.04985407	256 160
	Сметная прибыль, 5.00%	5477328.657 x 5.00%	273 866
	Непредвиденные расходы, 2.000%	(50502025.657 + 256160.550) x 2.000%	1 015 163
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		52 047 216
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	52047216.364 x 1.0182	52 994 475
	НДС (12%)	52994475.702 x 12%	6 359 337
	Итого с НДС	52994475.702 + 6359337.084	59 353 812

Лист согласования
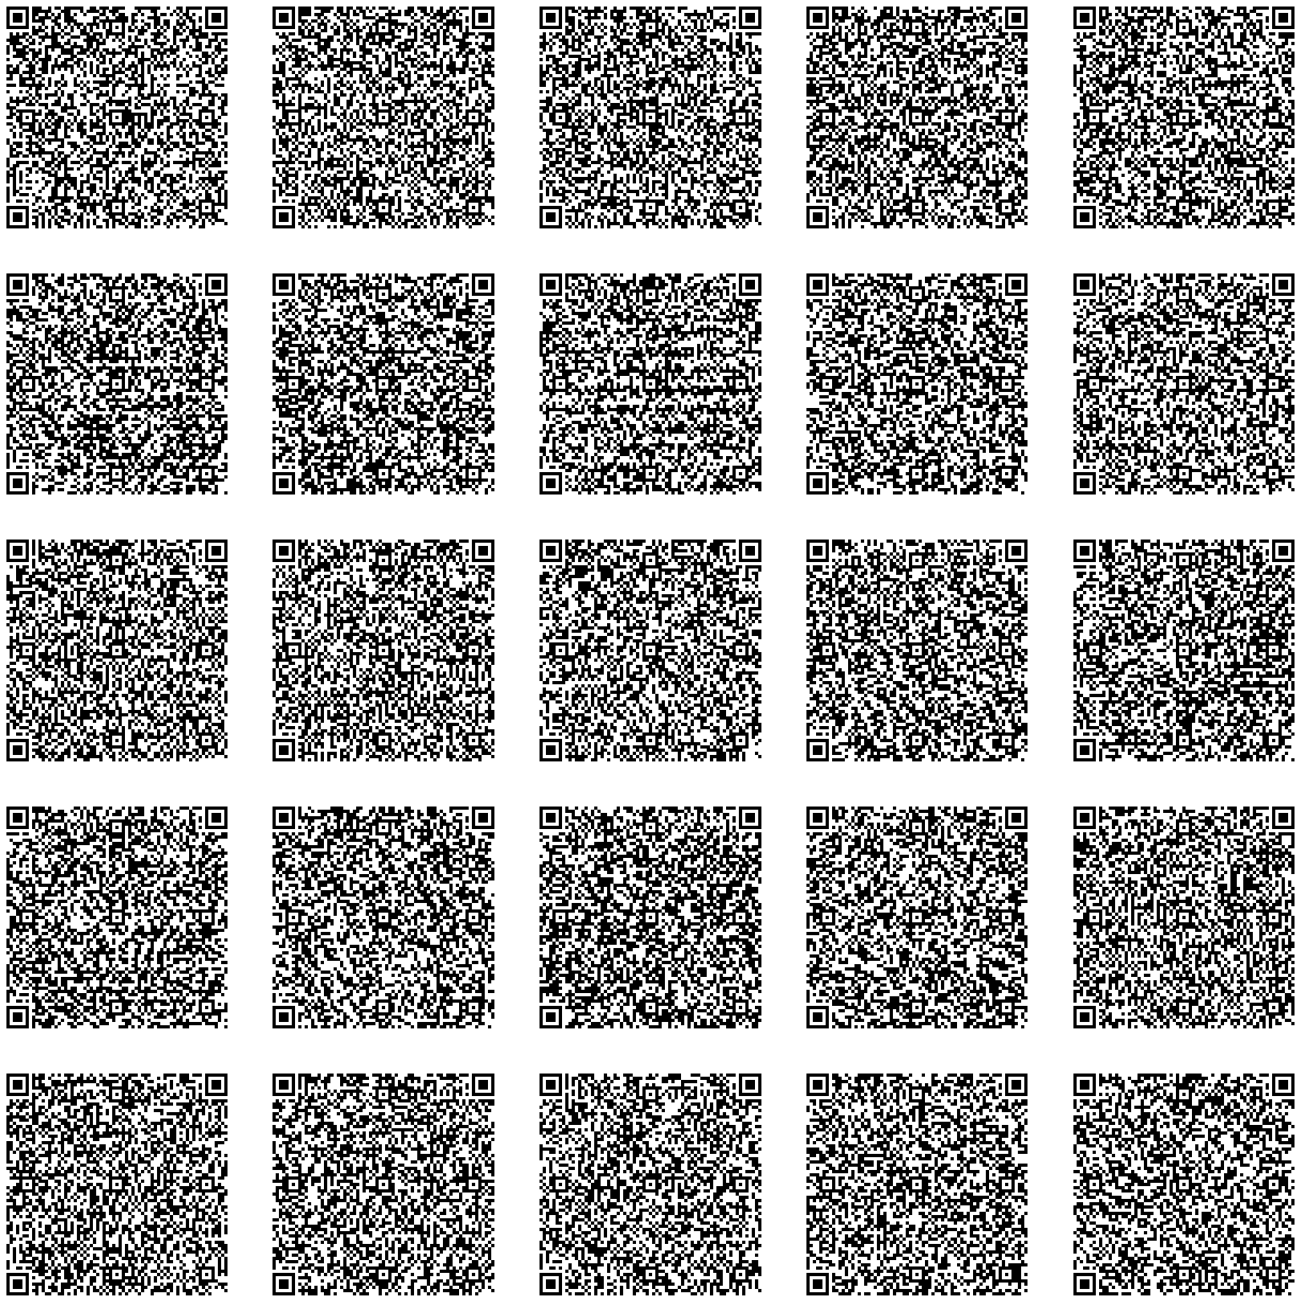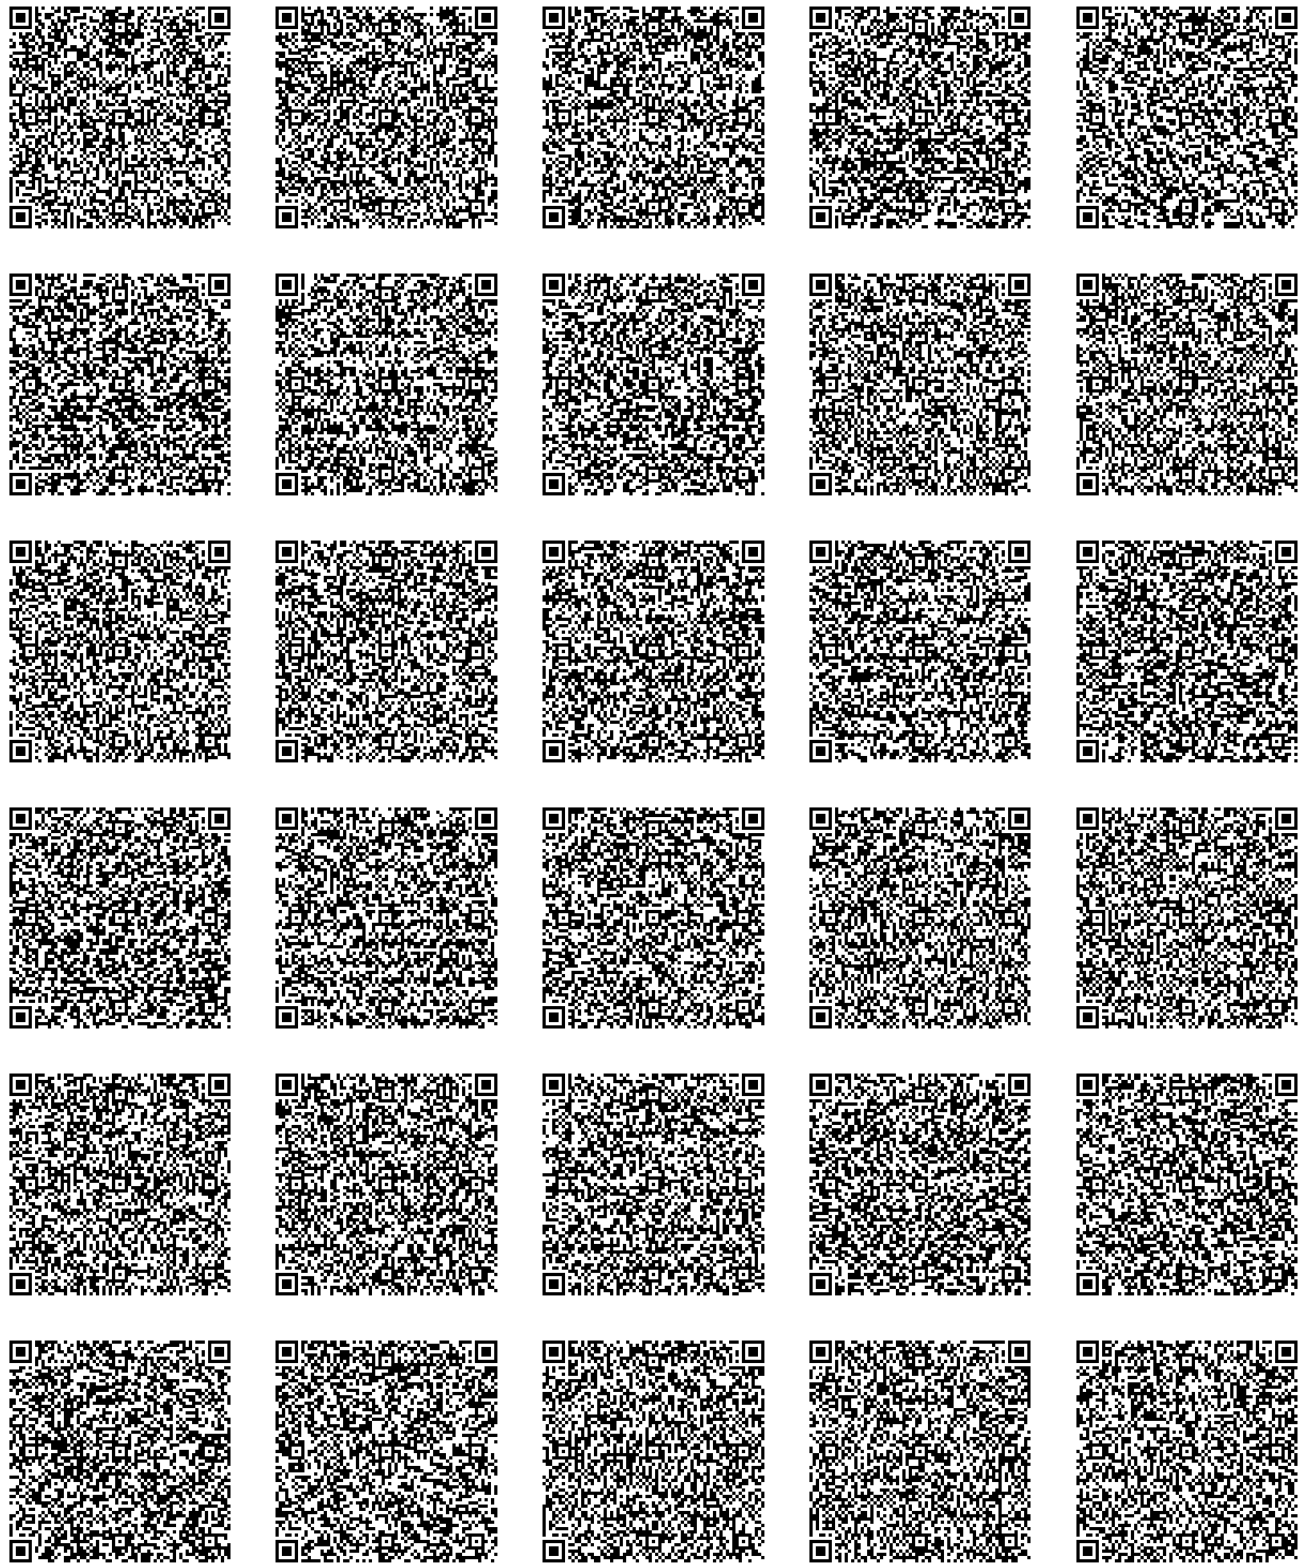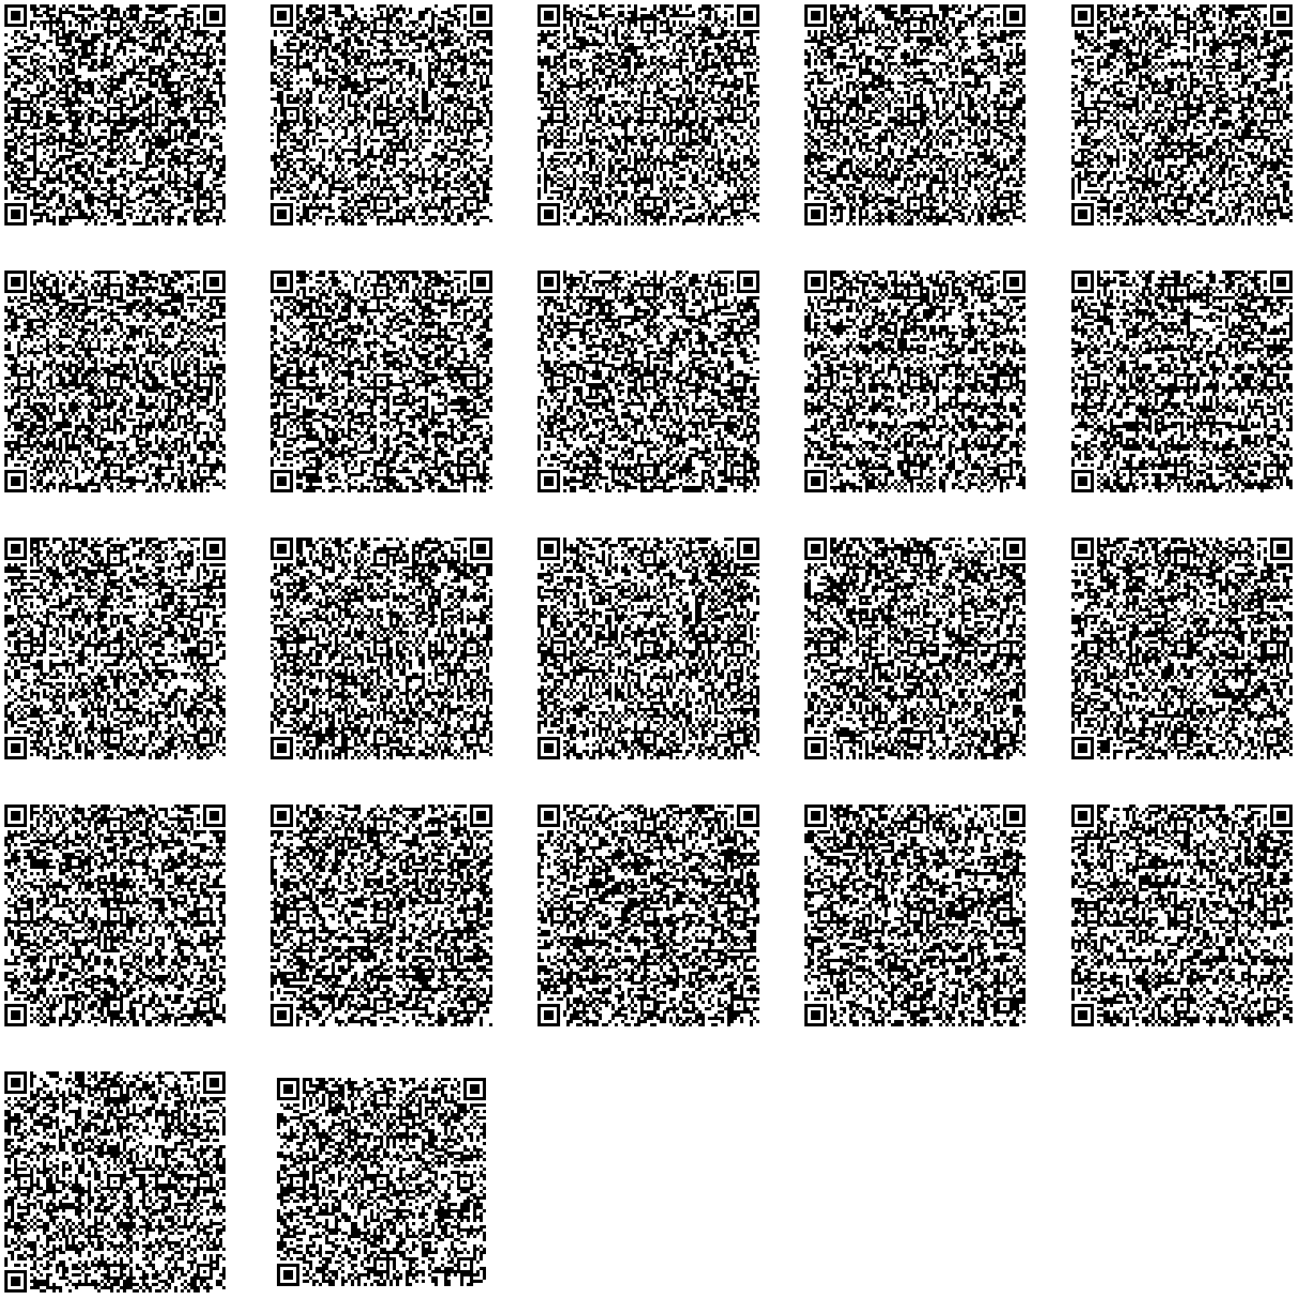
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	27.11.2024 06:50
Представители технического надзора		
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	27.11.2024 10:19
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	27.11.2024 13:46
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	27.11.2024 12:55
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	27.11.2024 10:16
Представители заказчика		
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	28.11.2024 05:20
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	28.11.2024 06:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 07:03
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 05:33 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
