Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети газоснабжения				
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,02МПа				
			Подраздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	6101-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2	м3	45.6	381	17 374
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1.37	8 300	11 371
3	3	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4.8	6 917	33 202
4	4	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	37.83	89	3 367
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	4.8	3 609	17 323
6	6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	37.83	576	21 790
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/Подсыпка трубы 0,1м, 0,2м/ Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2.85	3 609	10 286
8	8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.12	159	19
			Итого по подразделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**114 732**
			Подраздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.038	1 254 242	47 661
10	10	241-202-0210РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	38.38	1 085	41 642
			Итого по подразделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ				**89 303**
			Подраздел: УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ				
11	11	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	36	21	756
12	12	249-101-0202РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	36	47	1 692
			Итого по подразделу: УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ				**2 448**
			Подраздел: УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ. 63 ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ- 1 УЗЕЛ				
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.008268	385 425	3 187
14	14	241-102-0160РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	1.3	2 406	3 128
15	15	243-907-6148СпрСЦ 02.2024	Кронштейн настенный основание 300мм	шт.	1	2 147	2 147
16	16	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.00202	1 254 242	2 534
17	17	241-202-0210РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	2.0402	1 085	2 214
18	18	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 185	4 185
19	19	241-208-1806РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3 250
20	20	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0.239772	496	119
21	21	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.239772	385	92
			Итого по подразделу: УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА ДИАМ. 63 ММ ИЗ ГРУНТА С ПЕРЕХОДОМ ПЭ/СТ- 1 УЗЕЛ				**20 856**
			Подраздел: МУФТЫ				
22	22	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 185	16 740
23	23	241-211-0606РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1 314	5 256

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: МУФТЫ				**21 996**
			Подраздел: ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - 1шт /ГСН. Лист 4/				
24	24	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 376	17 376
25	25	251-101-0139РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.	1	3 049	3 049
26	26	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1.85	1 511	2 795
27	27	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.05	21 182	1 059
28	28	213-101-0501РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.001	60 353	60
			Итого по подразделу: ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК - 1шт /ГСН. Лист 4/				**24 339**
			Подраздел: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
29	29	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0.038	2 178 256	82 774
30	30	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	2 338	9 352
			Итого по подразделу: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				**92 126**
			Итого по разделу: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,02МПа				**365 800**
			Раздел: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,02МПа				
			Подраздел: ПРОКЛАДКА ТРУБ				
31	31	6123-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм	км	0.008	3 369 143	26 953
32	32	241-102-0137РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8.08	1 511	12 209
33	33	241-112-0124РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
34	34	6121-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0.0005	3 454 561	1 727
35	35	241-114-0117РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
			Итого по подразделу: ПРОКЛАДКА ТРУБ				**42 701**
			Подраздел: ЗАДВИЖКА				
36	36	6123-0106-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	1	16 620	16 620

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	242-103-0301РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	57 996	57 996
			Итого по подразделу: ЗАДВИЖКА				**74 616**
			Подраздел: ИФС				
38	38	6121-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	1	2 379	2 379
39	39	241-116-1107РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	25 970	25 970
			Итого по подразделу: ИФС				**28 349**
			Подраздел: КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА К МЕТ. КОНСТРУКЦИЯМ КР-1 - 2шт /ГСН.АС/				
40	40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.003142	385 425	1 211
41	41	222-519-0301РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0.003142	1 079 890	3 393
			Итого по подразделу: КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА К МЕТ. КОНСТРУКЦИЯМ КР-1 - 2шт /ГСН.АС/				**4 604**
			Подраздел: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
42	42	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1.67	496	828
43	43	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1.67	385	643
44	44	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0.008	2 178 256	17 426
45	45	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2 338	2 338
46	46	6123-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1	35 081	35 081
			Итого по подразделу: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				**56 316**
			Итого по разделу: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ Р=0,02МПа				**206 586**
			Итого по локальной смете: Наружные сети газоснабжения				**572 386**
			ИТОГО по акту:				**572 386**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	572386.000 x 6.60%	37 777
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	572386.000 + 37777.475	610 163
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.04985407	572386.000 x 0.04985407	28 535
	Сметная прибыль, 5.00%	610163.475 x 5.00%	30 508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Непредвиденные расходы, 2.000%				(610163.475 + 28535.774) x 2.000%	12 773
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					681 981
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				681981.408 x 1.0368	707 078
		НДС (12%)				707078.324 x 12%	84 849
		Итого с НДС				707078.324 + 84849.399	791 927

Лист согласования
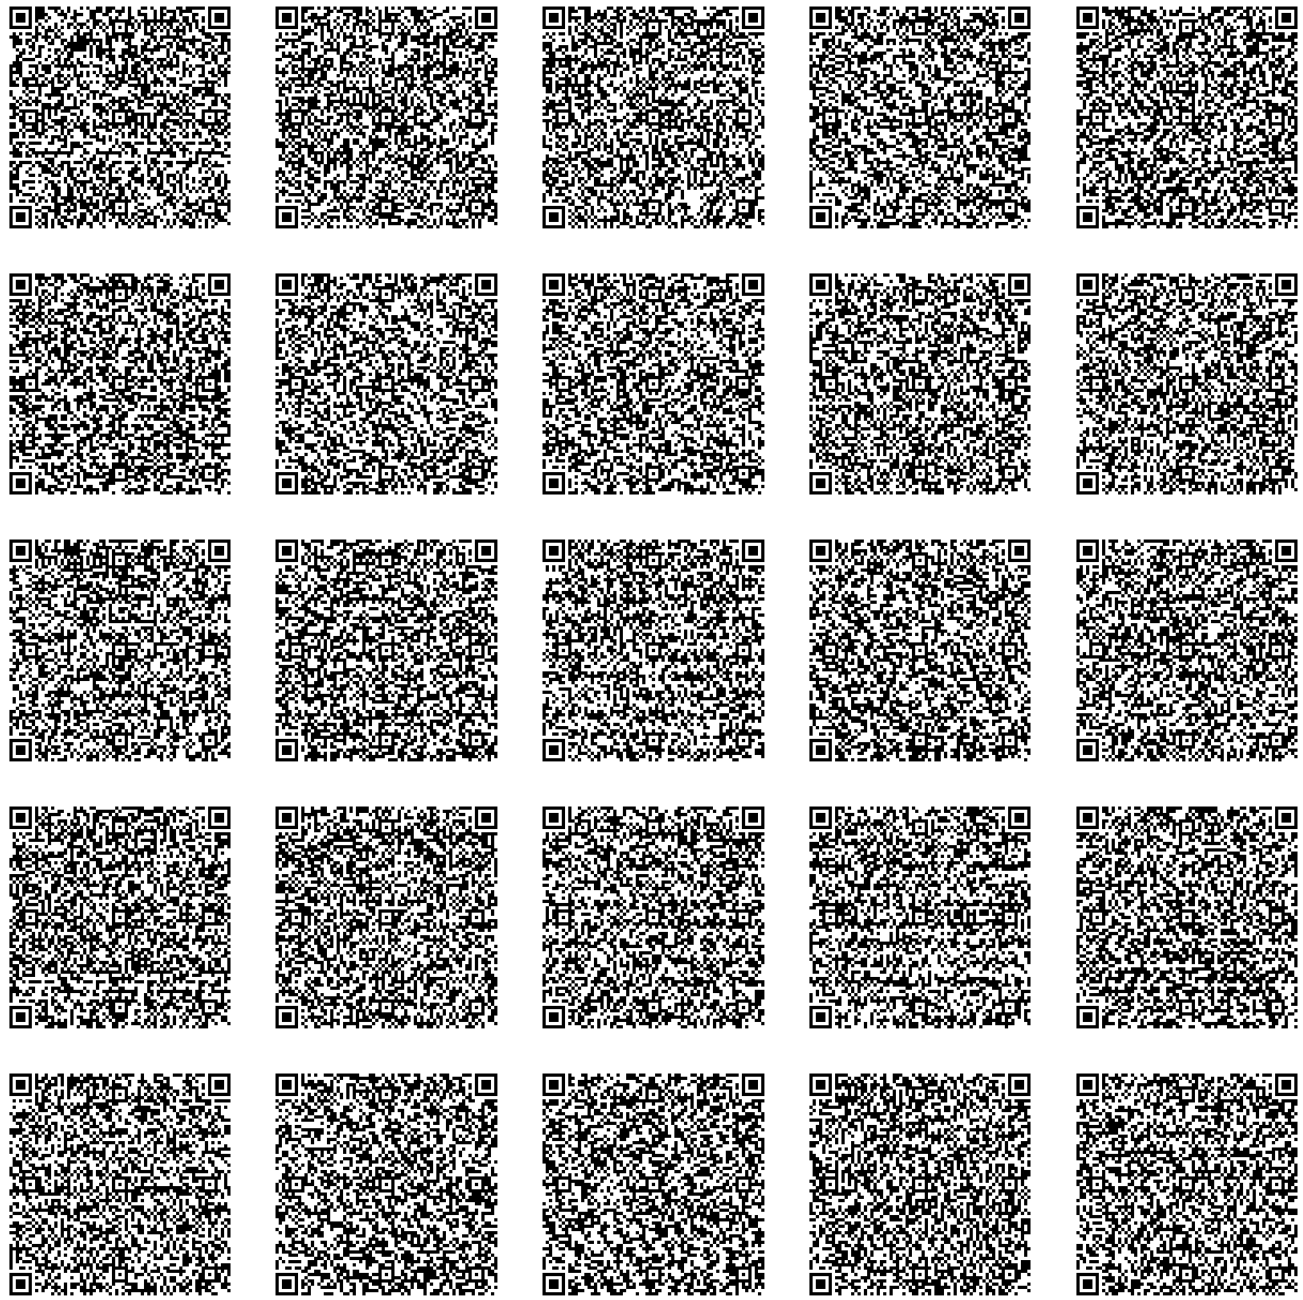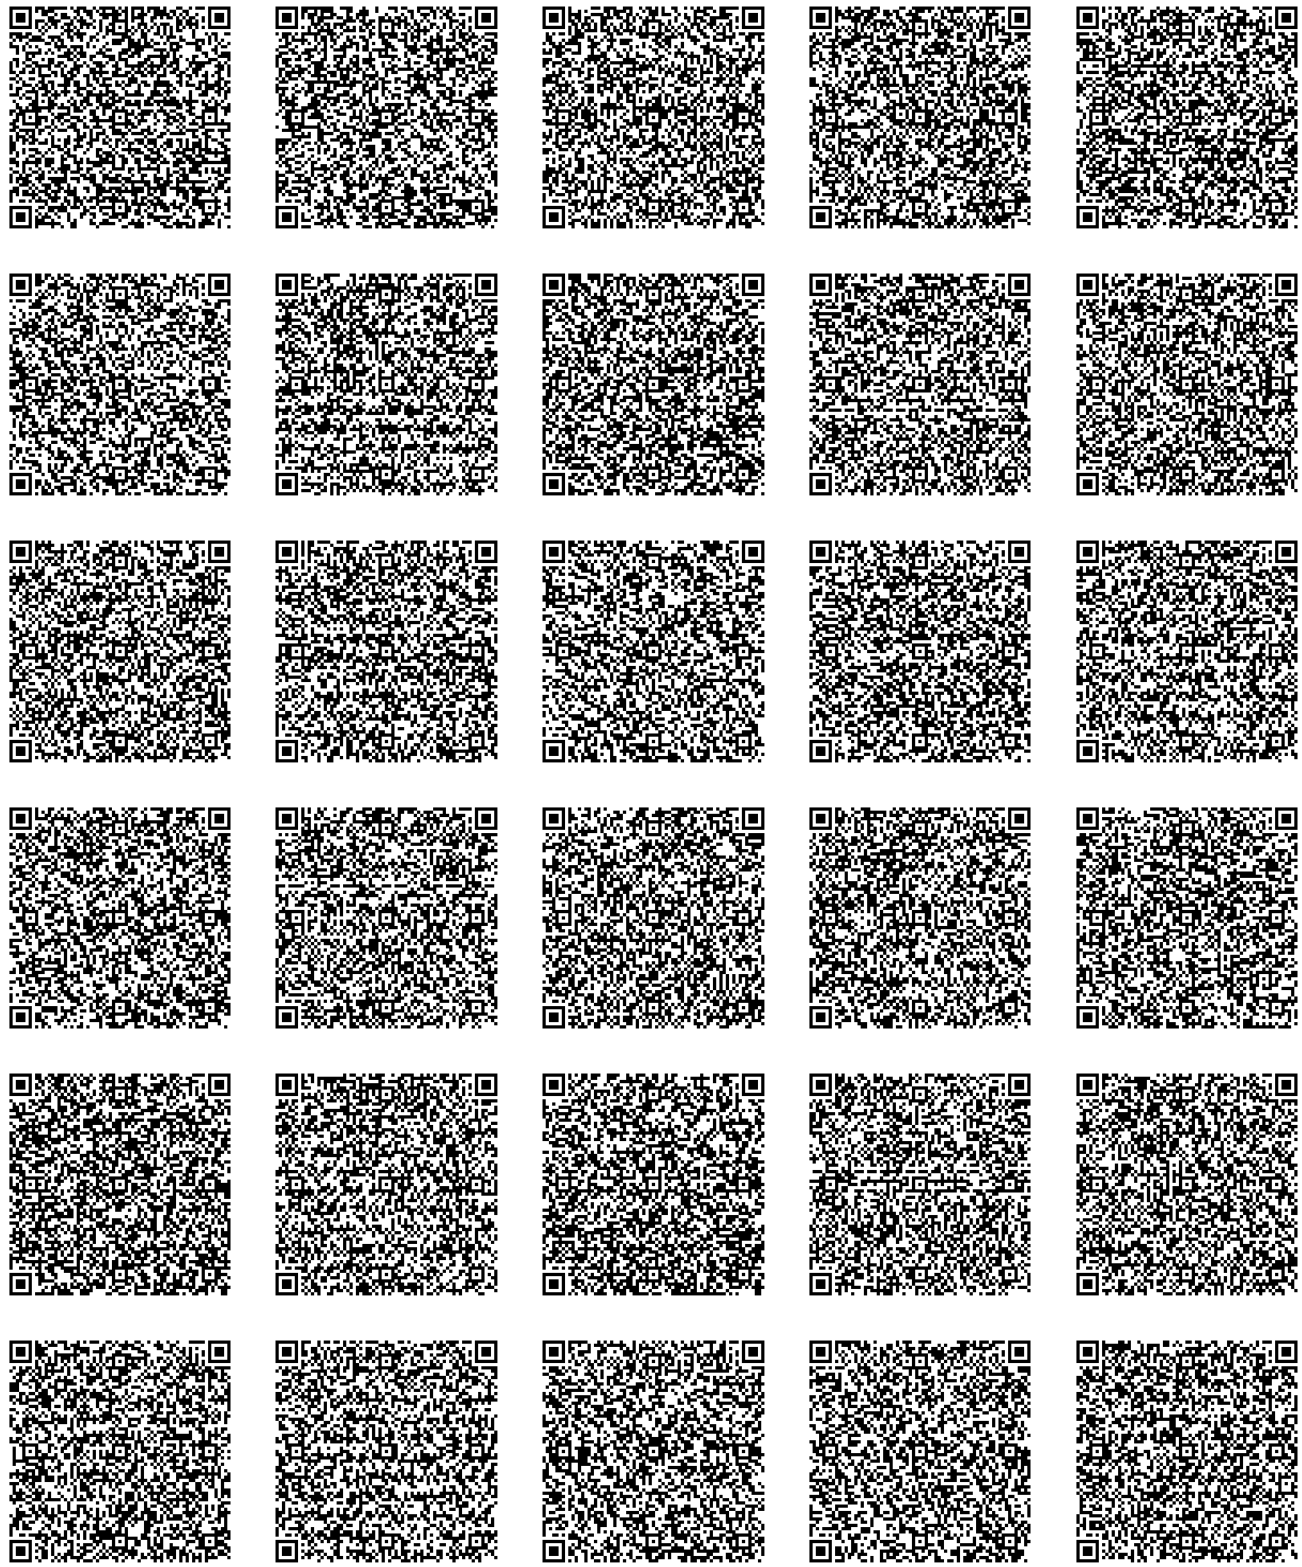
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	06.12.2024 13:54
Представители технического надзора		
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	09.12.2024 07:16
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	07.12.2024 13:10
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	09.12.2024 08:04
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	08.12.2024 08:57
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	10.12.2024 16:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	10.12.2024 15:37
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	11.12.2024 04:16
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	10.12.2024 15:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
