Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети водоснабжения и канализаций				
			Раздел: РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 50м3 /для бытовых стоков/ - 1комплект /НВК. АС. Лист 3/				
			Подраздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	97	6101-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	749.325	365	273 504
2	98	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м3	23.175	6 360	147 393
3	99	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	404.8	51	20 645
4	100	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	101.2	3 286	332 543
5	101	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	404.8	576	233 165
			Итого по подразделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**1 007 250**
			Подраздел: ПЛИТА ПЛ-2				
6	102	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	9	11 845	106 605
7	104	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	12.8	35 874	459 187
8	105	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.832	339 177	282 195

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	106	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0296	387 658	11 475
10	107	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг /Скоба, стропы, талреп/	т	0.1352	1 421 709	192 215
11	108	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	13	4 097	53 261
			Итого по подразделу: ПЛИТА ПЛ-2				**1 104 938**
			Подраздел: РЕЗЕРВУАР				
12	109	1328-1104-0305 РСНБ РК 2022	Резервуар стальной, объем 50 м3 /100м3/, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	1	683 948	683 948
13	110	СТПоз.669РСНБ РК 2022	Емкость технических жидкостей Rainpark TLT-50 из стеклопластика V±50м3	шт.	1	7 255 383	7 255 383
			Итого по подразделу: РЕЗЕРВУАР				**7 939 331**
			Итого по разделу: РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 50м3 /для бытовых стоков/ - 1комплект /НВК. АС. Лист 3/				**10 051 519**
			Раздел: РЕЗЕРВУАР ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100м3 /для производственной канализаций/ - 1комплект /НВК. АС. Лист 2/				
			Подраздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
14	144	6101-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	1120.35	365	408 928
15	145	6101-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	м3	34.65	6 360	220 374
16	146	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	605.6	51	30 886
17	147	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	151.4	3 286	497 500
18	148	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	605.6	576	348 825
			Итого по подразделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**1 506 514**
			Подраздел: ПЛИТА ПЛ-1				
19	149	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	13	11 845	153 985
20	150	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	6.6	29 762	196 429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	151	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	18.7	35 874	670 843
22	152	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.2224	339 177	414 610
23	153	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.037	387 658	14 342
24	154	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг /Скоба, стропы, талреп/	т	0.169	1 421 709	240 269
25	155	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16	4 097	65 552
			Итого по подразделу: ПЛИТА ПЛ-1				**1 756 032**
			Подраздел: РЕЗЕРВУАР				
26	156	1328-1104-0305 РСНБ РК 2022	Резервуар стальной, объем 50 м3 /100м3/, горизонтальный. Монтаж оборудования	шт.	1	683 948	683 948
27	157	244-204-0523 СпрСЦ 02.2024	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017 внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 м3	шт.	1	19 636 105	19 636 105
			Итого по подразделу: РЕЗЕРВУАР				**20 320 053**
			Итого по разделу: РЕЗЕРВУАР ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 100м3 /для производственной канализаций/ - 1комплект /НВК. АС. Лист 2/				**23 582 599**
			Итого по локальной смете: Наружные сети водоснабжения и канализаций				**33 634 118**
			ИТОГО по акту:				**33 634 118**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	33634118.000 x 6.60%	2 219 851
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	33634118.000 + 2219851.756	35 853 969
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.04985407	33634118.000 x 0.04985407	1 676 797
	Сметная прибыль, 5.00%	35853969.756 x 5.00%	1 792 698
	Непредвиденные расходы, 2.000%	(35853969.756 + 1676797.797) x 2.000%	750 615
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		40 074 081
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	40074081.391 x 1.0182	40 803 429
	НДС (12%)	40803429.673 x 12%	4 896 411
	Итого с НДС	40803429.673 + 4896411.561	45 699 841

Лист согласования
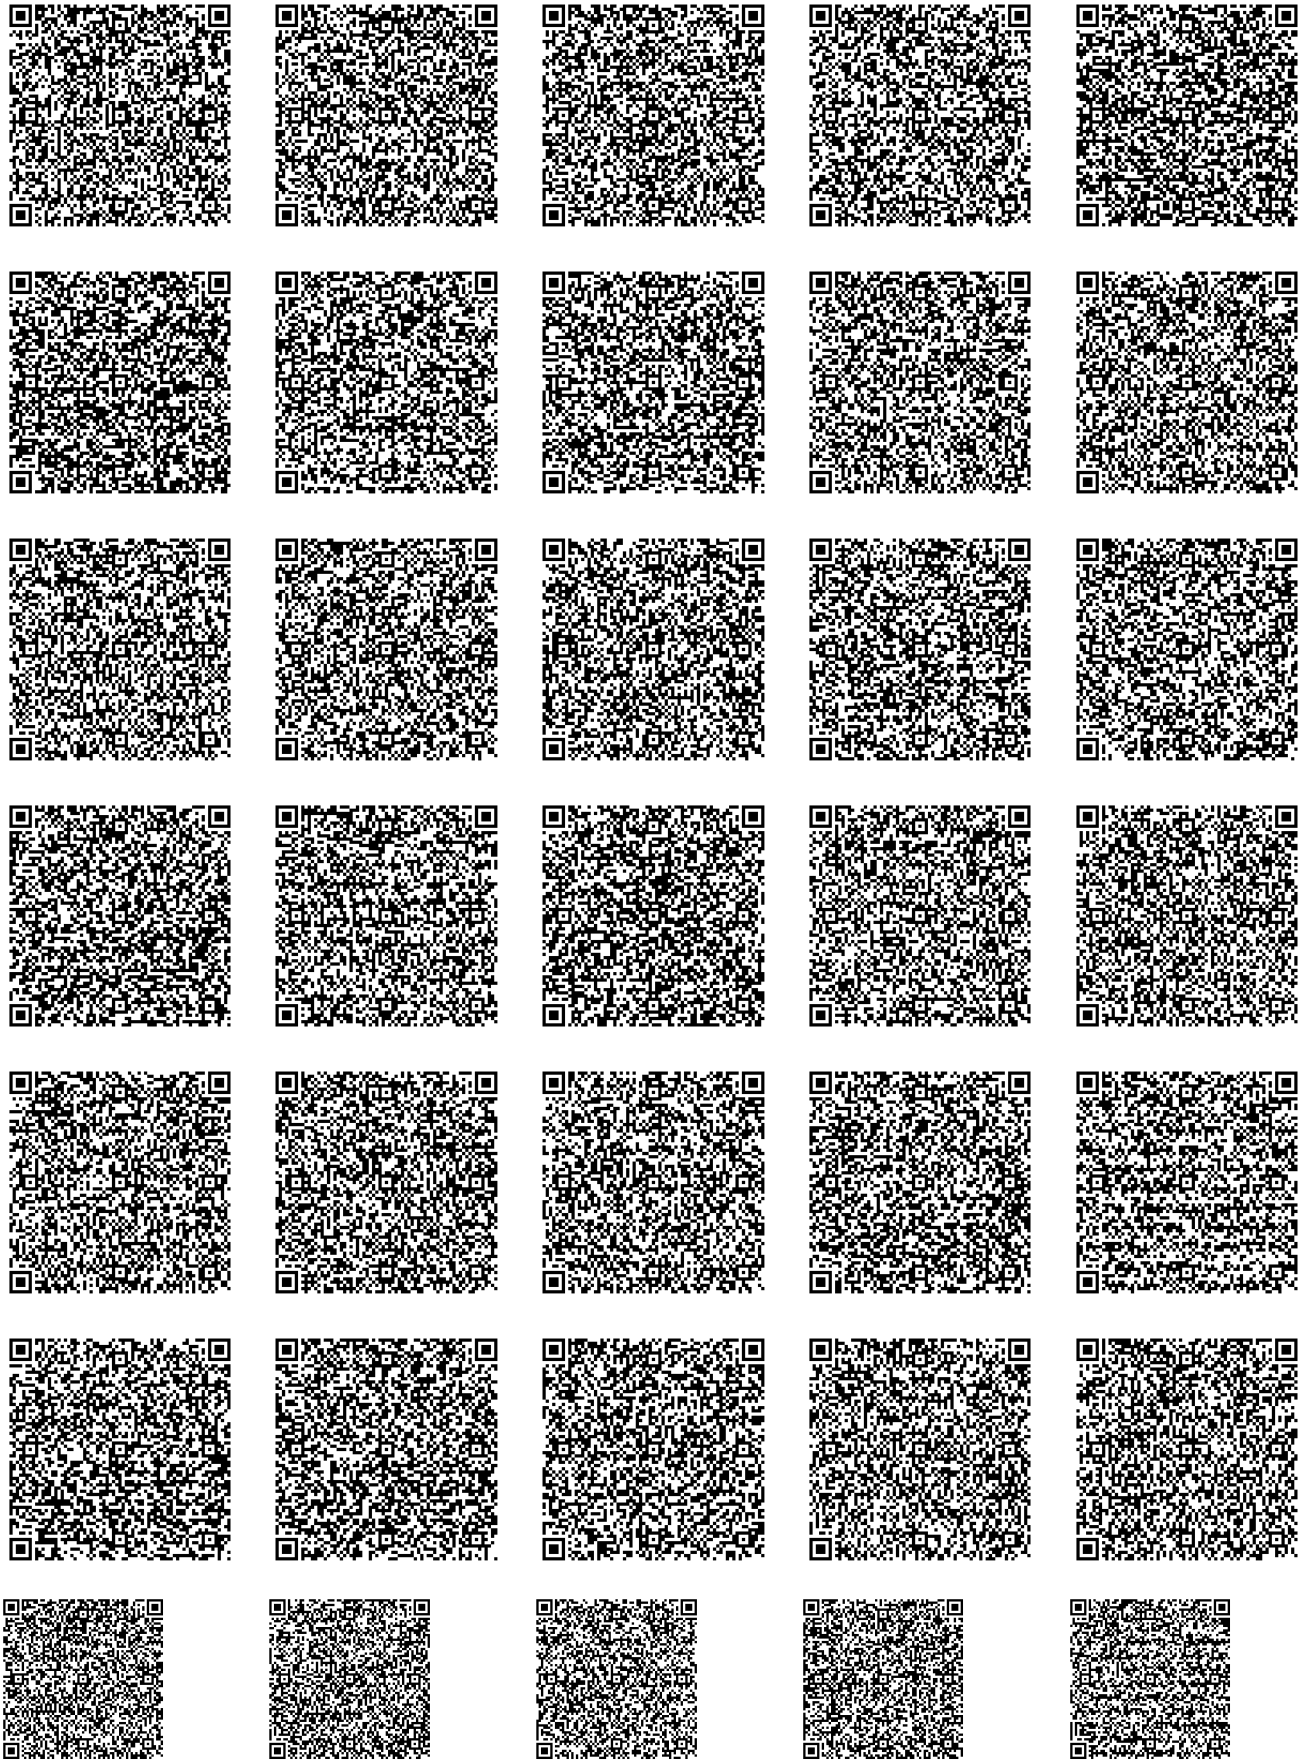
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	27.11.2024 06:49
Представители технического надзора		
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	27.11.2024 10:22
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	27.11.2024 12:56
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	27.11.2024 13:46
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	27.11.2024 10:19
Представители заказчика		
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	28.11.2024 05:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	28.11.2024 06:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	28.11.2024 05:22
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	28.11.2024 07:04
