Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения				
			Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
			Подраздел: ОБШИВКА ВОД.УЗЛА /АР. Лист 11 п.п.9/				
1	5	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	4.5	5 865	26 392
			Итого по подразделу: ОБШИВКА ВОД.УЗЛА /АР. Лист 11 п.п.9/				**26 392**
			Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				**26 392**
			Раздел: ПОЛЫ /АР. Лист 51-52/				
			Подраздел: ТИП-4				
2	132	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	707.877	1 295	916 700
3	133	233-101-0403 СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	736.19208	24 975	18 386 397
			Итого по подразделу: ТИП-4				**19 303 097**
			Подраздел: ТИП-5				
4	140	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	541.152	2 446	1 323 657
5	141	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	541.152	1 295	700 792
6	142	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	562.79808	5 214	2 934 429

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ТИП-5				**4 958 879**
			Подраздел: ТИП-6				
7	151	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	101.07	2 446	247 217
8	152	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	101.07	1 295	130 885
9	153	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	105.1128	5 214	548 057
			Итого по подразделу: ТИП-6				**926 160**
			Подраздел: ТИП-10				
10	176	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	57.438	2 446	140 493
11	177	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м2	57.438	2 631	151 119
12	178	233-202-0603 СпрСЦ 02.2024	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м2	58.58676	12 837	752 077
			Итого по подразделу: ТИП-10				**1 043 690**
			Подраздел: ТИП-11				
13	185	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	143.56197	6 110	877 163
14	186	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	146.43321	7 380	1 080 677
			Итого по подразделу: ТИП-11				**1 957 840**
			Подраздел: ТИП-13				
15	203	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	59.247	2 446	144 918
16	204	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	59.247	911	53 973
17	205	6109-0202-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тонкослойного защитного покрытия из полиуретановой эмали	м2	59.247	4 397	260 509
			Итого по подразделу: ТИП-13				**459 401**
			Подраздел: ТИП-14				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	212	6109-0202-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм	м2	154.458	7 726	1 193 342
19	213	6109-0202-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0201	м2	154.458	20 453	3 159 129
			Итого по подразделу: ТИП-14				**4 352 472**
			Подраздел: ТИП-18				
20	220	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	63.09	6 110	385 479
21	221	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	64.3518	7 380	474 916
			Итого по подразделу: ТИП-18				**860 396**
			Подраздел: ТИП-5				
22	228	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	940.455	2 446	2 300 353
23	229	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	940.455	1 295	1 217 889
24	230	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	978.0732	5 214	5 099 673
			Итого по подразделу: ТИП-5				**8 617 915**
			Подраздел: ТИП-7				
25	237	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	96.255	2 446	235 439
26	238	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	96.255	1 295	124 649
27	239	233-101-0201 РСНБ РК 2022	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	м2	98.1801	7 800	765 804
			Итого по подразделу: ТИП-7				**1 125 894**
			Подраздел: ТИП-10				
28	262	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	124.569	2 446	304 695
29	263	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м2	124.569	2 631	327 741

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	264	233-202-0603 СпрСЦ 02.2024	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC	м2	127.06038	12 837	1 631 074
			Итого по подразделу: ТИП-10				**2 263 511**
			Подраздел: ТИП-11				
31	271	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	138.70944	6 110	847 514
32	272	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	141.48363	7 380	1 044 149
			Итого по подразделу: ТИП-11				**1 891 663**
			Подраздел: ТИП 18				
33	275	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	56.88	6 110	347 536
34	276	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	58.0176	7 380	428 169
			Итого по подразделу: ТИП 18				**775 706**
			Подраздел: ТИП-15				
35	277	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	82.494	2 034	167 792
36	278	215-301-0206 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м2	84.14388	3 276	275 655
37	279	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м2	82.494	13 655	1 126 455
			Итого по подразделу: ТИП-15				**1 569 903**
			Подраздел: ТИП-16				
38	286	6109-0307-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом	м2	65.763	13 655	897 993
			Итого по подразделу: ТИП-16				**897 993**
			Подраздел: ТИП-5				
39	291	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	812.898	1 838	1 494 106
40	292	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	812.898	1 096	890 936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	293	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	812.898	2 446	1 988 348
42	294	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	812.898	1 295	1 052 703
43	295	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	845.41392	5 214	4 407 988
			Итого по подразделу: ТИП-5				**9 834 082**
			Подраздел: ТИП-6				
44	300	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	163.008	1 838	299 609
45	301	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	163.008	1 096	178 657
46	302	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.285264	59 456	16 960
47	303	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.285264	415 660	118 573
48	304	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	163.008	2 446	398 718
49	305	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	163.008	1 295	211 095
50	306	233-101-0105 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	169.52832	5 214	883 920
			Итого по подразделу: ТИП-6				**2 107 533**
			Подраздел: ТИП-7				
51	311	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	144.135	1 838	264 920
52	312	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	144.135	1 096	157 971
53	313	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	144.135	2 446	352 554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	314	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	144.135	1 295	186 654
55	315	233-101-0201 РСНБ РК 2022	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм	м2	147.0177	7 800	1 146 737
			Итого по подразделу: ТИП-7				**2 108 838**
			Подраздел: ТИП-8				
56	320	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	92.376	1 838	169 786
57	321	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	92.376	822	75 933
			Итого по подразделу: ТИП-8				**245 719**
			Подраздел: ТИП-11				
58	328	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	533.763	1 838	981 056
59	329	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	533.763	822	438 753
60	330	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	533.763	6 110	3 261 292
61	331	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х9мм	м2	544.43826	7 380	4 017 954
			Итого по подразделу: ТИП-11				**8 699 057**
			Подраздел: ТИП 18				
62	336	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	49.5	1 838	90 981
63	337	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	49.5	822	40 689
			Итого по подразделу: ТИП 18				**131 670**
			Подраздел: ТИП 19				
64	342	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	84.195	1 838	154 750
65	343	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	84.195	274	23 069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	344	6106-0306-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж съемного металлического покрытия полов, размер 500х500 мм из стальных штампованных плит	м2	84.195	21 919	1 845 469
67	345	233-202-0501 СпрСЦ 02.2024	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке	м2	85.8789	94 479	8 113 752
68	346	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	84.195	1 295	109 032
69	347	233-102-0203 РСНБ РК 2022	Виниловое покрытие гетерогенное толщиной 2,5 мм, класс 34	м2	85.8789	10 785	926 203
			Итого по подразделу: ТИП 19				**11 172 278**
			Подраздел: СЦЕНА И ТРИБУНА /АР. Лист 80-82/				
70	350	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0.8847	188 588	166 843
71	351	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.2331	438 481	102 210
72	352	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.6516	409 591	266 889
73	353	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0.142317	2 159 677	307 359
74	354	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	226.8	104	23 587
75	355	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	30.81051	385	11 862
76	356	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	15.66495	5 495	86 078
77	357	6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	3.5829	224 472	804 260
78	358	6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	м2	76.95	8 577	660 000
79	359	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5.8959	9 392	55 374

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	360	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных	м2	77.175	2 034	156 974
81	361	215-301-0206 РСНБ РК 2022	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм	м2	78.7185	3 276	257 881
82	362	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее из готовых ковров на комнату	м2	77.175	5 671	437 659
			Итого по подразделу: СЦЕНА И ТРИБУНА /АР. Лист 80-82/				**3 336 981**
			Итого по разделу: ПОЛЫ /АР. Лист 51-52/				**88 640 688**
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР. Лист 48-50.1/				
			Подраздел: ПОТОЛОК				
83	368	6112-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	47.68	854	40 719
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК				**40 719**
			Подраздел: МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНЫ, КОЛОННЫ				
84	369	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	270.45	1 184	320 213
			Итого по подразделу: МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТЕНЫ, КОЛОННЫ				**320 213**
			Подраздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА				
85	371	6112-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	м2	561.45	1 184	664 757
			Итого по подразделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА				**664 757**
			Подраздел: ПОТОЛОК - ГКЛ+ВЭК				
86	372	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	707.44	7 023	4 968 351
87	373	1134-0108-0403 РСНБ РК 2022	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	57.85	1 848	106 907
88	374	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	2.979275	34 448	102 629
89	375	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	353.72	2 164	765 450
90	376	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	353.72	1 393	492 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - ГКЛ+ВЭК				**6 436 070**
			Подраздел: ПОТОЛОК - ШПАТЛЕВКА+ВЭК				
91	380	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	602.01	1 393	838 600
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - ШПАТЛЕВКА+ВЭК				**838 600**
			Подраздел: ВЭК				
92	382	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	795.13	1 564	1 243 583
93	383	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	795.13	1 247	991 527
			Итого по подразделу: ВЭК				**2 235 110**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
94	384	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	80.24	3 695	296 487
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**296 487**
			Подраздел: ГКЛ+ВЭК				
95	388	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	21.935	1 564	34 306
96	389	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	21.935	1 247	27 352
			Итого по подразделу: ГКЛ+ВЭК				**61 659**
			Подраздел: ВЭК				
97	391	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	669.57	1 564	1 047 207
98	392	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	669.57	1 247	834 954
			Итого по подразделу: ВЭК				**1 882 161**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
99	393	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	23.575	3 695	87 109
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**87 109**
			Подраздел: ГКЛ+ВЭК				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	397	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	7.985	1 564	12 488
101	398	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	7.985	1 247	9 957
			Итого по подразделу: ГКЛ+ВЭК				**22 446**
			Подраздел: ВЭК				
102	401	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	520.355	1 564	813 835
103	402	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	520.355	1 247	648 882
			Итого по подразделу: ВЭК				**1 462 717**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
104	403	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	м2	56.18	367	20 618
105	404	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	198.915	3 695	734 991
106	405	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	198.915	10 232	2 035 298
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**2 790 907**
			Подраздел: ВЭК				
107	407	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	969.6	1 564	1 516 454
108	408	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	969.6	1 247	1 209 091
			Итого по подразделу: ВЭК				**2 725 545**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
109	409	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	125.61	3 695	464 129
110	410	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	125.61	10 232	1 285 241
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**1 749 370**
			Подраздел: ГКЛ+ВЭК				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	411	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	34.26	1 564	53 582
112	412	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	34.26	1 247	42 722
			Итого по подразделу: ГКЛ+ВЭК				**96 304**
			Подраздел: ПОТОЛОК - ГКЛ+ВЭК				
113	413	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	394.245	7 023	2 768 782
114	414	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	394.245	2 164	853 145
115	415	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	394.245	1 393	549 183
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - ГКЛ+ВЭК				**4 171 112**
			Подраздел: ПОТОЛОК - АРМСТРОНГ				
116	416	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	377.55	5 505	2 078 412
117	417	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	388.8765	4 122	1 602 948
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - АРМСТРОНГ				**3 681 361**
			Подраздел: ПОТОЛОК - ШПАТЛЕВКА+ОКРАСКА				
118	418	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	761.274	2 304	1 753 974
119	419	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	761.274	1 393	1 060 454
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - ШПАТЛЕВКА+ОКРАСКА				**2 814 429**
			Подраздел: ВЭК				
120	421	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1534.014	1 564	2 399 197
121	422	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1534.014	1 247	1 912 915
			Итого по подразделу: ВЭК				**4 312 113**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
122	423	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	69.408	3 695	256 462
123	424	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	69.408	10 232	710 182
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**966 645**
			Подраздел: ВЭК				
124	426	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	523.89	1 564	819 363
125	427	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	523.89	1 247	653 291
			Итого по подразделу: ВЭК				**1 472 654**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
126	428	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	20.745	3 695	76 653
127	429	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	20.745	10 232	212 263
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**288 916**
			Подраздел: ВЭК				
128	432	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	98.514	1 564	154 075
129	433	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	98.514	1 247	122 847
			Итого по подразделу: ВЭК				**276 922**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
130	434	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	5.121	3 695	18 922
131	435	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	5.121	10 232	52 398
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**71 320**
			Подраздел: ВЭК				
132	437	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1777.23	1 564	2 779 587

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	438	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1777.23	1 247	2 216 205
			Итого по подразделу: ВЭК				**4 995 793**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
134	439	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	219.096	3 695	809 559
135	440	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	219.096	10 232	2 241 790
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**3 051 350**
			Подраздел: ПОТОЛОК - ГКЛ+ВЭК				
136	441	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	153.189	7 023	1 075 846
137	442	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	153.189	2 164	331 500
138	443	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	153.189	1 393	213 392
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - ГКЛ+ВЭК				**1 620 739**
			Подраздел: ПОТОЛОК - АРМСТРОНГ				
139	444	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	307.4535	5 505	1 692 531
140	445	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	316.677105	4 122	1 305 342
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - АРМСТРОНГ				**2 997 874**
			Подраздел: ПОТОЛОК - ШПАТЛЕВКА+ОКРАСКА				
141	446	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	969.516	2 304	2 233 764
142	447	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	969.516	1 393	1 350 535
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК - ШПАТЛЕВКА+ОКРАСКА				**3 584 300**
			Подраздел: ВЭК				
143	449	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1125.576	1 564	1 760 400

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	450	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1125.576	1 247	1 403 593
			Итого по подразделу: ВЭК				**3 163 994**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
145	451	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	49.185	3 695	181 738
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**181 738**
			Подраздел: ВЭК				
146	454	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	381.024	1 564	595 921
147	455	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	381.024	1 247	475 136
			Итого по подразделу: ВЭК				**1 071 058**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				
148	456	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	28.332	3 695	104 687
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**104 687**
			Подраздел: ВЭК				
149	460	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	64.539	1 564	100 938
150	461	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	64.539	1 247	80 479
			Итого по подразделу: ВЭК				**181 418**
			Подраздел: ВЭК				
151	462	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	1291.842	1 289	1 665 184
152	463	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1291.842	1 564	2 020 440
153	464	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1291.842	1 247	1 610 927
			Итого по подразделу: ВЭК				**5 296 552**
			Подраздел: КЕРАМ.ПЛИТКИ				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
154	465	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	199.134	3 695	735 800
			Итого по подразделу: КЕРАМ.ПЛИТКИ				**735 800**
			Подраздел: ПОТОЛОК				
155	467	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	313.29	1 564	489 985
156	468	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	313.29	1 393	436 412
			Итого по подразделу: ПОТОЛОК				**926 397**
			Подраздел: СТЕНЫ				
157	469	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1030.32	2 837	2 923 018
158	470	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1030.29	1 564	1 611 373
159	471	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1030.32	1 247	1 284 809
			Итого по подразделу: СТЕНЫ				**5 819 200**
			Подраздел: ОКНА				
160	472	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	492.867	3 980	1 961 610
161	473	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	492.867	1 564	770 843
162	474	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	492.867	1 247	614 605
			Итого по подразделу: ОКНА				**3 347 059**
			Подраздел: ДВЕРИ				
163	475	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м2	37.566	1 811	68 031
164	476	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	37.566	1 564	58 752
165	477	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	37.566	1 247	46 845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ДВЕРИ				**173 629**
			Подраздел: ВИТРАЖИ				
166	478	6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м2	32.193	1 811	58 301
167	479	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	32.193	1 564	50 349
168	480	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	32.193	1 247	40 144
			Итого по подразделу: ВИТРАЖИ				**148 795**
			Подраздел: ФАРТУК				
169	481	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	25.272	3 695	93 380
			Итого по подразделу: ФАРТУК				**93 380**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР. Лист 48-50.1/				**77 259 425**
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР. Лист 30/				
			Подраздел: ФАСАД				
170	489	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	705.366	6 892	4 861 382
171	490	231-305-0501 СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	775.9026	12 212	9 475 322
172	494	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	864.225	4 010	3 465 542
173	495	6112-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	495	3 218	1 592 910
174	496	1115-0213-0102 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	65.421	13 669	894 240
175	497	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	5.495364	34 448	189 304
176	501	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	27	5 527	149 229
177	502	231-305-0101 СпрСЦ 02.2024	Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	27	12 216	329 832

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ФАСАД				**20 957 762**
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР. Лист 30/				**20 957 762**
			Раздел: КРОВЛЯ /АР. Лист 36.1/				
			Подраздел: Р ТИП 1				
178	503	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	349.92	352	123 171
179	504	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.090702	95 688	8 679
180	505	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	349.92	2 234	781 721
181	506	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	77.5213188	50 053	3 880 174
182	507	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	1279.8	2 065	2 642 786
183	508	224-102-0908 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	1542.105	4 683	7 221 677
184	509	6111-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	172.773	56 642	9 786 208
185	510	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	1279.8	1 607	2 056 638
186	511	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	1279.8	124	158 695
187	512	6110-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	1279.8	8 604	11 011 399
			Итого по подразделу: Р ТИП 1				**37 671 152**
			Подраздел: Р ТИП 2				
188	514	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	55.134	352	19 407
189	515	235-104-0301 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0.0606474	95 688	5 803
190	516	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	55.134	2 234	123 169

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	517	234-102-0302 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	6.8145624	35 441	241 515
192	518	6111-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	7.44309	56 642	421 591
193	519	6110-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	55.134	8 604	474 372
			Итого по подразделу: Р ТИП 2				**1 285 859**
			Подраздел: Р ТИП 3				
194	521	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	1019.286	2 065	2 104 825
195	522	224-103-1117 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	1172.1789	6 745	7 906 347
196	523	6110-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровли плоской из ПВХ-мембраны	м2	1019.286	1 086	1 106 944
197	524	235-104-0103 РСНБ РК 2022	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм	м2	1121.2146	2 686	3 011 582
198	525	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1019.286	2 234	2 277 084
199	526	234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	157.479687	71 173	11 208 302
200	527	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	1019.286	2 065	2 104 825
201	528	224-102-1205 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	1172.1789	7 886	9 243 802
202	529	6109-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки из плит древесноволокнистых	м2	2038.572	303	617 687
203	530	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	м2	2079.34344	2 561	5 325 198
204	531	6110-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	1019.286	8 604	8 769 936
			Итого по подразделу: Р ТИП 3				**53 676 536**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Р КАРКАС КР1-КР32 /АР. Лист 44.3/				
205	575	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2.5069618	221 603	555 550
206	576	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2.5069618	365 165	915 454
207	577	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	72.7018922	248	18 029
208	578	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	72.7018922	385	27 990
209	579	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	22.827	4 491	102 516
210	580	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.1327162	538 333	71 445
			Итого по подразделу: Р КАРКАС КР1-КР32 /АР. Лист 44.3/				**1 690 986**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /АР. Лист 36.1/				**94 324 535**
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				
			Подраздел: ОГ-1 (103,32 п.м)				
211	581	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	92.988	6 448	599 586
212	582	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	92.988	37 335	3 471 706
			Итого по подразделу: ОГ-1 (103,32 п.м)				**4 071 293**
			Подраздел: ОГ-2 (4,4п.м)				
213	583	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	3.96	6 448	25 533
214	584	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	3.96	37 335	147 846
			Итого по подразделу: ОГ-2 (4,4п.м)				**173 380**
			Подраздел: ОГ-5 (9,3 п.м)				
215	585	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	8.37	6 448	53 969

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
216	586	222-503-0304 РСНБ РК 2022	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8.37	37 335	312 494
			Итого по подразделу: ОГ-5 (9,3 п.м)				**366 463**
			Подраздел: ОГ-3				
217	587	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	2.718	6 448	17 525
218	588	241-109-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х4,0 мм	м	2.718	14 918	40 546
219	589	241-109-0208 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 18х2,0 мм	м	0.36	2 553	918
220	590	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	89.262	248	22 137
221	591	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	89.262	385	34 365
			Итого по подразделу: ОГ-3				**115 494**
			Подраздел: Р СТРЕМЯНКИ СТ-1, Ст-2, СТ-3 /АР. Лист 78/				
222	606	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	13.82364	239 421	3 309 670
223	607	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	13.82364	1 146 761	15 852 411
224	608	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	400.88556	248	99 420
225	609	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	400.88556	385	154 341
			Итого по подразделу: Р СТРЕМЯНКИ СТ-1, Ст-2, СТ-3 /АР. Лист 78/				**19 415 842**
			Подраздел: ФУНДАМЕНТ Фм2				
226	617	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0.0592	1 467 786	86 893
			Итого по подразделу: ФУНДАМЕНТ Фм2				**86 893**
			Подраздел: СТОЙКА Ст1				
227	618	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1.26496	70 413	89 070

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	619	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1.13904	385 964	439 628
229	620	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.12592	357 986	45 078
230	621	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	36.68384	248	9 098
231	622	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	36.68384	385	14 123
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст1				**596 997**
			Подраздел: КОЗЫРЕК				
232	623	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	4.08044	221 603	904 238
233	624	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.9762	385 964	376 778
234	625	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.1708	592 033	101 119
235	626	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.02824	357 986	10 110
236	627	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.00628	373 487	2 345
237	628	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2.89892	365 165	1 058 584
238	629	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	118.33276	248	29 347
239	630	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	118.33276	385	45 558
240	633	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	32	5 799	185 568
241	634	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	35.2	2 895	101 903

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	635	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	32.4	5 092	164 981
243	636	224-103-0916 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	37.26	5 167	192 522
244	637	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	7.04	7 559	53 215
245	638	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных	м	14.08	2 347	33 046
246	639	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	14.08	2 253	31 722
247	640	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12.8	2 554	32 691
			Итого по подразделу: КОЗЫРЕК				**3 323 728**
			Подраздел: СТОЙКА Ст1				
248	649	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.63248	70 413	44 535
249	650	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.56952	385 964	219 814
250	651	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.06296	357 986	22 539
251	652	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	18.34192	248	4 549
252	653	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	18.34192	385	7 062
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст1				**298 499**
			Подраздел: КОЗЫРЕК				
253	654	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2.10052	221 603	465 482
254	655	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.5484	385 964	211 663

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	656	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.0854	592 033	50 560
256	657	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01412	357 986	5 055
257	658	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.00314	373 487	1 173
258	659	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.44946	365 165	529 292
259	660	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	60.91508	248	15 107
260	661	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	60.91508	385	23 452
261	664	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	18.2	5 799	105 542
262	665	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	20.02	2 895	57 958
263	666	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	18	5 092	91 656
264	667	224-103-0916 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	20.7	5 167	106 957
265	668	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4	7 559	30 236
266	669	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных	м	7.68	2 347	18 025
267	670	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	7.68	2 253	17 303
268	671	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6.4	2 554	16 346
			Итого по подразделу: КОЗЫРЕК				**1 745 807**
			Подраздел: СТОЙКА Ст1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
269	680	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	2.45888	70 413	173 137
270	681	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2.24	385 964	864 559
271	682	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.21888	357 986	78 356
272	683	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	71.30752	248	17 684
273	684	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	71.30752	385	27 453
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст1				**1 161 189**
			Подраздел: КОЗЫРЕК				
274	685	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3.934352	221 603	871 864
275	686	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.376	385 964	145 122
276	687	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0.59296	364 937	216 393
277	688	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.19128	592 033	113 244
278	689	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.032672	357 986	11 696
279	690	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.01256	373 487	4 691
280	691	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2.72888	365 165	996 491
281	692	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	114.096208	248	28 296
282	693	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	114.096208	385	43 927

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
283	696	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	33.6	5 799	194 846
284	697	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	36.96	2 895	106 999
285	698	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	30.4	5 092	154 797
286	699	224-103-0916 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	34.96	5 167	180 638
287	700	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	8.8	7 559	66 519
288	701	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных	м	17.6	2 347	41 307
289	702	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	17.6	2 253	39 653
290	703	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	29.6	2 554	75 598
			Итого по подразделу: КОЗЫРЕК				**3 292 081**
			Подраздел: СТОЙКА Ст1				
291	716	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.46928	70 413	33 043
292	717	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.4214	385 964	162 645
293	718	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.04788	357 986	17 140
294	719	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13.60912	248	3 375
295	720	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13.60912	385	5 240
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст1				**221 443**
			Подраздел: КОЗЫРЕК				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
296	721	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1.09485	221 603	242 622
297	722	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.33383	385 964	128 846
298	723	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.0477	592 033	28 240
299	724	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01413	357 986	5 058
300	725	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.00314	373 487	1 173
301	726	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.69605	365 165	254 173
302	727	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	31.75065	248	7 874
303	728	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	31.75065	385	12 224
304	731	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	12.6	5 799	73 067
305	732	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	13.86	2 895	40 125
306	733	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	12.1	5 092	61 613
307	734	224-103-0916 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13.915	5 167	71 899
308	735	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4.3	7 559	32 504
309	736	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных	м	4.7	2 347	11 031
310	737	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	4.7	2 253	10 589

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
311	738	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6.4	2 554	16 346
			Итого по подразделу: КОЗЫРЕК				**997 384**
			Подраздел: СТОЙКА Ст1				
312	747	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0.63368	70 413	44 619
313	748	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.57072	385 964	220 277
314	749	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.06296	357 986	22 539
315	750	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	18.37672	248	4 557
316	751	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	18.37672	385	7 075
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст1				**299 067**
			Подраздел: КОЗЫРЕК				
317	752	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	2.04272	221 603	452 673
318	753	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0.4906	385 964	189 354
319	754	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.0854	592 033	50 560
320	755	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.01412	357 986	5 055
321	756	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.00314	373 487	1 173
322	757	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1.44946	365 165	529 292
323	758	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	59.23888	248	14 691

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
324	759	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	59.23888	385	22 807
325	762	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	14.04	5 799	81 418
326	763	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	15.444	2 895	44 710
327	764	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14.04	5 092	71 492
328	765	224-103-0916 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16.146	5 167	83 426
329	766	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	4	7 559	30 236
330	767	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных	м	8.6	2 347	20 184
331	768	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	8.6	2 253	19 376
332	769	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	6.4	2 554	16 346
			Итого по подразделу: КОЗЫРЕК				**1 632 793**
			Подраздел: СТОЙКА Ст1				
333	774	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1.3998	70 413	98 564
334	775	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1.2424	385 964	479 522
335	776	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.1574	357 986	56 346
336	777	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	40.5942	248	10 067
337	778	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	40.5942	385	15 629
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст1				**660 129**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: СТОЙКА Ст2				
338	779	6106-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	1.3138	70 413	92 509
339	780	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1.1564	385 964	446 329
340	781	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.1574	357 986	56 346
341	782	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	38.1002	248	9 449
342	783	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	38.1002	385	14 669
			Итого по подразделу: СТОЙКА Ст2				**619 303**
			Подраздел: КОЗЫРЕК				
343	784	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	11.1457	221 603	2 469 921
344	785	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2.78835	385 964	1 076 203
345	786	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.2135	592 033	126 399
346	787	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0353	357 986	12 636
347	788	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0.00785	373 487	2 932
348	789	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	8.1007	365 165	2 958 092
349	790	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	323.2253	248	80 160
350	791	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	323.2253	385	124 441
351	796	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	177.5	5 092	903 830

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
352	797	224-103-0916 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	204.125	5 167	1 054 714
353	798	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	11	7 559	83 149
354	799	6110-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов подвесных	м	50.6	2 347	118 758
355	800	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	50.6	2 253	114 002
356	801	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12.175	2 554	31 094
			Итого по подразделу: КОЗЫРЕК				**9 156 334**
			Итого по разделу: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				**48 234 120**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения				**329 442 925**
			ИТОГО по акту:				**329 442 925**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	329442925.155 x 6.60%	21 743 232
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	329442925.155 + 21743232.746	351 186 157
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.04985407	329442925.155 x 0.04985407	16 424 071
	Сметная прибыль, 5.00%	351186157.901 x 5.00%	17 559 307
	Непредвиденные расходы, 2.000%	(351186157.901 + 16424071.862) x 2.000%	7 352 204
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		392 521 742
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	392521742.253 x 1.0368	406 966 542
	НДС (12%)	406966542.368 x 12%	48 835 985
	Итого с НДС	406966542.368 + 48835985.084	455 802 527

Лист согласования
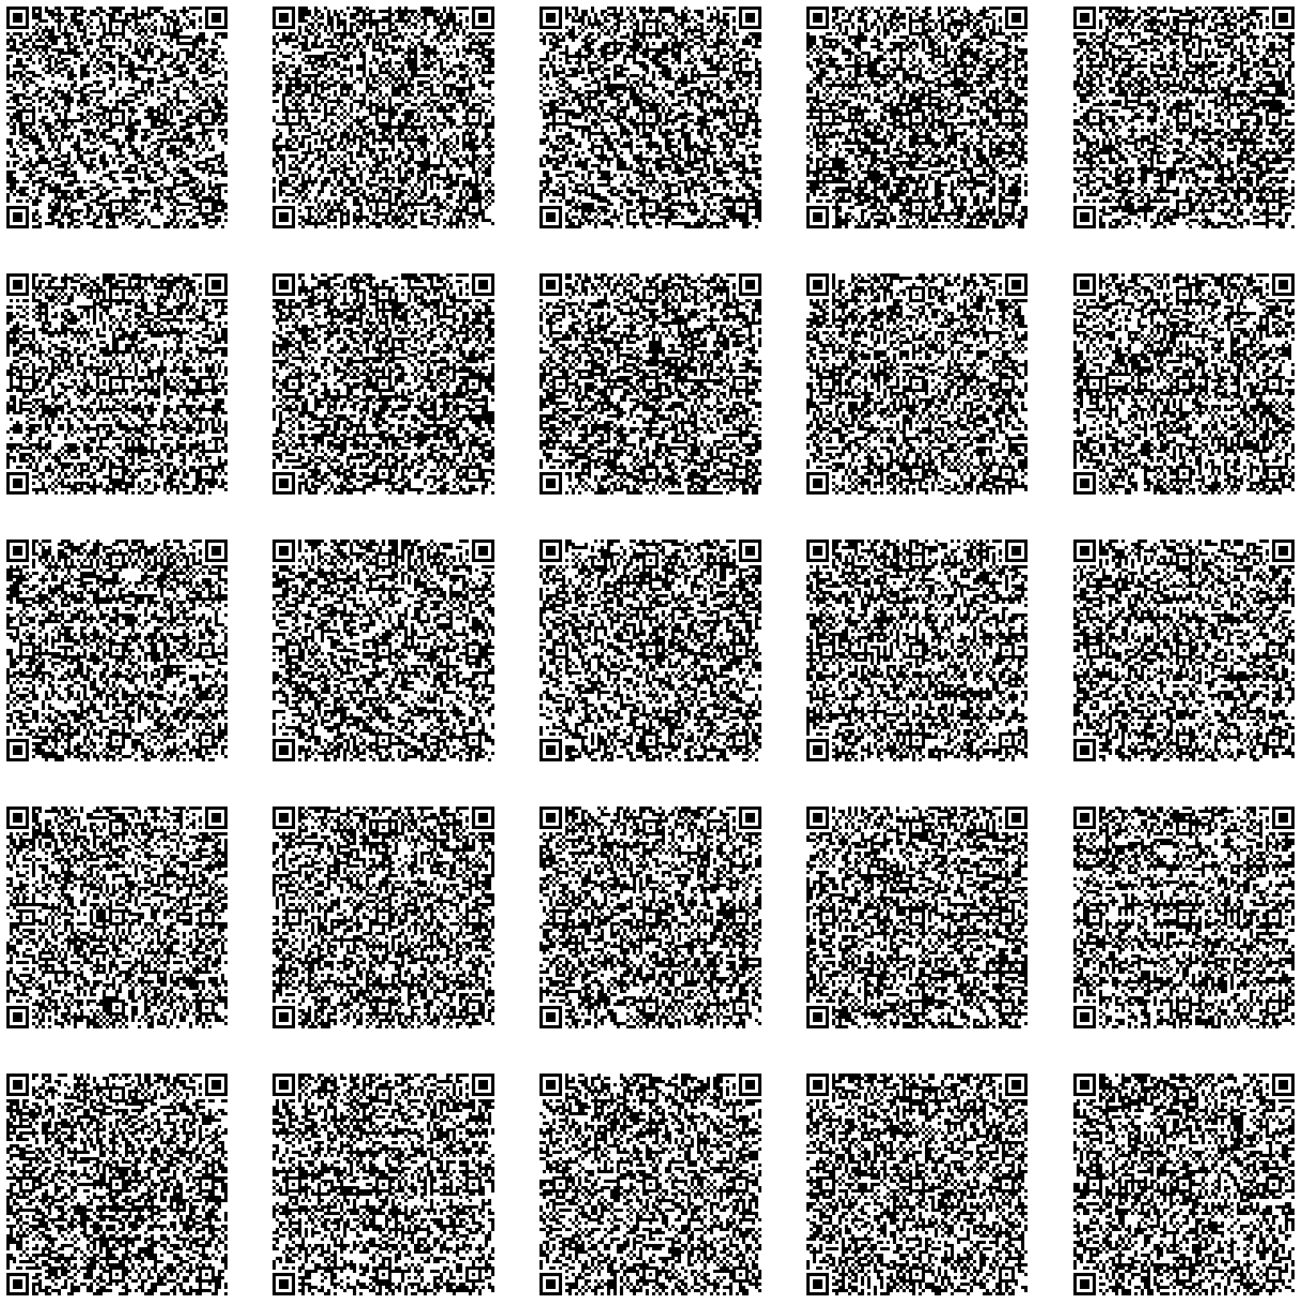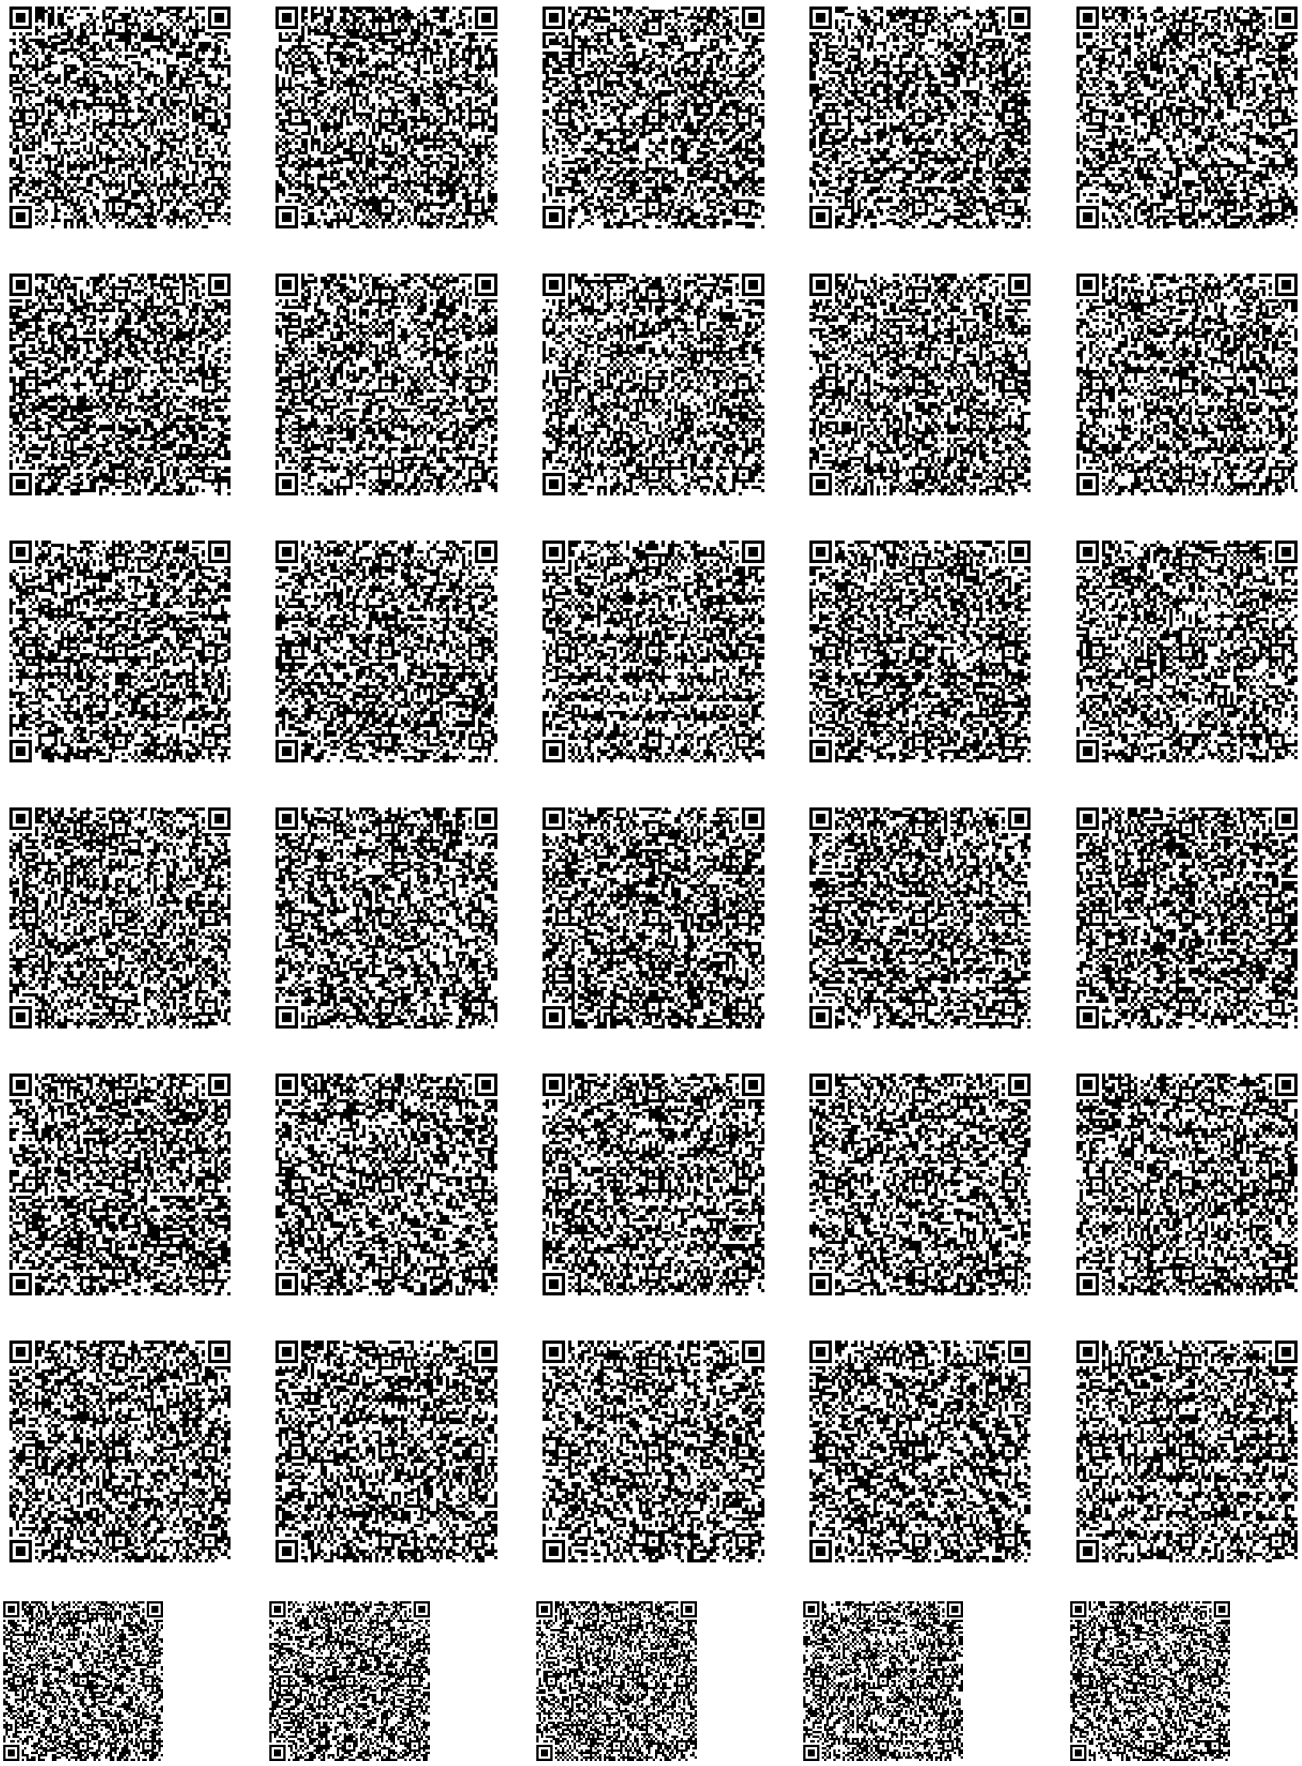
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	16.12.2024 10:20
Представители технического надзора		
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	16.12.2024 10:58
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	16.12.2024 10:56
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	16.12.2024 11:03
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	16.12.2024 11:19
Представители заказчика		
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	16.12.2024 14:12
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	16.12.2024 11:32
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	16.12.2024 11:33 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	16.12.2024 13:33 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
