Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **020140003665 - ТОО Сэт-Сервис**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «КБИ», в г. Кызылорда, Кызылординской области на 600 мест**

Договор подряда (контракт) №: **193 от 24.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Покрытие				
1	1	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	954.9	8 796	8 399 300
2	2	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	572.94	10 323	5 914 459
3	3	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	1.9098	217 858	416 065
4	4	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3819.6	2 888	11 031 004
5	5	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	3819.6	1 248	4 766 860
6	6	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	1006.2	4 673	4 701 972
7	7	255-101-0103РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	1006.2	2 451	2 466 196
8	8	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	313.02	8 796	2 753 324
9	9	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	156.51	10 323	1 615 653
10	10	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м2	1565.1	3 805	5 955 205

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	255-102-0605РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	1540.058	2 400	3 696 138
12	12	7101-0301-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные.	м	537.3	4 069	2 186 273
13	13	255-101-0106РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	537.3	1 374	738 250
14	23	6113-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение игровой разметки спортивных покрытий вручную	м	687.078	519	356 593
15	24	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	84.78	10 323	875 184
16	25	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0.2826	217 858	61 566
17	26	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	565.2	2 888	1 632 297
18	27	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.	м	181.8	4 494	817 009
19	28	255-101-0106РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	181.8	1 374	249 793
20	29	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	378.675	10 323	3 909 061
21	30	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	201.96	29 764	6 011 137
22	31	1147-0402-0201РСНБ РК 2022	Покрытие спортивное рулонное, толщина 12 мм /20мм/. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2524.5	4 652	11 743 974
23	32	255-301-0402РСНБ РК 2022	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	2574.99	10 606	27 310 344
24	33	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.	м	675.9	4 494	3 037 494
25	34	255-101-0106РСНБ РК 2022	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	675.9	1 374	928 686
26	35	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	8.6022	8 796	75 664
27	36	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	4.73121	10 323	48 840

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	37	6109-0306-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	40.176	3 667	147 325
29	38	251-104-0101РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	40.176	8 153	327 555
30	39	6109-0308-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее	м2	2.835	10 123	28 698
31	40	251-104-0102РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	2.835	21 722	61 581
			Итого по локальной смете: Покрытие				**112 263 514**
			ИТОГО по акту:				**112 263 514**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.600%)	112263514.140 x 6.60%	7 409 391
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	112263514.140 + 7409391.826	119 672 905
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска, 0.04985407	112263514.140 x 0.04985407	5 596 793
	Сметная прибыль, 5.00%	119672905.966 x 5.00%	5 983 645
	Непредвиденные расходы, 2.000%	(119672905.966 + 5596793.505) x 2.000%	2 505 393
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		133 758 738
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	133758738.759 x 1.0368	138 681 060
	НДС (12%)	138681060.345 x 12%	16 641 727
	Итого с НДС	138681060.345 + 16641727.241	155 322 787

Лист согласования
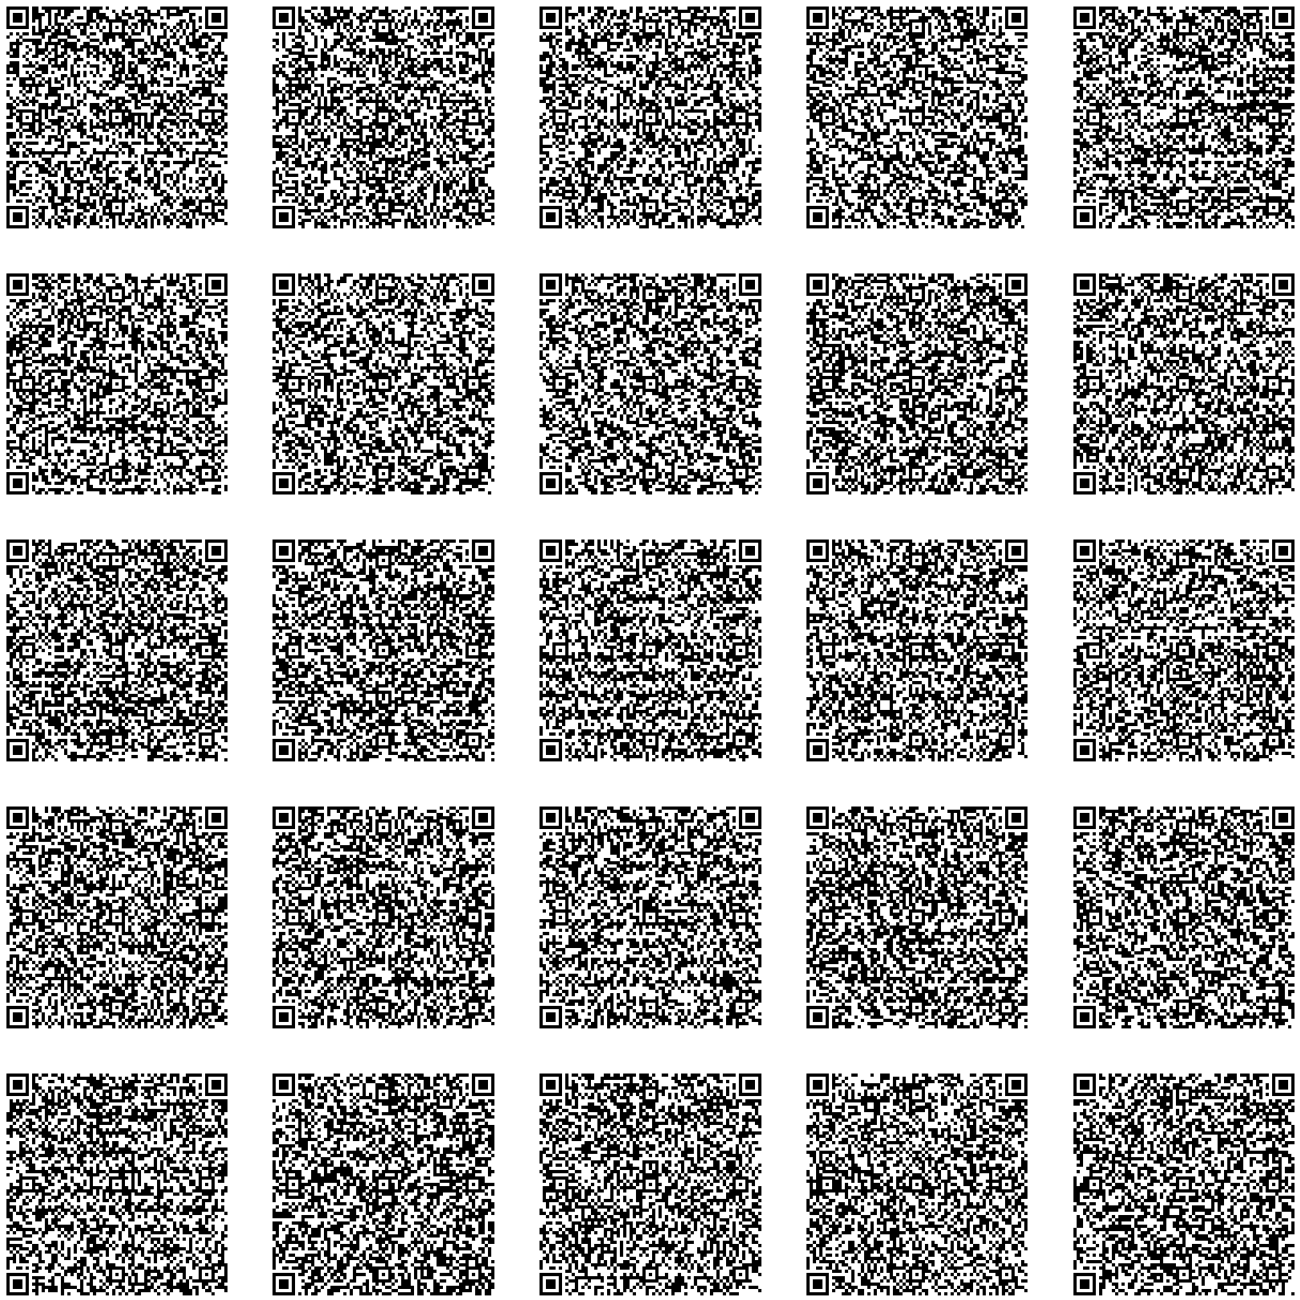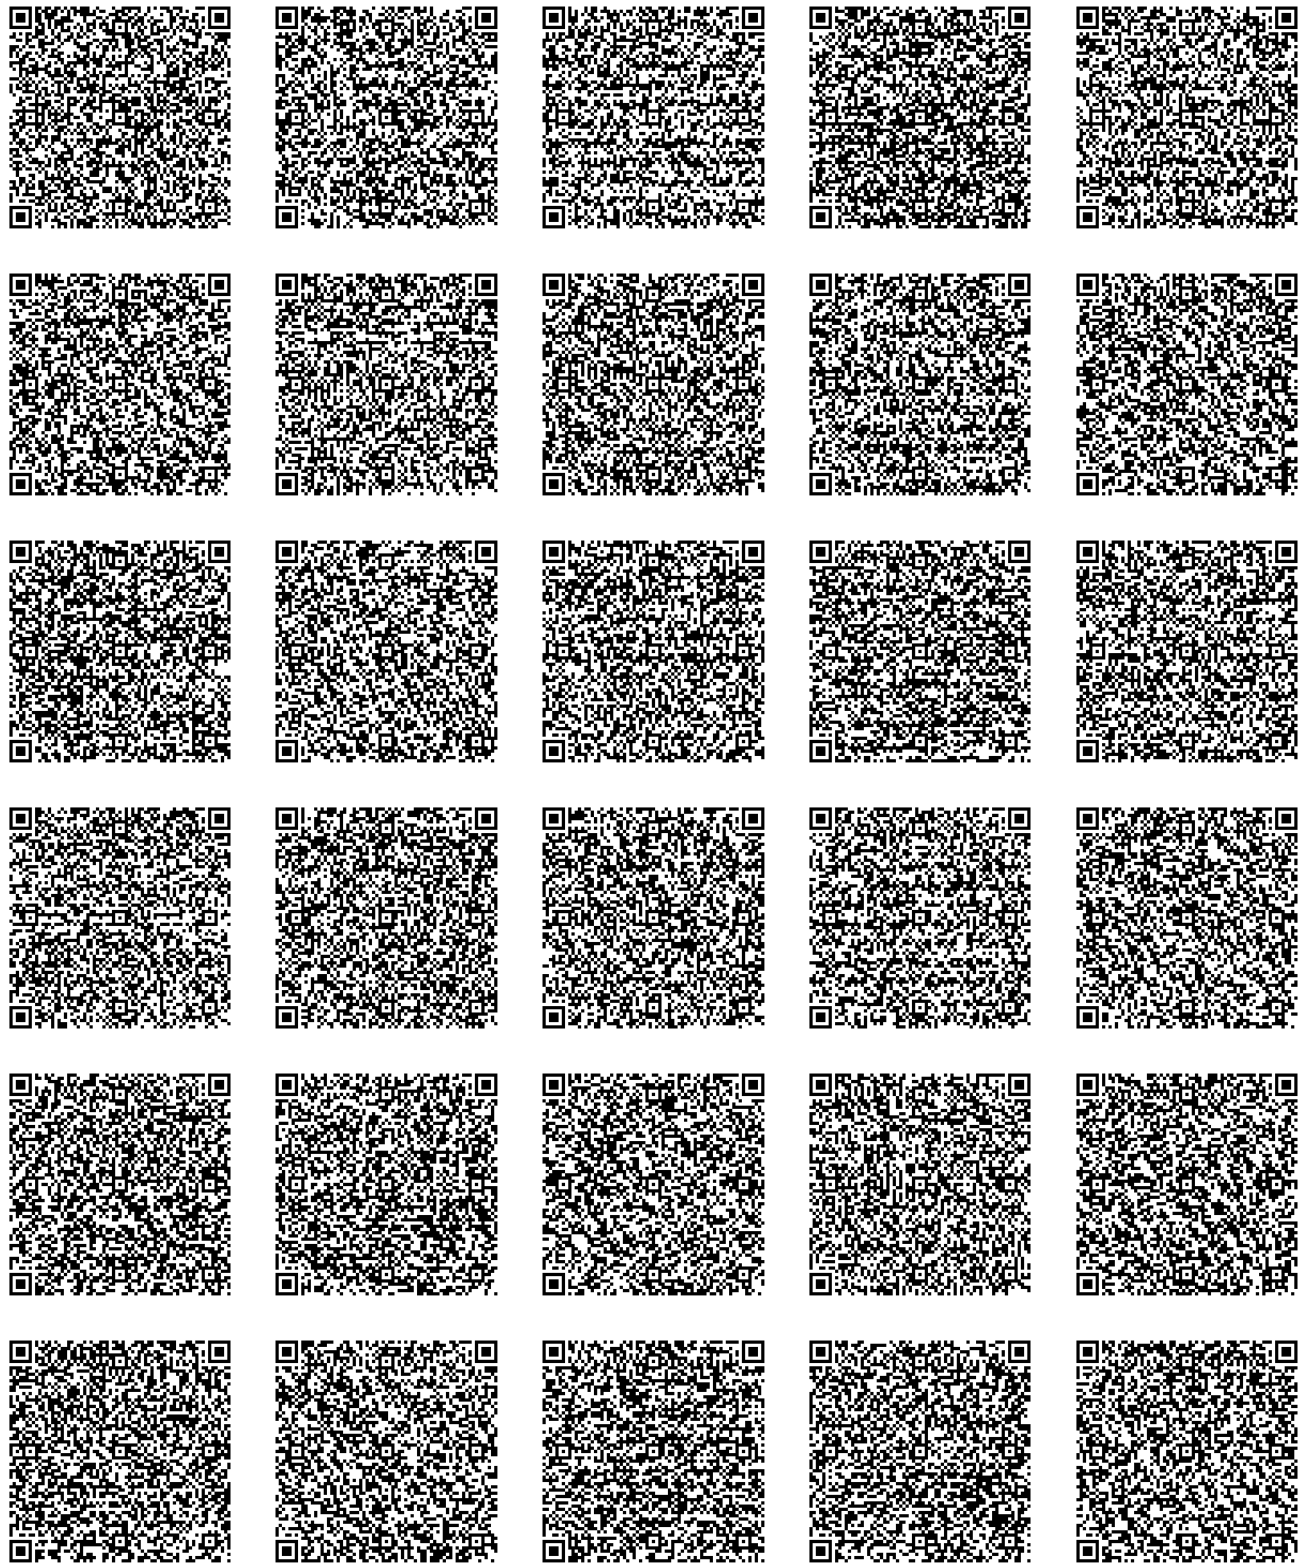
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
601026402459 - ИМАНОВА РОЗА САДИБЕКОВНА	Директор	06.12.2024 13:48
Представители технического надзора		
870501303454 - БЕРДАУЛЕТОВ СУЛТАН КАЙРАТОВИЧ	зам. директор	09.12.2024 08:10
830811301078 - ТУРЕХОДЖАЕВ БЕРИК ТУРСУНБЕКОВИЧ	Технадзор	09.12.2024 07:16
830305301673 - СТАМШАЕВ АСКАР КАДРИЯЕВИЧ	Технический надзор	07.12.2024 12:54
Представители авторского надзора		
900419301054 - ДАБЫЛОВ БАГДАТ БУЛАТОВИЧ	Авторский надзор	08.12.2024 08:58
Представители заказчика		
820209301461 - КОНАКБАЕВ ЕРИК БОЛАТОВИЧ	Ведущий специалист (куратор объекта)	10.12.2024 15:38
780610300592 - АБДУЛАЕВ НУРЛАН ТЫНЫШБАЕВИЧ	Региональный руководитель	11.12.2024 04:17
860524402822 - МИРАМ САЛАУАТ МИРАМҚЫЗЫ	Ведущий специалист (сметчик)	10.12.2024 15:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	начальник сметного отдела	10.12.2024 16:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
