Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" города Костанай на 900 обучающихся в Костанайской области

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за февраль месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	001140004068			**127**	**от 11.08.2023 г.**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.2023 г.; №2 от 28.02.2024 г.; №3 от 16.04.2024 г.; №4 от 19.04.2024 г.; № 5 от 26.07.2024 г.; № 6 от 08.08.2024 г.№7 от 30.12.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	**4 855 968 686**	**778 423 994**	**4 335 686 326,79**				**520 282 359,21**	**4 855 968 686**
в том числе: за февраль месяц 2025года	**309 065 050**	**309 065 050**	**275 950 937,50**				**33 114 112,50**	**309 065 050**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Руководитель управления ТОО "Engineering Services", БИН 130440013597** **Садвакасов Д.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#700a3d1d-5bb6-425f-a507-866ef9c20637)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в микрорайоне "Аэропорт" города Костанай на 900 обучающихся в Костанайской области

Реестр актов выполненных работ
за февраль месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 75	Отопление	41 988 645
2	Акт № 76	Конструкции металлические	12 475 659
3	Акт № 77	Архитектурная часть 1	38 427 573
4	Акт № 78	Архитектурная часть 2	216 173 173
		ИТОГО	**309 065 050**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Технический надзор: **Руководитель управления ТОО "Engineering Services", БИН 130440013597** **Садвакасов Д.Б.**

М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подписано через EQURYLYS.KZ (#700a3d1d-5bb6-425f-a507-866ef9c20637)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Технический надзор: ИИН 861106350093 - САДВАКАСОВ ДАУРЕН null	Руководитель управления	Подписано: 25.02.2025 19:08
Заказчик: ИИН 850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА null	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	Подписано: 25.02.2025 20:28
Генеральный подрядчик: ИИН 910221350048 - КВОН АНТОН null	Директор	Подписано: 25.02.2025 18:42
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления - член Правления	-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#700a3d1d-5bb6-425f-a507-866ef9c20637)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#700a3d1d-5bb6-425f-a507-866ef9c20637)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, г. Костанай, микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **127 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 1				
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ /АС л.3-15,16/25.04				
			Подраздел: Облицовка стен гранитом, 600х600х15мм/п.9,10/				
1	21	6112-0401-0112ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада керамогранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	350.56	19 773	6 931 622
2	22	231-102-0101РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	350.56	8 140	2 853 558
3	23	231-201-0101РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	357.571	13 429	4 801 821
			Итого по подразделу: Облицовка стен гранитом, 600х600х15мм/п.9,10/				**14 587 002**
			Подраздел: Облицовка подпорных стен + накрывочный элемент, гранитной плиткой /п.19,22/				
4	28	6112-0101-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	78.69	27 872	2 193 248
5	29	231-201-0101РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм	м2	80.264	13 429	1 077 865
			Итого по подразделу: Облицовка подпорных стен + накрывочный элемент, гранитной плиткой /п.19,22/				**3 271 113**
			Подраздел: Устройство ступеней, пандусов и площадок крылец из гранитных плит/п.20/				
6	30	6109-0306-0501ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 3 штук	м2	241.54	19 471	4 703 025
7	31	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	247.579	18 095	4 479 942
			Итого по подразделу: Устройство ступеней, пандусов и площадок крылец из гранитных плит/п.20/				**9 182 967**
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ /АС л.3-15,16/25.04				**27 041 082**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 1				**27 041 082**
			ИТОГО по акту:				**27 041 082**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				27041082.000 x 7.30%	1 973 999

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				27041082.000 + 1973999.038	29 015 081
		Сметная прибыль, 5.00%				29015081.038 x 5.00%	1 450 754
		Непредвиденные расходы, 5.000%				29015081.038 x 5.000%	1 450 754
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					31 916 589
		на 4 квартал 2024 г, к = 1.0750				31916589.141 x 1.0750	34 310 333
		НДС (12%)				34310333.327 x 12%	4 117 239
		Итого с НДС				34310333.327 + 4117239.999	38 427 573

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	23.02.2025 06:55
Представители технического надзора		
850504350756 - КОЖАХМЕТОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Технадзор	24.02.2025 05:00
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	24.02.2025 08:07
Представители заказчика		
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.02.2025 11:13
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.02.2025 13:21
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	25.02.2025 06:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	24.02.2025 11:10 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	24.02.2025 11:11

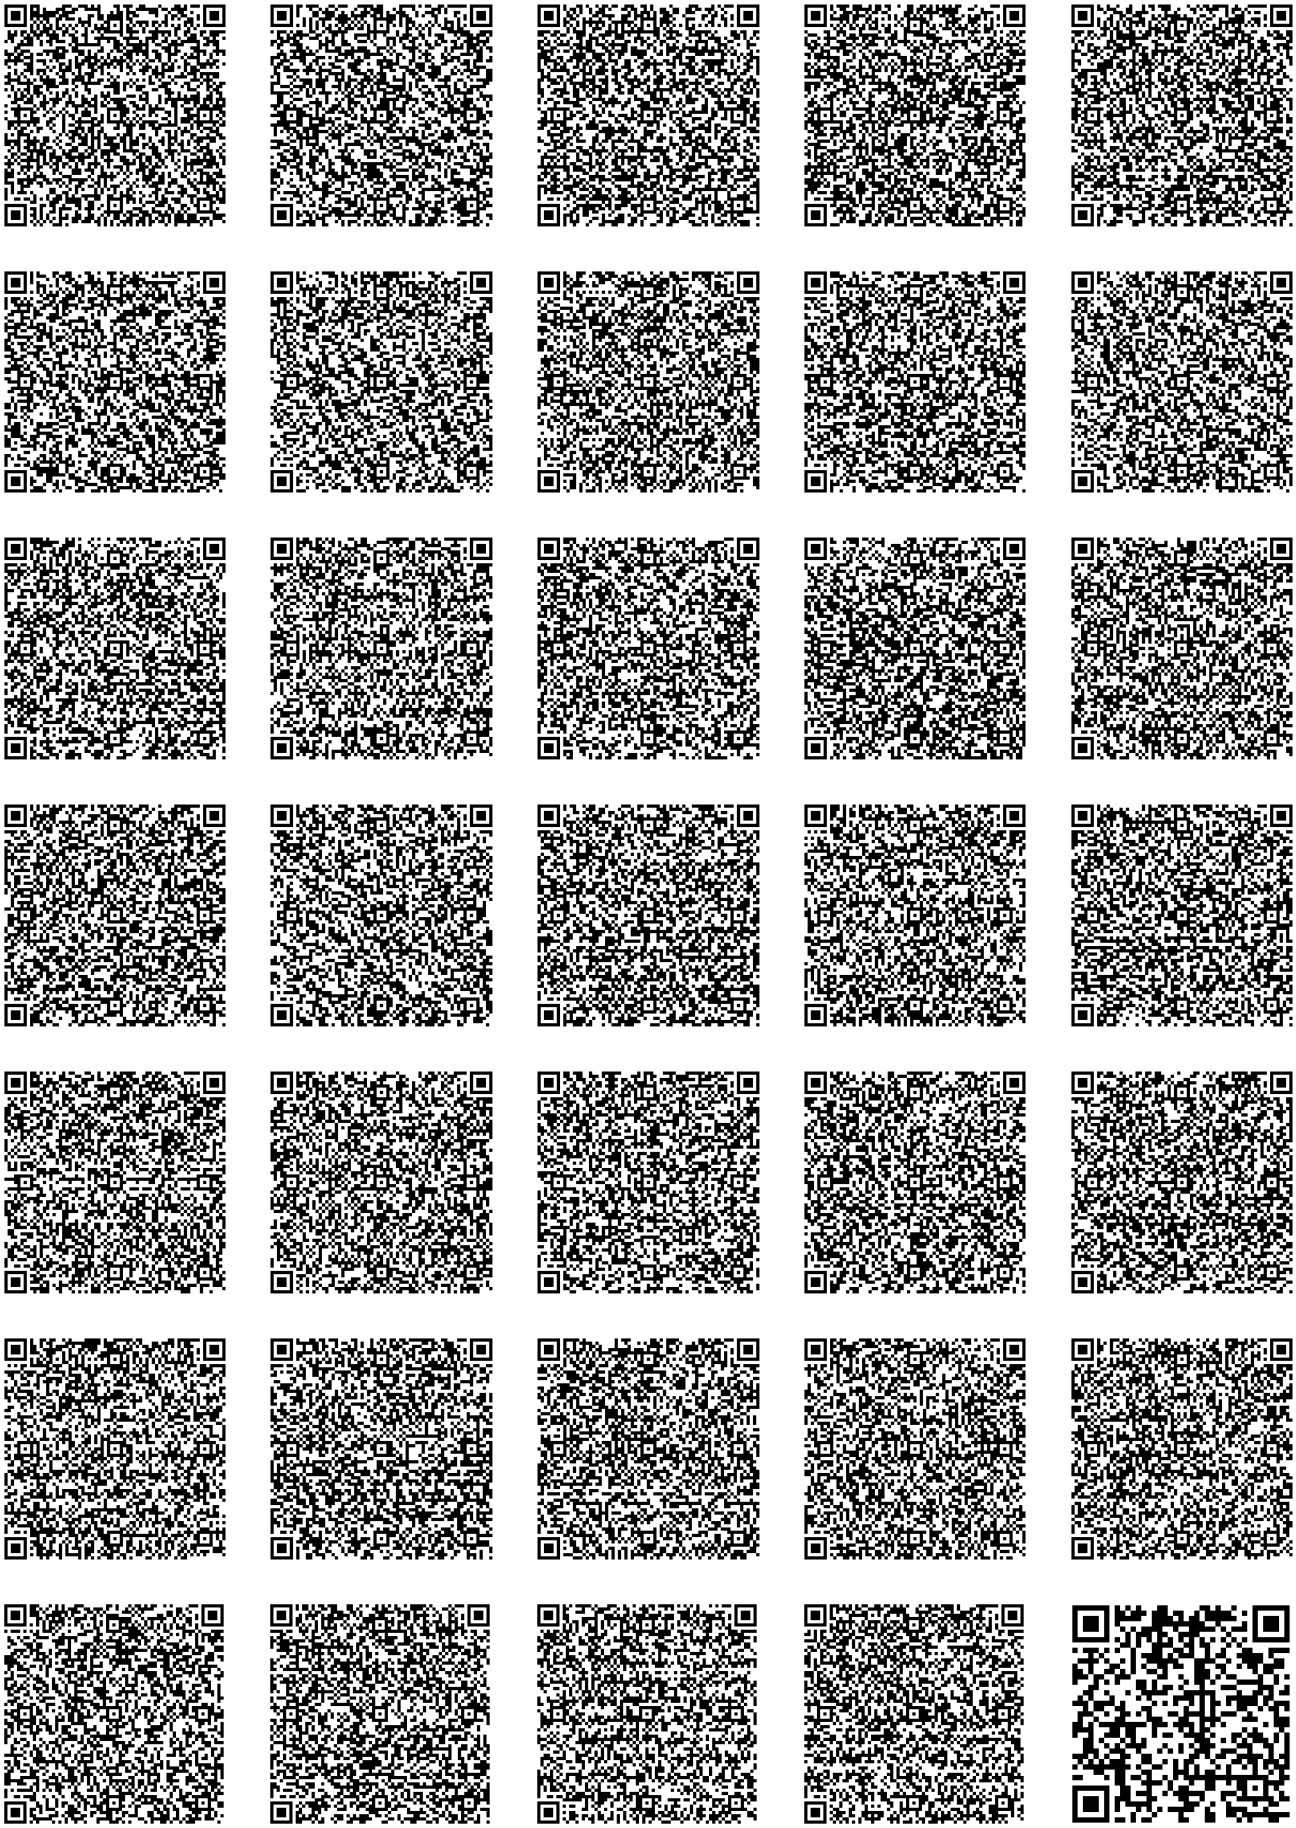

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, г. Костанай, микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **127 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 2				
			Раздел: ПОЛЫ /АР л.98,99/25.04				
			Подраздел: ТИП 05-2030,81м2				
1	55	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных/л.98, примеч.10/ на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1294.97	6 556	8 489 823
2	56	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	1320.881	3 632	4 797 439
			Итого по подразделу: ТИП 05-2030,81м2				**13 287 263**
			Подраздел: ТИП 10-32,16 м2				
3	100	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	32.16	7 289	234 414
4	101	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	32.803	3 083	101 132
			Итого по подразделу: ТИП 10-32,16 м2				**335 546**
			Подраздел: ТИП 11-150,25 м2				
5	109	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	150.25	7 289	1 095 172
6	110	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	153.255	3 083	472 485
			Итого по подразделу: ТИП 11-150,25 м2				**1 567 657**
			Подраздел: ТИП 12-244,43 м2				
7	118	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	244.43	6 949	1 698 544

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	119	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	977.72	192	187 722
9	120	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	249.319	3 083	768 650
			Итого по подразделу: ТИП 12-244,43 м2				**2 654 916**
			Подраздел: ТИП 14-20,51 м2				
10	140	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	20.51	7 289	149 497
11	141	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	20.92	3 083	64 496
			Итого по подразделу: ТИП 14-20,51 м2				**213 993**
			Подраздел: ТИП 15-1994,95 м2				
12	144	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	195.46	6 556	1 281 435
13	145	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	199.371	3 632	724 115
			Итого по подразделу: ТИП 15-1994,95 м2				**2 005 551**
			Подраздел: ТИП 19-110,18 м2				
14	168	6109-0306-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	110.18	6 949	765 641
15	169	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	440.72	192	84 618
16	170	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	112.384	3 083	346 480
			Итого по подразделу: ТИП 19-110,18 м2				**1 196 739**
			Подраздел: ТИП 20-28,94 м2				
17	177	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28.94	6 556	189 731
18	178	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	29.519	3 632	107 213
			Итого по подразделу: ТИП 20-28,94 м2				**296 944**
			Подраздел: ТИП 23"-34,57 м2				
19	193	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие из фанеры/2 слоя по 9мм/ из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	34.57	734	25 374
20	194	215-301-0804РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	71.214	3 982	283 574

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	195	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом/с 2-х сторон 2 слоя/	м2	34.57	1 429	49 401
22	196	6109-0308-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике	м2 покрытия	34.57	2 783	96 208
23	197	233-102-0103РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	35.261	5 559	196 016
			Итого по подразделу: ТИП 23"-34,57 м2				**650 573**
			Подраздел: ТИП 23/2-33,45 м2				
24	202	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие из фанеры/1 слой толщ.9мм/ из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33.45	366	12 243
25	203	215-301-0804РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	34.454	3 982	137 196
26	204	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом/с 2-х сторон/	м2	33.45	714	23 883
27	205	6109-0308-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике	м2 покрытия	33.45	2 783	93 091
28	206	233-102-0103РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	34.119	5 559	189 668
			Итого по подразделу: ТИП 23/2-33,45 м2				**456 081**
			Подраздел: ТИП 28"-17,31 м2				
29	217	6111-0403-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие из фанеры/1 слой толщ.9мм/ из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	17.31	366	6 335
30	218	215-301-0804РСНБ РК 2022	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	м2	17.829	3 982	70 995
31	219	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом/с 2-х сторон/	м2	17.31	714	12 359
32	220	6109-0308-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике	м2 покрытия	17.31	2 783	48 173
33	221	233-102-0103РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	17.656	5 559	98 150
			Итого по подразделу: ТИП 28"-17,31 м2				**236 013**
			Подраздел: ТИП 27-82,16 м2				
34	234	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	82.16	6 556	538 641

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	235	233-202-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м2	83.803	7 380	618 466
			Итого по подразделу: ТИП 27-82,16 м2				**1 157 107**
			Подраздел: ЛИНОЛЕУМ ЗАВОДИМЫЙ НА СТЕНЫ /АР л.98, примеч.10/25.04				
36	243	6109-0308-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из готовых ковров на комнату. Устройство на мастике	м2 покрытия	27.05	2 783	75 280
37	244	233-102-0103РСНБ РК 2022	Ковролин искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33	м2	27.591	5 559	153 378
38	245	6109-0308-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м2 покрытия	193.24	1 406	271 695
39	246	233-101-0105РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 33, 34	м2	158.246	5 214	825 095
40	247	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный/антистат./ ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	35.641	3 354	119 540
41	248	233-101-0110РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	3.12	6 147	19 179
42	249	233-101-0302РСНБ РК 2022	Линолеум натуральный/танцевальный/ на джутовой основе коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34	м2	3.886	10 338	40 173
			Итого по подразделу: ЛИНОЛЕУМ ЗАВОДИМЫЙ НА СТЕНЫ /АР л.98, примеч.10/25.04				**1 504 340**
			Итого по разделу: ПОЛЫ /АР л.98,99/25.04				**25 562 723**
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/01.03,26.04				
			Подраздел: Тамбуры. Потолки				
43	262	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	56.39	2 369	133 588
44	263	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	56.39	1 516	85 487
			Итого по подразделу: Тамбуры. Потолки				**219 075**
			Подраздел: Тамбуры. Стены				
45	266	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности по полимерной сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	106.36	7 050	749 838
46	267	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	114.869	145	16 656
47	268	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	28.5	4 882	139 137
48	269	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	137.77	1 697	233 796

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	270	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	137.77	1 356	186 816
			Итого по подразделу: Тамбуры. Стены				**1 326 243**
			Подраздел: Вестибюль, холл, лифтовый холл и др. Стены				
50	276	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1365.34	1 697	2 316 982
51	277	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1446.52	1 356	1 961 481
			Итого по подразделу: Вестибюль, холл, лифтовый холл и др. Стены				**4 278 463**
			Подраздел: Кухня: производственные помещения, помещ. холодильных камер и др. Потолки				
52	307	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	350.77	3 354	1 176 483
53	308	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми /моющая/водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	350.77	1 398	490 376
54	309	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми /моющая/водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	350.77	752	263 779
			Итого по подразделу: Кухня: производственные помещения, помещ. холодильных камер и др. Потолки				**1 930 638**
			Подраздел: Кухня: производственные помещения, помещ. холодильных камер и др. Стены				
55	312	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	533.69	1 697	905 672
56	313	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	544.28	1 356	738 044
57	314	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	580.2	8 014	4 649 723
58	315	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2320.8	192	445 594
59	316	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	591.804	3 233	1 913 302
			Итого по подразделу: Кухня: производственные помещения, помещ. холодильных камер и др. Стены				**8 652 335**
			Подраздел: Кухня: гардеробные персонала, кабинет заведующего и др. Потолки				
60	317	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	22.06	3 354	73 989

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	318	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми/моющая/ водоэмульсионным составом за один раз, потолок, подготовленный под окраску	м2	22.06	1 398	30 840
62	319	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми/моющая/ водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	22.06	752	16 589
			Итого по подразделу: Кухня: гардеробные персонала, кабинет заведующего и др. Потолки				**121 418**
			Подраздел: Кухня: гардеробные персонала, кабинет заведующего и др. Стены				
63	322	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	81.63	1 697	138 526
64	323	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	81.63	1 356	110 690
65	324	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	0.96	8 354	8 020
66	325	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	0.979	3 233	3 165
			Итого по подразделу: Кухня: гардеробные персонала, кабинет заведующего и др. Стены				**260 401**
			Подраздел: Кухня: душевая, санузлы и ПУИ. Стены				
67	328	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	16.81	1 697	28 527
68	329	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	16.81	1 356	22 794
69	330	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	23	8 014	184 322
70	331	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	92	192	17 664
71	332	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	23.46	3 233	75 846
			Итого по подразделу: Кухня: душевая, санузлы и ПУИ. Стены				**329 153**
			Подраздел: Столовая: зона раздаточной. Потолки				
72	333	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей нагипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	м2	32.64	2 369	77 324
73	334	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	32.64	1 516	49 482
			Итого по подразделу: Столовая: зона раздаточной. Потолки				**126 806**
			Подраздел: Столовая: зона раздаточной. Стены				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	337	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	26.32	1 697	44 665
75	338	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	30.22	1 356	40 978
76	339	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	27.52	8 354	229 902
77	340	231-302-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	28.07	4 732	132 827
			Итого по подразделу: Столовая: зона раздаточной. Стены				**448 372**
			Подраздел: Столовая: обеденный зал и др. Потолки				
78	341	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	357.06	3 354	1 197 579
79	342	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	357.06	1 516	541 303
			Итого по подразделу: Столовая: обеденный зал и др. Потолки				**1 738 882**
			Подраздел: Столовая: обеденный зал и др. Стены				
80	347	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	371.77	4 882	1 814 981
81	348	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	450.01	1 697	763 667
82	349	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	458.54	1 356	621 780
			Итого по подразделу: Столовая: обеденный зал и др. Стены				**3 200 428**
			Подраздел: Столовая: умывальные при обеденном зале. Потолки				
83	350	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	34.85	3 354	116 887
84	351	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	34.85	1 516	52 833
			Итого по подразделу: Столовая: умывальные при обеденном зале. Потолки				**169 720**
			Подраздел: Столовая: умывальные при обеденном зале. Стены				
85	352	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	39.06	4 076	159 209

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	353	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	27.9	4 882	136 208
87	354	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	33.47	1 697	56 799
88	355	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	37.36	1 356	50 660
89	356	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	44.85	8 354	374 677
90	357	231-302-0203РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм	м2	45.747	4 732	216 475
			Итого по подразделу: Столовая: умывальные при обеденном зале. Стены				**994 028**
			Подраздел: ПУИ и др. Потолки				
91	358	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	29.97	3 354	100 519
92	359	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	29.97	1 516	45 435
			Итого по подразделу: ПУИ и др. Потолки				**145 954**
			Подраздел: ПУИ и др. Стены				
93	360	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	88.73	4 076	361 663
94	361	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	57.03	4 882	278 420
95	362	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	62.36	1 697	105 825
96	363	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	65.26	1 356	88 493
97	364	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	93.31	8 014	747 786
98	365	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	373.24	192	71 662
99	366	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	95.176	3 083	293 428
			Итого по подразделу: ПУИ и др. Стены				**1 947 277**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ПЛИНТУСА 1 ЭТАЖ/				
100	367	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	866.2	1 340	1 160 708
101	368	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических	м	50.82	1 349	68 556
102	370	231-302-0401РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	874.862	1 977	1 729 602
103	371	233-202-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5.133	3 083	15 825
			Итого по подразделу: ПЛИНТУСА 1 ЭТАЖ/				**2 974 691**
			Подраздел: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации и др. Потолки				
104	373	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей нагипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	м2	474.3	2 369	1 123 617
105	374	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	474.3	1 516	719 039
			Итого по подразделу: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации и др. Потолки				**1 842 656**
			Подраздел: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации и др. Стены.				
106	378	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1546.34	1 356	2 096 837
			Итого по подразделу: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации и др. Стены.				**2 096 837**
			Подраздел: Учебные классы, лаборантские и др. Потолки.				
107	388	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	м2	94.6	3 354	317 288
108	389	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	589.45	1 516	893 606
			Итого по подразделу: Учебные классы, лаборантские и др. Потолки.				**1 210 894**
			Подраздел: Учебные классы, лаборантские и др. Стены.				
109	393	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	982.47	1 356	1 332 229
			Итого по подразделу: Учебные классы, лаборантские и др. Стены.				**1 332 229**
			Подраздел: Кабинеты преподавателей физкультуры и др. Стены.				
110	397	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	65.52	1 697	111 187

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	398	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	251.56	1 356	341 115
			Итого по подразделу: Кабинеты преподавателей физкультуры и др. Стены.				**452 302**
			Подраздел: Гардероб при актовом зале. Потолки.				
112	399	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей нагипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	м2	27.83	2 369	65 929
113	400	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	27.83	1 516	42 190
			Итого по подразделу: Гардероб при актовом зале. Потолки.				**108 119**
			Подраздел: Гардероб при актовом зале. Стены.				
114	402	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	45.53	1 697	77 264
115	403	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	45.53	1 356	61 738
			Итого по подразделу: Гардероб при актовом зале. Стены.				**139 003**
			Подраздел: Спортивные залы. Стены.				
116	404	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	1907.34	4 882	9 311 634
117	405	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1907.34	1 697	3 236 756
118	406	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1907.34	1 356	2 586 353
			Итого по подразделу: Спортивные залы. Стены.				**15 134 743**
			Подраздел: Актовый зал. Стены.				
119	407	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	359.4	4 882	1 754 590
			Итого по подразделу: Актовый зал. Стены.				**1 754 590**
			Подраздел: Раздевалки при спортзалах. Потолки				
120	410	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	121.53	3 354	407 612
121	411	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	121.53	1 516	184 239

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Раздевалки при спортзалах. Потолки				**591 851**
			Подраздел: Раздевалки при спортзалах. Стены.				
122	412	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	326.58	4 882	1 594 364
123	413	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	343.96	1 697	583 700
124	414	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми/моющая/ водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	354.84	1 199	425 453
125	415	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми/моющая/ водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	354.84	618	219 291
			Итого по подразделу: Раздевалки при спортзалах. Стены.				**2 822 808**
			Подраздел: ПУИ. Стены.				
126	423	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	60.24	8 014	482 763
127	424	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	240.96	192	46 264
128	425	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	61.445	3 233	198 652
			Итого по подразделу: ПУИ. Стены.				**727 679**
			Подраздел: ПЛИНТУСА 2 ЭТАЖ				
129	426	6109-0401-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из керамогранита	м	240.64	1 340	322 457
130	427	6109-0401-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного/мягкого/ на мастике	м	236.15	562	132 716
131	429	231-302-0401РСНБ РК 2022	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	243.053	1 977	480 515
132	430	233-204-0104РСНБ РК 2022	Плинтус полимерный/мягкий/	м	238.512	1 273	303 626
			Итого по подразделу: ПЛИНТУСА 2 ЭТАЖ				**1 239 315**
			Подраздел: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации, коворкинг и др. Потолки				
133	432	6112-0301-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей нагипсовой основе под чистовую отделку облицованного гипсокартонными листами	м2	94.46	2 369	223 775
134	433	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	94.46	1 516	143 201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации, коворкинг и др. Потолки				**366 977**
			Подраздел: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации, коворкинг и др. Стены				
135	437	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	598.34	1 356	811 349
			Итого по подразделу: Холл, лифтовый холл, коридоры, рекреации, коворкинг и др. Стены				**811 349**
			Подраздел: Санузлы для учеников, персонала и МГН. Стены				
136	442	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	130.15	1 697	220 865
137	443	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	141.24	1 356	191 521
138	444	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	245.79	8 014	1 969 761
139	445	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	983.16	192	188 767
140	446	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	250.706	3 233	810 532
			Итого по подразделу: Санузлы для учеников, персонала и МГН. Стены				**3 381 446**
			Подраздел: Учебные классы, лаборантские, раздевалки, STEM-лаборатория и др. Потолки				
141	448	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	550.77	1 516	834 967
			Итого по подразделу: Учебные классы, лаборантские, раздевалки, STEM-лаборатория и др. Потолки				**834 967**
			Подраздел: Учебные классы, лаборантские, раздевалки, STEM-лаборатория и др. Стены				
142	452	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1051.69	1 356	1 426 091
			Итого по подразделу: Учебные классы, лаборантские, раздевалки, STEM-лаборатория и др. Стены				**1 426 091**
			Подраздел: ПУИ. Потолки.				
143	455	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	11.91	3 354	39 946
144	456	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	1101.54	1 516	1 669 935
			Итого по подразделу: ПУИ. Потолки.				**1 709 881**
			Подраздел: ПУИ. Стены				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	459	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	22.62	1 697	38 386
146	460	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	26.85	1 356	36 409
147	461	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	39.62	8 014	317 515
148	462	232-502-0102РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	158.48	192	30 428
149	463	232-201-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	40.412	3 233	130 652
			Итого по подразделу: ПУИ. Стены				**553 390**
			Подраздел: Раздевалка при зале хореографии. Потолки				
150	464	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	21.82	3 354	73 184
151	465	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	21.82	1 516	33 079
			Итого по подразделу: Раздевалка при зале хореографии. Потолки				**106 263**
			Подраздел: Раздевалка при зале хореографии. Стены				
152	467	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	74.88	1 697	127 071
153	468	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	71.2	1 356	96 547
154	469	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми/моющая/ водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	8.27	1 199	9 916
155	470	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми/моющая/ водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	8.27	618	5 111
			Итого по подразделу: Раздевалка при зале хореографии. Стены				**238 645**
			Подраздел: Лестничные клетки. Потолки				
156	471	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	455.07	3 354	1 526 305
157	472	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	455.07	1 516	689 886
			Итого по подразделу: Лестничные клетки. Потолки				**2 216 191**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Лестничные клетки. Стены.				
158	474	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1116.31	1 697	1 894 378
159	475	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1116.31	1 356	1 513 716
			Итого по подразделу: Лестничные клетки. Стены.				**3 408 094**
			Подраздел: ОТКОСЫ ОБЩИЕ/л.100-104, примеч.5,17,15,14/04.12,13.02,01.03,13,03				
160	480	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	м2	1223.68	5 375	6 577 280
161	481	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1223.68	1 697	2 076 585
162	482	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	1223.68	1 356	1 659 310
			Итого по подразделу: ОТКОСЫ ОБЩИЕ/л.100-104, примеч.5,17,15,14/04.12,13.02,01.03,13,03				**10 313 175**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/01.03,26.04				**83 683 382**
			Раздел: СИСТЕМЫ КНАУФ/АР л.105/13.02,26.04				
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-А, D=87,5/				
163	488	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	547.36	5 527	3 025 259
164	489	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	574.728	764	439 092
165	490	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	547.36	1 878	1 027 942
166	491	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	28.189	15 111	425 964
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-А, D=87,5/				**4 918 257**
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-Н2, D=87,5/				
167	492	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	209.55	5 527	1 158 183
168	493	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	220.028	925	203 526
169	494	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	209.55	1 878	393 535

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
170	495	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	10.792	15 111	163 078
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-Н2, D=87,5/				**1 918 322**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С111/ГСП-А, D=125/				
171	496	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	502.13	7 353	3 692 161
172	497	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	38.791	15 111	586 170
173	498	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	1054.473	764	805 617
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С111/ГСП-А, D=125/				**5 083 949**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С131.2/Файерборд и ГСП-А, D=100/				
174	499	6107-0201-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	м2	194.97	7 182	1 400 275
175	500	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	10.041	15 111	151 730
176	501	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	204.719	764	156 405
177	502	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	204.719	1 080	221 097
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С131.2/Файерборд и ГСП-А, D=100/				**1 929 507**
			Подраздел: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С115.1/ГСП-А, D=155/				
178	503	6107-0201-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной перегородки на двойном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 155-255 мм, глухой	м2	42.87	15 844	679 232
179	504	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	2.208	15 111	33 365
			Итого по подразделу: ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОНА С115.1/ГСП-А, D=155/				**712 597**
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНОМ П113/ГСП-А, D72,5/				
180	507	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	81.02	6 797	550 693
181	508	232-101-0101РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	83.451	688	57 414
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНОМ П113/ГСП-А, D72,5/				**608 107**
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНОМ П113/ГСП-Н2, D72,5/				
182	509	6107-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2	20.74	6 797	140 970

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
183	510	232-101-0201РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	21.362	1 033	22 067
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНОМ П113/ГСП-Н2, D72,5/				**163 037**
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНОМ П-232/D72,5, Файерборд/				
184	511	6107-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонного потолка на двухуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	м2 потолка	679.76	6 495	4 415 041
185	512	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	679.76	1 878	1 276 589
186	513	232-101-0301РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	700.158	536	375 284
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОНОМ П-232/D72,5, Файерборд/				**6 066 915**
			Подраздел: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ РЕЕЧНЫЕ				
187	516	6112-0501-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, ячеистых, со сборкой панелей	м2	398.05	13 775	5 483 139
			Итого по подразделу: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ РЕЕЧНЫЕ				**5 483 139**
			Подраздел: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ КАССЕТНЫЕ/Armstrong Bioguard, медицинского назначения/				
188	517	1134-0108-1002РСНБ РК 2022	Потолки подвесные из алюминиевых панелей. Устройство	м2 поверхности	99.26	22 653	2 248 537
189	518	232-401-0102РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	99.26	5 534	549 305
			Итого по подразделу: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ КАССЕТНЫЕ/Armstrong Bioguard, медицинского назначения/				**2 797 842**
			Подраздел: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ КАССЕТНЫЕ/Armstrong тип 1/				
190	519	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	118.64	6 056	718 483
191	520	232-401-0102РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	118.64	5 534	656 553
			Итого по подразделу: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ КАССЕТНЫЕ/Armstrong тип 1/				**1 375 037**
			Подраздел: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ КАССЕТНЫЕ/Armstrong тип 2/				
192	521	6112-0501-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	443.73	6 056	2 687 229
193	522	232-401-0102РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	443.73	5 534	2 455 602
			Итого по подразделу: ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ КАССЕТНЫЕ/Armstrong тип 2/				**5 142 831**
			Итого по разделу: СИСТЕМЫ КНАУФ/АР л.105/13.02,26.04				**36 199 541**
			Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА БЛОКИ А, Б, В/АР л.122,123,124/01.03,26.04				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	694	6107-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	м2	219.87	6 051	1 330 433
195	695	215-301-0901РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 16 мм	м2	241.857	6 477	1 566 508
196	696	6108-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора, фрамужный	комплект	73	5 429	396 317
197	697	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ручки с замками для сантехнических кабин	шт.	73	5 471	399 416
198	698	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столешниц из ПВХ/на кронштейнах/ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	39.52	4 457	176 141
199	699	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столешница акриловая шириной 500мм/для санузлов/	м.п.	40.31	49 226	1 984 323
			Подраздел: ПОРУЧНИ В САНУЗЛАХ/АР л.100, примеч.7/				
200	700	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	32	1 647	52 704
201	701	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поручень из нержавеющей стали Vitra 320-3014/для санузлов МГН/	шт.	16	17 438	279 023
202	702	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поручень из нержавеющей стали Vitra Arkitekta 320-3010/60см для санузлов МГН/	шт.	16	30 518	488 290
			Итого по подразделу: ПОРУЧНИ В САНУЗЛАХ/АР л.100, примеч.7/				**820 017**
			Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА БЛОКИ А, Б, В/АР л.122,123,124/01.03,26.04				**6 673 156**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 2				**152 118 804**
			ИТОГО по акту:				**152 118 804**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	152118804.115 x 7.30%	11 104 672
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	152118804.115 + 11104672.991	163 223 477
	Сметная прибыль, 5.00%	163223477.105 x 5.00%	8 161 173
	Непредвиденные расходы, 5.000%	163223477.105 x 5.000%	8 161 173
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		179 545 824
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г.,, к = 1.0750	179545824.816 x 1.0750	193 011 761
	НДС (12%)	193011761.677 x 12%	23 161 411
	Итого с НДС	193011761.677 + 23161411.401	216 173 173

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	21.02.2025 09:38
Представители технического надзора		
850504350756 - КОЖАХМЕТОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Технадзор	21.02.2025 12:39
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	21.02.2025 10:27
Представители заказчика		
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	25.02.2025 06:44 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	24.02.2025 09:48 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	24.02.2025 09:52
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.02.2025 10:02
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.02.2025 13:18

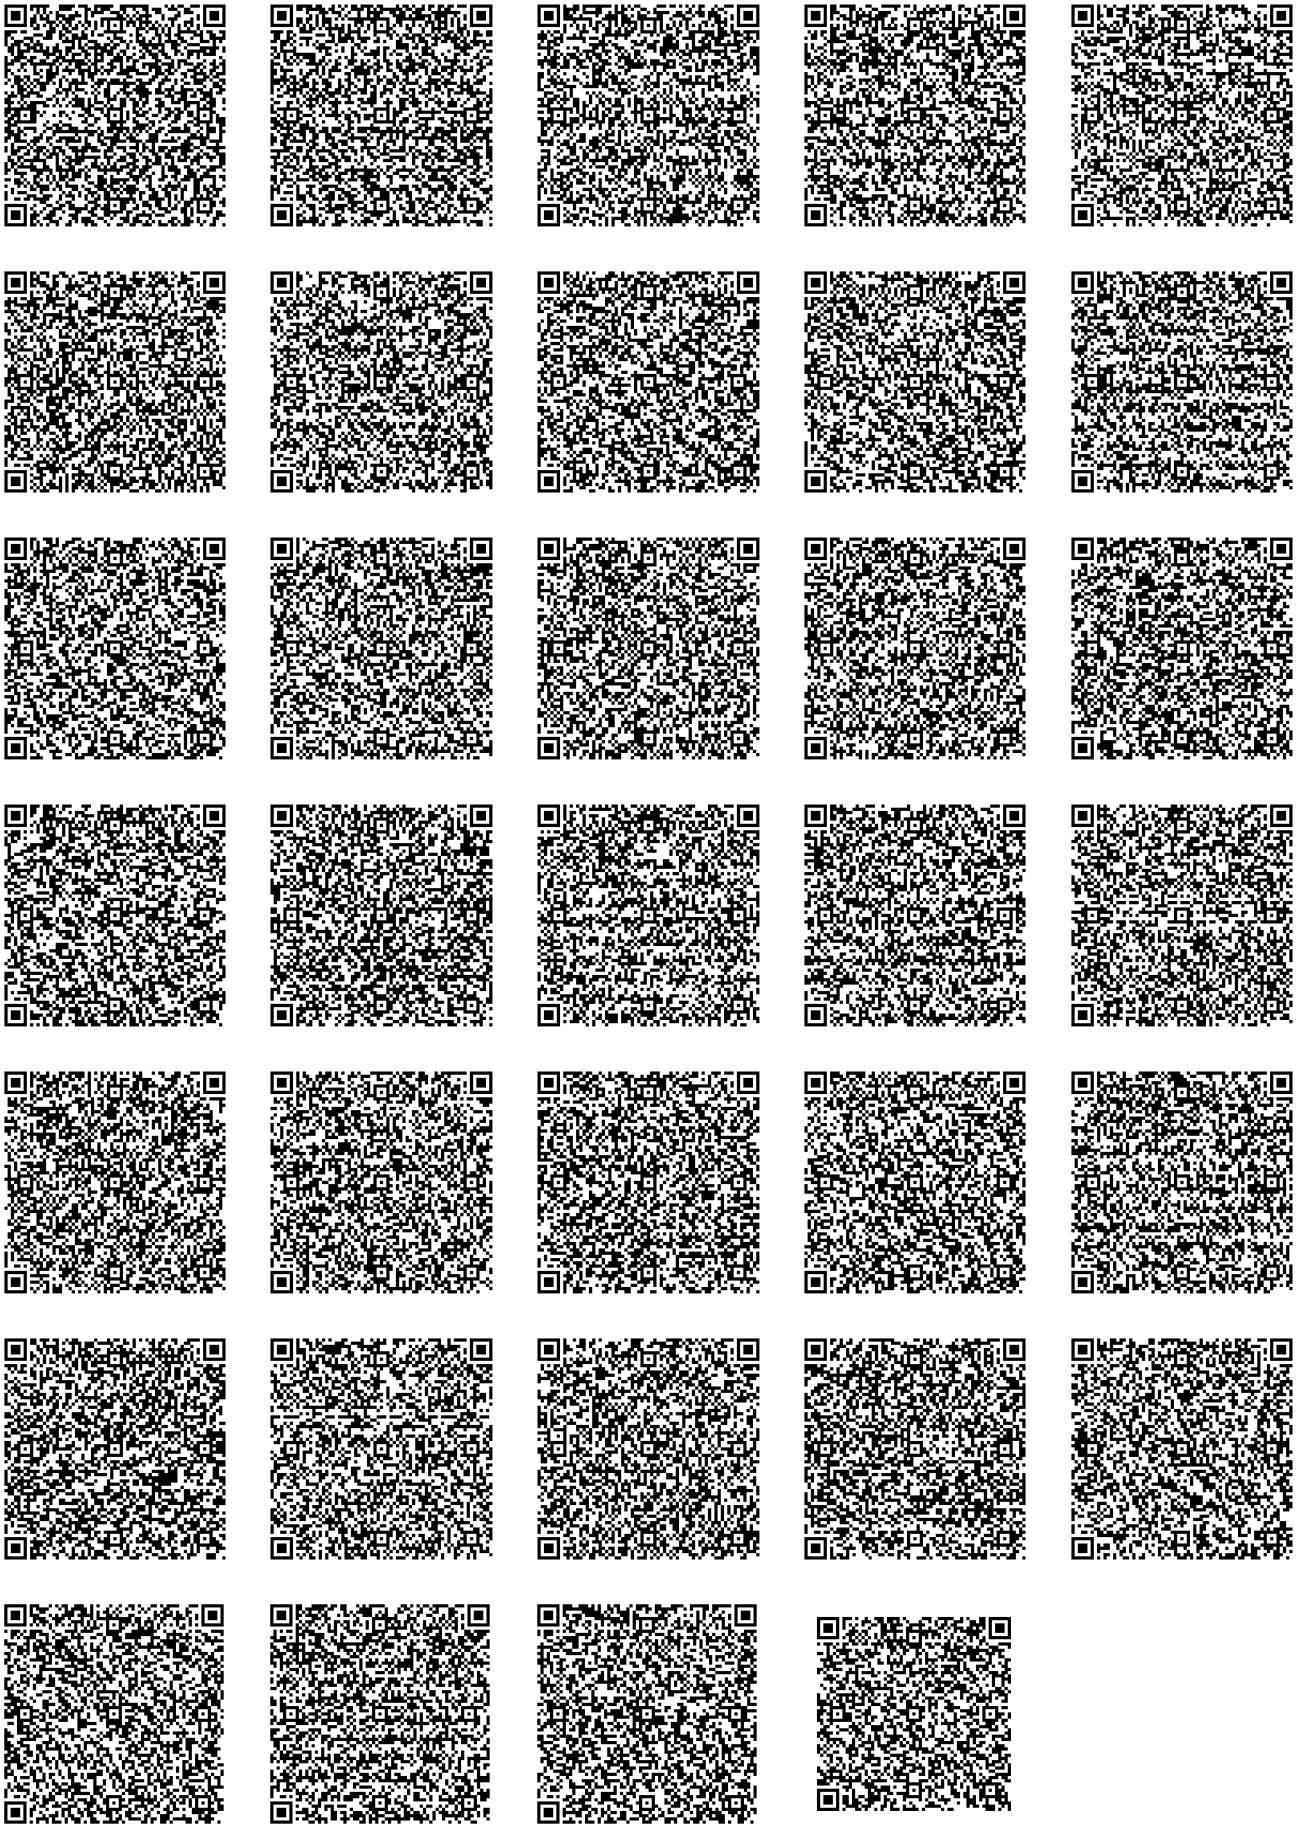

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, г. Костанай, микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **127 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции металлические				
			Раздел: КРОВЛЯ /л.7/				
			Подраздел: Огнезащита				
1	17	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1642	203	333 325
2	18	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	1642	2 388	3 921 096
			Итого по подразделу: Огнезащита				**4 254 421**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.7/				**4 254 421**
			Раздел: КРОВЛЯ /л.8/				
			Подраздел: Огнезащита				
3	35	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	502	203	101 906
4	36	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	502	2 388	1 198 776
			Итого по подразделу: Огнезащита				**1 300 682**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.8/				**1 300 682**
			Раздел: КРОВЛЯ /л.11/				
			Подраздел: Огнезащита				
5	53	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	493	203	100 078
6	54	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	493	2 388	1 177 284
			Итого по подразделу: Огнезащита				**1 277 363**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.11/				**1 277 363**
			Раздел: КРОВЛЯ /л.14/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Огнезащита				
7	71	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	534	203	108 401
8	72	6111-0501-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	534	2 388	1 275 192
			Итого по подразделу: Огнезащита				**1 383 594**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /л.14/				**1 383 594**
			Раздел: ТРЕБУНА /л.17/				
			Подраздел: Огнезащита				
9	83	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	104	265	27 560
10	84	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	104	203	21 112
11	85	6111-0501-0604ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	м2	104	6 488	674 751
			Итого по подразделу: Огнезащита				**723 424**
			Итого по разделу: ТРЕБУНА /л.17/				**723 424**
			Итого по локальной смете: Конструкции металлические				**8 939 486**
			ИТОГО по акту:				**8 939 486**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)			8939486.007 x 7.30%	652 582
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			8939486.007 + 652582.496	9 592 068
			Сметная прибыль, 5.00%			9592068.503 x 5.00%	479 603
			Непредвиденные расходы, 5.000%			9592068.503 x 5.000%	479 603
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				10 551 275
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, III квартал 2024 г.,, к = 1.0557			10551275.353 x 1.0557	11 138 981
			НДС (12%)			11138981.390 x 12%	1 336 677
			Итого с НДС			11138981.390 + 1336677.767	12 475 659

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	20.02.2025 12:38
Представители технического надзора		
850504350756 - КОЖАХМЕТОВ КАНАТ КАЙРОЛЛАЕВИЧ	Технадзор	21.02.2025 11:15
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	21.02.2025 06:29
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	22.02.2025 06:15 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	22.02.2025 06:23
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	22.02.2025 06:25
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	24.02.2025 08:17 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.02.2025 13:32

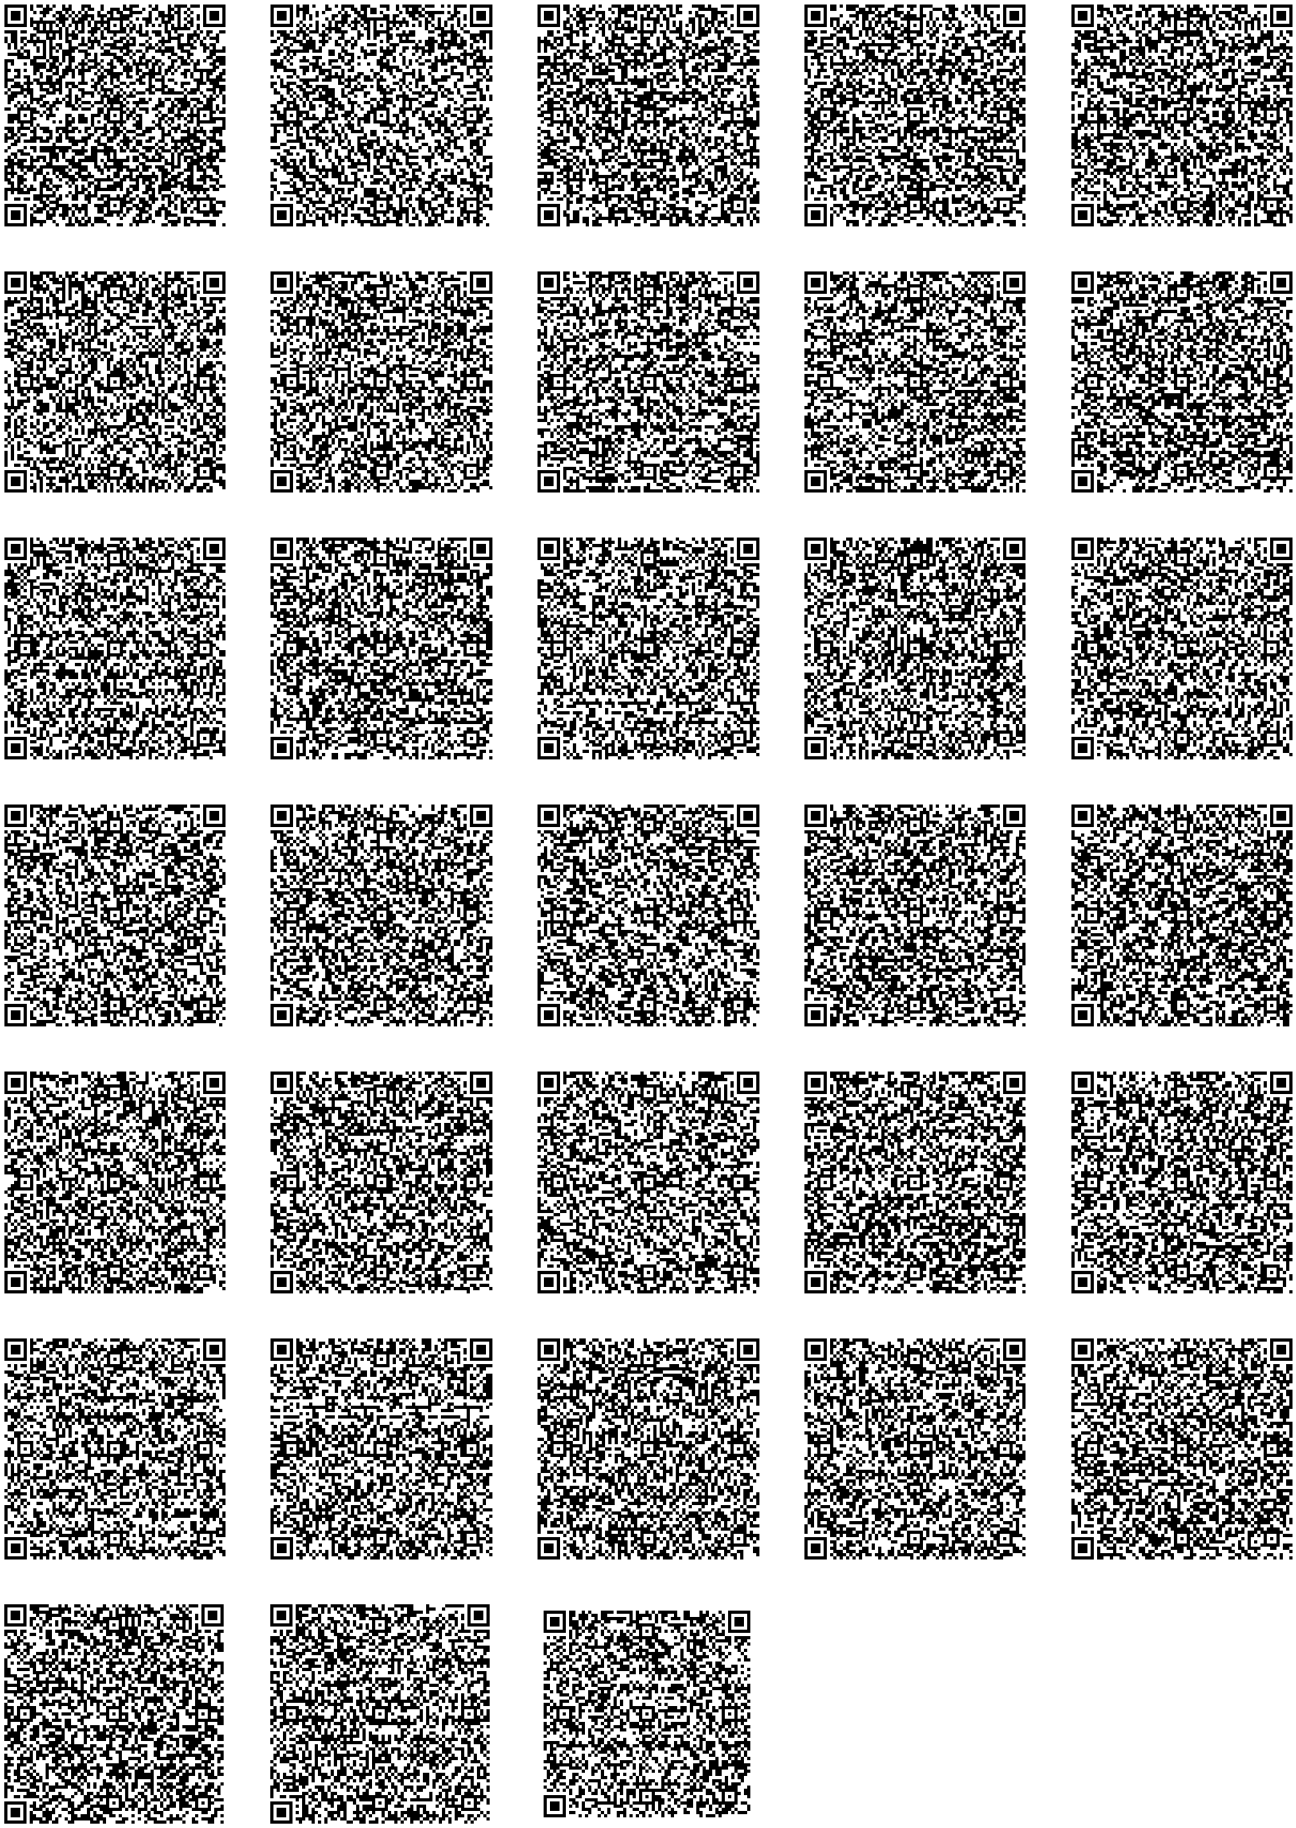

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, г. Костанай, микрорайоне «Аэропорт» на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **127 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление				
			Раздел: Отопление				
1	67	6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	265	7 229	1 915 685
2	71	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	262.35	2 342	614 424
3	86	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	6390	375	2 396 250
4	87	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	260	382	99 320
5	88	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1075	1 968	2 115 600
6	93	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	302.5	394	119 185
7	94	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	49.5	470	23 265
8	95	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	38.5	515	19 828
9	96	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	55	581	31 955

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	97	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	159.5	783	124 888
11	98	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	198	925	183 150
12	99	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	44	1 206	53 064
13	100	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	44	1 719	75 636
14	101	6116-0701-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	16	21 700	347 200
15	102	6116-0701-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры	шт.	22	24 156	531 432
16	103	245-509-0401 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	10	37 342	373 420
17	104	245-509-0402 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	4	42 236	168 944
18	105	245-509-0403 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	18	50 202	903 636
19	106	245-509-0402 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм	шт.	2	42 236	84 472
20	107	245-509-0403 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм	шт.	4	50 202	200 808
21	108	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	171.5	265	45 448
22	109	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	171.5	407	69 800
23	110	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	650	708	460 200
			Итого по разделу: Отопление				**10 957 610**
			Раздел: Теплоснабжение установок П1-П10				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	111	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 440	4 880
25	112	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	8	2 788	22 304
26	113	242-312-1504 СпрСЦ 02.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	50 000	100 000
27	114	242-312-1505 СпрСЦ 02.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	3	63 104	189 312
28	115	242-312-1506 СпрСЦ 02.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	79 010	158 020
29	116	242-312-1507 СпрСЦ 02.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	109 012	327 036
30	117	242-207-1304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 349	37 396
31	118	242-207-1305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	13 023	78 138
32	119	242-207-1306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	6	20 204	121 224
33	120	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16 797	67 188
34	121	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	15 702	62 808
35	122	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 909	9 818
36	123	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	3	5 858	17 574
37	124	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	3	5 878	17 634
38	125	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	7 257	14 514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	126	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	7 410	14 820
40	127	242-404-0605 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	3	9 557	28 671
41	128	242-404-0606 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	15 161	45 483
42	129	242-404-0307 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	59 755	119 510
43	130	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	5 825	233 000
44	131	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	комплект	6	805	4 830
45	132	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3 338	20 028
46	133	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	40	1 925	77 000
47	134	245-701-0701 СпрСЦ 02.2024	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	40	3 940	157 600
48	135	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	40	1 797	71 880
49	136	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	40	1 910	76 400
50	137	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	40	5 565	222 600
51	150	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	100	375	37 500
52	151	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	440	382	168 080
53	152	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	540	1 968	1 062 720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	153	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	27.5	515	14 162
55	154	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	38.5	581	22 368
56	155	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	44	783	34 452
57	156	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	319	925	295 075
58	157	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	60.5	1 206	72 963
59	158	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	93.5	1 719	160 726
60	159	234-303-0326 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	11	2 887	31 757
61	160	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	134	265	35 510
62	161	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	134	407	54 538
63	162	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	510	708	361 080
			Итого по разделу: Теплоснабжение установок П1-П10				**4 650 599**
			Раздел: Тепловой узел				
64	165	6116-0603-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса от 200 до 300 кг	шт.	2	43 435	86 870
65	166	513-205-0415 СпрСЦ 02.2024	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к тепловой сети по одноступенчатой схеме, T1±70°C/T2±44°C, B1±5°C/T3±60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 29, модель XGF№19A-TO 16/29-TKTM43	шт.	1	1 547 969	1 547 969
66	167	513-205-0411 СпрСЦ 02.2024	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к тепловой сети по одноступенчатой схеме, T1±70°C/T2±44°C, B1±5°C/T3±60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 26, модель XGF№14A-TO 16/26-TKTL32	шт.	1	1 101 758	1 101 758
67	168	6116-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	4	86 124	344 496

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	169	511-401-0127 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин	шт.	2	387 683	775 366
69	170	511-403-0523 СпрСЦ 02.2024	Насос циркуляционный с резьбовым или фланцевым соединением с электродвигателем ECM, для любых систем отопления, промышленных циркуляционных установок, кондиционирования, закрытых контуров охлаждения YONOS MAXO 100/0,5-12 PN10, арт. 2120661	шт.	2	1 267 999	2 535 998
70	171	1312-1101-0303 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	24 328	48 656
71	172	1312-1101-0305 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	44 347	44 347
72	173	1312-1101-0306 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	50 284	50 284
73	174	242-310-0606 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	2	331 055	662 110
74	175	242-310-0708 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч	шт.	1	1 614 320	1 614 320
75	176	242-312-0909 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 100	шт.	1	437 188	437 188
76	177	245-405-2517 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5x15 s/mm, P 2 BA	шт.	2	245 127	490 254
77	178	245-405-2509 РСНБ РК 2022	Привод электрический импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 4 s/mm, P 18 BA	шт.	1	624 857	624 857
78	179	6116-0701-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	33	1 925	63 525
79	180	245-701-0701 СпрСЦ 02.2024	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60	шт.	33	3 940	130 020
80	181	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	33	1 797	59 301
81	182	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	13	1 910	24 830
82	183	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	13	5 565	72 345

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	184	6125-1001-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	11	5 738	63 118
84	185	245-601-0202 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	2	219 967	439 934
85	186	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26 095
86	187	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	42 806	171 224
87	188	245-601-0802 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 250 мм	шт.	4	41 631	166 524
88	189	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	26 095	52 190
89	190	245-601-0402 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 217/317	шт.	1	67 377	67 377
90	191	245-601-0406 РСНБ РК 2022	Ключ программирования A 266	шт.	1	109 405	109 405
91	192	245-601-0601 РСНБ РК 2022	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	2	29 939	59 878
92	193	6116-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 219 мм	шт.	2	240 521	481 042
93	194	242-207-1301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 580	15 480
94	195	242-207-1303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	6 023	36 138
95	196	242-207-1304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	9 349	37 396
96	197	242-207-1305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	13 023	52 092
97	198	242-207-1306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	20 204	60 612

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
98	199	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	14	16 797	235 158
99	200	6114-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 125 мм	шт.	2	38 682	77 364
100	201	6114-0202-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	2	38 693	77 386
101	202	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	15 702	31 404
102	203	242-202-0308 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	21 035	42 070
103	204	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	10	33 215	332 150
104	205	242-202-0310 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	66 539	133 078
105	206	242-202-0311 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	2	86 126	172 252
106	207	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	2	4 909	9 818
107	208	6116-0605-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	5 858	5 858
108	209	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	1	5 878	5 878
109	210	6116-0605-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	1	10 802	10 802
110	211	242-404-0104 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	25 388	50 776
111	212	242-404-0105 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108	30 108
112	213	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	39 557	39 557

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
113	214	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80 305	80 305
114	215	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	9 273	27 819
115	216	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	4	16 797	67 188
116	217	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	15 344	30 688
117	218	242-306-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	16 528	16 528
118	219	242-306-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	18 291	18 291
119	220	242-306-0107 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	3	36 005	108 015
120	230	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	40	382	15 280
121	231	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	20	413	8 260
122	232	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	1 968	118 080
123	233	234-303-0319 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	11	925	10 175
124	234	234-303-0321 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	11	1 206	13 266
125	235	234-303-0323 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	22	1 719	37 818
126	236	234-303-0326 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	11	2 887	31 757
127	237	234-303-0328 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 160 мм	м	11	3 533	38 863

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	238	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21	265	5 565
129	239	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.046	449 673	20 685
130	240	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200	708	141 600
			Итого по разделу: Тепловой узел				**14 596 841**
			Итого по локальной смете: Отопление				**30 205 050**
			ИТОГО по акту:				**30 205 050**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				24243959.000 x 7.30%	1 769 809
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				30205050.000 + 1769809.053	31 974 859
		Сметная прибыль, 5.00%				26013768.053 x 5.00%	1 300 688
		Непредвиденные расходы, 5.000%				31974859.053 x 5.000%	1 598 742
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					34 874 290
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г.,, к = 1.0750				34874290.409 x 1.0750	37 489 862
		НДС (12%)				37489862.189 x 12%	4 498 783
		Итого с НДС				37489862.189 + 4498783.463	41 988 645

Лист согласования
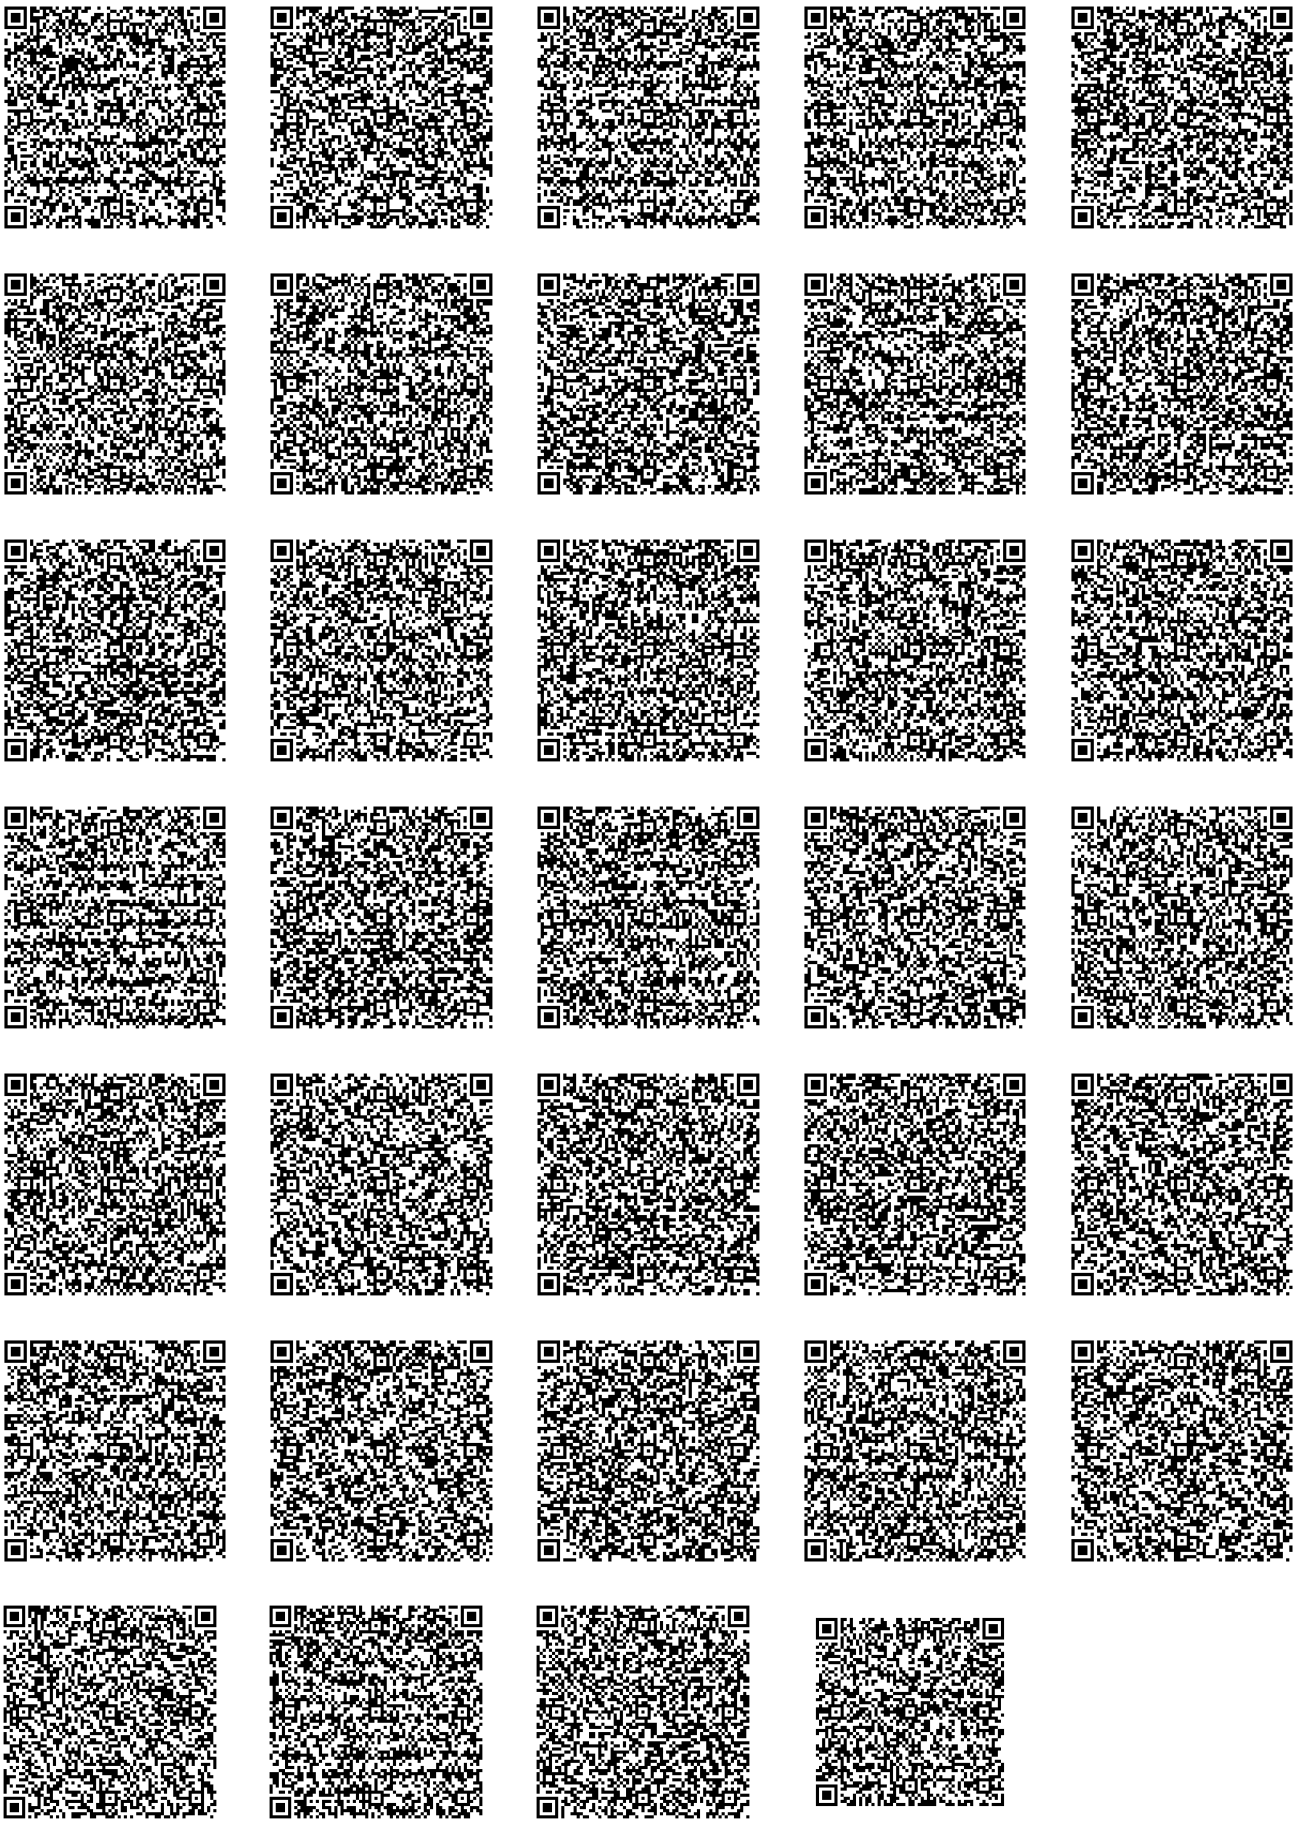
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	18.02.2025 12:40
Представители технического надзора		
780224302312 - ШАЯХМЕТОВ МИРАС БАГИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	20.02.2025 06:31
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	20.02.2025 06:08
Представители заказчика		
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист отдела смет и ценообразования	25.02.2025 06:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.02.2025 13:27
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	21.02.2025 13:38 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	21.02.2025 13:40
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	21.02.2025 13:55 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
