Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа на 900 обучающихся в Костанайском районе Костанайской области.

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	001140004068			**128**	**от 11.08.2023 г.**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.2023 г.; №2 от 30.01.2024 г.; №3 от 28.02.2024 г.; №4 от 16.04.2024 г.; № 5 от 31.07.2024 г.; № 6 от 08.08.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	**4 977 511 171**	**4 977 511 171**	**4 444 206 402,68**				**533 304 768,32**	**4 977 511 171**
в том числе: за декабрь месяц 2024 года	**239 492 805**	**239 492 805**	**213 832 861,61**				**25 659 943,39**	**239 492 805**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Директор ТОО "MSK Engineering", БИН 070440006322** **Манкеев Ж. Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#291cc164-3b5b-47a0-8d31-c37ab0016ed6)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа на 900 обучающихся в Костанайском районе Костанайской области

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 58	МАФы	**97 875 937**
2	Акт № 59	Вертикальная планировка	**34 242 324**
3	Акт № 60	Архитектурная часть 2.	**60 586 974**
4	Акт № 61	Озеленение	**23 187 209**
5	Акт № 62	Наружное элекроосвещение	**23 600 361**
		ИТОГО	**239 492 805**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Технический надзор: **Директор ТОО "MSK Engineering", БИН 070440006322** **Манкеев Ж. Н.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подписано через EQURYLYS.KZ (#291cc164-3b5b-47a0-8d31-c37ab0016ed6)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 910221350048 - КВОН АНТОН null	Директор	Подписано: 26.12.2024 10:01
Технический надзор: ИИН 660124300615 - МАНКЕЕВ ЖОМАРТ null	Директор технического надзора	Подписано: 26.12.2024 11:03
Заказчик: ИИН 850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА null	Ведущий специалист	Подписано: 26.12.2024 12:50
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления - член Правления	Подписано: 26.12.2024 13:55

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#291cc164-3b5b-47a0-8d31-c37ab0016ed6)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#291cc164-3b5b-47a0-8d31-c37ab0016ed6)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#291cc164-3b5b-47a0-8d31-c37ab0016ed6)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: МАФы				
			Раздел: Наружное ограждение				
1	1	8601-0602-0402 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15	секция	219.667	140 750	30 918 130
2	2	8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	2	237 987	475 974
3	3	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	5	164 008	820 040
			Итого по разделу: Наружное ограждение				**32 214 144**
			Раздел: Зона отдыха				
4	5	8601-0302-0902 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья, модель ППК-2	комплект	8	103 100	824 800
5	6	8601-0302-0905 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции скамеек из полимер-песчаного композита с подразделением по типам (видам): Скамья, модель ППК-5	комплект	10	135 264	1 352 640
6	8	8601-0104-0412 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом	комплект	4	336 111	1 344 444
7	9	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный	шт.	6	149 491	896 946
8	10	8601-0301-0301 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции столов с подразделением по типам (видам): Шахматный стол со скамьями	комплект	3	308 949	926 847

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	11	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	6	384 790	2 308 740
			Итого по разделу: Зона отдыха				**7 654 417**
			Раздел: Детские площадки для подвижных игр				
10	12	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	4	201 663	806 652
11	13	8601-0104-0103 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	3	230 145	690 435
12	14	8601-0104-0410 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	3	811 404	2 434 212
13	15	8601-0104-0404 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки	комплект	4	241 976	967 904
14	16	8601-0113-0110 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,778 м х 5,640 м х 3,692 м)	комплект	1	3 007 934	3 007 934
15	17	8601-0113-0111 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,731 м х 2,895 м х 3,353 м)	комплект	1	1 071 916	1 071 916
16	18	8601-0113-0112 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	1 923 486	1 923 486
17	20	8601-0103-0203 УСН РК 8.02-03-2023	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Пирамида"	шт.	2	283 345	566 690
18	21	8601-0113-0117 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,025 м х 5,155 м х 3,100 м)	комплект	1	2 816 018	2 816 018
19	22	8601-0113-0116 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (8,515 м х 4,710 м х 3,800 м)	комплект	1	3 059 476	3 059 476
20	23	8601-0113-0115 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (4,60 м х 4,30 м х 3,00 м)	комплект	1	1 077 665	1 077 665
			Итого по разделу: Детские площадки для подвижных игр				**18 422 388**
			Раздел: Спортивная зона				
			Подраздел: Ограждение хоккейной площадки				
21	24	8601-0802-0101 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ограждения хоккейной площадки минимальных размеров, изготавливаемые по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типам (видам): Деревянное ограждение хоккейной площадки минимальных размеров	конструкция	1	2 722 495	2 722 495
			Итого по подразделу: Ограждение хоккейной площадки				**2 722 495**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Стойки металлические Ст-5/89шт./				
22	42	8601-0805-0104 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)	комплект	1	491 309	491 309
23	43	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)	комплект	1	332 650	332 650
24	44	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойка волейбольная высотой 2,9 м	комплект	2	219 869	439 738
25	45	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2023	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	1	130 881	130 881
26	46	8601-0103-0205 УСН РК 8.02-03-2023	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лазалка "Спираль горизонтальная"	шт.	1	151 574	151 574
27	47	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	532 333	532 333
28	48	8601-0201-0103 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (3,700 м х 2,660 м х 2,060 м)	комплект	1	354 896	354 896
29	49	8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами	комплект	1	114 493	114 493
30	50	8601-0207-0304 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	1	194 426	194 426
31	51	8601-0213-0202 УСН РК 8.02-03-2023	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,4 м	шт.	1	77 612	77 612
32	52	8601-0213-0301 УСН РК 8.02-03-2023	Модульная конструкция брусьев разновысоких. Брусья разновысокие	шт.	1	76 297	76 297
33	53	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	1	917 504	917 504
34	54	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	1 209 125	1 209 125
35	55	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый с турником	комплект	1	997 890	997 890
36	56	8601-0216-0301 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции тренажерных комплексов, с подразделением по типам (видам): Тренажерный комплекс комбинированный	комплект	1	996 649	996 649

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	57	8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	2	258 080	516 160
			Итого по подразделу: Стойки металлические Ст-5/89шт./				**7 533 537**
			Итого по разделу: Спортивная зона				**10 256 032**
			Раздел: Хозяйственная зона				
38	58	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	327 294	327 294
			Итого по разделу: Хозяйственная зона				**327 294**
			Итого по локальной смете: МАФы				**68 874 275**
			ИТОГО по акту:				**68 874 275**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	68874275.000 x 7.30%	5 027 822
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	68874275.000 + 5027822.206	73 902 097
	Сметная прибыль, 5.00%	73902097.206 x 5.00%	3 695 104
	Непредвиденные расходы, 5.000%	73902097.206 x 5.000%	3 695 104
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		81 292 306
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750	81292306.927 x 1.0750	87 389 229
	НДС (12%)	87389229.947 x 12%	10 486 707
	Итого с НДС	87389229.947 + 10486707.594	97 875 937

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	24.12.2024 05:44
Представители технического надзора		
650426300695 - САФИН РУЛАН ГАЛИМОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 06:09
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	24.12.2024 12:15
Представители заказчика		
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 16:39
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	25.12.2024 04:27 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.12.2024 11:27
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	24.12.2024 16:34 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	24.12.2024 16:37

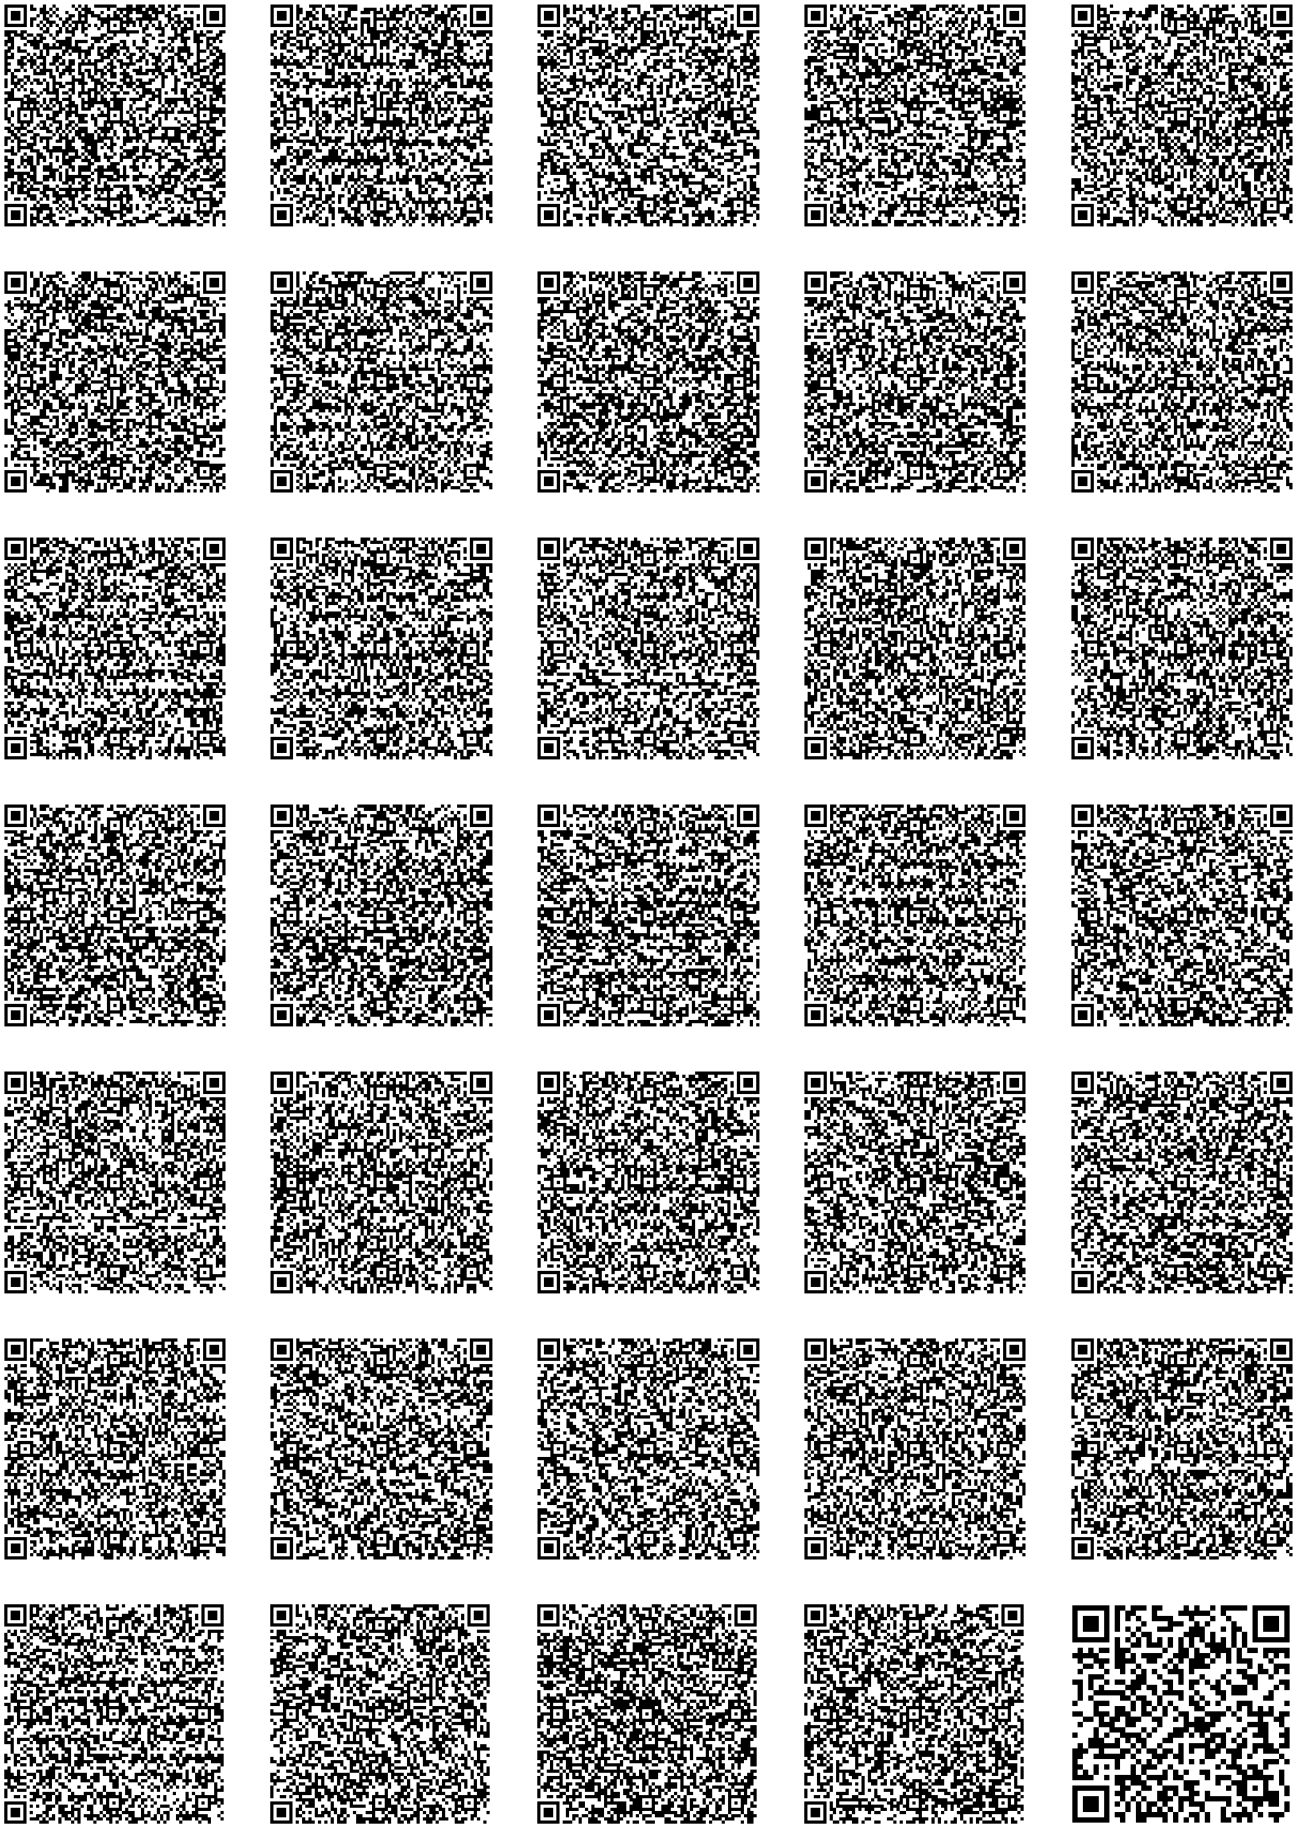

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вертикальная планировка				
			Раздел: Вертикальная планировка участок 1				
1	1	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 /насыпь/	м3	17022	175	2 978 850
2	2	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202.	м3	17022	499	8 493 978
3	3	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 /выемка/	м3	7533	175	1 318 275
4	4	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202.	м3	7533	499	3 758 967
5	5	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2/недостаток природного грунта/	м3	1488	476	708 288
6	6	412-102-0118РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	79682.4	52	4 143 484
7	7	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 /плодородный грунт/	м3	5765	175	1 008 875
8	8	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202.	м3	5765	499	2 876 735
9	9	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	133	240	31 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6101-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с).	м2	20129.92	6	120 780
			Итого по разделу: Вертикальная планировка участок 1				**25 440 153**
			Итого по локальной смете: Вертикальная планировка				**25 440 153**
			ИТОГО по акту:				**25 440 153**

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	25440153.000 x 7.30%	1 857 131
Итого с затратами на организацию и управление СМР	25440153.000 + 1857131.218	27 297 284
Сметная прибыль, 5.00%	27297284.218 x 5.00%	1 364 864
Непредвиденные расходы, 5.000%	27297284.218 x 5.000%	1 364 864
Итого с непредвидемыми работами и затратами		30 027 012
НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, I квартал 2024 г., к = 1.0182	30027012.639 x 1.0182	30 573 504
НДС (12%)	30573504.269 x 12%	3 668 820
Итого с НДС	30573504.269 + 3668820.512	34 242 324

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	24.12.2024 05:44
Представители технического надзора		
650426300695 - САФИН РУЛАН ГАЛИМОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 06:11
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	24.12.2024 12:15
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	26.12.2024 04:18
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	25.12.2024 05:31 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	25.12.2024 12:30 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 05:32
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	25.12.2024 08:17

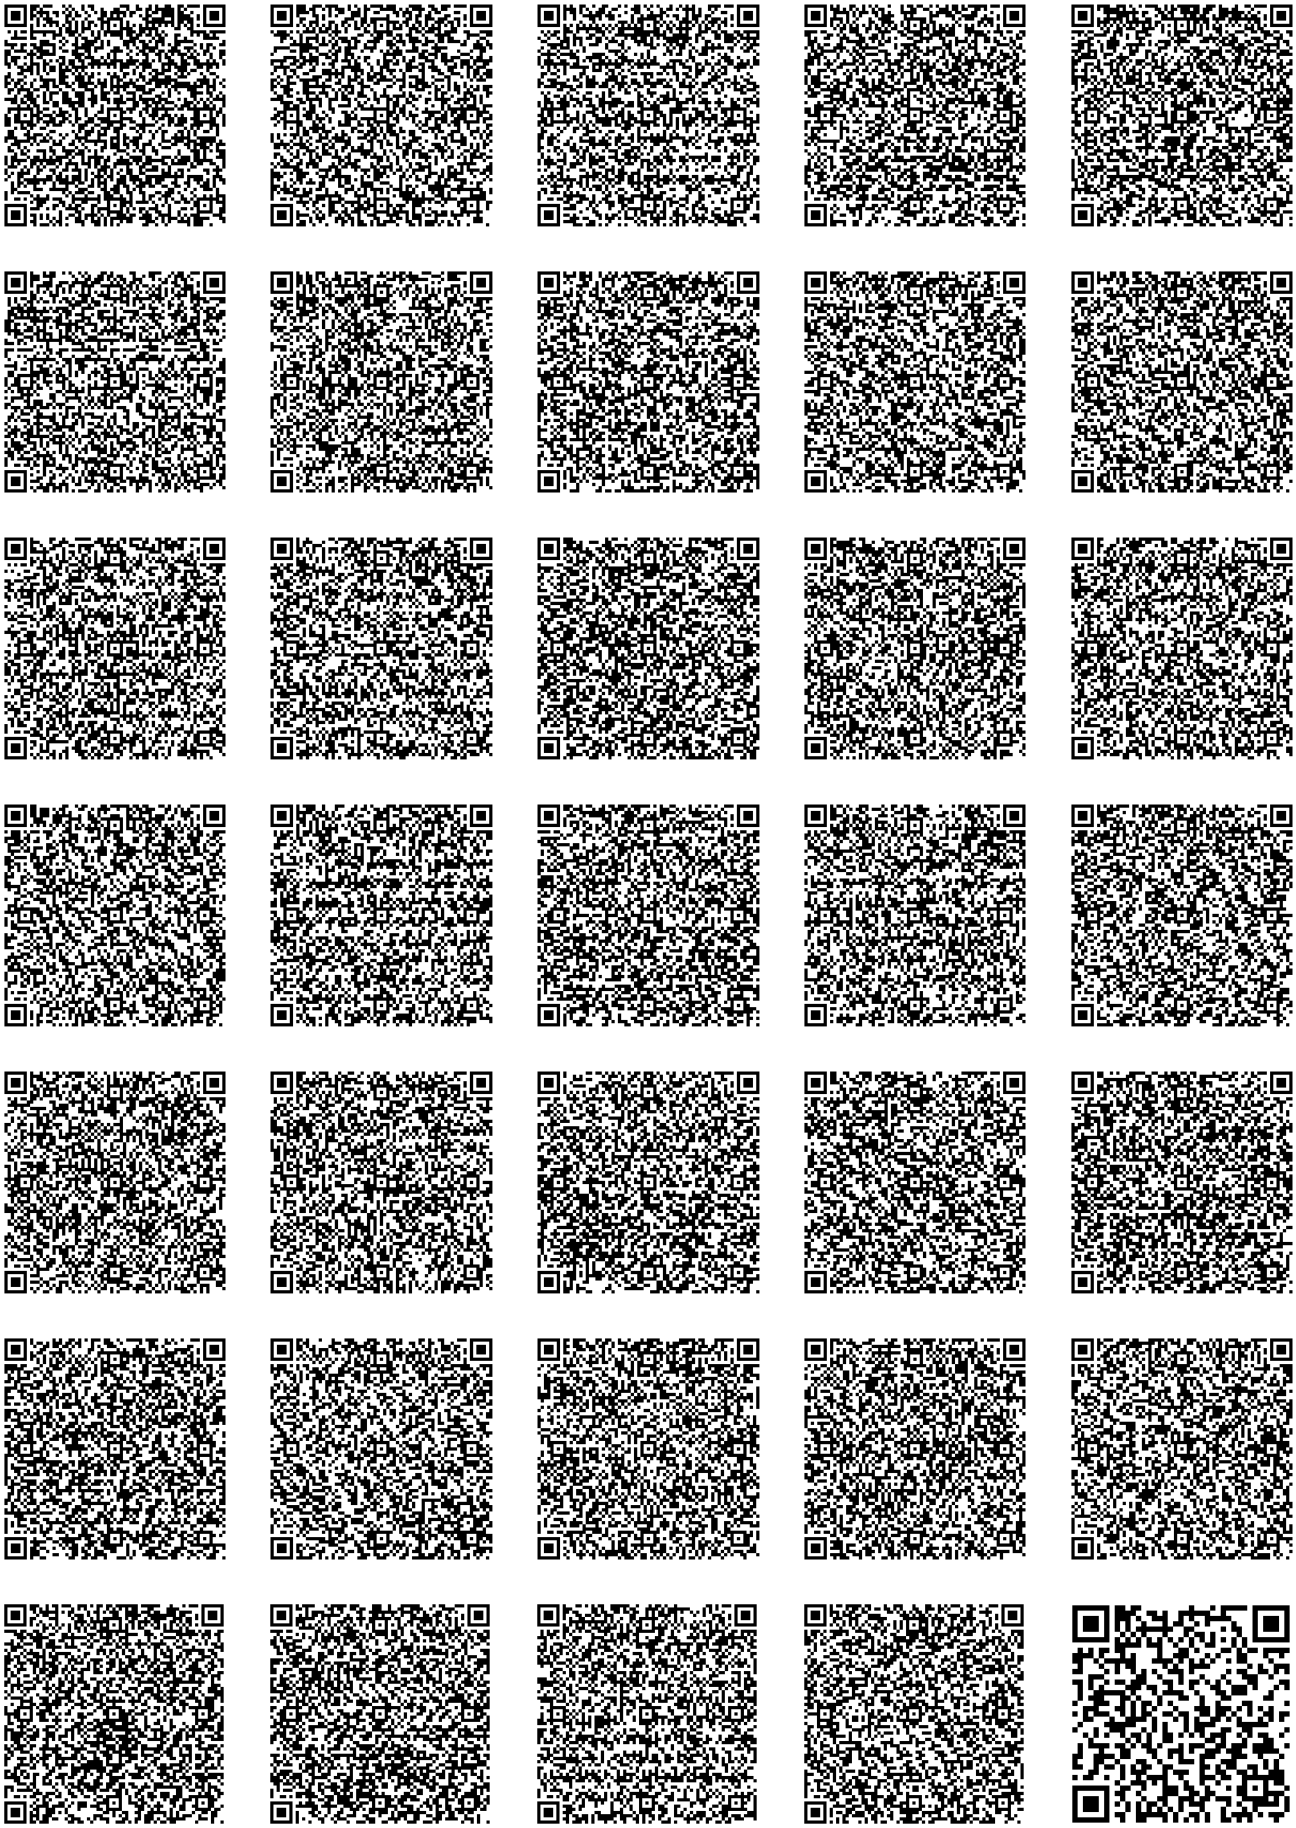

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 2..				
			Раздел: ПРОЕМЫ/АС л.108-111/+30.11,13.02,01.03				
			Подраздел: ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОК-1/6шт./, ОК-1"/4шт./, ОК-8/5шт./, ОК-8"/5шт./				
1	621	6108-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2	м2	105.49	6 967	734 949
2	622	223-103-0123 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	105.49	88 276	9 312 235
			Итого по подразделу: ОКНА АЛЮМИНИЕВЫЕ ОК-1/6шт./, ОК-1"/4шт./, ОК-8/5шт./, ОК-8"/5шт./				**10 047 184**
			Подраздел: ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОК1-ОК10/312шт./АР л.109, примеч.39/				
3	636	6108-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора, оконный	комплект	312	2 346	731 952
4	637	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	312	1 419	442 728
			Итого по подразделу: ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОК1-ОК10/312шт./АР л.109, примеч.39/				**1 174 680**
			Подраздел: ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПД1-ПД4				
5	644	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	570.45	4 368	2 491 726
6	645	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	627.495	1 442	904 848
7	646	6108-0105-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м/для ОК-13, примеч.36/	м	1.5	5 825	8 738

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	647	223-501-0122 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 700 мм и более/для ОК-13, примеч.36/	м	1.65	4 038	6 663
			Итого по подразделу: ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ПД1-ПД4				**3 411 975**
			Подраздел: СЕТКИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ НА ОК1, ОК-1",ОК-8, ОК-8"/АР л.110, примеч.3/				
9	648	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сетки	м2	197.1	644	126 932
10	649	217-202-0401 РСНБ РК 2022	Сетка полиэфирная размер ячеек 10 мм х 10 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	197.1	952	187 639
			Итого по подразделу: СЕТКИ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ НА ОК1, ОК-1",ОК-8, ОК-8"/АР л.110, примеч.3/				**314 571**
			Подраздел: КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА НА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЯХ/желтые кружки д.150мм для п.01/1-06, АР л.110, примеч.2/				
11	650	6112-0304-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Оклейка поверхности самоклеящейся поливинилхлоридной пленкой, по листовым материалам	м2	5.369	3 958	21 251
12	651	522-101-1048002 СпрСЦ 11.2023	Фишка разметочная/прим.	шт.	76	300	22 800
			Итого по подразделу: КОНТРАСТНАЯ МАРКИРОВКА НА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЯХ/желтые кружки д.150мм для п.01/1-06, АР л.110, примеч.2/				**44 051**
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ/АС л.108-111/+30.11,13.02,01.03				**14 992 461**
			Раздел: ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ ВН1-ВН10 /АР л.112-114,117/30.11,14.02				
13	652	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	29.64	3 404	100 895
14	653	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64.13	3 747	240 295
15	654	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29.64	132 887	3 938 771
16	655	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	64.13	118 468	7 597 353
			Итого по разделу: ВИТРАЖИ НАРУЖНЫЕ ВН1-ВН10 /АР л.112-114,117/30.11,14.02				**11 877 314**
			Раздел: ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВВ1 /АР л.115,117/01.03				
17	659	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	9.13	3 404	31 078
18	660	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15.51	3 747	58 116

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	661	СТ1223-301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Витраж/ВВ-1/, из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	20.65	315 681	6 518 813
20	662	222-502-0107 РСНБ РК 2022	Панели металлические/глухое заполнение/ трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	3.99	20 402	81 404
			Подраздел: СЕТКИ МОСКИТНЫЕ/АР л.117, примеч.16/				
21	663	6108-0107-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка сетки антимоскитной	м2	8.36	5 615	46 941
			Итого по подразделу: СЕТКИ МОСКИТНЫЕ/АР л.117, примеч.16/				**46 941**
			Подраздел: ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ/11шт./АР л.117, примеч.16/				
22	664	6108-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора, оконный	комплект	11	2 346	25 806
23	665	223-502-0401 РСНБ РК 2022	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	11	1 419	15 609
			Итого по подразделу: ЗАМКИ БЕЗОПАСНОСТИ/11шт./АР л.117, примеч.16/				**41 415**
			Подраздел: РУЧКИ АНТИПАНИКА/20шт./АР л.117, примеч.17/				
24	666	6108-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора/ручка антипаника/, фрамужный	комплект	20	5 429	108 580
25	667	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Ручки "антипаника"	шт.	20	63 994	1 279 893
			Итого по подразделу: РУЧКИ АНТИПАНИКА/20шт./АР л.117, примеч.17/				**1 388 473**
			Итого по разделу: ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ОГНЕСТОЙКИЕ ВВ1 /АР л.115,117/01.03				**8 166 241**
			Раздел: УЗЛЫ ПО ФАСАДАМ/АР л.118-121/14.02,01.03				
			Подраздел: УЗЛЫ 3, 4 /АР л.120/витражи ВН по цоколю/				
26	686	6105-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной однослойной из керамических камней, простой	м3	0.324	36 533	11 836
27	687	213-101-0501 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.063	115 942	7 304
28	688	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	2.7	1 707	4 609
29	689	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.278	46 463	12 917

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	690	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство противопожарной отсечки из листовой оцинкованной стали	м2	3.6	8 067	29 041
31	691	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	6.3	392	2 470
32	692	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	7.245	120	869
			Итого по подразделу: УЗЛЫ 3, 4 /АР л.120/витражи ВН по цоколю/				**69 047**
			Подраздел: УЗЛЫ 5, 5.1/АР л.120/витраж в проеме, боковая часть ВН2,3,6,7/				
33	693	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	4.368	1 707	7 456
34	694	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.225	46 463	10 454
35	695	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство противопожарной отсечки из листовой оцинкованной стали	м2	1.2	8 067	9 680
36	696	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	3.604	5 521	19 898
37	697	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	3.784	944	3 572
38	698	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	3.604	1 454	5 240
			Итого по подразделу: УЗЛЫ 5, 5.1/АР л.120/витраж в проеме, боковая часть ВН2,3,6,7/				**56 300**
			Подраздел: УЗЛЫ 6, 6.1/АР л.120/витражи ВН изнутри поверху/				
39	699	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	3.6	1 707	6 145
40	700	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.185	46 463	8 596
41	701	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство противопожарной отсечки из листовой оцинкованной стали	м2	2.7	8 067	21 781
42	702	6107-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	2.97	5 521	16 397

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	703	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	3.119	944	2 944
44	704	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	2.97	1 454	4 318
			Итого по подразделу: УЗЛЫ 6, 6.1/АР л.120/витражи ВН изнутри поверху/				**60 181**
			Подраздел: УЗЛЫ 7, 7.1/АР л.120/витражи ВН-5,8,8" боковая часть/				
45	705	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	13.995	1 707	23 889
46	706	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1.441	46 463	66 953
47	707	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство противопожарной отсечки из листовой оцинкованной стали	м2	18.66	8 067	150 530
48	708	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	32.655	392	12 801
49	709	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	37.553	120	4 506
			Итого по подразделу: УЗЛЫ 7, 7.1/АР л.120/витражи ВН-5,8,8" боковая часть/				**258 679**
			Подраздел: УЗЛЕЛ 9.1/ВН снаружи поверху см.АР л.114/				
50	716	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1.8	1 707	3 073
51	717	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	0.185	46 463	8 596
52	718	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство противопожарной отсечки из листовой оцинкованной стали	м2	2.7	8 067	21 781
			Итого по подразделу: УЗЛЕЛ 9.1/ВН снаружи поверху см.АР л.114/				**33 450**
			Итого по разделу: УЗЛЫ ПО ФАСАДАМ/АР л.118-121/14.02,01.03				**477 657**
			Раздел: САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА БЛОКИ А, Б, В/АР л.122,123,124/+1.12,14.02,01.03				
53	719	6107-0103-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению каркасно-филенчатых в санузлах	м2	219.87	6 084	1 337 689
54	720	215-301-0901 РСНБ РК 2022	Фанера ламинированная толщиной 16 мм	м2	241.857	8 443	2 041 999

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	721	6108-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора, фрамужный	комплект	73	5 429	396 317
56	722	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ручки с замками для сантехнических кабин	шт.	73	5 669	413 902
57	723	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка столешниц из ПВХ/на кронштейнах/ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	39.52	4 368	172 622
58	724	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столешница акриловая шириной 500мм/для санузлов/	м.п.	40.31	47 454	1 912 887
			Подраздел: ПОРУЧНИ В САНУЗЛАХ/АР л.100, примеч.7/				
59	725	6115-0104-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	32	1 647	52 704
60	726	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поручень из нержавеющей стали Vitra 320-3014/для санузлов МГН/	шт.	16	18 071	289 143
61	727	СТКоммерческое ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поручень из нержавеющей стали Vitra Arkitekta 320-3010/60см для санузлов МГН/	шт.	16	31 625	506 000
			Итого по подразделу: ПОРУЧНИ В САНУЗЛАХ/АР л.100, примеч.7/				**847 847**
			Итого по разделу: САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА БЛОКИ А, Б, В/АР л.122,123,124/+1.12,14.02,01.03				**7 123 265**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 2..				**42 636 938**
			ИТОГО по акту:				**42 636 938**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	42614138.000 x 7.30%	3 110 832
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	42636938.000 + 3110832.155	45 747 770
	Сметная прибыль, 5.00%	45724970.155 x 5.00%	2 286 248
	Непредвиденные расходы, 5.000%	45747770.155 x 5.000%	2 287 388
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		50 321 407
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750	50321407.171 x 1.0750	54 095 512
	НДС (12%)	54095512.709 x 12%	6 491 461
	Итого с НДС	54095512.709 + 6491461.525	60 586 974

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	24.12.2024 06:09
Представители технического надзора		
650426300695 - САФИН РУЛАН ГАЛИМОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 06:41
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	24.12.2024 12:14
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	25.12.2024 03:49 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 04:25
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	25.12.2024 04:37
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	25.12.2024 04:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.12.2024 11:23

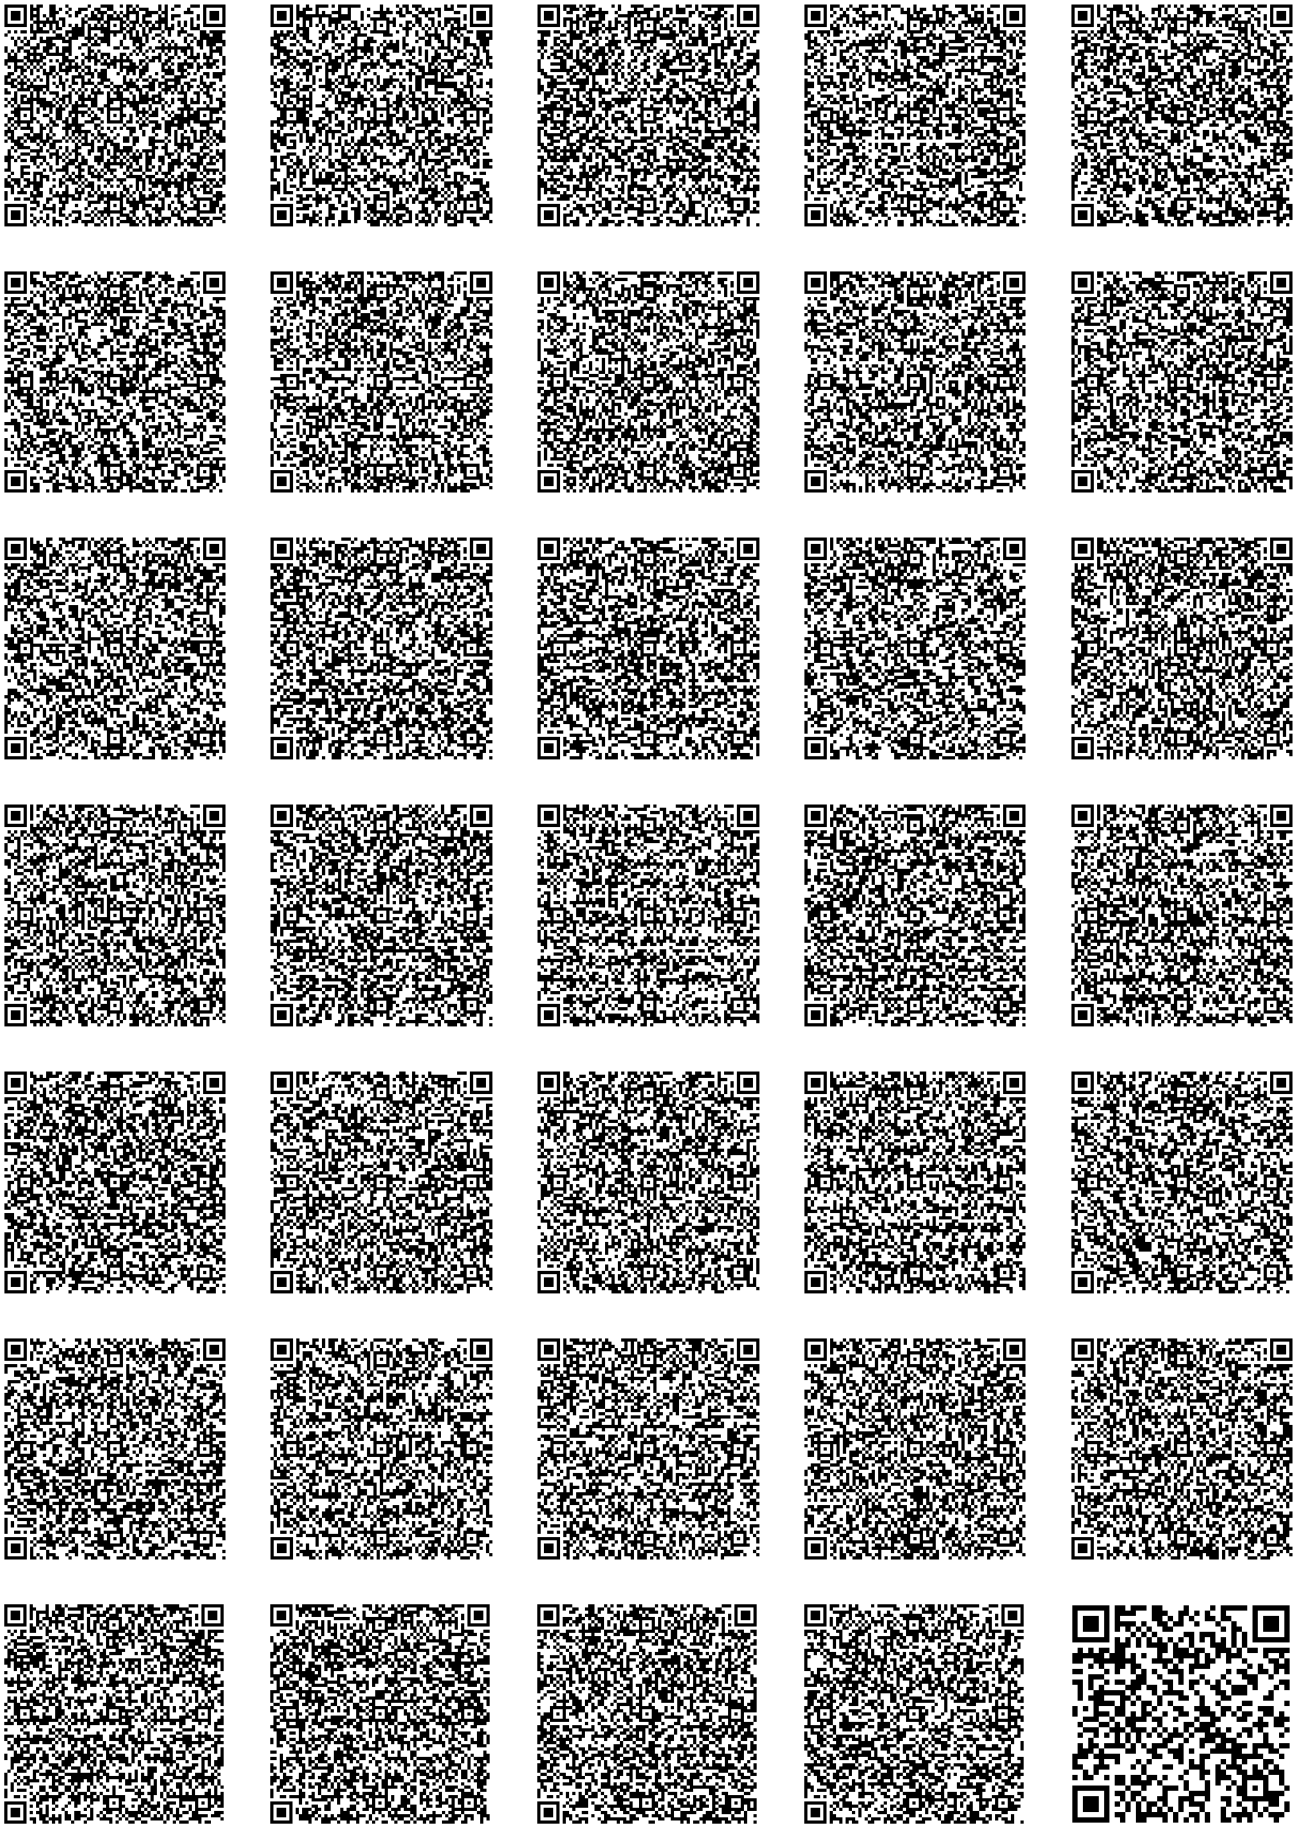

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Озеленение				
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1	1	6113-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	6188.11	398	2 462 868
2	2	6113-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Культивация почвы, с одновременным боронованием	га	0.36	4 841	1 743
			Подраздел: Живая изгородь				
3	3	6113-0108-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	36.667	2 753	100 944
4	4	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание ДЭС песчаное. Устройство/15см	м3 основания	2.75	9 702	26 680
5	5	6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	36.667	2 449	89 797
6	6	254-102-0501РСНБ РК 2022	Вяз мелколистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	80	1 780	142 400
7	7	254-104-0101РСНБ РК 2022	Ирга с оголённой корневой системой	шт.	30	1 478	44 340
			Итого по подразделу: Живая изгородь				**404 161**
			Подраздел: Кусты				
8	8	6113-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	18	3 754	67 572

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание ДЭС песчаное. Устройство/15см	м3 основания	1.026	9 702	9 954
10	10	6113-0105-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	18	5 466	98 388
11	11	254-104-0401РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	6	1 021	6 126
12	12	254-104-1502РСНБ РК 2022	Миндаль с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	12	15 491	185 892
			Итого по подразделу: Кусты				**367 932**
			Подраздел: Деревья				
13	13	6113-0102-0320 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	69	24 551	1 694 019
14	14	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание ДЭС песчаное. Устройство/30см	м3 основания	36.432	9 702	353 463
15	15	6113-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	69	13 819	953 511
16	16	254-103-0402РСНБ РК 2022	Берёза бородавчатая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	16	9 588	153 408
17	17	254-103-2502РСНБ РК 2022	Клен татарский Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	15	15 985	239 775
18	18	254-103-4402РСНБ РК 2022	Ясень зеленый Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	12	15 612	187 344
19	19	254-103-1802РСНБ РК 2022	Ива плакучая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	15	12 001	180 015
20	20	254-103-3802РСНБ РК 2022	Тополь Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	11	9 588	105 468
			Итого по подразделу: Деревья				**3 867 003**
			Подраздел: Цветник однолетники /173,48 м2/				
21	21	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	ДЭС из песка. Устройство/10см/	м3 основания	17.348	9 702	168 310
22	22	6113-0113-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	173.48	2 410	418 087
23	23	6113-0113-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201/до30см/	м2	173.48	654	113 456
24	24	1147-0113-0301РСНБ РК 2022	Цветники однолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	173.48	7 864	1 364 247

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	254-105-0101РСНБ РК 2022	Петуния	шт.	1110.272	212	235 378
26	26	254-105-0102РСНБ РК 2022	Бархатцы (тагетис)	шт.	1110.272	137	152 107
27	27	254-105-0103РСНБ РК 2022	Бегония	шт.	1110.272	164	182 085
			Итого по подразделу: Цветник однолетники /173,48 м2/				**2 633 670**
			Подраздел: Газон /2323,16м2/				
28	28	6113-0112-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1858	1 470	2 731 259
29	29	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять/добавлять до 20см/	м2	1858	329	611 282
30	30	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание ДЭС песчаное. Устройство/10см	м3 основания	185	9 702	1 794 870
31	31	6113-0112-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1858	776	1 441 807
			Итого по подразделу: Газон /2323,16м2/				**6 579 220**
			Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				**16 316 597**
			Итого по локальной смете: Озеленение				**16 316 597**
			ИТОГО по акту:				**16 316 597**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	16316597.134 x 7.30%	1 191 111
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	16316597.134 + 1191111.622	17 507 708
	Сметная прибыль, 5.00%	17507708.756 x 5.00%	875 385
	Непредвиденные расходы, 5.000%	17507708.756 x 5.000%	875 385
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		19 258 479
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750	19258479.631 x 1.0750	20 702 865
	НДС (12%)	20702865.604 x 12%	2 484 343
	Итого с НДС	20702865.604 + 2484343.872	23 187 209

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	24.12.2024 05:43
Представители технического надзора		
650426300695 - САФИН РУЛАН ГАЛИМОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 06:07
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	24.12.2024 12:16
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	25.12.2024 11:31
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	24.12.2024 16:09 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	24.12.2024 16:12
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	25.12.2024 04:27 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 16:18

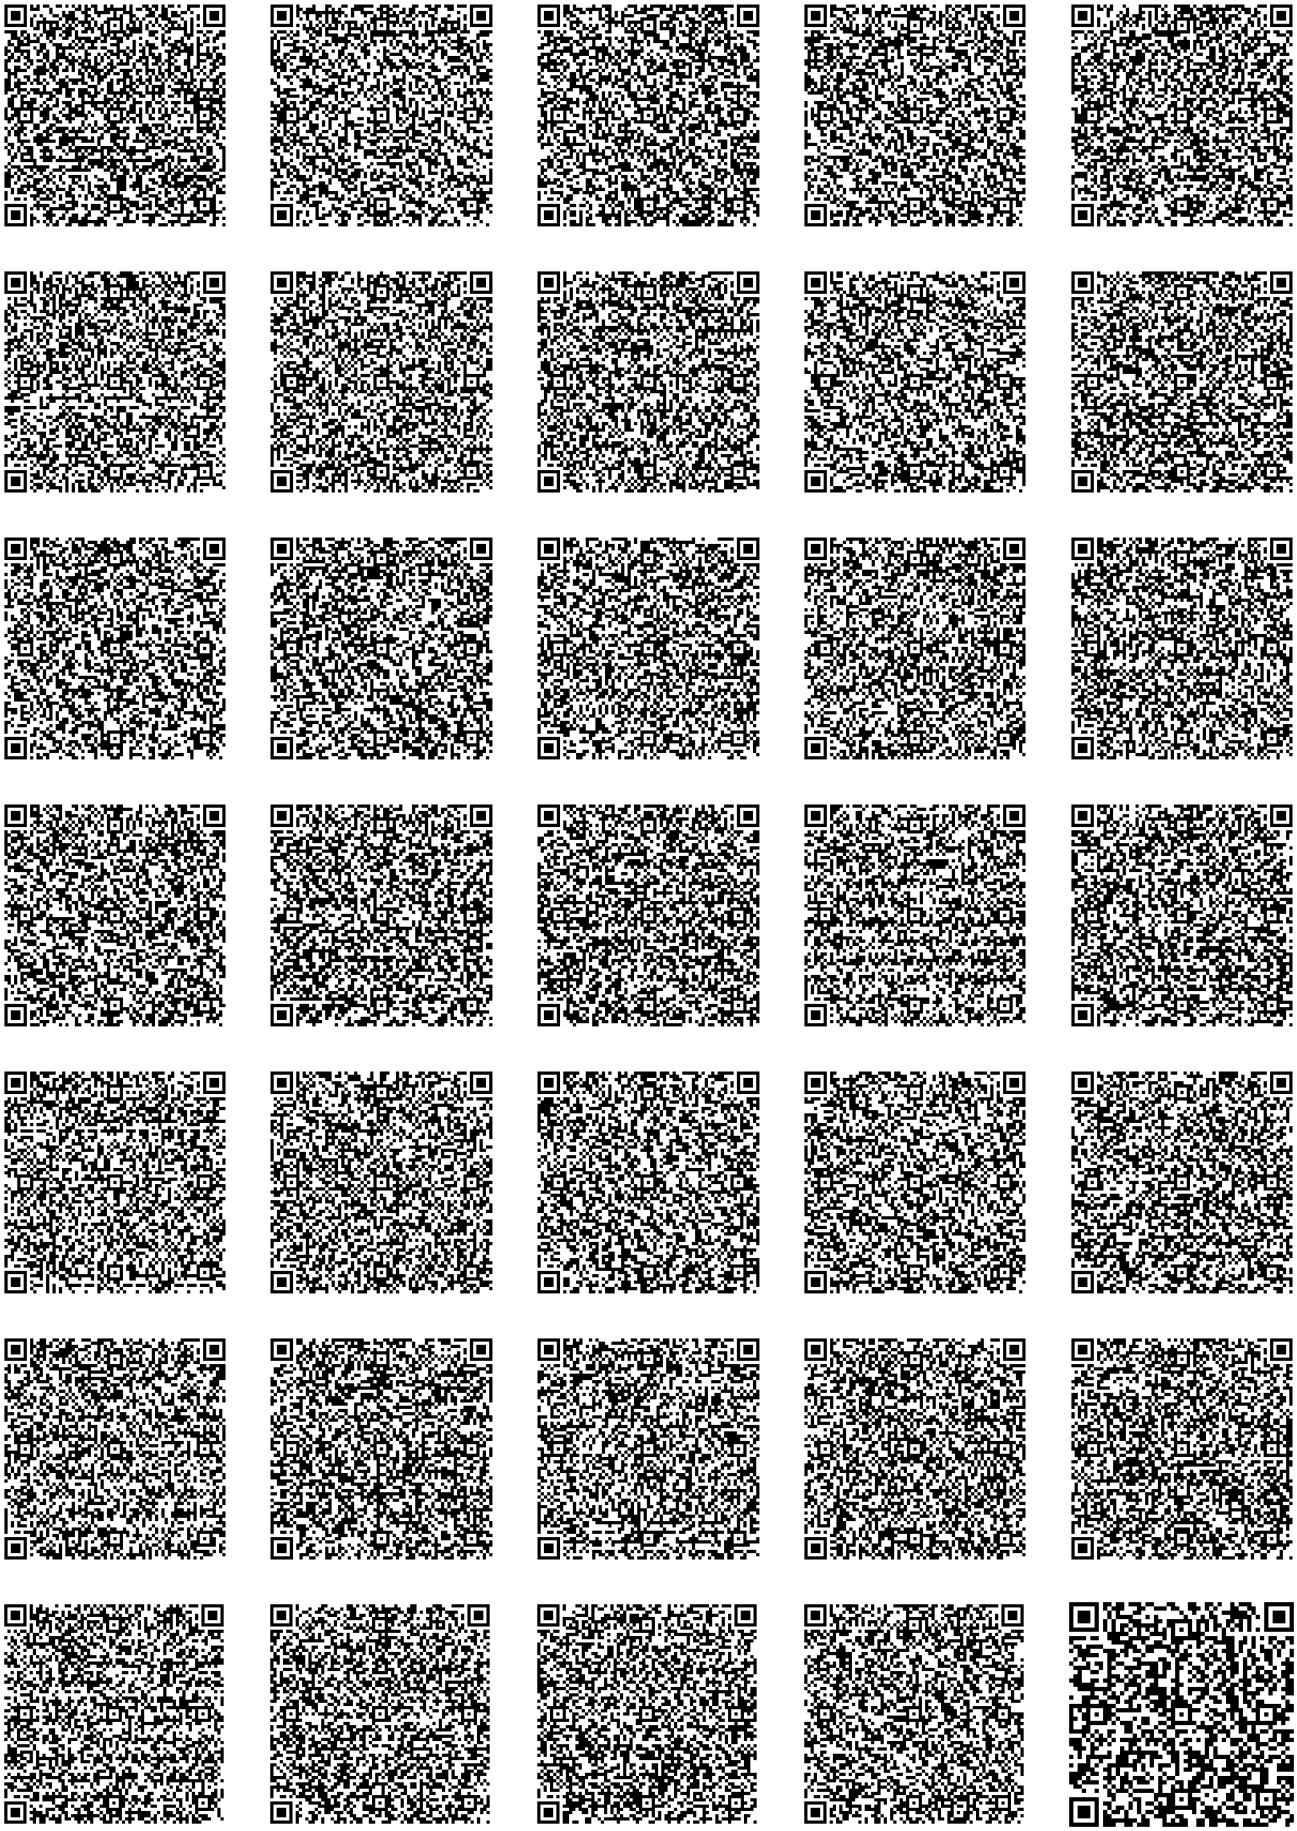

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружное элекроосвещение				
1	1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	113	375	42 375
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	4	9 300	37 200
3	3	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/песок/	м3 грунта	59	4 045	238 655
4	4	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	66	2 733	180 377
5	5	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46	97	4 462
6	6	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	4 045	52 585
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	46	642	29 532
8	8	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	59	460	27 140
9	9	412-102-0110РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов/9,4км/ самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	968	69	66 791
10	10	1133-0207-0103РСНБ РК 2022	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	32	16 806	537 792
11	11	247-103-0267РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66	шт.	32	130 139	4 164 448

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	247-306-0923СпрСЦ 11.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)	шт.	28	13 907	389 396
13	13	247-306-0929СпрСЦ 11.2023	Кронштейн консольный К-1	шт.	32	19 367	619 744
14	14	247-306-0914СпрСЦ 11.2023	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48	шт.	6	8 357	50 142
15	15	261-404-0530РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1.12	5 671	6 352
16	16	243-105-0501РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.245	343 606	84 183
17	17	1133-0304-0402РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	27	32 207	869 589
18	18	212-101-0701РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.3	24 573	302 248
19	19	247-306-1209СпрСЦ 11.2023	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-8м, grey/black	шт.	5	168 741	843 705
20	20	247-306-1206СпрСЦ 11.2023	Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-5м, grey/black, колпак	шт.	22	88 526	1 947 572
21	21	6124-0303-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка пульта управления напольного, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	шт.	1	21 982	21 982
22	22	515-301-1401СпрСЦ 11.2023	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	шт.	1	3 469 944	3 469 944
23	23	6124-0103-2703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж металлических конструкций	т	0.302	1 532 982	462 961
24	24	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.684	205	2 600
25	25	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	6 442	206 144
26	26	247-204-0709РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	32	702	22 464
27	27	6124-0201-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	6 357	12 714
28	28	243-903-2105РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	шт.	2	10 611	21 222
29	29	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	140	1 045	146 300
30	30	6124-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	28	2 029	56 812

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	600	1 113	667 800
32	32	243-113-0804РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0.797	628 835	501 180
33	33	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях	м	145	556	80 620
34	34	241-201-0613РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	145	2 466	357 570
35	35	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм	м	110	192	21 120
36	36	241-201-0610РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	110	829	91 190
37	37	6124-0201-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	700	23	16 100
38	38	249-101-0501РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	700	40	28 000
39	39	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	78	1 577	123 006
40	40	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	25	7 455	186 375
			Итого по локальной смете: Наружное элекроосвещение				**16 990 394**
			ИТОГО по акту:				**16 990 394**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	13520450.610 x 7.30%	986 992
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	16990394.610 + 986992.920	17 977 387
	Сметная прибыль, 5.00%	14507443.530 x 5.00%	725 372
	Непредвиденные расходы, 5.000%	17977387.530 x 5.000%	898 869
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		19 601 629
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750	19601629.083 x 1.0750	21 071 751
	НДС (12%)	21071751.265 x 12%	2 528 610
	Итого с НДС	21071751.265 + 2528610.152	23 600 361

Лист согласования
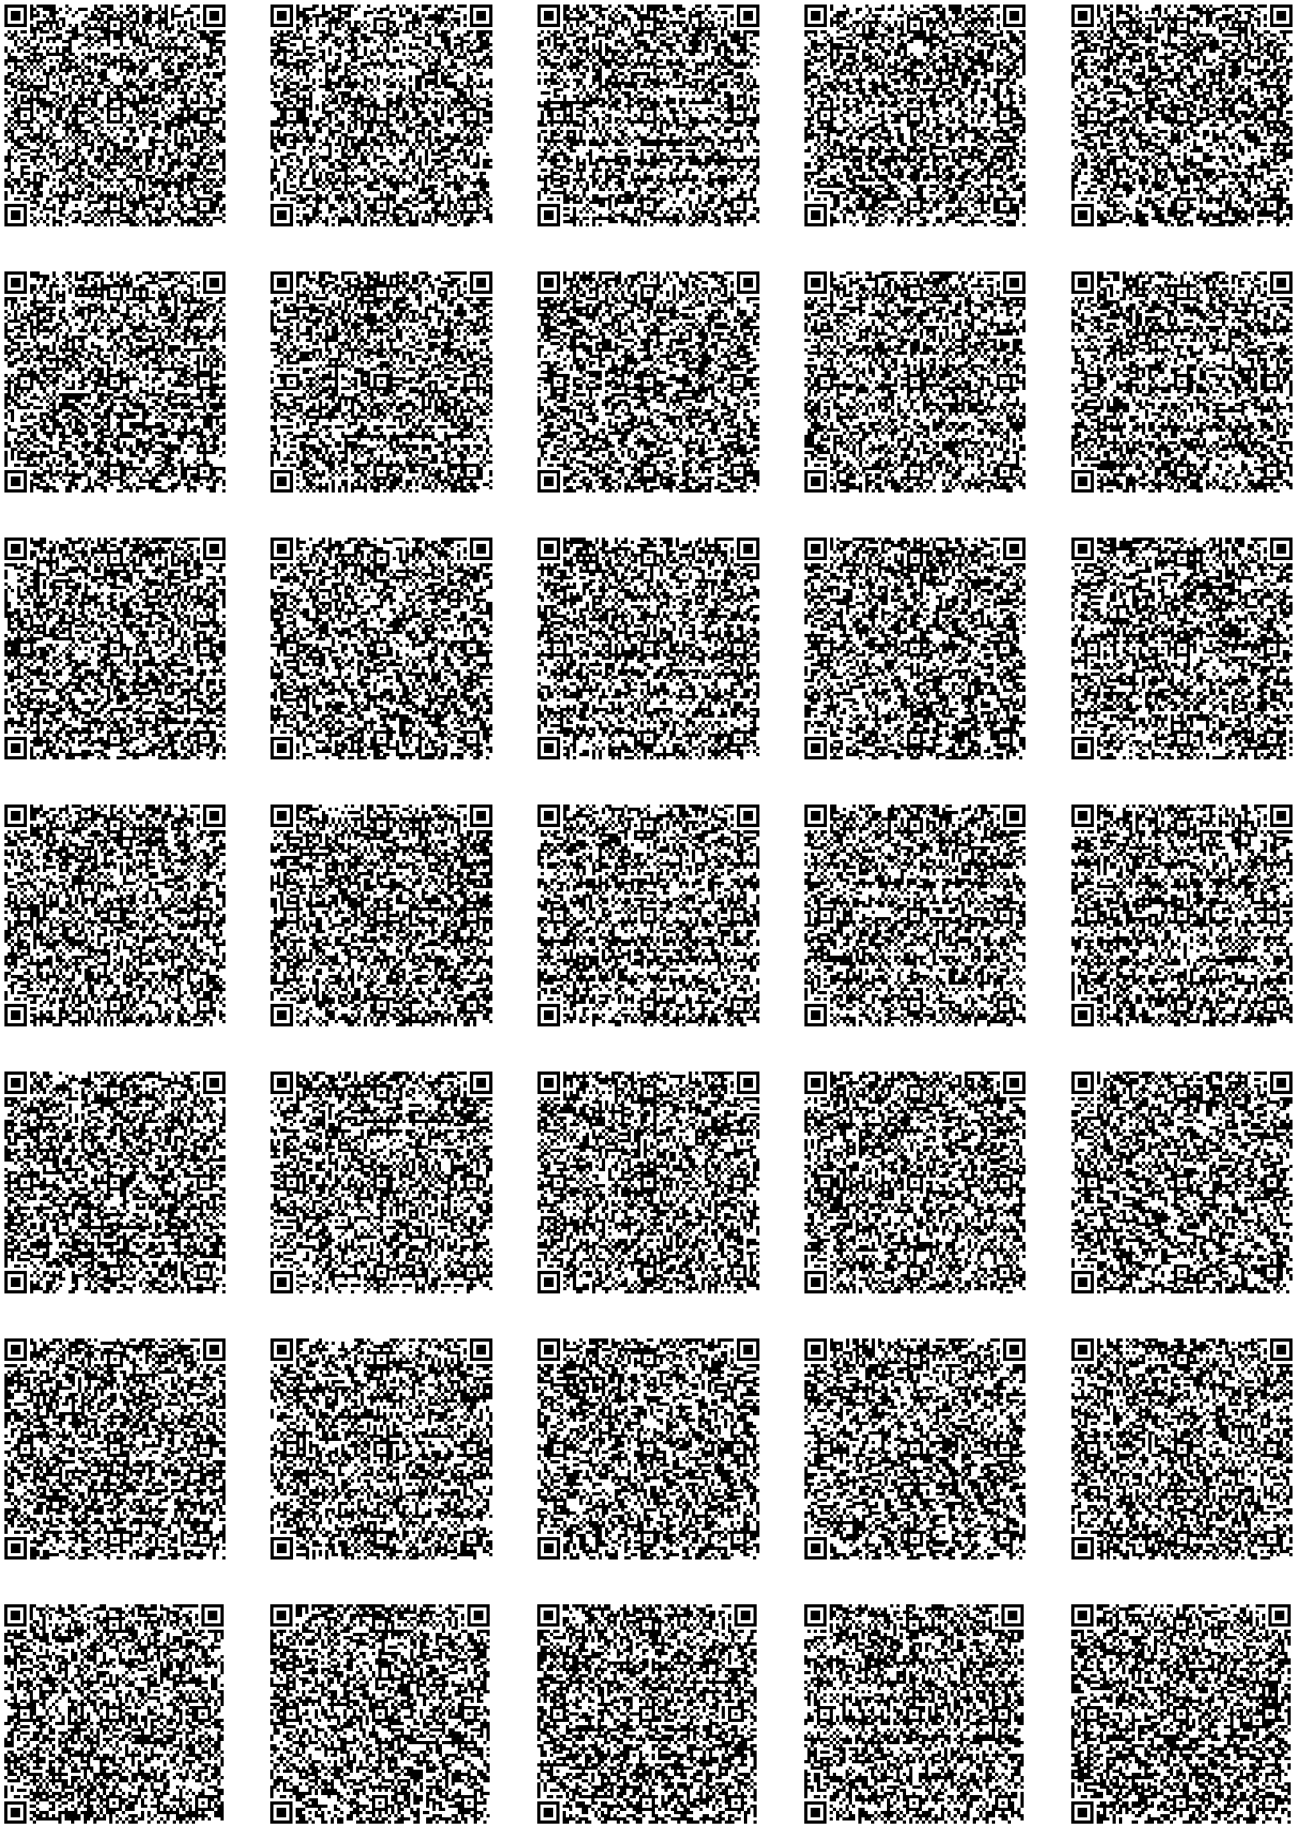
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	24.12.2024 05:44
Представители технического надзора		
650426300695 - САФИН РУЛАН ГАЛИМОВИЧ	Эксперт технического надзора	24.12.2024 06:39
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	24.12.2024 12:15
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	25.12.2024 04:37 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	25.12.2024 10:06
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	25.12.2024 11:46
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	25.12.2024 12:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	26.12.2024 04:15
