Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10.
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа на 900 обучающихся в Костанайском районе Костанайской области.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за март месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	001140004068			**128**	**от 11.08.2023 г.**		
				доп.соглашения: №1 от 19.12.2023 г.; №2 от 30.01.2024 г.; №3 от 28.02.2024 г.; №4 от 16.04.2024 г.; № 5 от 31.07.2024 г.; № 6 от 08.08.2024 г. ; №7 от 30.12.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	**5 582 065 066**	**420 762 307**	**4 983 986 666,07**				**598 078 399,93**	**5 582 065 066**
в том числе: за март месяц 2025 года	**106 128 243**	**106 128 243**	**94 757 359,82**				**11 370 883,18**	**106 128 243**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Технический надзор: **Директор ТОО "MSK Engineering", БИН 070440006322** **Манкеев Ж. Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#829a3ab6-6cfa-4428-bdbb-1315be44b914)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "ASTI", БИН 001140004068, г. Астана, Ж. Нажімеденова 62, НП 7.
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в селе Заречное Заречного сельского округа на 900 обучающихся в Костанайском районе Костанайской области

Реестр актов выполненных работ
за март месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт № 82	Устройство покрытий	**520 848**
2	Акт № 83	Архитектурная часть 2	**9 126 707**
3	Акт № 84	Архитектурная часть 1	**3 985 099**
4	Акт № 86	Общестроительные работы КР	**33 632 728**
5	Акт № 87	Наружные сети теплоснабжения.СО	**700 184**
6	Акт № 88	Архитектурная часть 1	**8 498 461**
7	Акт № 89	Технологическое оборудование-1	**-3 591 969**
8	Акт № 90	Вентиляция	**53 256 185**
		ИТОГО	**106 128 243**

Заказчик: **Первый заместитель Председателя Правления - член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961** **Малгаздаров Г. Т.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подрядчик: **Директор ТОО "ASTI" , БИН 001140004068** **Квон А.А.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Технический надзор: **Директор ТОО "MSK Engineering", БИН 070440006322** **Манкеев Ж. Н.**
М.П. *(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)*

Подписано через EQURYLYS.KZ (#829a3ab6-6cfa-4428-bdbb-1315be44b914)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 910221350048 - КВОН АНТОН null	Директор	Подписано: 20.03.2025 16:28
Технический надзор: ИИН 660124300615 - МАНКЕЕВ ЖОМАРТ null	Директор технического надзора	Подписано: 20.03.2025 17:05
Заказчик: ИИН 850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА null	Ведущий специалист	Подписано: 20.03.2025 18:08
Заказчик: ИИН 750526300411 - МАЛГАЗДАРОВ ГАБИТ null	Первый заместитель Председателя Правления - член Правления	Подписано: 20.03.2025 18:25

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#829a3ab6-6cfa-4428-bdbb-1315be44b914)

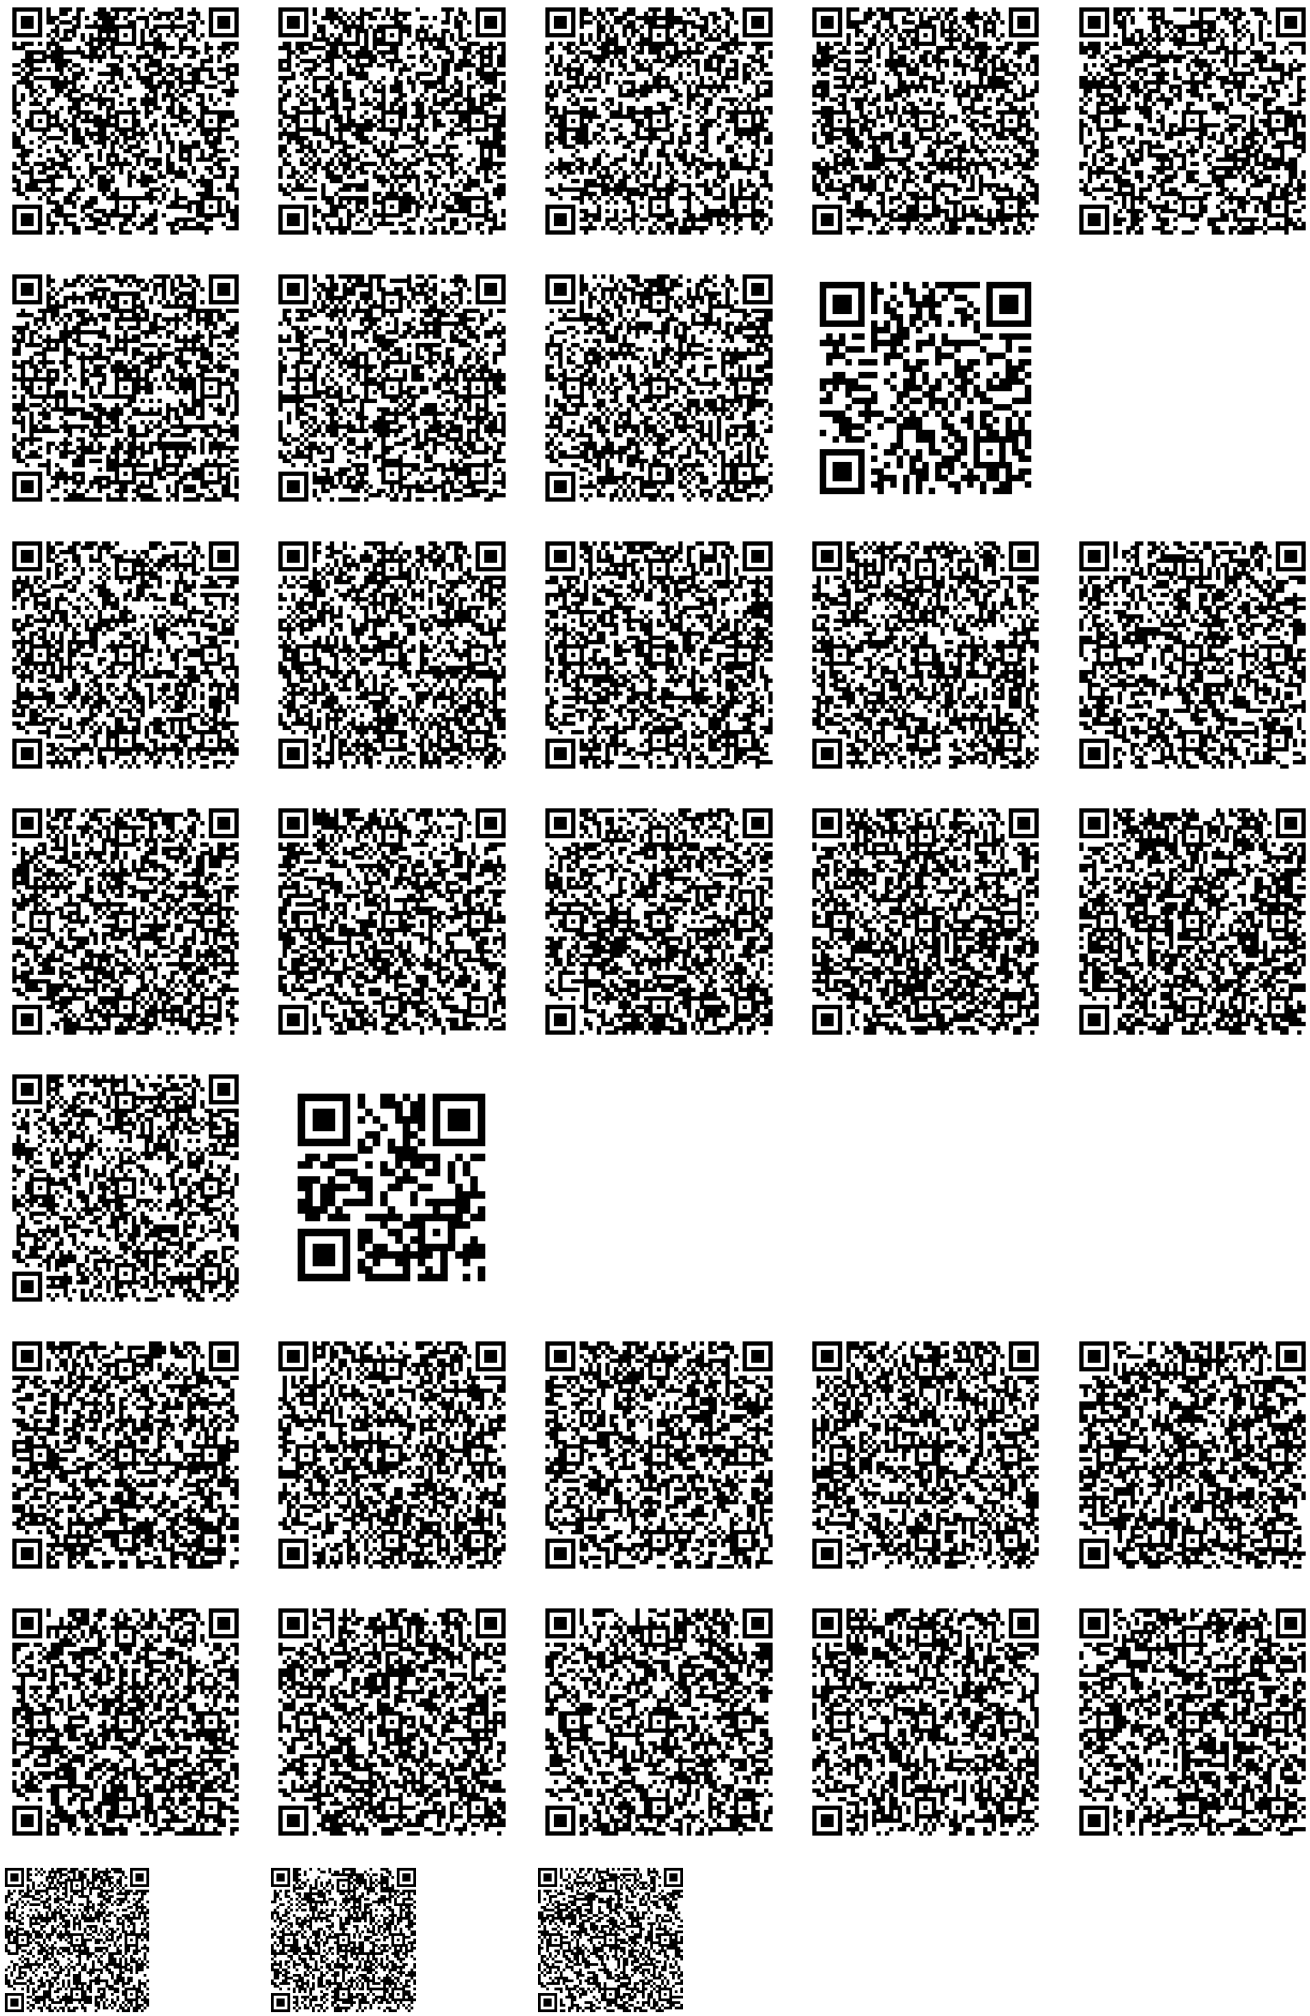

Подписано через EQURYLYS.KZ (#829a3ab6-6cfa-4428-bdbb-1315be44b914)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#829a3ab6-6cfa-4428-bdbb-1315be44b914)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Устройство покрытий				
			Раздел: ПОКРЫТИЯ/ГП л.5,6/				
			Подраздел: Тип 2.ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПО ПОКРЫТИЮ ИЗ БРУСЧАТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА				
1	15	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/до толщ. 15 см/	м3	6.6	6 344	41 870
2	16	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	44	1 757	77 308
			Итого по подразделу: Тип 2.ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПО ПОКРЫТИЮ ИЗ БРУСЧАТКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОЕЗДА				**119 178**
			Подраздел: Тип 3.ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПО ТРОТУАРНОМУ ПОКРЫТИЮ, БРУСЧАТКА				
3	25	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции /20-40/ мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	6.6	1 757	11 596
4	26	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ. 20 см/	м2	6.6	484	3 194
			Итого по подразделу: Тип 3.ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА ПО ТРОТУАРНОМУ ПОКРЫТИЮ, БРУСЧАТКА				**14 790**
			Подраздел: Песок /18 м2/				
5	56	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка/до толщ. 50 см/	м3	9	6 344	57 096
			Итого по подразделу: Песок /18 м2/				**57 096**
			Подраздел: Разметка				
6	61	7101-0803-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,12 м	км	1.587	110 555	175 451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Разметка				**175 451**
			Итого по разделу: ПОКРЫТИЯ/ТП л.5,6/				**366 515**
			Итого по локальной смете: Устройство покрытий				**366 515**
			ИТОГО по акту:				**366 515**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (7.300%)				366515.000 x 7.30%	26 756
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				366515.000 + 26755.596	393 271
		Сметная прибыль, (5.00%)				393270.596 x 5.00%	19 664
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				393270.596 x 5.000%	19 664
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					432 598
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750				432597.655 x 1.0750	465 042
		НДС (12%)				465042.479 x 12%	55 805
		Итого с НДС				465042.479 + 55805.098	520 848

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	18.03.2025 19:56
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	19.03.2025 10:33
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 20:02
Представители заказчика		
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	19.03.2025 10:48
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	19.03.2025 10:57
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	19.03.2025 12:50 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	19.03.2025 10:47 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	19.03.2025 13:42

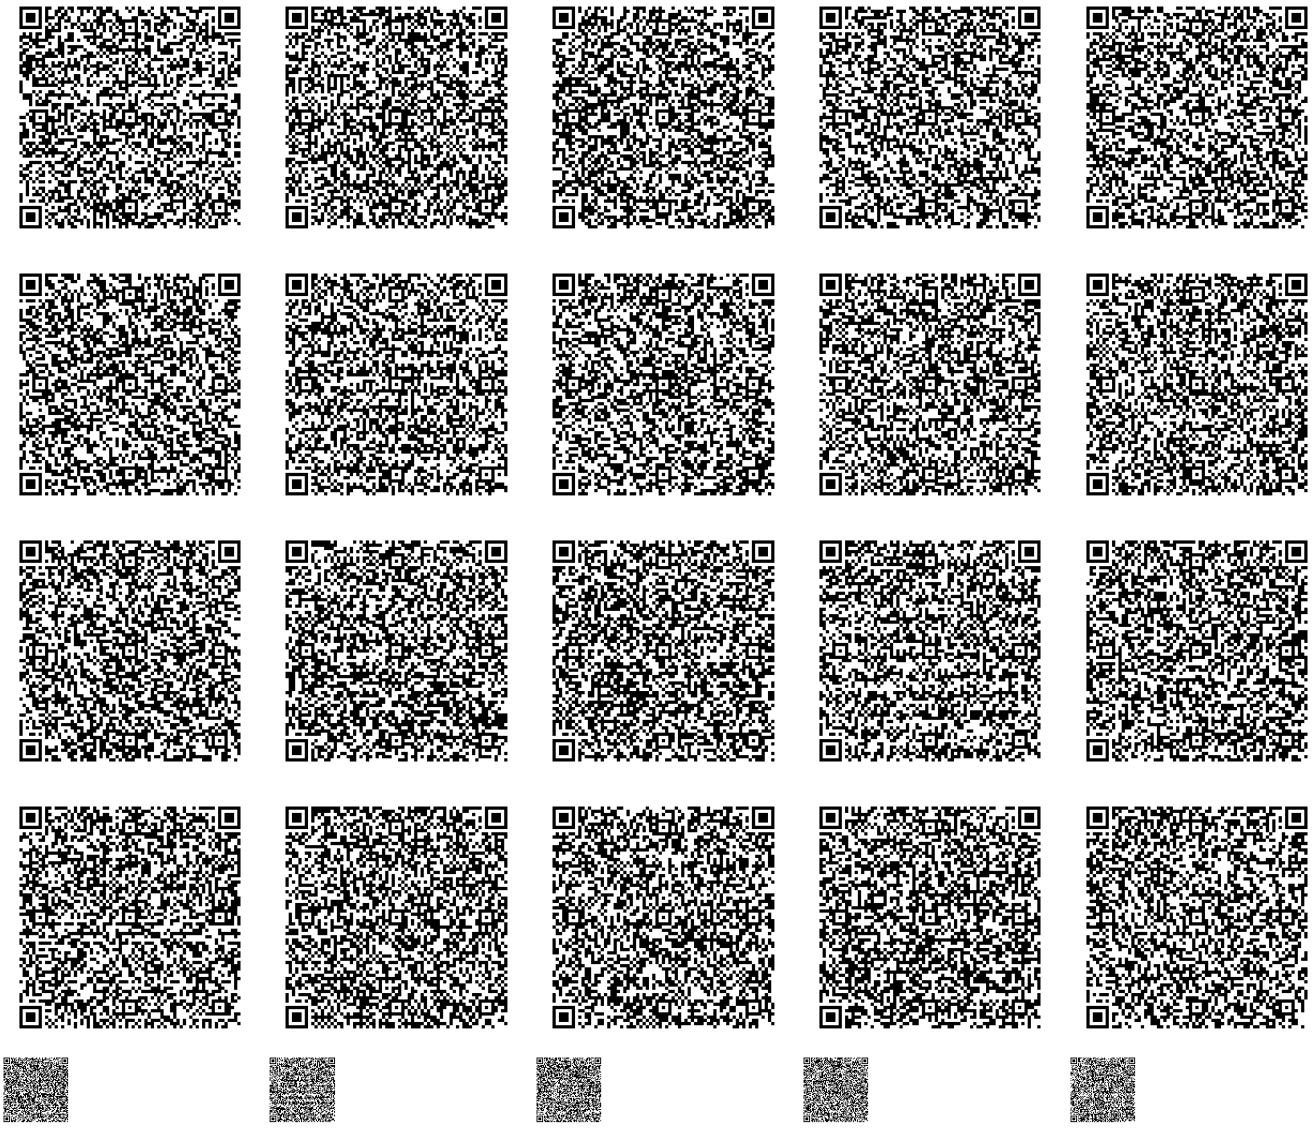

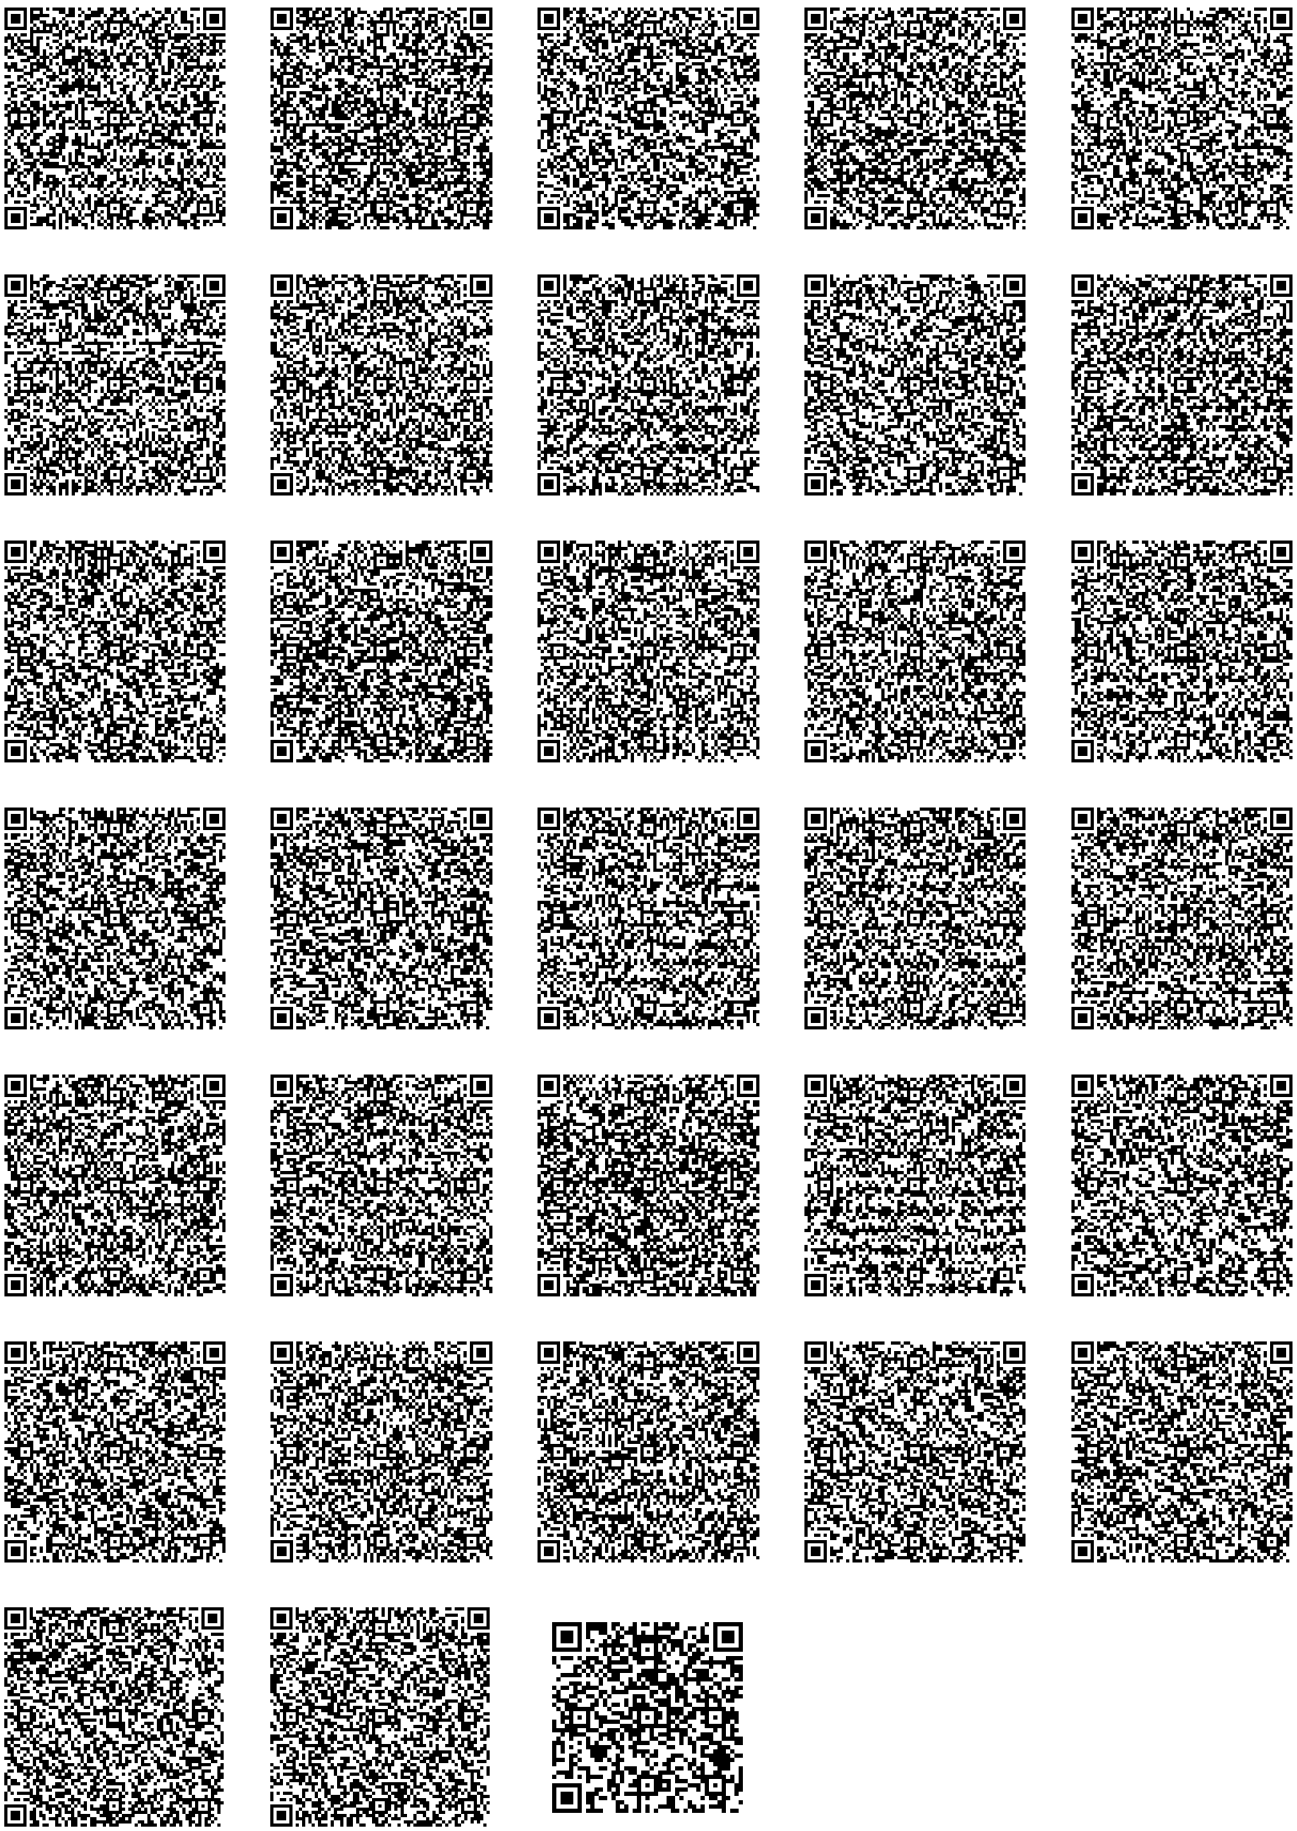

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 2				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/1.12-4.12,13.02,01.03				
			Подраздел: ПЛИНТУСА 1 ЭТАЖ/04.12,13.02,01.03				
1	373	6109-0401-0801ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	631.23	562	354 751
2	376	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	637.542	1 833	1 168 614
			Итого по подразделу: ПЛИНТУСА 1 ЭТАЖ/04.12,13.02,01.03				**1 523 365**
			Подраздел: ПЛИНТУСА 2 ЭТАЖ				
3	429	6109-0401-0801ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	823.53	562	462 823
4	432	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	831.765	1 833	1 524 625
			Итого по подразделу: ПЛИНТУСА 2 ЭТАЖ				**1 987 449**
			Подраздел: ПЛИНТУСА 3 ЭТАЖ				
5	482	6109-0401-0801ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	767.73	562	431 464
6	483	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	775.407	1 833	1 421 321
			Итого по подразделу: ПЛИНТУСА 3 ЭТАЖ				**1 852 785**
			Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АР л.100-104/1.12-4.12,13.02,01.03				**5 363 600**
			Раздел: СИСТЕМЫ КНАУФ/АР л.105/04.12,13.02				
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-А, D=87,5/				
7	503	6107-0204-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	82.675	5 521	456 448
8	504	232-101-0102РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	86.809	741	64 325

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	505	6111-0402-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	82.3	1 879	154 641
10	506	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	4.258	15 111	64 342
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-А, D=87,5/				**739 758**
			Подраздел: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-Н2, D=87,5/				
11	507	6107-0204-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	34.79	5 521	192 075
12	508	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	36.531	944	34 485
13	509	6111-0402-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	34.79	1 879	65 370
14	510	234-101-0301РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная/АкустикКнауф/ из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	1.792	15 111	27 078
			Итого по подразделу: ОБЛИЦОВКА СТЕН ГИПСОКАРТОНОМ С-625/ГСП-Н2, D=87,5/				**319 010**
			Итого по разделу: СИСТЕМЫ КНАУФ/АР л.105/04.12,13.02				**1 058 768**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 2				**6 422 368**
			ИТОГО по акту:				**6 422 368**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (7.300%)	6422368.800 x 7.30%	468 832
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	6422368.800 + 468832.935	6 891 201
	Сметная прибыль, (5.00%)	6891201.735 x 5.00%	344 560
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	6891201.735 x 5.000%	344 560
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		7 580 321
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750	7580321.908 x 1.0750	8 148 846
	НДС (12%)	8148846.051 x 12%	977 861
	Итого с НДС	8148846.051 + 977861.526	9 126 707

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	18.03.2025 19:38
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	19.03.2025 10:32
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 20:01
Представители заказчика		
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	19.03.2025 13:07
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	20.03.2025 10:13 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	20.03.2025 12:28
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	19.03.2025 15:21
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	19.03.2025 11:56 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы

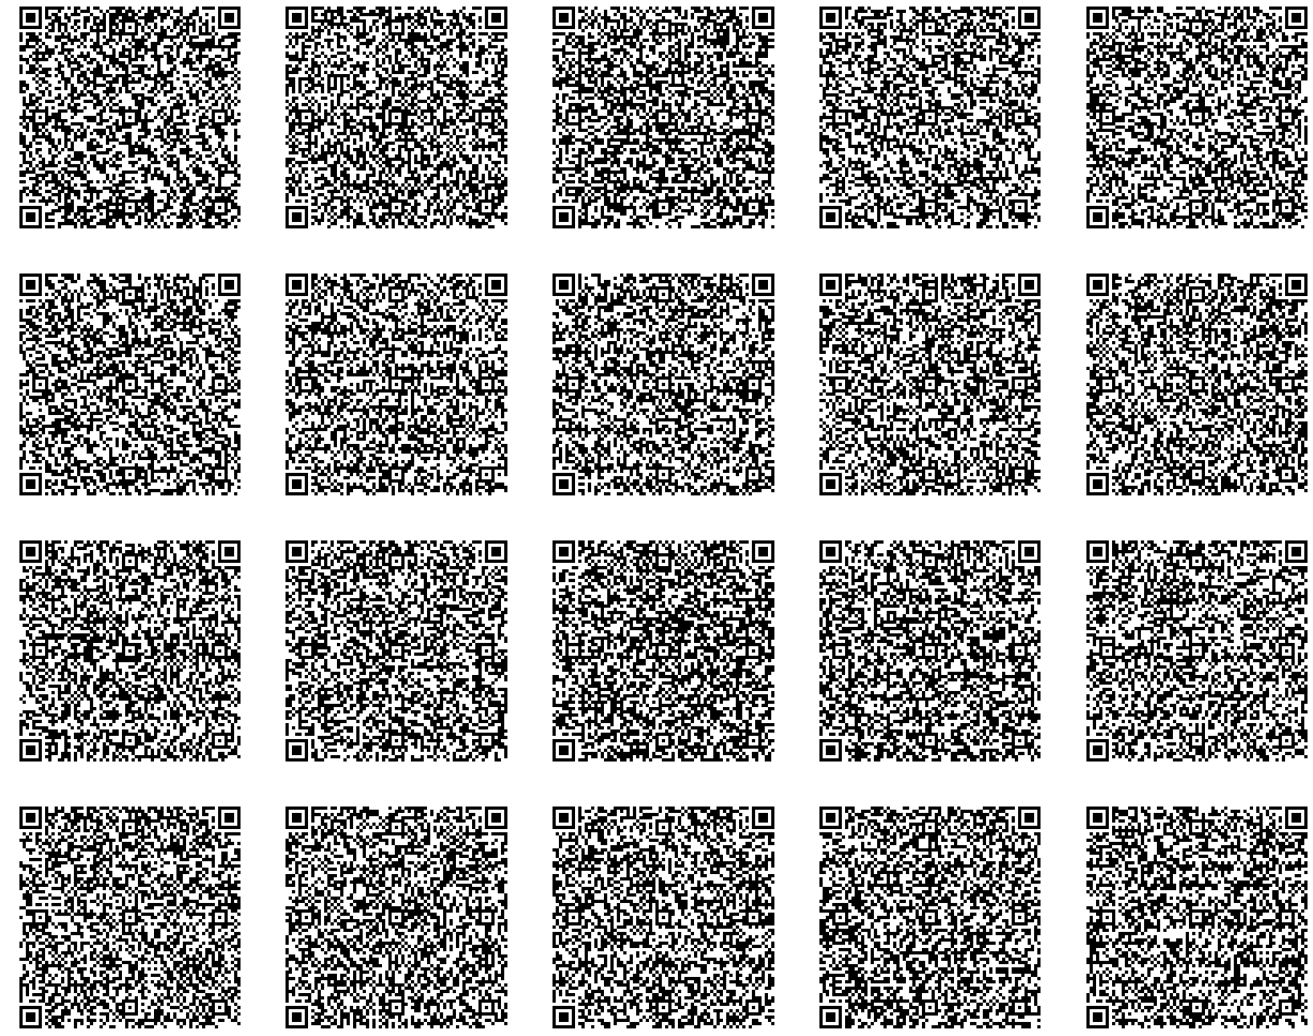

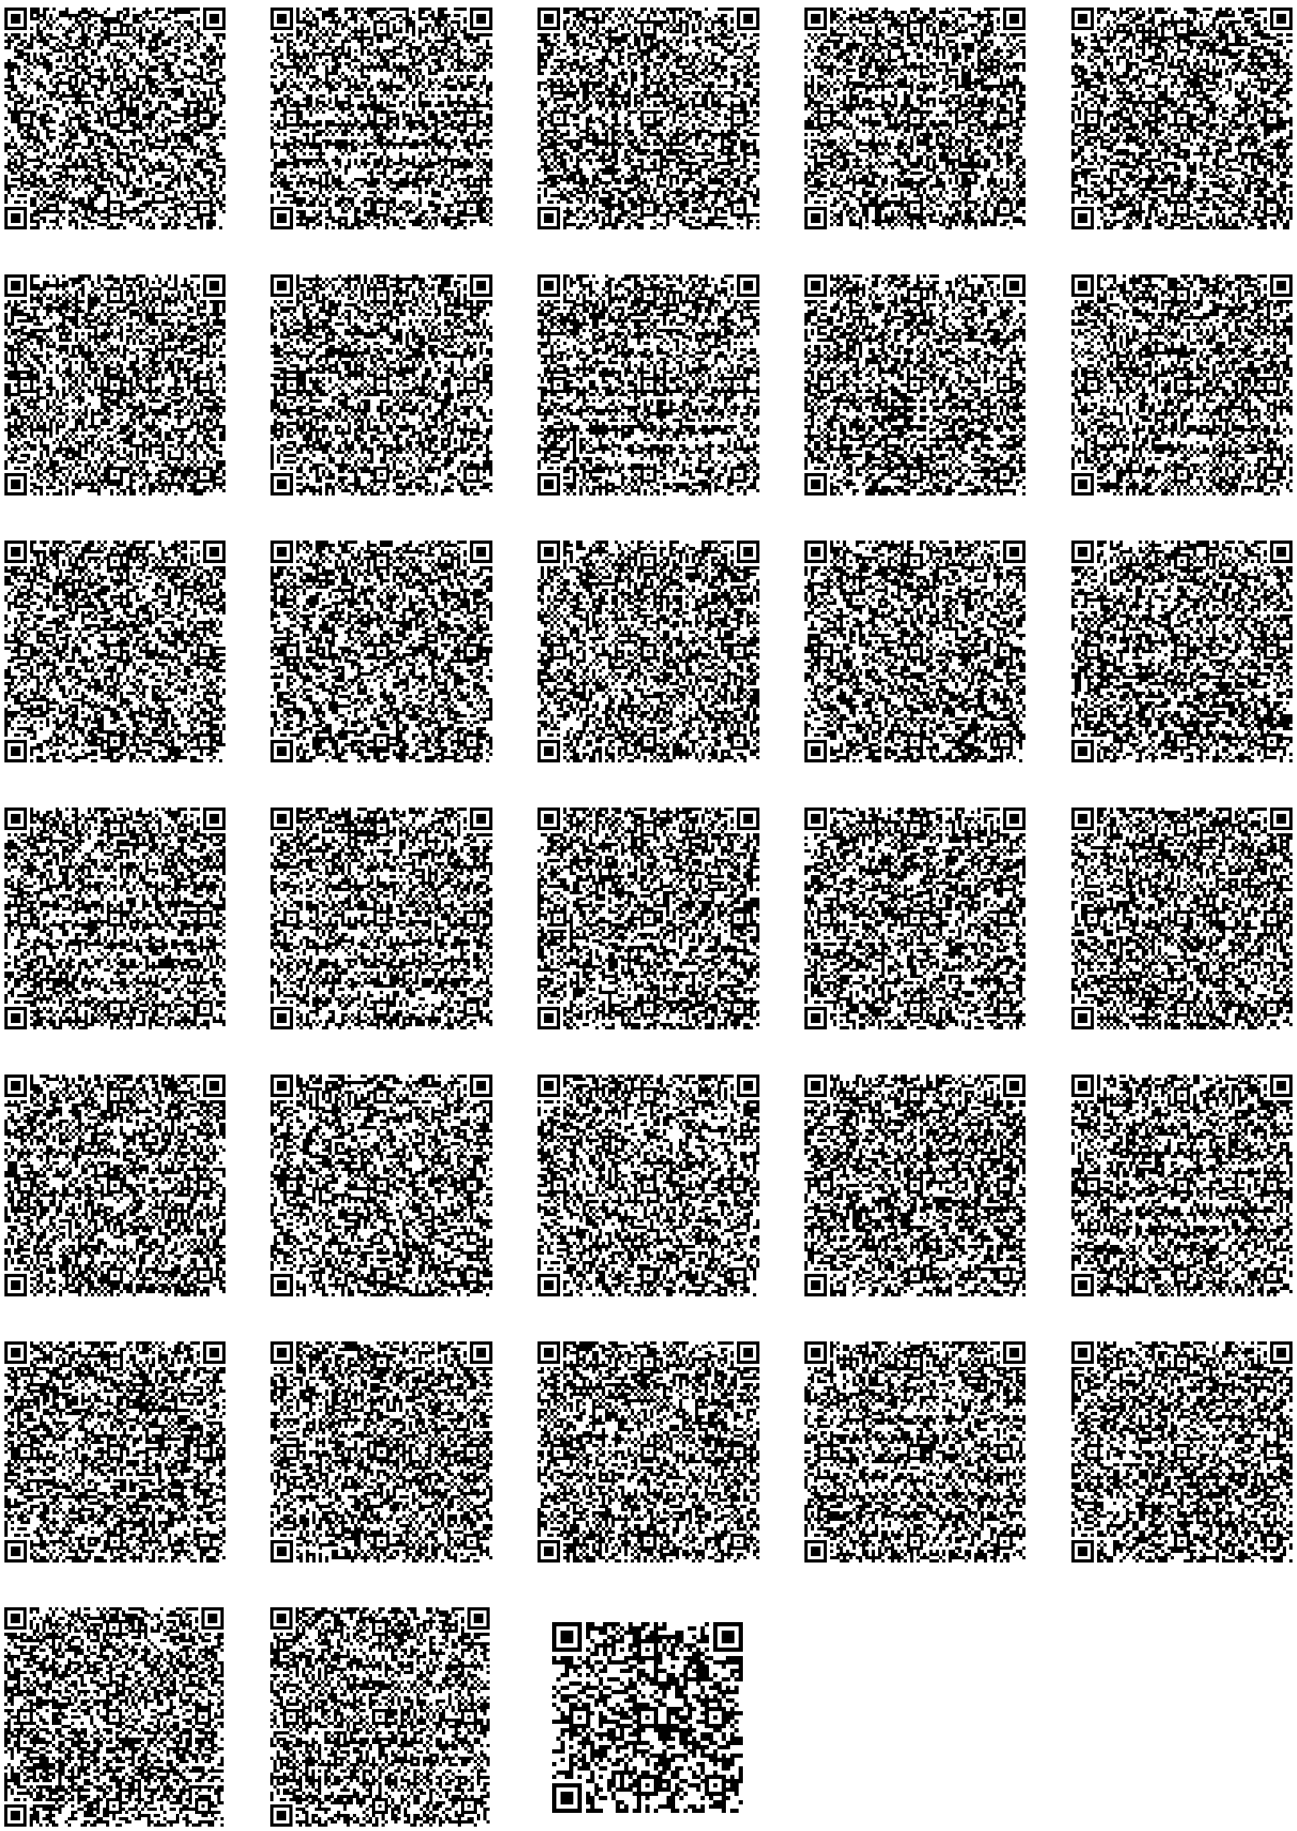

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 1				
			Раздел: КЛАДКА /АР л.30-33/29.11,11.12,10.02,29.02				
			Подраздел: КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА /М-125 и М-100, 250х120х88/770,510,380,250мм/				
1	42	6105-0201-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	37	35 034	1 296 258
2	43	213-101-0502РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	13	115 942	1 507 246
3	44	213-101-0501РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0.1	115 942	11 594
4	45	212-401-0102РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6	15 416	92 496
			Итого по подразделу: КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА /М-125 и М-100, 250х120х88/770,510,380,250мм/				**2 907 594**
			Итого по разделу: КЛАДКА /АР л.30-33/29.11,11.12,10.02,29.02				**2 907 594**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 1				**2 907 594**
			ИТОГО по акту:				**2 907 594**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)				2907594.200 x 7.30%	212 254
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2907594.200 + 212254.382	3 119 848
		Сметная прибыль, (5.00%)				3119848.582 x 5.00%	155 992
		Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)				3119848.582 x 5.000%	155 992
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					3 431 833
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, II квартал 2024 г., к = 1.0368				3431833.440 x 1.0368	3 558 124
		НДС (12%)				3558124.911 x 12%	426 974
		Итого с НДС				3558124.911 + 426974.989	3 985 099

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	18.03.2025 18:57
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	19.03.2025 10:31
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 20:03
Представители заказчика		
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	20.03.2025 12:18
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	19.03.2025 12:21 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	19.03.2025 13:07
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	20.03.2025 10:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	19.03.2025 19:07

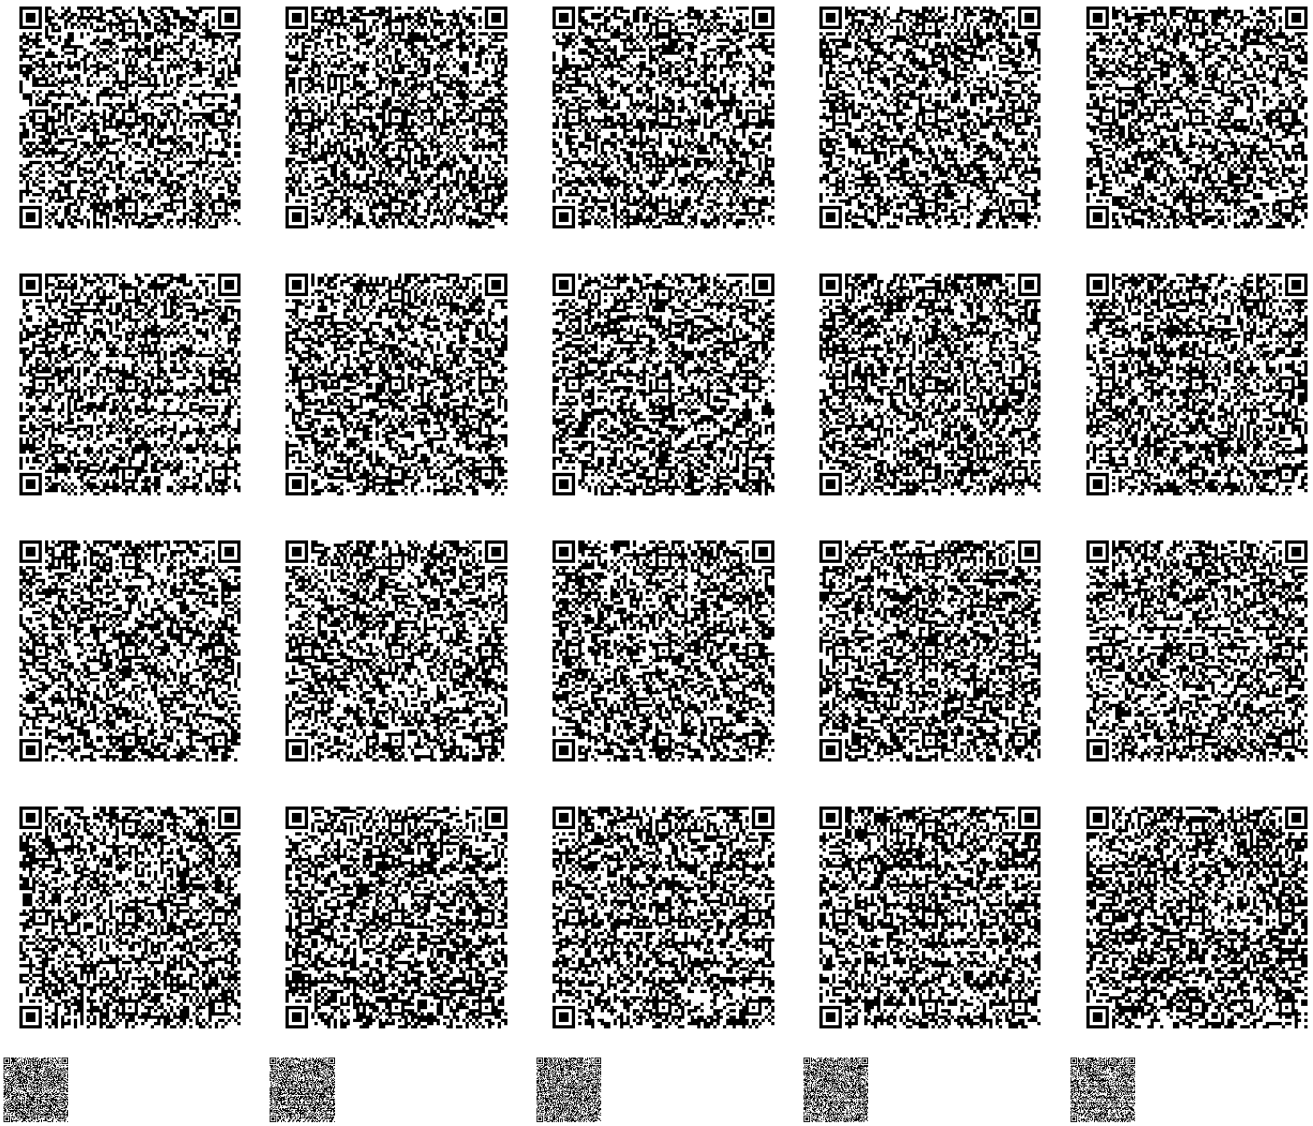

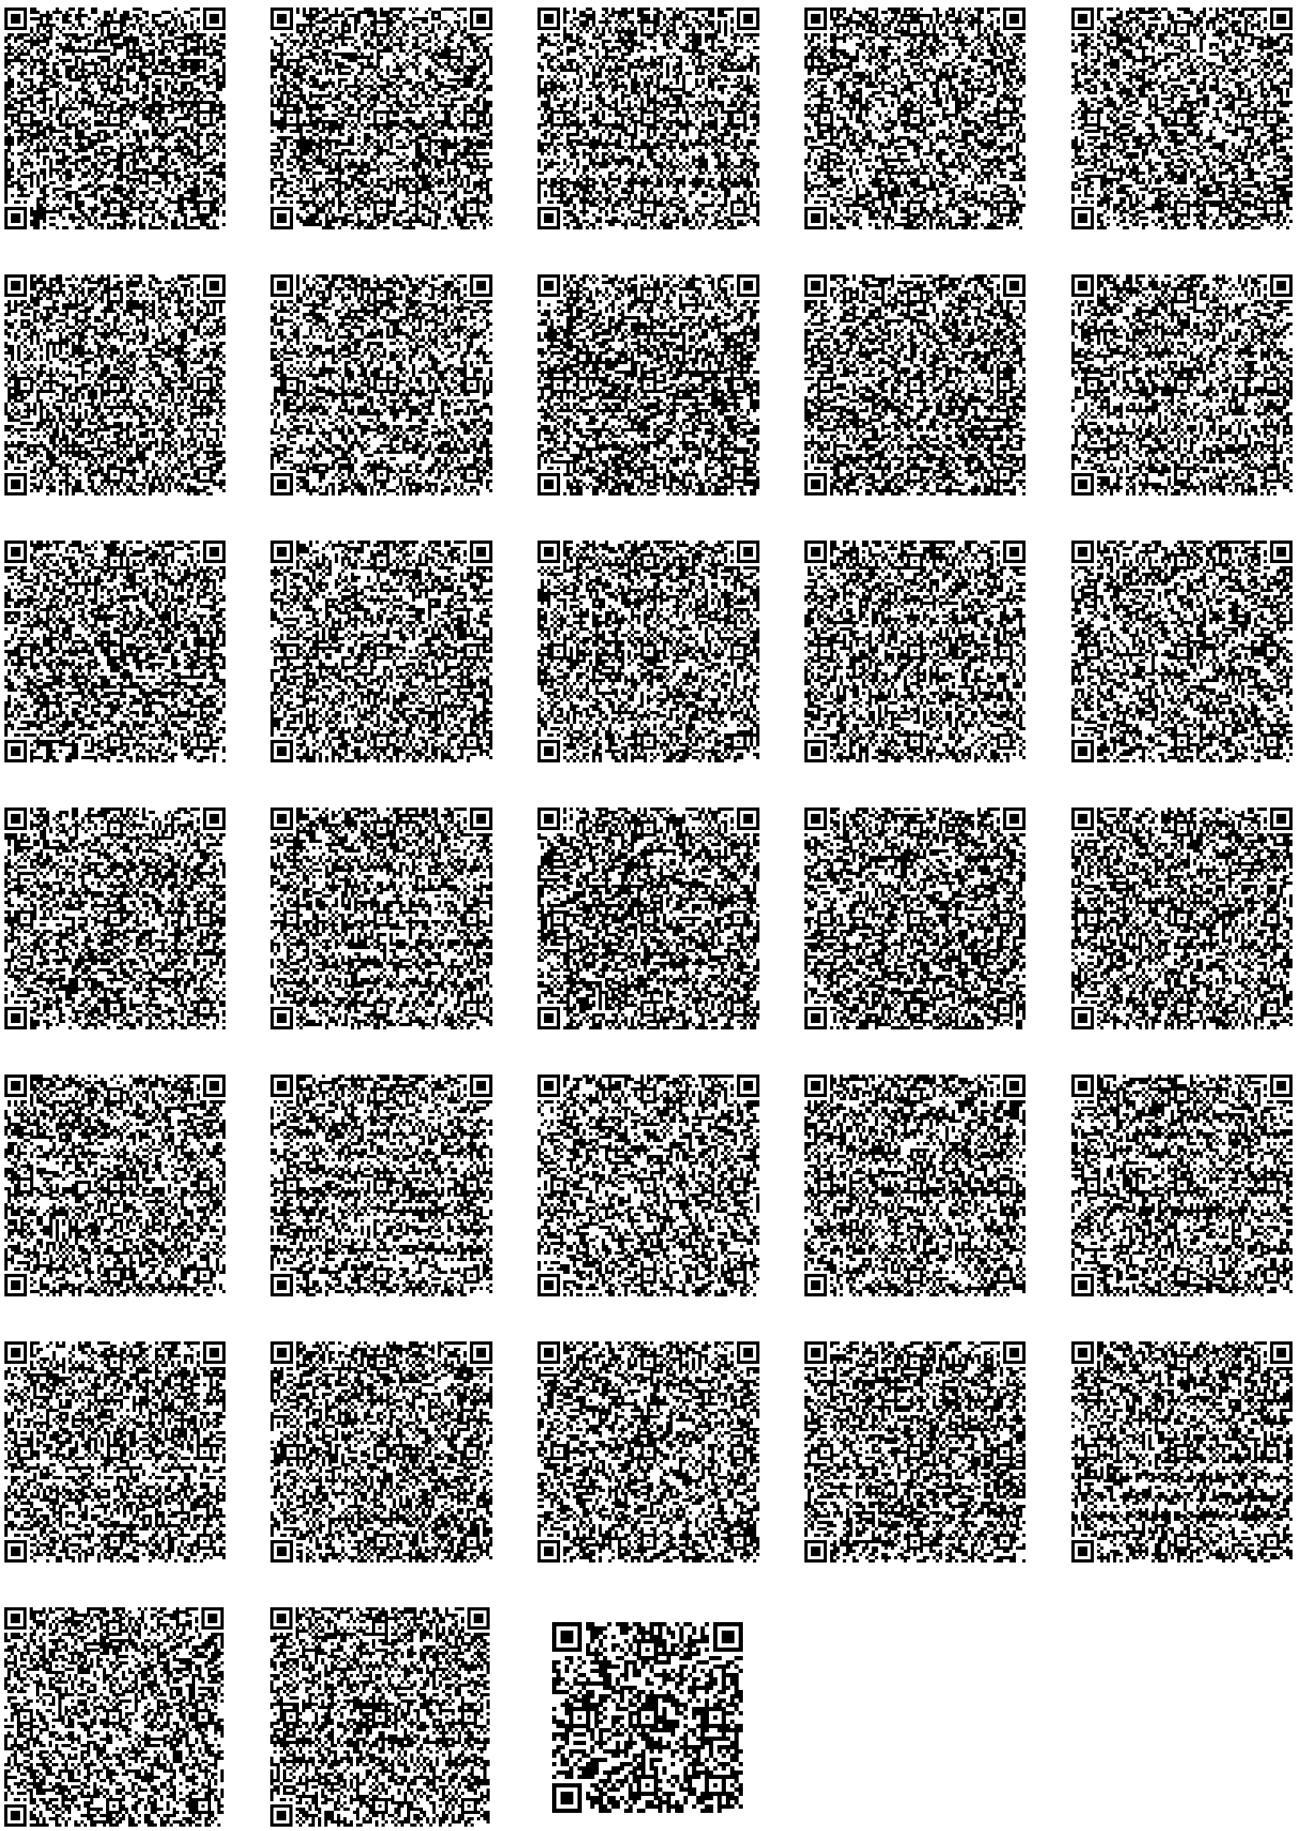

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Общестроительные работы КР				
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ СБОРНЫЕ/18.11,07.02,26.02,29.02				
			Подраздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. БЛОК А-2. На отм-ке -9,600/КЖ л./				
1	77	6104-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	6	7 537	45 222
2	78	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	77	9 163	705 551
3	79	222-203-0407РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	593.1	14 024	8 317 634
			Итого по подразделу: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ. БЛОК А-2. На отм-ке -9,600/КЖ л./				**9 068 407**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-6/3шт./КР л.11/				
4	112	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	34.758	267	9 280
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-6/3шт./КР л.11/				**9 280**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-11/1шт./КР л.12/				
5	145	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10.66	267	2 846
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-11/1шт./КР л.12/				**2 846**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-12/1шт./КР л.12/				
6	157	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	16.864	267	4 503
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-12/1шт./КР л.12/				**4 503**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-13/1шт./КР л.12/				
7	170	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	20.738	267	5 537
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-13/1шт./КР л.12/				**5 537**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Монолитный участок МУ-15/3шт./КР л.13/				
8	195	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	36.609	267	9 775
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-15/3шт./КР л.13/				**9 775**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-16/3шт./КР л.13/				
9	208	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	36.327	267	9 699
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-16/3шт./КР л.13/				**9 699**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-17/3шт./КР л.13/				
10	221	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	35.883	267	9 581
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-17/3шт./КР л.13/				**9 581**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-18/2шт./КР л.12/				
11	234	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	46.02	267	12 287
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-18/2шт./КР л.12/				**12 287**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-20/2шт./КР л.12/				
12	249	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	33.21	267	8 867
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-20/2шт./КР л.12/				**8 867**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-21/1шт./КР л.14/				
13	262	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7.216	267	1 927
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-21/1шт./КР л.14/				**1 927**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-22/1шт./КР л.14/				
14	275	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7.787	267	2 079
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-22/1шт./КР л.14/				**2 079**
			Подраздел: Монолитный участок МУ-23/1шт./КР л.14/				
15	288	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7.151	267	1 909
			Итого по подразделу: Монолитный участок МУ-23/1шт./КР л.14/				**1 909**
			Итого по разделу: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ СБОРНЫЕ/18.11,07.02,26.02,29.02				**9 146 698**
			Раздел: ПРОГОНЫ. БЛОК А1/1,2,3 этажи/КР л.47/20.11,08.02,26.02				
			Подраздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 510мм/КЖ л./				
16	1202	6103-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство/пояса/ стены, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	35	44 332	1 551 620
17	1203	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	35.525	23 757	843 967

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	1204	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.546	350 886	191 584
19	1205	6103-0701-0808ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка/ЗД-1/ детали закладной, вес до 20 кг	т	1.215	1 419 324	1 724 479
			Итого по подразделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 510мм/КЖ л./				**4 311 650**
			Подраздел: КАРКАС КП-1/234м.п./л.48/				
20	1206	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7393	346 402	256 095
21	1207	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.3853	350 886	135 196
22	1208	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5586	334 129	520 773
23	1209	6103-0703-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных/КП-1/ условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2.6833	85 169	228 534
			Итого по подразделу: КАРКАС КП-1/234м.п./л.48/				**1 140 599**
			Подраздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 380мм/КЖ л./				
24	1210	6103-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство/пояса/ стены, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	32	44 332	1 418 624
25	1211	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32.48	23 757	771 627
26	1212	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.7486	350 886	262 673
			Итого по подразделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 380мм/КЖ л./				**2 452 925**
			Подраздел: КАРКАС КП-2/330м.п./л.48/				
27	1213	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.946	346 402	327 696
28	1214	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.543	350 886	190 531
29	1215	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7813	334 129	261 055
30	1216	6103-0703-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных/КП-1/ условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2.2706	85 169	193 385
			Итого по подразделу: КАРКАС КП-2/330м.п./л.48/				**972 667**
			Подраздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 510мм/КЖ л./				
31	1222	6103-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство/пояса/ стены, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	38.6	44 332	1 711 215
32	1223	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	39.179	23 757	930 776
33	1224	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.5933	350 886	208 181
			Итого по подразделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 510мм/КЖ л./				**2 850 171**
			Подраздел: КАРКАС КП-1/255м.п./				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	1225	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.806	346 402	279 200
35	1226	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.42	350 886	147 372
36	1227	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.698	334 129	567 351
37	1228	6103-0703-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных/КП-1/ условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2.924	85 169	249 034
			Итого по подразделу: КАРКАС КП-1/255м.п./				**1 242 957**
			Подраздел: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 380мм/КЖ л./				
38	1229	6103-0101-0302ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство/пояса/ стены, высота до 3 м, толщина от 300 до 500 мм	м3	24	44 332	1 063 968
39	1230	212-101-0601РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24.36	23 757	578 721
40	1231	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.4593	350 886	161 162
			Итого по подразделу: МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС ДЛЯ СТЕН 380мм/КЖ л./				**1 803 850**
			Подраздел: КАРКАС КП-2/270м.п./				
41	1232	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.774	346 402	268 115
42	1233	214-210-0501РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.4446	350 886	156 004
43	1234	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6393	334 129	213 609
44	1235	6103-0703-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных/КП-1/ условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1.857	85 169	158 159
			Итого по подразделу: КАРКАС КП-2/270м.п./				**795 887**
			Итого по разделу: ПРОГОНЫ. БЛОК А1/1,2,3 этажи/КР л.47/20.11,08.02,26.02				**15 570 706**
			Раздел: КАРКАСЫ ВЕНТШАХТ НА КРОВЛЕ /КР л.83-101/09.02,28.02				
			Подраздел: ЗОНТЫ ЗМ1 - ЗМ13/КР л.152-154/09.02,28.02				
45	2176	214-301-0201РСНБ РК 2022	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 толщиной 1,0 мм	м2	25.147	10 731	269 852
			Итого по подразделу: ЗОНТЫ ЗМ1 - ЗМ13/КР л.152-154/09.02,28.02				**269 852**
			Итого по разделу: КАРКАСЫ ВЕНТШАХТ НА КРОВЛЕ /КР л.83-101/09.02,28.02				**269 852**
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы КР				**24 987 257**
			ИТОГО по акту:				**24 987 257**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (7.300%)	24987256.502 x 7.30%	1 824 070
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	24987256.502 + 1824069.772	26 811 326
	Сметная прибыль, (5.00%)	26811326.274 x 5.00%	1 340 566
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	26811326.274 x 5.000%	1 340 566

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					29 492 459
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, I квартал 2024 г., к = 1.0182				29492458.902 x 1.0182	30 029 222
		НДС (12%)				30029221.654 x 12%	3 603 507
		Итого с НДС				30029221.654 + 3603506.598	33 632 728

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	17.03.2025 16:11
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	18.03.2025 10:33
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 09:27
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	18.03.2025 11:05 Комментарий: расценки согласно локальной сметы
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	18.03.2025 11:46
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	18.03.2025 12:16
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	18.03.2025 15:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	19.03.2025 13:38

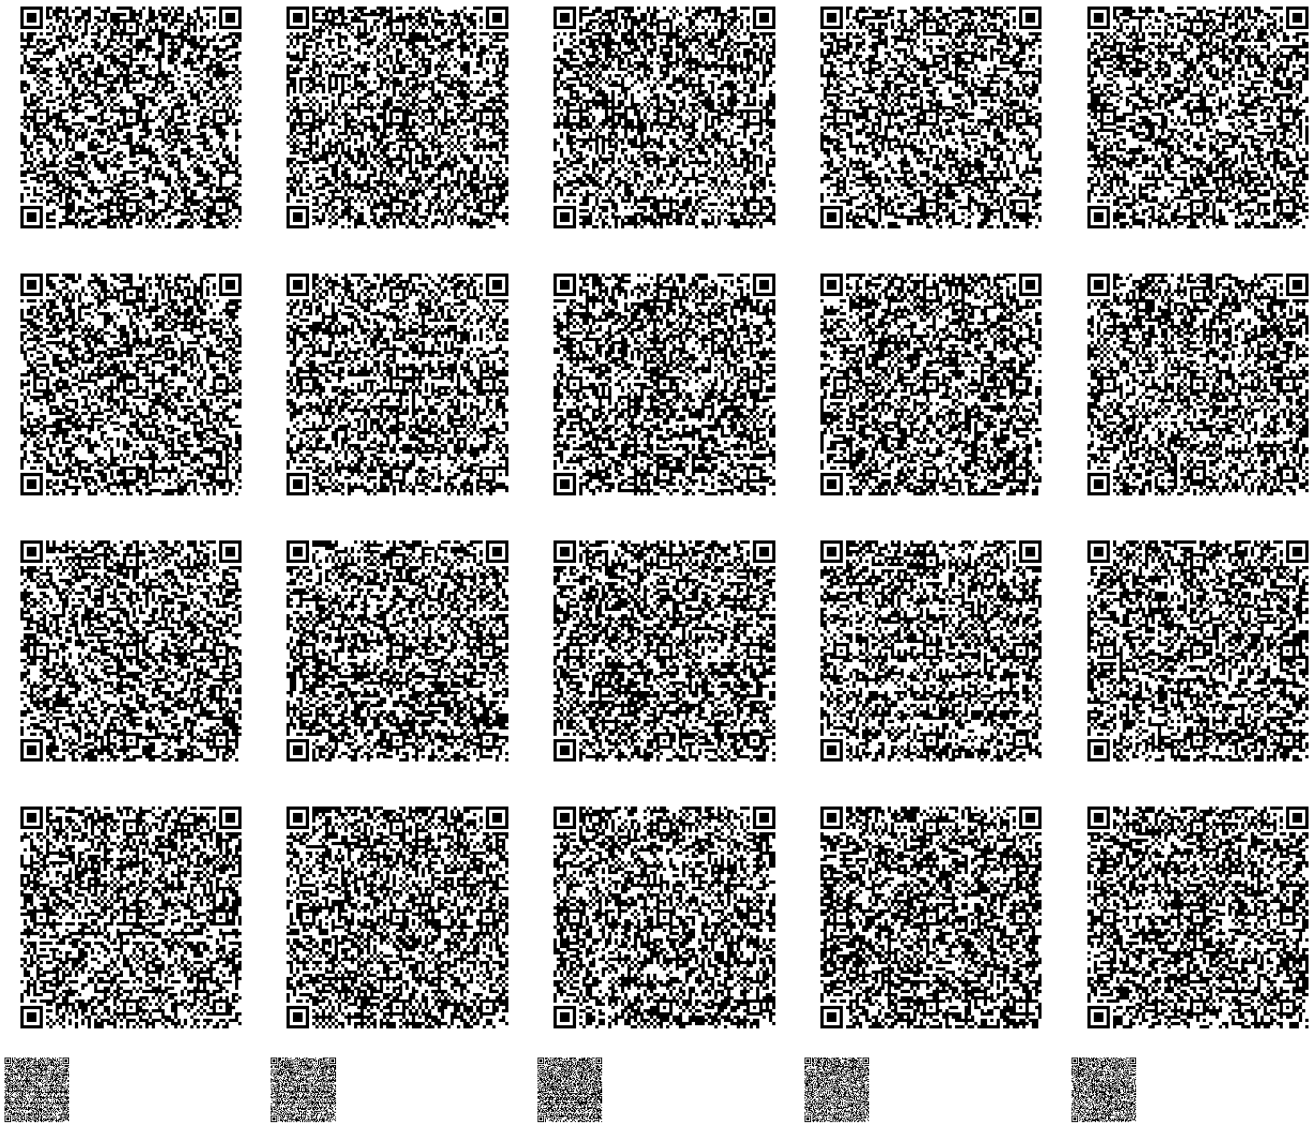

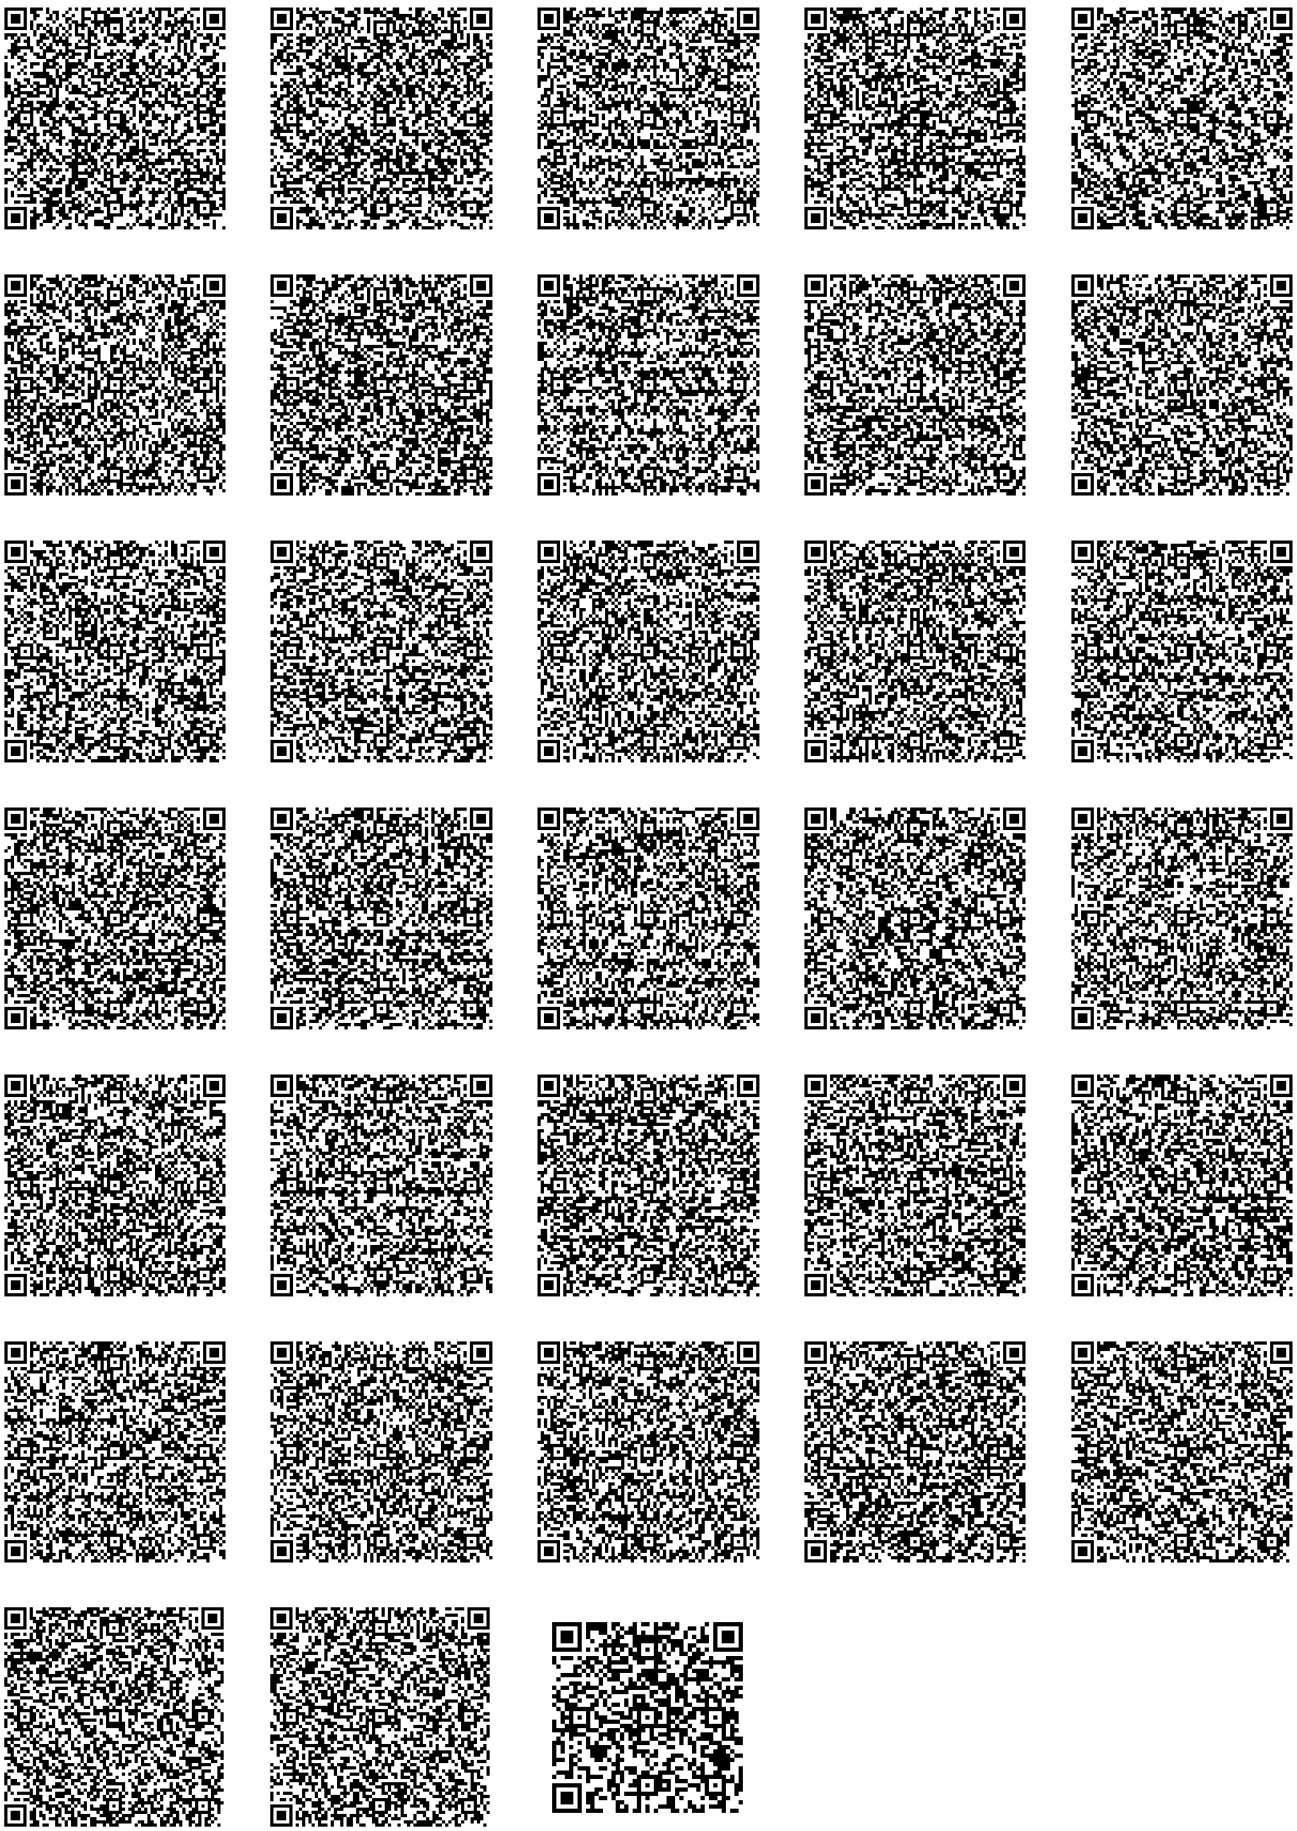

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружные сети теплоснабжения.СО				
			Раздел: #ОБОРУДОВАНИЕ ОДК				
1	18	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 442	6 442
2	19	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детектор повреждений стационарный с УСПД "ПИКОН" ДПС-2АМ/ТВ	компл.	1	400 714	400 714
3	20	6123-0104-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1	2 550	2 550
4	21	245-403-0211РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/ШГ	шт.	1	36 574	36 574
5	22	6123-0104-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2	12 873	25 746
6	23	6123-0104-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	72 410	72 410
7	24	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0.014	269 330	3 771
8	25	243-122-0302РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66	км	0.014	492 544	6 896
			Итого по разделу: #ОБОРУДОВАНИЕ ОДК				**555 103**
			Итого по локальной смете: Наружные сети теплоснабжения.СО				**555 103**
			ИТОГО по акту:				**555 103**
	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (7.300%)					154389.000 x 7.30%	11 270
	Итого с затратами на организацию и управление СМР					555103.000 + 11270.397	566 373

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, (5.00%)				165659.397 x 5.00%	8 282
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				566373.397 x 5.000%	28 318
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					602 975
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, II квартал 2024 г., к = 1.0368				602975.037 x 1.0368	625 164
		НДС (12%)				625164.518 x 12%	75 019
		Итого с НДС				625164.518 + 75019.742	700 184

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	20.03.2025 09:39
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	20.03.2025 10:26
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	20.03.2025 09:57
Представители заказчика		
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	20.03.2025 11:39
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	20.03.2025 12:30
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	20.03.2025 11:32 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	20.03.2025 12:03
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	20.03.2025 12:22 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

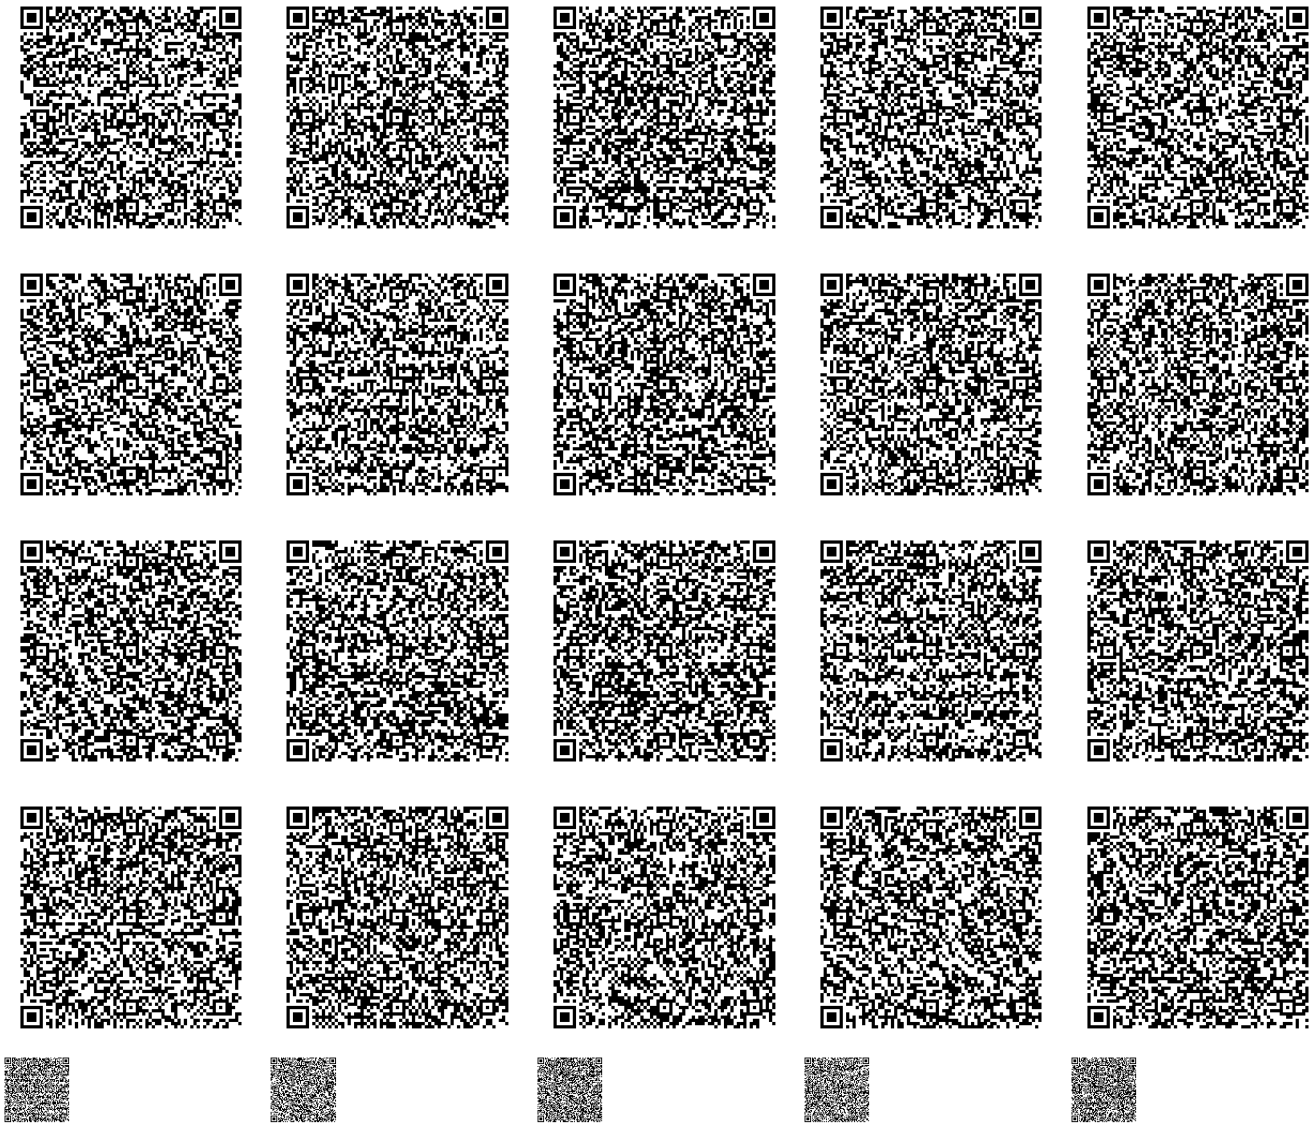

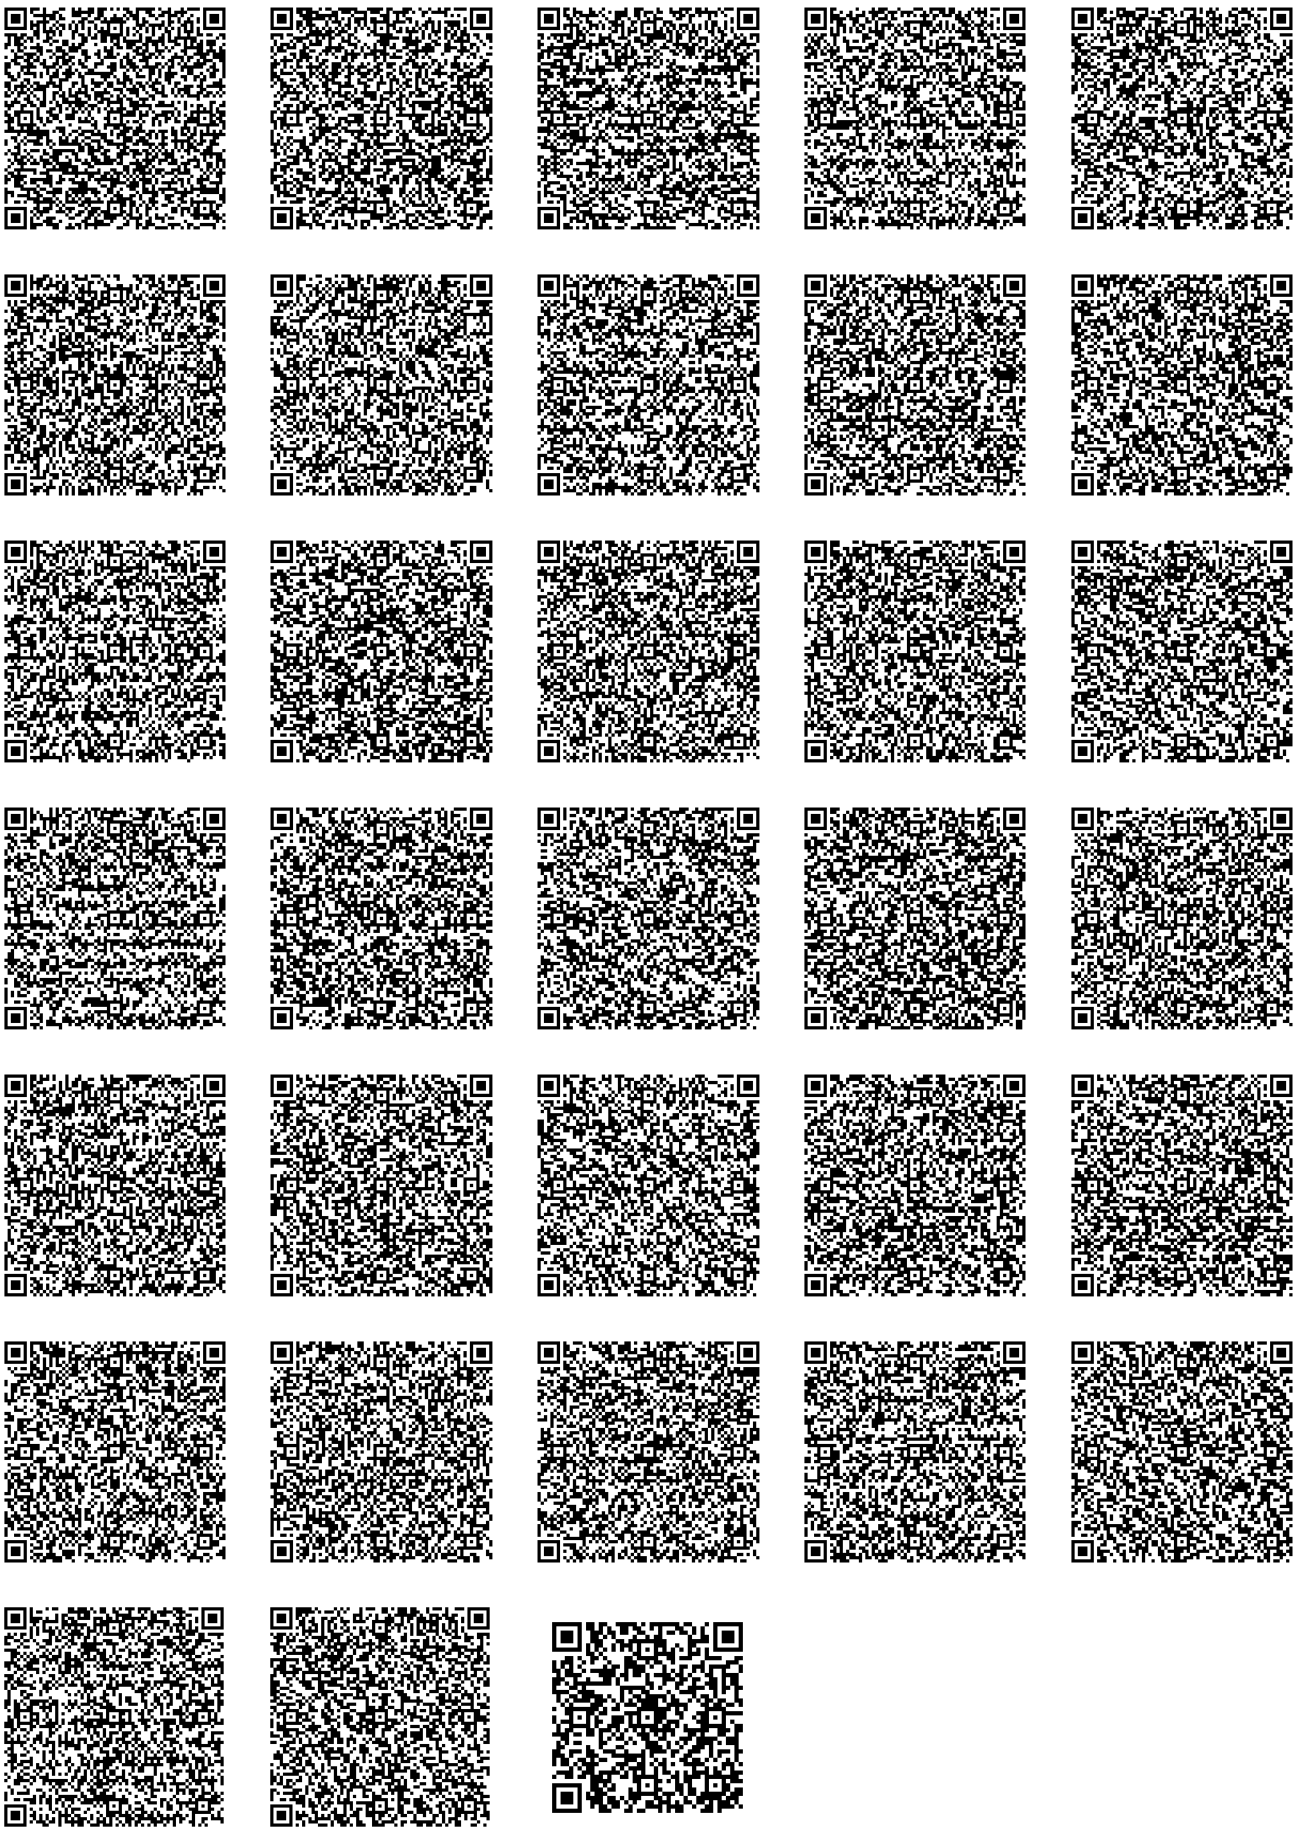

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурная часть 1				
			Раздел: КЛАДКА /АР л.30-33/29.11,11.12,10.02,29.02				
			Подраздел: ЛЮЧКИ РЕВИЗИОННЫЕ 200х200/15+17шт./, 250х300/28+18шт./АР л.31 примеч.8,9, л.33 примеч.7,8/10.02				
1	49	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	78	1 487	115 986
2	50	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Лючки	шт.	78	806	62 868
			Итого по подразделу: ЛЮЧКИ РЕВИЗИОННЫЕ 200х200/15+17шт./, 250х300/28+18шт./АР л.31 примеч.8,9, л.33 примеч.7,8/10.02				**178 854**
			Итого по разделу: КЛАДКА /АР л.30-33/29.11,11.12,10.02,29.02				**178 854**
			Раздел: КРОВЛЯ /АР л.34,62-69 КР л.69,78/+1.12,29.02				
			Подраздел: Профиль гнутый корытный, расход см. ниже				
3	80	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов битумно-полимерных	м2	622.6	932	580 263
4	81	235-103-0211 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	1481.98	1 642	2 433 411
5	82	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов Добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	622.6	353	219 777
6	83	235-103-0416 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	740.99	1 829	1 355 270
			Итого по подразделу: Профиль гнутый корытный, расход см. ниже				**4 588 722**
			Подраздел: Узел 2к/между блоками/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	187	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий/компенсатор/ мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	41.054	8 067	331 182
8	189	6111-0401-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация шва мастикой горизонтального	м шва	63.16	1 043	65 875
			Итого по подразделу: Узел 2к/между блоками/				**397 058**
			Подраздел: Узел 3к/аэраторы/54шт./				
9	192	6110-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий из ПВХ-мембраны	шт.	54	2 002	108 108
			Итого по подразделу: Узел 3к/аэраторы/54шт./				**108 108**
			Подраздел: Узел 4к/устройство водосточных воронок учтено в разделе ВК/8шт./				
10	195	6110-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к водосточным воронкам для кровли трехслойных мастичных, армированных двумя слоями стеклосетки из мастики битумно-гидроизоляционной холодного применения	воронка	27.2	12 627	343 454
			Итого по подразделу: Узел 4к/устройство водосточных воронок учтено в разделе ВК/8шт./				**343 454**
			Подраздел: Узел 9к				
11	205	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий/4 доп. слоя/ к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	2.28	16 253	37 056
			Итого по подразделу: Узел 9к				**37 056**
			Подраздел: Узел 10к				
12	215	6110-0202-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство планок/рейка/ для кровель из металлочерепицы торцевых (ветровых)	м	33.2	1 512	50 198
13	216	224-105-0501 РСНБ РК 2022	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м	м	17.43	1 248	21 752
14	217	6111-0401-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация шва мастикой горизонтального	м шва	33.2	1 043	34 627
			Итого по подразделу: Узел 10к				**106 578**
			Подраздел: Узел /узлы прохода фановой трубы, АР л.69, доп. раздел ВК/д.110мм-5шт., д.50мм-5шт./				
15	257	6118-0204-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	10	15 935	159 350
16	258	241-507-0101 РСНБ РК 2022	Хомут ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	5	3 770	18 850
17	259	241-507-0102 РСНБ РК 2022	Хомут ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	7 719	38 595

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	260	6111-0401-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Герметизация шва мастикой горизонтального	м шва	3.5	1 043	3 650
			Итого по подразделу: Узел /узлы прохода фановой трубы, АР л.69, доп. раздел ВК/д.110мм-5шт., д.50мм-5шт./				**220 445**
			Итого по разделу: КРОВЛЯ /АР л.34,62-69 КР л.69,78/+1.12,29.02				**5 801 424**
			Итого по локальной смете: Архитектурная часть 1				**5 980 278**
			ИТОГО по акту:				**5 980 278**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (%.3f%%) (7.300%)				5980278.748 x 7.30%	436 560
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				5980278.748 + 436560.360	6 416 839
		Сметная прибыль, (5.00%)				6416839.108 x 5.00%	320 841
		Непредвиденные расходы, (5.000%)				6416839.108 x 5.000%	320 841
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					7 058 523
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750				7058523.019 x 1.0750	7 587 912
		НДС (12%)				7587912.245 x 12%	910 549
		Итого с НДС				7587912.245 + 910549.469	8 498 461

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	15.03.2025 10:45
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	18.03.2025 14:41
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 09:55
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	19.03.2025 16:48 Комментарий: Расценки согласно локальной смете
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	19.03.2025 18:21
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	20.03.2025 12:24
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	19.03.2025 18:14
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	20.03.2025 10:09 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

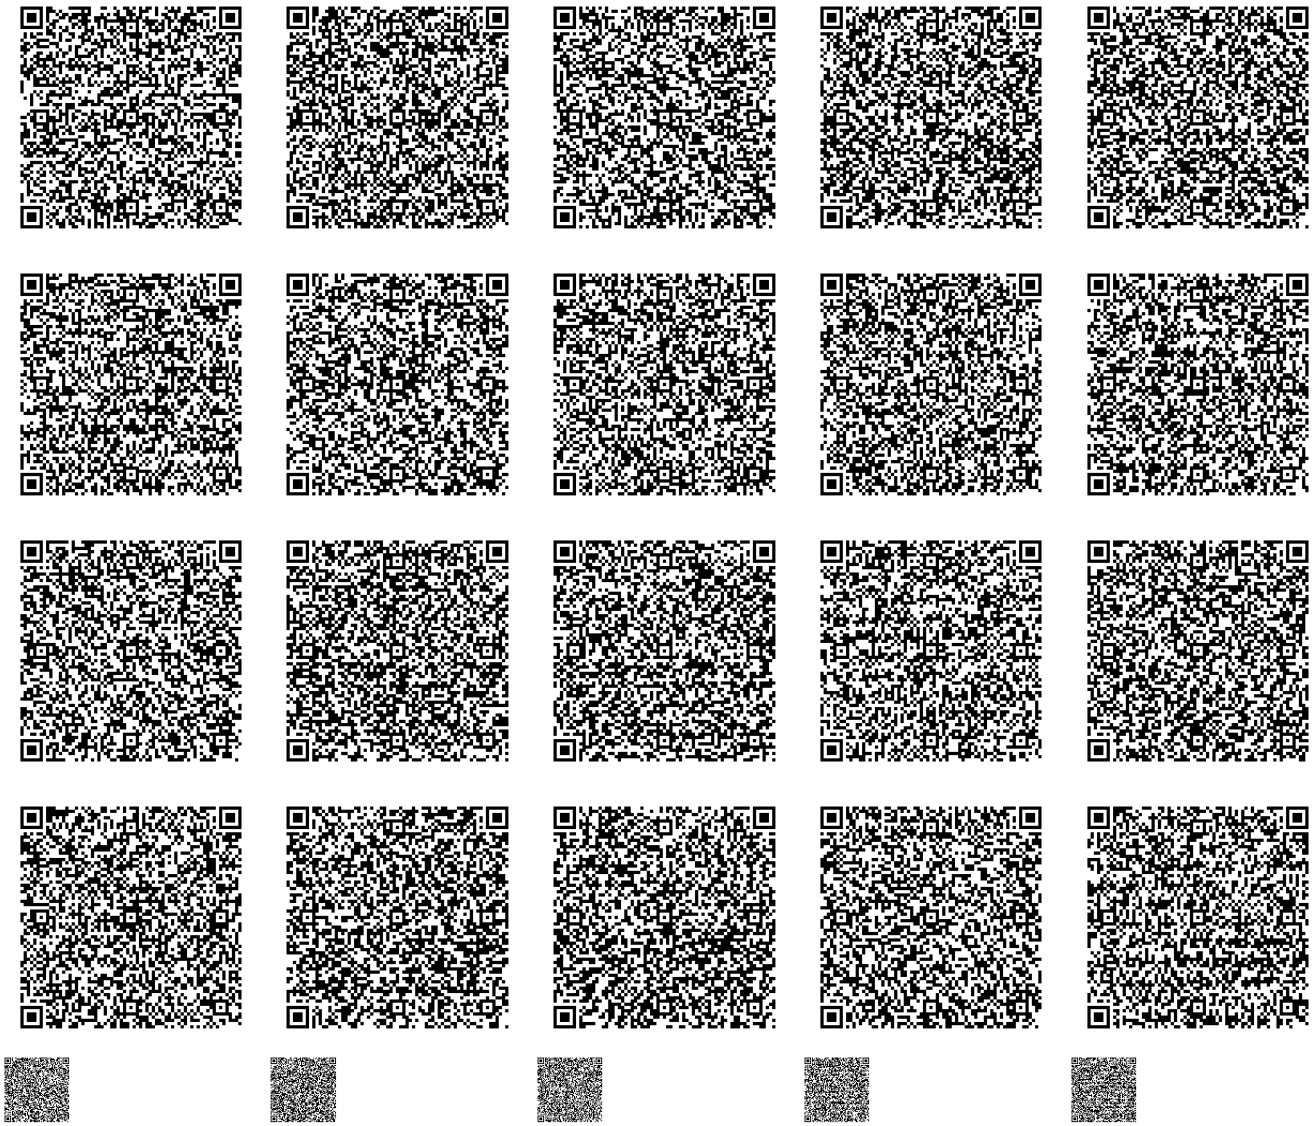

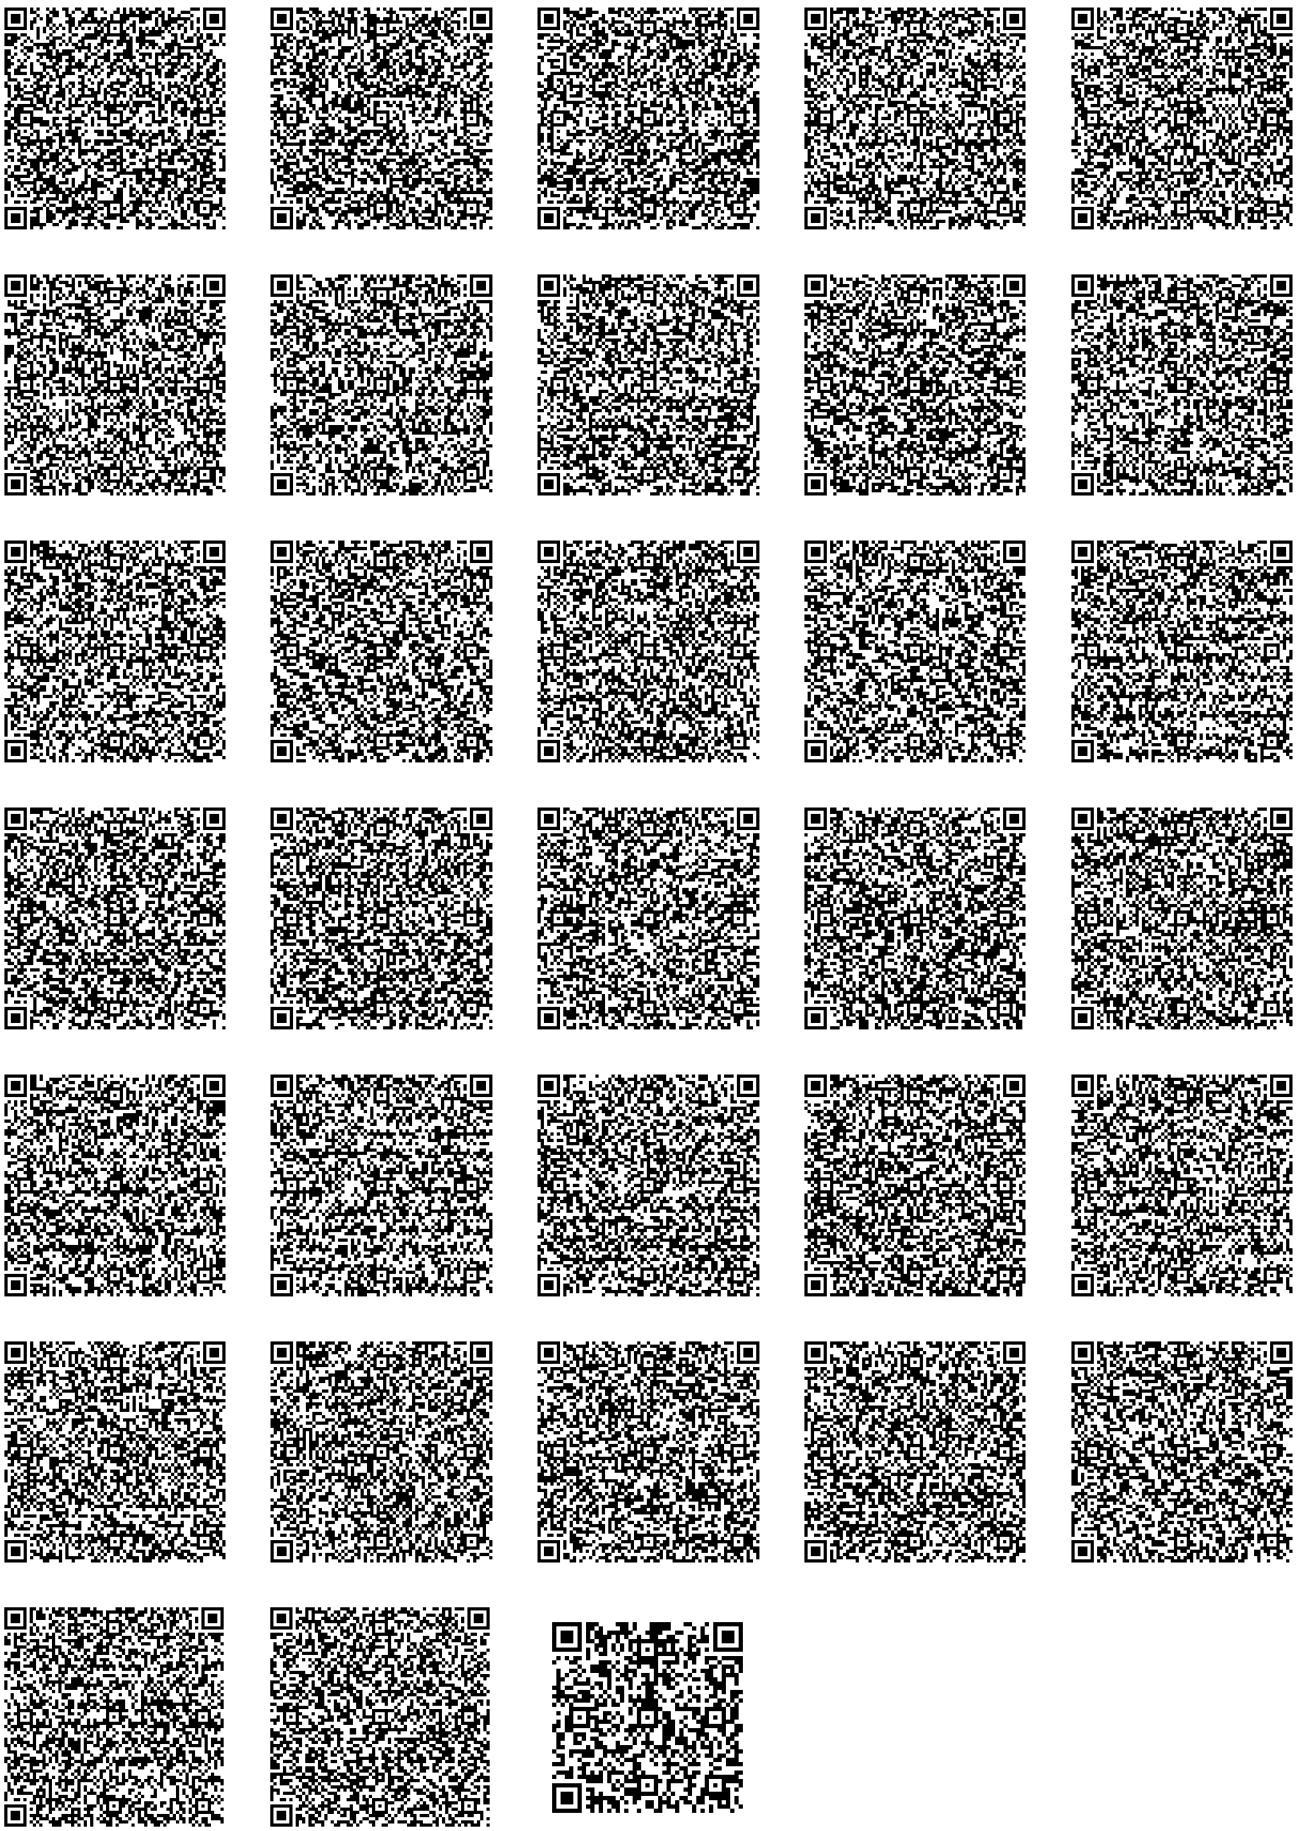

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование-1				
			Раздел: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ				
			Подраздел: Начальный класс-3 шт				
1	128	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-3	52 006	-156 018
			Итого по подразделу: Начальный класс-3 шт				**-156 018**
			Подраздел: Предшкольный класс-3 шт				
2	140	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-3	52 006	-156 018
			Итого по подразделу: Предшкольный класс-3 шт				**-156 018**
			Подраздел: Приемная-кабинет делопроизводства				
3	159	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Приемная-кабинет делопроизводства				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет директора.				
4	163	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет директора.				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет биологии				
5	184	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет биологии				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет визуального искусства				
6	197	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет визуального искусства				**-52 006**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Инструментальная				
7	241	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Инструментальная				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет географии				
8	263	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет географии				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет химии /биотехнологии				
9	285	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет химии /биотехнологии				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет социального педагога				
10	357	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет социального педагога				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет психолога				
11	372	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет психолога				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет логопеда				
12	381	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет логопеда				**-52 006**
			Итого по разделу: ПЕРВЫЙ ЭТАЖ				**-832 096**
			Раздел: Второй этаж				
			Подраздел: Начальные классы -4шт				
13	424	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-4	52 006	-208 024
			Итого по подразделу: Начальные классы -4шт				**-208 024**
			Подраздел: Кабинет раздельного обучения лингвистического направления для начальной школы -2шт				
14	435	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-2	52 006	-104 012
			Итого по подразделу: Кабинет раздельного обучения лингвистического направления для начальной школы -2шт				**-104 012**
			Подраздел: Кабинет информатики на 13уч				
15	446	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет информатики на 13уч				**-52 006**
			Подраздел: Тренерская-2шт				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	457	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-2	52 006	-104 012
			Итого по подразделу: Тренерская-2шт				**-104 012**
			Подраздел: Кабинет математики-2шт				
17	479	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-2	52 006	-104 012
			Итого по подразделу: Кабинет математики-2шт				**-104 012**
			Подраздел: Кабинет информатики на 13уч-2шт				
18	495	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-2	52 006	-104 012
			Итого по подразделу: Кабинет информатики на 13уч-2шт				**-104 012**
			Подраздел: Методический кабинет				
19	518	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Методический кабинет				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет физики/нанотехнологии				
20	537	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет физики/нанотехнологии				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет НВП				
21	557	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет НВП				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет зам. руководителя				
22	565	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет зам. руководителя				**-52 006**
			Подраздел: Актовый зал на 206 мест				
23	627	СпрСЦ 11.2023	Радиомикрофонная система на 10 микрофонов	шт	-1	84 918	-84 918
			Итого по подразделу: Актовый зал на 206 мест				**-84 918**
			Итого по разделу: Второй этаж				**-969 020**
			Раздел: Третий этаж				
			Подраздел: Кабинет рус.яз -4шт				
24	654	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-4	52 006	-208 024
			Итого по подразделу: Кабинет рус.яз -4шт				**-208 024**
			Подраздел: Начальные классы -5шт				
25	666	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-5	52 006	-260 030

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Начальные классы -5шт				**-260 030**
			Подраздел: Кабинет истории-2шт				
26	679	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-2	52 006	-104 012
			Итого по подразделу: Кабинет истории-2шт				**-104 012**
			Подраздел: Кабинет музыки				
27	694	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет музыки				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет математики Кабинет каз.яз. и литературы-3шт				
28	710	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-4	52 006	-208 024
			Итого по подразделу: Кабинет математики Кабинет каз.яз. и литературы-3шт				**-208 024**
			Подраздел: Stem лаборатория				
29	727	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Stem лаборатория				**-52 006**
			Подраздел: Кабинет робототехники				
30	744	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Кабинет робототехники				**-52 006**
			Подраздел: Методический кабинет				
31	769	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-1	52 006	-52 006
			Итого по подразделу: Методический кабинет				**-52 006**
			Подраздел: Библиотека на 17 читательских мест и медиатекой на 8 мест				
32	792	СпрСЦ 11.2023	Акустическая система Sven SPS-750	шт	-2	52 006	-104 012
			Итого по подразделу: Библиотека на 17 читательских мест и медиатекой на 8 мест				**-104 012**
			Итого по разделу: Третий этаж				**-1 092 126**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование-1				**-2 893 242**
			ИТОГО по акту:				**-2 893 242**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	0.000 x 7.30%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	-2893242.000 + 0.000	-2 893 242
	Сметная прибыль, (5.00%)	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)	-2893242.000 x 5.000%	-144 662
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		-3 037 904
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, III квартал 2024 г., к = 1.0557	-3037904.100 x 1.0557	-3 207 115

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (12%)				-3207115.358 x 12%	-384 854
		Итого с НДС				-3207115.358 + -384853.843	-3 591 969

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	17.03.2025 09:18
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	18.03.2025 15:22
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 16:03
Представители заказчика		
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	18.03.2025 16:28
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	19.03.2025 13:40
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	18.03.2025 16:30
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	18.03.2025 16:26 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	19.03.2025 12:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

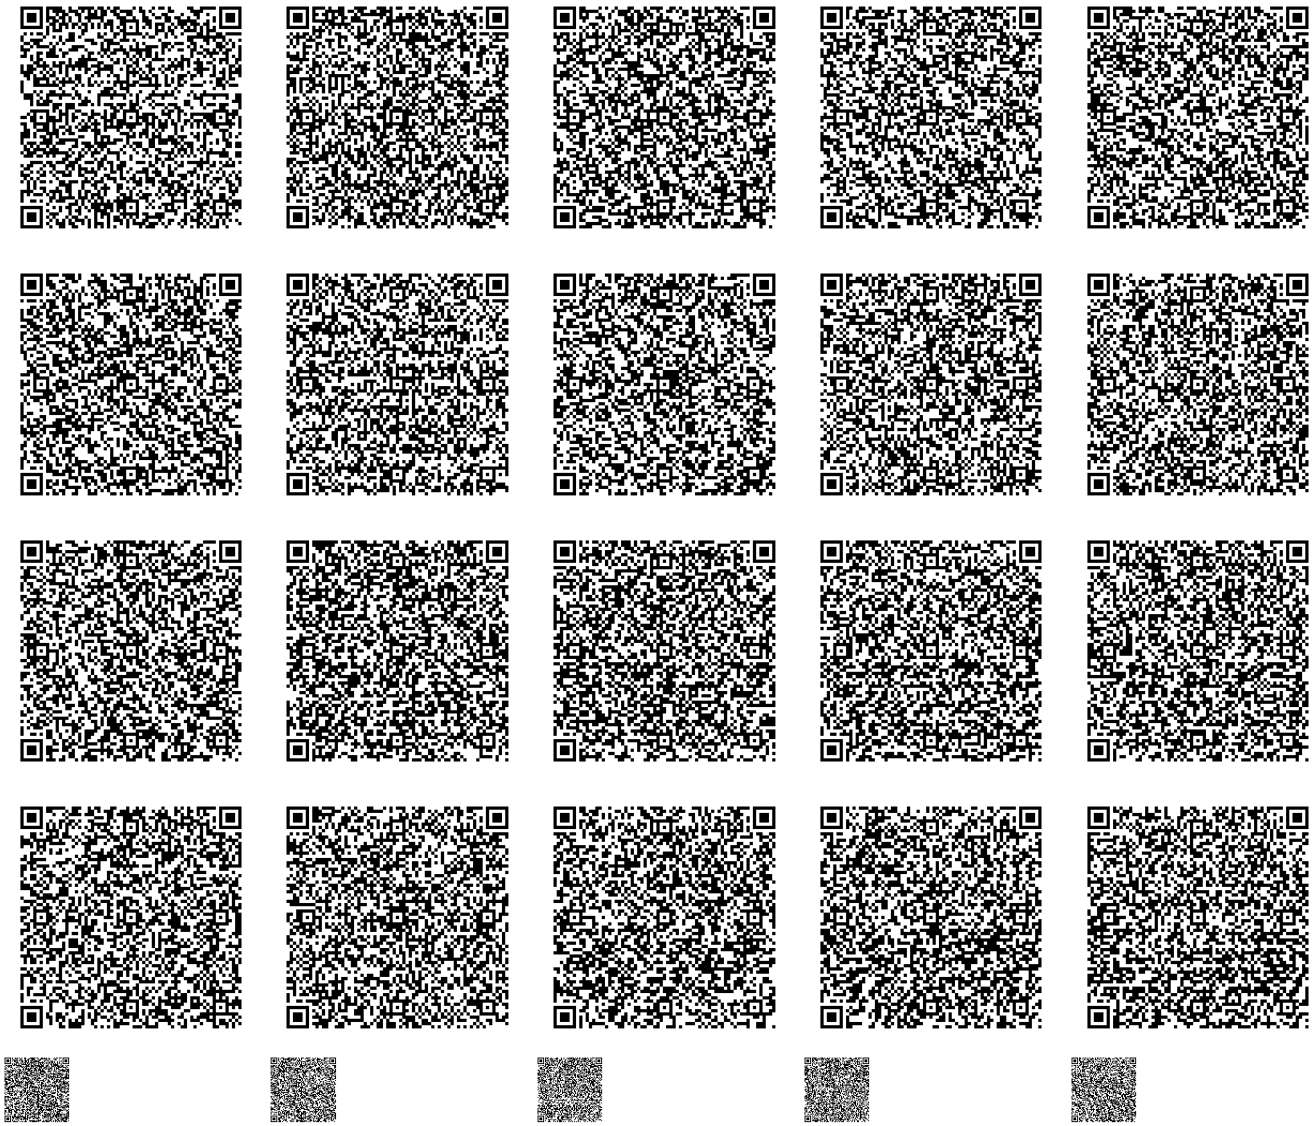

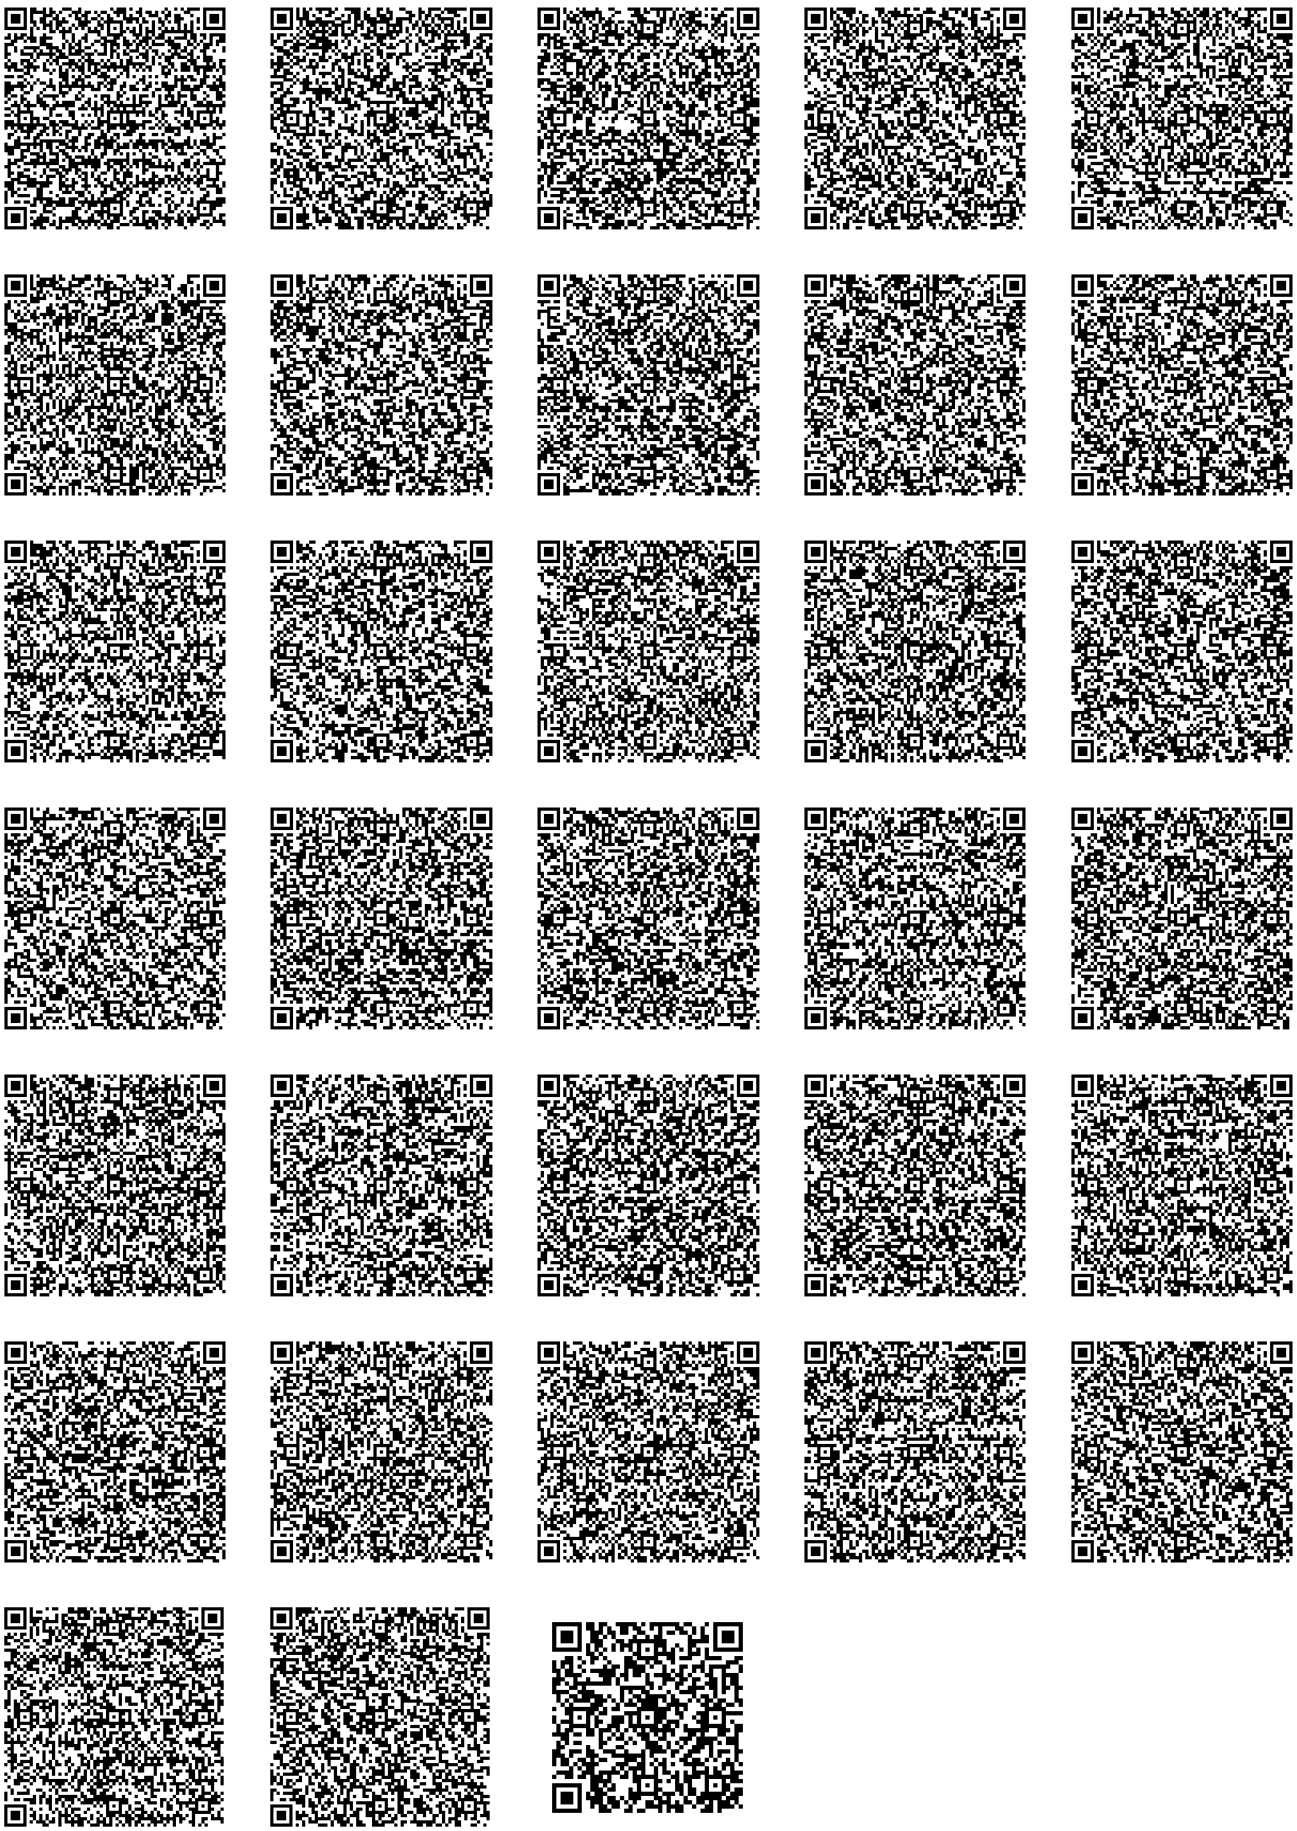

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **001140004068 - ТОО ASTI**

Стройка: **Строительство школы в Костанайской области, Костанайском районе, село Заречное, Заречного сельского округа на 900 мест**

Договор подряда (контракт) №: **128 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Март 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: ВЕ1-52				
1	1	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	147	6 455	948 885
2	2	246-304-0503РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
3	3	246-304-0505РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	6	8 997	53 982
4	4	246-304-0526РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	12 996	25 992
5	5	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9 445	28 335
6	6	246-304-0530РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	10	6 531	65 310
7	7	246-304-0549РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	3 562	10 686
8	8	246-304-0551РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	5	6 928	34 640
9	9	246-304-0574РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	1	8 071	8 071
10	10	246-304-0572РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм	шт.	2	3 740	7 480
11	11	246-304-0574РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	10	8 071	80 710
12	12	246-304-0605РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	9 308	9 308

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	246-304-0607РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм	шт.	40	10 242	409 680
14	14	246-304-0626РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 100 мм	шт.	1	3 989	3 989
15	15	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	62	12 355	766 010
16	16	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	16	15 037	240 592
17	17	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	31	14 312	443 671
18	18	6118-0101-0415 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм	м2	6	8 806	52 836
19	19	246-301-0503РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	50	775	38 750
20	20	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным огнезащитным материалом	м2 изолируемой поверхности	8	4 687	37 496
21	21	234-302-0201РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	9.1	3 745	34 079
22	30	6118-0208-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	9	18 190	163 710
23	31	246-308-0304РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-14, диаметром 400 мм	шт.	3	163 859	491 577
24	32	246-308-0306РСНБ РК 2022	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	шт.	6	191 250	1 147 500
25	33	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	9	24 029	216 261
26	34	246-306-0215РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 400 мм	шт.	3	119 606	358 818
27	35	246-306-0217РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 500 мм	шт.	6	135 177	811 062
			Итого по подразделу: ВЕ1-52				**6 502 427**
			Подраздел: Изделия и материалы для системы вентиляции				
28	36	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	6 455	51 640
29	37	261-302-0123РСНБ РК 2022	Решетки /наружная РН 1500х1000 мм	м2	3	63 348	190 044
30	38	261-302-0123РСНБ РК 2022	Решетки /наружная РН 2200х1600 мм	м2	3.52	63 348	222 985

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	39	261-302-0123РСНБ РК 2022	Решетки регулирующие, размер 1000х1000 мм	м2	5	63 348	316 740
32	40	6118-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических неутепленных размер 1250х500 мм	шт.	3	73 683	221 049
			Итого по подразделу: Изделия и материалы для системы вентиляции				**1 002 458**
			Подраздел: П1				
33	45	514-401-0607РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS120-R-FHCVS расход воздуха 12000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	5 934 194	5 934 194
34	55	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	30	6 455	193 650
35	56	246-304-0574РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	12	8 071	96 852
36	57	246-304-0751РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 150 мм	шт.	15	14 349	215 235
37	58	246-304-0503РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
38	59	246-304-0526РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
39	60	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9 445	9 445
			Итого по подразделу: П1				**6 475 368**
			Подраздел: П2				
40	74	514-401-0606РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS100-R-FHCVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	5 218 801	5 218 801
41	84	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	21	6 455	135 555
42	85	246-304-0751РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 150 мм	шт.	17	14 349	243 933
43	86	246-304-0574РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 150 мм	шт.	3	8 071	24 213
44	87	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	9 445	9 445
			Итого по подразделу: П2				**5 631 947**
			Подраздел: П3				
45	95	514-401-0602РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2 701 871	2 701 871
46	104	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	6 455	64 550

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	105	246-304-0649РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 100 мм	шт.	1	4 478	4 478
48	106	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	9	12 355	111 195
			Итого по подразделу: П3				**2 882 094**
			Подраздел: П4				
49	115	514-401-0604РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS055-R-FHCVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	3 508 638	3 508 638
			Итого по подразделу: П4				**3 508 638**
			Подраздел: П5				
50	128	514-401-0602РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2 701 871	2 701 871
51	133	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	6 455	12 910
52	134	246-304-0549РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	3 562	7 124
			Итого по подразделу: П5				**2 721 905**
			Подраздел: П7				
53	156	514-401-0602РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS030-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	2 701 871	2 701 871
			Итого по подразделу: П7				**2 701 871**
			Подраздел: П8				
54	181	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	6 455	25 820
55	182	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	4	12 355	49 420
			Итого по подразделу: П8				**75 240**
			Подраздел: П9				
56	187	514-401-0604РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS055-R-FHCVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	3 508 638	3 508 638
			Итого по подразделу: П9				**3 508 638**
			Подраздел: П10				
57	199	514-401-0605РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем VVS075-R-FHCVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	4 227 770	4 227 770
58	206	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	6 455	38 730
59	207	246-304-0955РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 300 мм	шт.	6	31 164	186 984

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: П10				**4 453 484**
			Подраздел: П11				
60	219	514-401-0101РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	1 378 631	1 378 631
			Итого по подразделу: П11				**1 378 631**
			Подраздел: В12				
61	347	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	6 455	45 185
62	348	246-304-0503РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
63	349	246-304-0549РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм	шт.	3	3 562	10 686
64	350	246-304-0526РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	12 996	12 996
65	351	246-304-0551РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	6 928	6 928
66	352	246-304-0653РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	12 355	12 355
			Итого по подразделу: В12				**101 146**
			Подраздел: В13				
67	364	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	6 455	51 640
			Итого по подразделу: В13				**51 640**
			Итого по разделу: Вентиляция				**40 995 487**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**40 995 487**
			ИТОГО по акту:				**40 995 487**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (7.300%)	9113202.728 x 7.30%	665 263
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	40995487.728 + 665263.816	41 660 751
	Сметная прибыль, (5.00%)	9778466.544 x 5.00%	488 923
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	41660751.544 x 5.000%	2 083 037
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		44 232 712
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, IV квартал 2024 г., к = 1.0750	44232712.448 x 1.0750	47 550 165
	НДС (12%)	47550165.882 x 12%	5 706 019
	Итого с НДС	47550165.882 + 5706019.906	53 256 185

Лист согласования
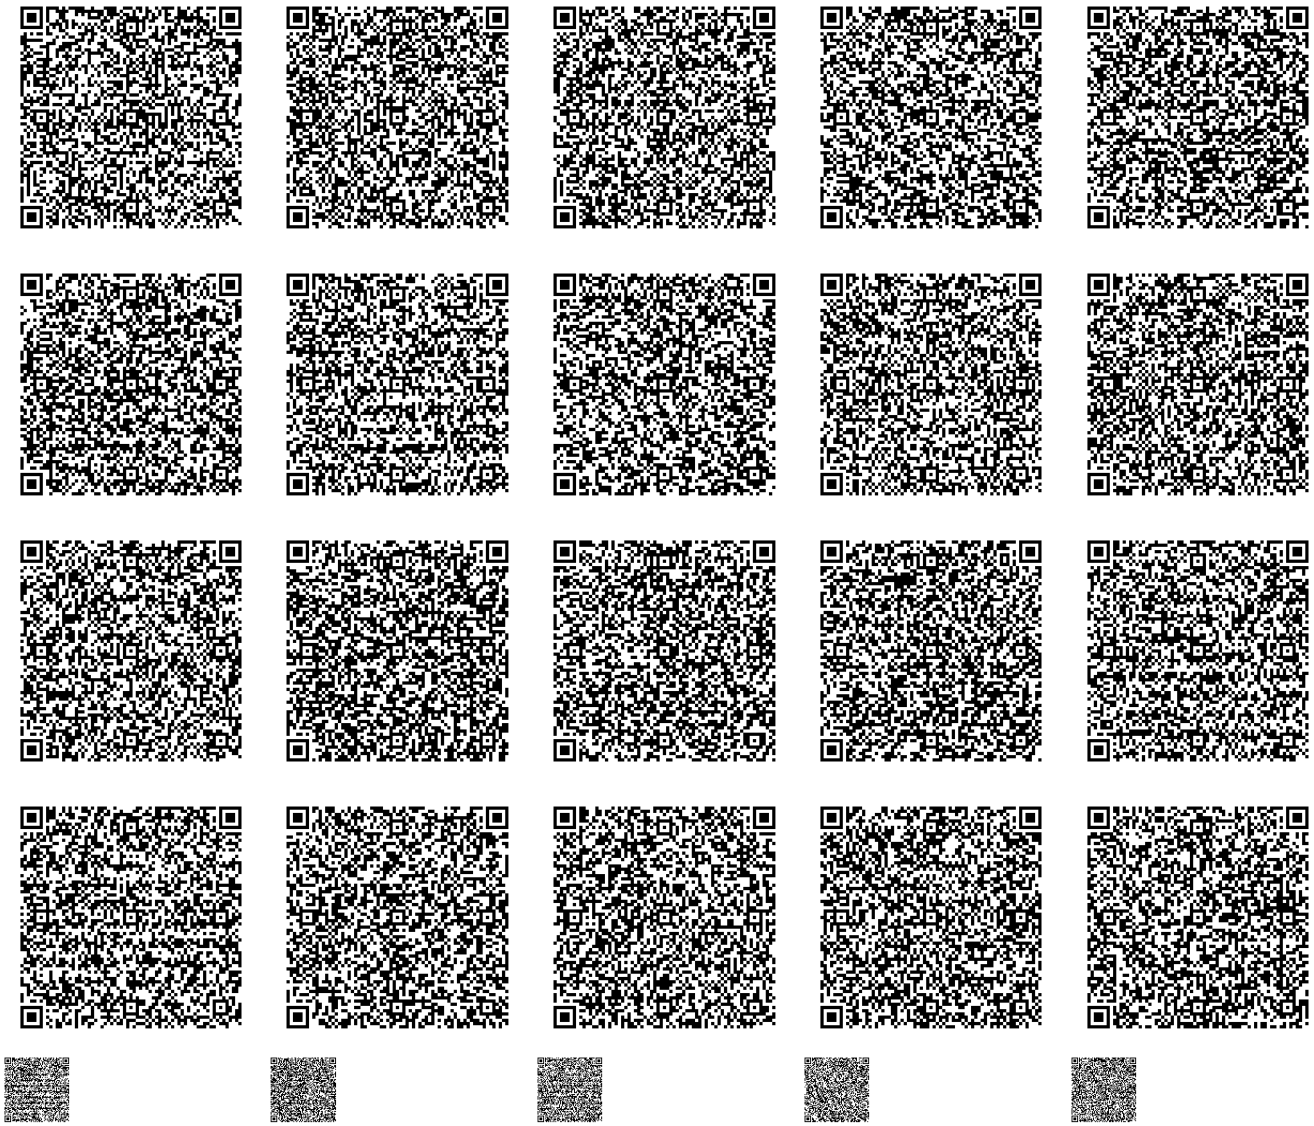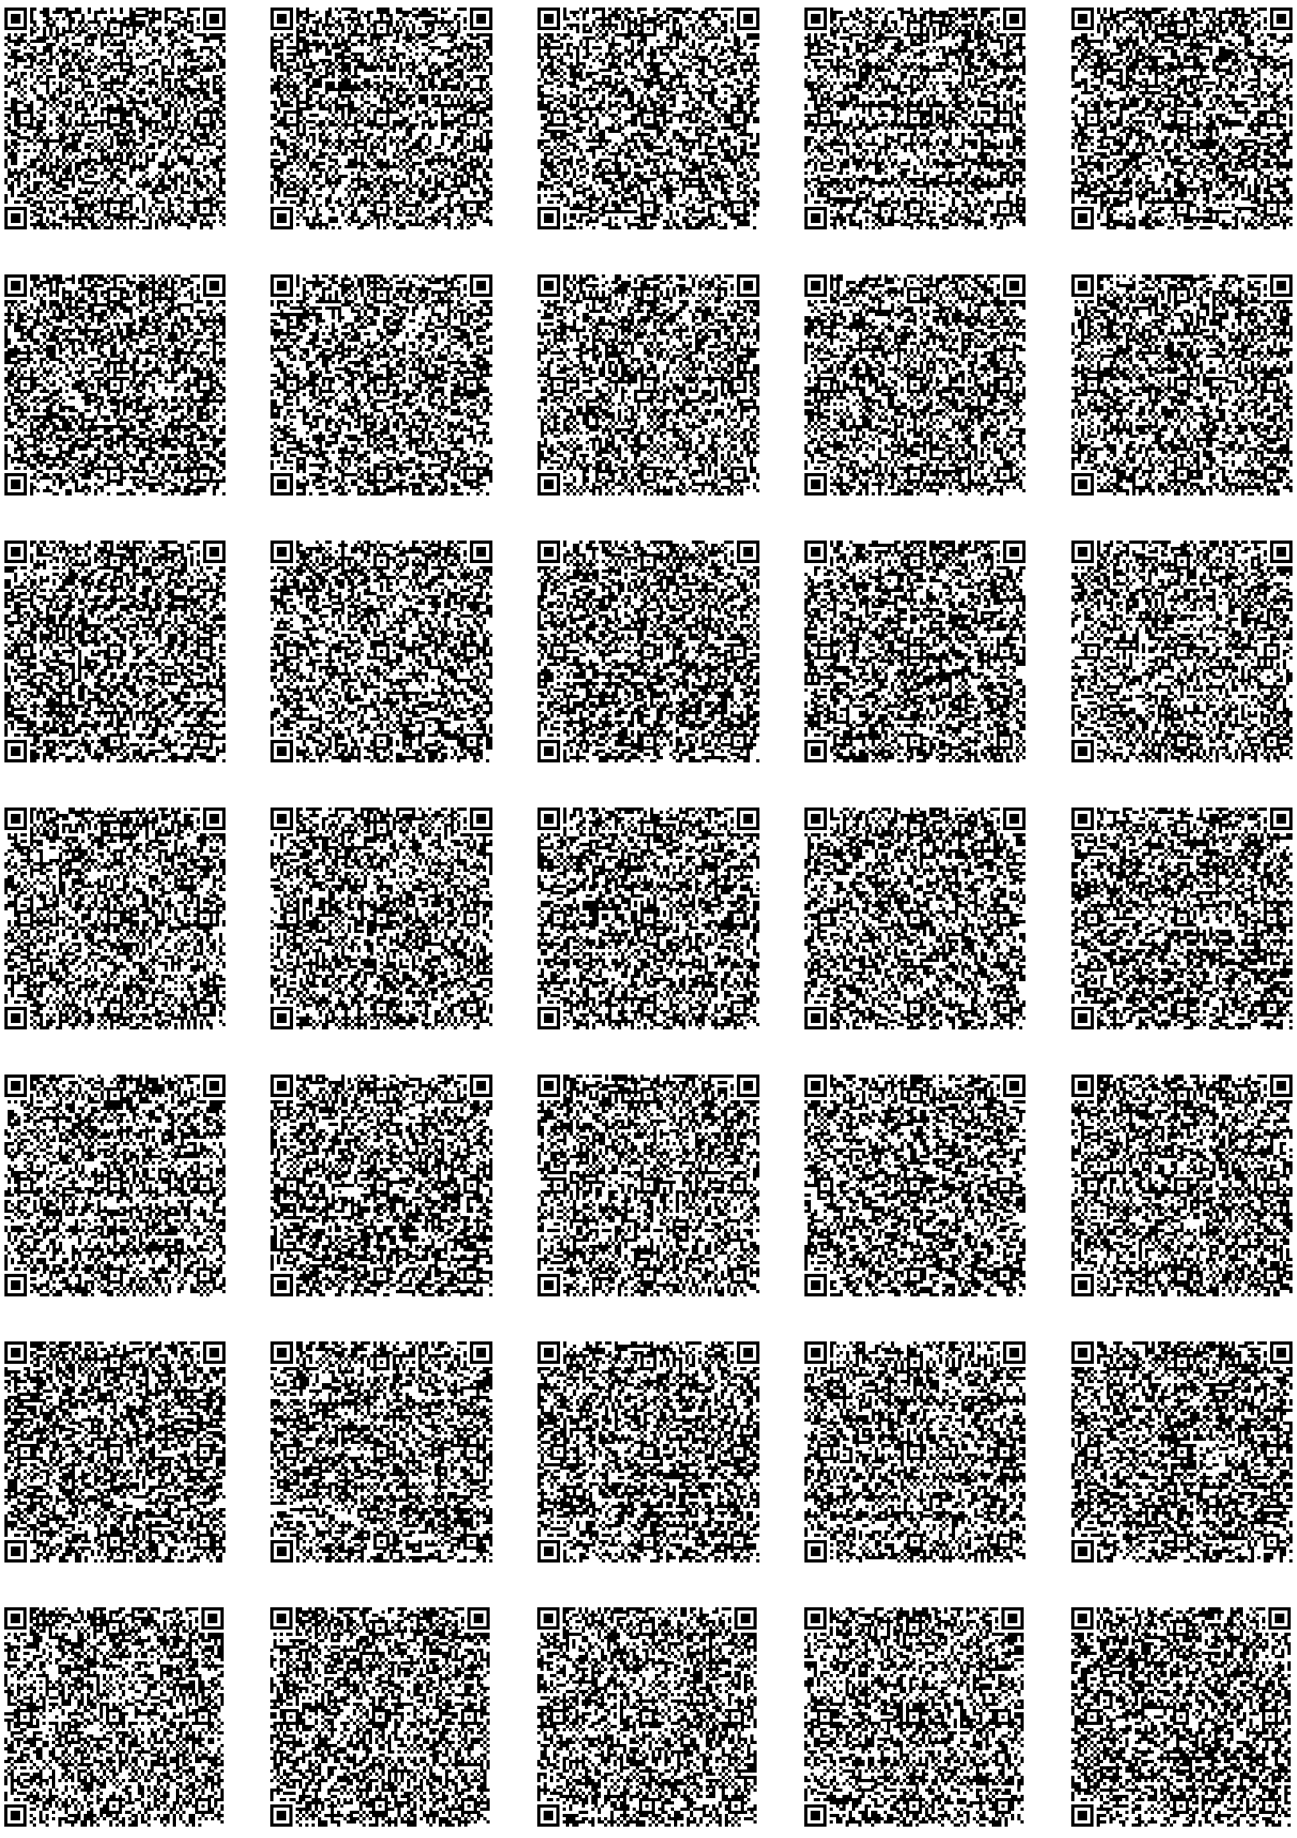
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
910221350048 - КВОН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Директор	14.03.2025 11:57
Представители технического надзора		
640220301909 - ДУТБАЕВ КАЙРАТ БИЛЯЛОВИЧ	Эксперт технического надзора	18.03.2025 15:24
Представители авторского надзора		
880207350589 - КОСТИЧЕНКО РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Эксперт авторского надзора	18.03.2025 16:02
Представители заказчика		
680120450025 - АСКАРОВА РОЗА РАХИМЖАНОВНА	Ведущий специалист (сметчик) Костанайской области	19.03.2025 17:17 Комментарий: Расценки согласно локальной сметы
830917351002 - КУРМАНГАЛИЕВ НУРЖАН КАЗТАЕВИЧ	Региональный руководитель	19.03.2025 17:20
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения по Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областям	20.03.2025 12:00
890428350641 - САДВАКАСОВ МЕЙРАМ НУРМУХАМБЕТОВИЧ	Ведущий специалист	19.03.2025 18:20
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист	20.03.2025 10:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
