ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060440002060-20240711-66230763	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000041
2.	**Дата выписки**	11.07.2024	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	**Дата совершения оборота**	11.07.2024			
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	
5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060440002060	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.кп 5		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 43001	9.2.	номер 0010563
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 090340012961	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	☐	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060440002060	26.1	ИИН/БИН 090340012961
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"	26.2	Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.кп 5	26.3	Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	☑	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	117
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	29.06.2023
			27.5	Учетный номер	
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер
		32.2	дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT	33.2	курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			93 092 961,61	93 092 961,61		0	93 092 961,61	12%	11 171 15 5,39	104 264 117			1		
				Всего по счету						**93 092 961,61**			**93 092 961,61**		**11 171 15 5,39**	**104 264 117**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	LMk721Bepni/rWj6E0fxT2vf/Py9/OrBvTYJcypryA/XErl8ZagiIwjeEgVw6pwc Z0m3q8X7L23OrHRmVUNNJQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	400 257 473	400 257 473	357 372 743,75				42 884 729,25	400 257 473
в том числе: за июль месяц 2024 года	104 264 117	104 264 117	93 092 961,61				11 171 155,39	104 264 117

Заказчик: **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Аршамов А.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#be798ddf-e962-4699-b3f7-35c071e57d10)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сы ғанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №7	Конструкции железобетонные. Блок А	34 713 664
2	Акт №8	Конструкции железобетонные. Блок Л	39 202 556
3	Акт №9	Конструкции железобетонные. Блок Ж	6 583 258
4	Акт №10	Конструкции железобетонные. Блок Б	4 438 785
5	Акт №11	Конструкции железобетонные. Блок И	7 412 775
6	Акт №12	Конструкции железобетонные. Блок К	11913079
		ИТОГО	**104 264 117**

Заказчик:

М.П.

Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,
Аршамов А.Т. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик:

М.П.

Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,
Адилбеков Ж.З. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор:

М.П.

Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226,
Садвакасов К.Т. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#be798ddf-e962-4699-b3f7-35c071e57d10)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник Отдела смет и ценообразования	Подписано: 11.07.2024 17:00
Заказчик: ИИН 601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ null	Директор департамента строительства по реализации национального проекта	Подписано: 11.07.2024 17:13
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 11.07.2024 16:08
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 11.07.2024 16:46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#be798ddf-e962-4699-b3f7-35c071e57d10)

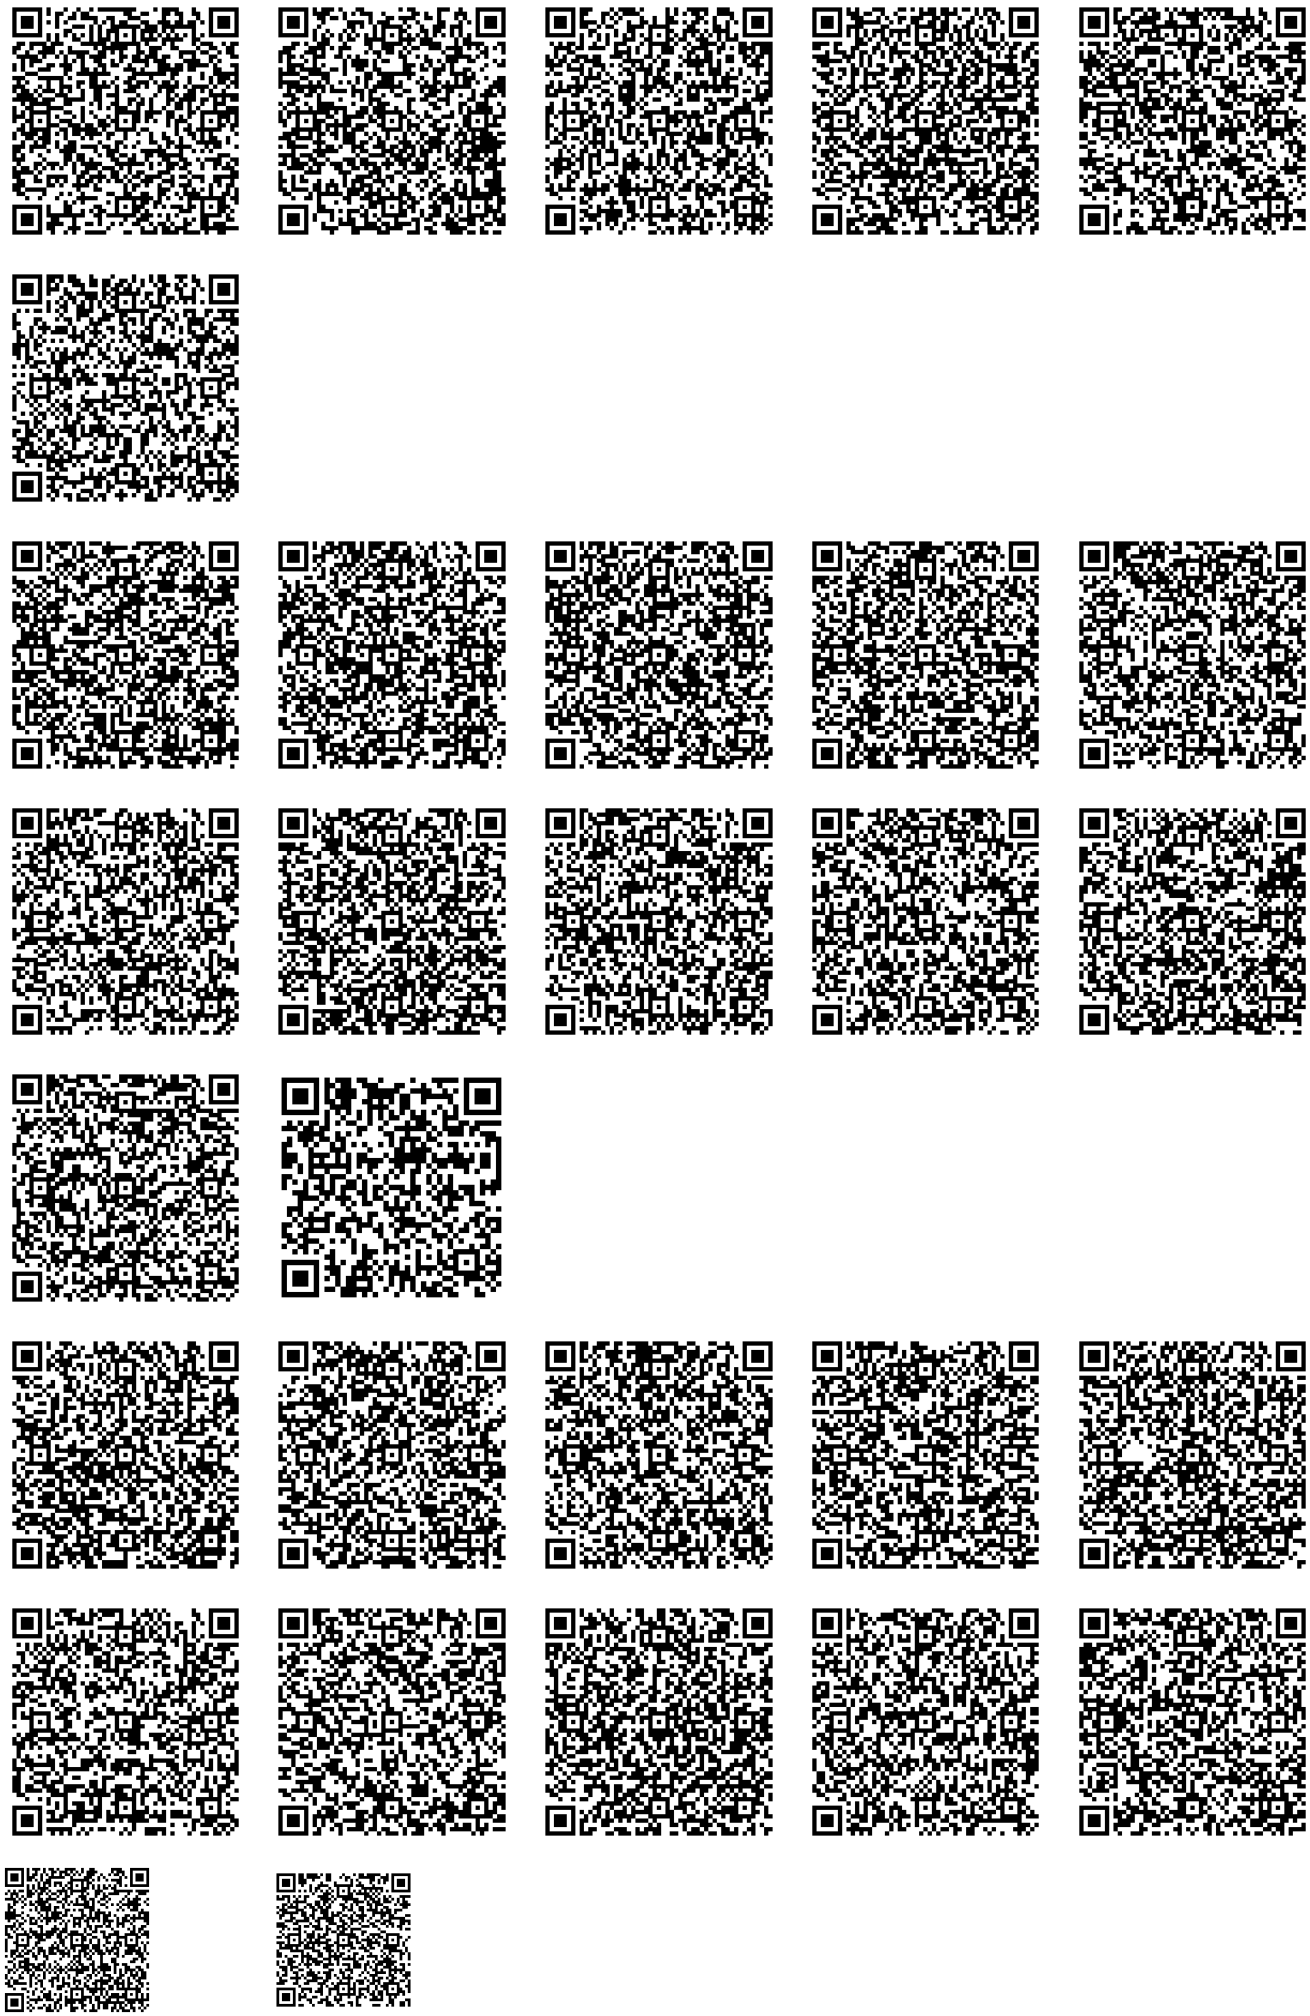

Подписано через EQURYLYS.KZ (#be798ddf-e962-4699-b3f7-35c071e57d10)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#be798ddf-e962-4699-b3f7-35c071e57d10)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок А				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-1 /12 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	12.6	72 352	911 635
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.46704	336 921	157 355
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.33596	325 873	435 353
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-1 /12 шт/				**1 504 344**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-2 /2 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.1	72 352	151 939
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07784	336 921	26 225
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.28	325 873	91 244
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-2 /2 шт/				**269 409**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-4 /2 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.1	72 352	151 939
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07784	336 921	26 225
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.34425	325 873	112 181
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-4 /2 шт/				**290 346**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-7 /2 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.14	72 352	154 833
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07784	336 921	26 225
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.47842	325 873	155 904
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-7 /2 шт/				**336 963**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-11 /2 шт/				
13	13	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.112	72 352	152 807
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.077024	336 921	25 951
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.291024	325 873	94 836
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-11 /2 шт/				**273 595**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-12 /2 шт/				
16	16	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.112	72 352	152 807
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.077024	336 921	25 951
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.412712	325 873	134 491
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-12 /2 шт/				**313 250**
			Подраздел: Стена монолитная См-1 /2 шт/				
19	19	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.32	98 004	31 361
20	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00258	336 921	869
21	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0586	325 873	19 096
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-1 /2 шт/				**51 326**
			Подраздел: Стена монолитная См-8 /1 шт/				
22	22	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	1.09	98 004	106 824
23	23	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00866	336 921	2 917
24	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.10628	325 873	34 633
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-8 /1 шт/				**144 375**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-1				
25	25	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.2	85 570	787 243

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.073224	336 921	24 670
27	27	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.898656	325 873	292 847
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-1				**1 104 762**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-2				
28	28	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	8.976	85 570	768 076
29	29	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071444	336 921	24 070
30	30	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.876776	325 873	285 717
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-2				**1 077 864**
			Итого по разделу: КАРКАС				**5 366 239**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				
31	32	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.48	99 975	447 888
32	33	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3602	336 921	121 358
33	34	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.754	325 873	245 708
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				**814 955**
			Подраздел: Балка монолитная Б-2 /16 шт/				
34	35	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28.8	99 975	2 879 280
35	36	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.3112	336 921	778 691
36	37	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.6152	325 873	1 503 969
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-2 /16 шт/				**5 161 940**
			Подраздел: Балка монолитная Б-3 /4 шт/				
37	38	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.2	99 975	519 870
38	39	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3788	336 921	127 625
39	40	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.8538	325 873	278 230
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-3 /4 шт/				**925 726**
			Подраздел: Балка монолитная Б-4 /8 шт/				
40	41	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20	99 975	1 999 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	42	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.5832	336 921	533 413
42	43	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.1904	325 873	1 039 665
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-4 /8 шт/				**3 572 578**
			Подраздел: Балка монолитная Б-5 /4 шт/				
43	44	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.12	99 975	311 922
44	45	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2588	336 921	87 195
45	46	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5282	325 873	172 126
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-5 /4 шт/				**571 243**
			Подраздел: Балка монолитная Б-6 /4 шт/				
46	47	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9.7	99 975	969 757
47	48	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7766	336 921	261 652
48	49	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5988	325 873	521 005
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-6 /4 шт/				**1 752 416**
			Итого по разделу: Балки				**12 798 860**
			Раздел: Перекрытия и покрытие				
			Подраздел: Плиты сборные				
49	56	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	55	9 671	531 905
50	57	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.15-8/	м2	43.2	10 622	458 870
51	58	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.12-8/	м2	86.4	10 622	917 740
52	59	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.10-8/	м2	57.6	10 622	611 827
53	60	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 66.15-8/	м2	19.8	10 622	210 315
54	61	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 66.12-8/	м2	31.68	10 622	336 504
55	62	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 66.10-8/	м2	19.8	10 622	210 315
56	63	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.15-8/	м2	36	10 622	382 392
57	64	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.12-8/	м2	86.4	10 622	917 740

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	65	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.10-8/	м2	48	10 622	509 856
			Итого по подразделу: Плиты сборные				**5 087 468**
			Подраздел: А1,А2				
59	66	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.0243	1 306 411	31 745
60	67	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0243	336 921	8 187
			Итого по подразделу: А1,А2				**39 932**
			Подраздел: Монолитные участки				
61	68	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14.08	104 310	1 468 684
62	69	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.833	325 873	271 452
			Итого по подразделу: Монолитные участки				**1 740 137**
			Подраздел: Плита монолитная Пм-1А				
63	70	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5.78	104 310	602 911
64	71	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0666	336 921	22 438
65	72	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3625	325 873	118 128
			Итого по подразделу: Плита монолитная Пм-1А				**743 479**
			Подраздел: Млп-4А				
66	85	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0.93	104 310	97 008
67	86	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0227	336 921	7 648
68	87	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1368	325 873	44 579
			Итого по подразделу: Млп-4А				**149 235**
			Итого по разделу: Перекрытия и покрытие				**7 760 253**
			Раздел: Лестница Л-1				
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-1 /1 шт/				
69	100	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	32 338	20 049
70	101	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	90 129	55 879
71	102	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00232	336 921	781
72	103	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13973	325 873	45 534

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	104	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0048	363 687	1 745
74	105	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	13 096	8 119
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-1 /1 шт/				**132 110**
			Итого по разделу: Лестница Л-1				**132 110**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок А				**26 057 463**
			ИТОГО по акту:				**26 057 463**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	26057463.831 x 6.20%	1 615 562
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	26057463.831 + 1615562.708	27 673 026
	Сметная прибыль, 5.00%	27673026.538 x 5.00%	1 383 651
	Непредвиденные расходы, 5.000%	27673026.538 x 5.000%	1 383 651
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		30 440 329
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	30440329.192 x 1.0182	30 994 343
	НДС (12%)	30994343.183 x 12%	3 719 321
	Итого с НДС	30994343.183 + 3719321.182	34 713 664

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	05.07.2024 12:02:08
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	05.07.2024 12:56:44
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	05.07.2024 12:06:15
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	05.07.2024 13:19:40
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	05.07.2024 13:19:08
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	05.07.2024 13:17:40
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	09.07.2024 07:04:42

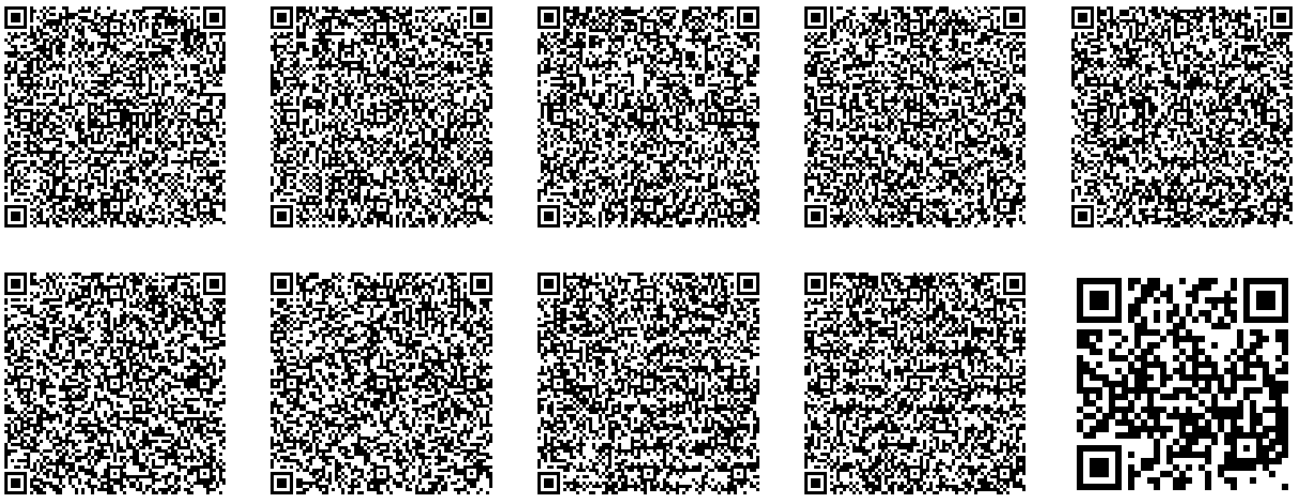

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок Л				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-1 /19 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	19.95	72 352	1 443 422
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.73948	336 921	249 146
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.11527	325 873	689 309
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-1 /19 шт/				**2 381 878**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-2 /5 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5.25	72 352	379 848
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1946	336 921	65 564
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7	325 873	228 111
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-2 /5 шт/				**673 523**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-3 /1 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.05	72 352	75 969
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.144525	325 873	47 096
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-3 /1 шт/				**136 179**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-6 /1 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.05	72 352	75 969
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22792	325 873	74 272
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-6 /1 шт/				**163 355**
			Подраздел: Стена монолитная См-3 /2 шт/				
13	13	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.18	98 004	17 640
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00144	336 921	485
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04084	325 873	13 308
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-3 /2 шт/				**31 434**
			Подраздел: Стена монолитная См-9 /1 шт/				
16	16	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	1.02	98 004	99 964
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00815	336 921	2 745
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.10002	325 873	32 593
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-9 /1 шт/				**135 303**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-3 /1 шт/				
19	19	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.012	85 570	771 156
20	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071724	336 921	24 165
21	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.880216	325 873	286 838
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-3 /1 шт/				**1 082 160**
			Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-4 /1 шт/				
22	22	1106-0601-0205РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	9.012	85 570	771 156
23	23	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.071724	336 921	24 165
24	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.880216	325 873	286 838
			Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-4 /1 шт/				**1 082 160**
			Итого по разделу: КАРКАС				**5 685 996**
			Раздел: null				
			Подраздел: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.48	99 975	447 888
26	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3602	336 921	121 358
27	27	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.754	325 873	245 708
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-1 /4 шт/				**814 955**
			Подраздел: Балка монолитная Б-2 /20 шт/				
28	28	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	36	99 975	3 599 100
29	29	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.889	336 921	973 364
30	30	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.769	325 873	1 879 961
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-2 /20 шт/				**6 452 426**
			Подраздел: Балка монолитная Б-23 /8 шт/				
31	31	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	22.36	99 975	2 235 441
32	32	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.8008	336 921	606 727
33	33	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.5592	325 873	1 159 847
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-23 /8 шт/				**4 002 015**
			Подраздел: Балка монолитная Б-24 /4 шт/				
34	34	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.44	99 975	343 914
35	35	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2738	336 921	92 248
36	36	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5438	325 873	177 209
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-24 /4 шт/				**613 372**
			Подраздел: Балка монолитная Б-25 /4 шт/				
37	37	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.7	99 975	669 832
38	38	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5252	336 921	176 950
39	39	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.0564	325 873	344 252
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-25 /4 шт/				**1 191 035**
			Подраздел: Балка монолитная Б-63 /4 шт/				
40	40	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11.02	99 975	1 101 724

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8928	336 921	300 803
42	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.8006	325 873	586 766
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-63 /4 шт/				**1 989 294**
			Итого по разделу: null				**15 063 099**
			Раздел: Перекрытия и покрытие				
			Подраздел: Плиты сборные				
43	43	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	57	9 671	551 247
44	44	6104-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 5 м2	шт.	2	7 934	15 868
45	45	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.15-8/	м2	97.2	10 622	1 032 458
46	46	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.12-8/	м2	181.44	10 622	1 927 255
47	47	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.10-8/	м2	93.6	10 622	994 219
48	48	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 66.15-8/	м2	9.9	10 622	105 157
49	49	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 66.12-8/	м2	7.92	10 622	84 126
50	50	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 66.10-8/	м2	6.6	10 622	70 105
51	51	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.15-8/	м2	36	10 622	382 392
52	53	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.10-8/	м2	12	10 622	127 464
53	54	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 58.15-8/	м2	8.7	10 622	92 411
54	55	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 58.12-8/	м2	13.92	10 622	147 858
55	58	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 50.12-8/	м2	23.7048	10 622	251 792
56	59	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 50.10-8/	м2	4.9302	10 622	52 368
57	60	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.03417	1 306 411	44 640
58	61	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03417	336 921	11 512
			Итого по подразделу: Плиты сборные				**5 890 876**
			Подраздел: Монолитные участки				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	62	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	14.45	104 310	1 507 279
60	63	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7935	325 873	258 580
			Итого по подразделу: Монолитные участки				**1 765 859**
			Подраздел: Плита монолитная Пм-1Л				
61	64	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5.78	104 310	602 911
62	65	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0666	336 921	22 438
63	66	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3625	325 873	118 128
			Итого по подразделу: Плита монолитная Пм-1Л				**743 479**
			Подраздел: Млп-4Л				
64	76	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0.88	104 310	91 792
65	77	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0225	336 921	7 580
66	78	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1418	325 873	46 208
			Итого по подразделу: Млп-4Л				**145 582**
			Итого по разделу: Перекрытия и покрытие				**8 545 798**
			Раздел: Лестница Л-7				
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-1 /1 шт/				
67	91	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	32 338	20 049
68	92	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	90 129	55 879
69	93	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00232	336 921	781
70	94	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.13973	325 873	45 534
71	95	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0048	363 687	1 745
72	96	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	13 096	8 119
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-1 /1 шт/				**132 110**
			Итого по разделу: Лестница Л-7				**132 110**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок Л				**29 427 005**
			ИТОГО по акту:				**29 427 005**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				29427005.703 x 6.20%	1 824 474

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				29427005.703 + 1824474.297	31 251 480
		Сметная прибыль, 5.00%				31251480.000 x 5.00%	1 562 574
		Непредвиденные расходы, 5.000%				31251480.000 x 5.000%	1 562 574
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					34 376 628
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				34376628.000 x 1.0182	35 002 282
		НДС (12%)				35002282.630 x 12%	4 200 273
		Итого с НДС				35002282.630 + 4200273.916	39 202 556

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	10.07.2024 14:08:31
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	10.07.2024 15:43:04
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	10.07.2024 15:33:13
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	10.07.2024 16:15:20
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	11.07.2024 07:56:45
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	11.07.2024 05:25:08
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	11.07.2024 06:15:52

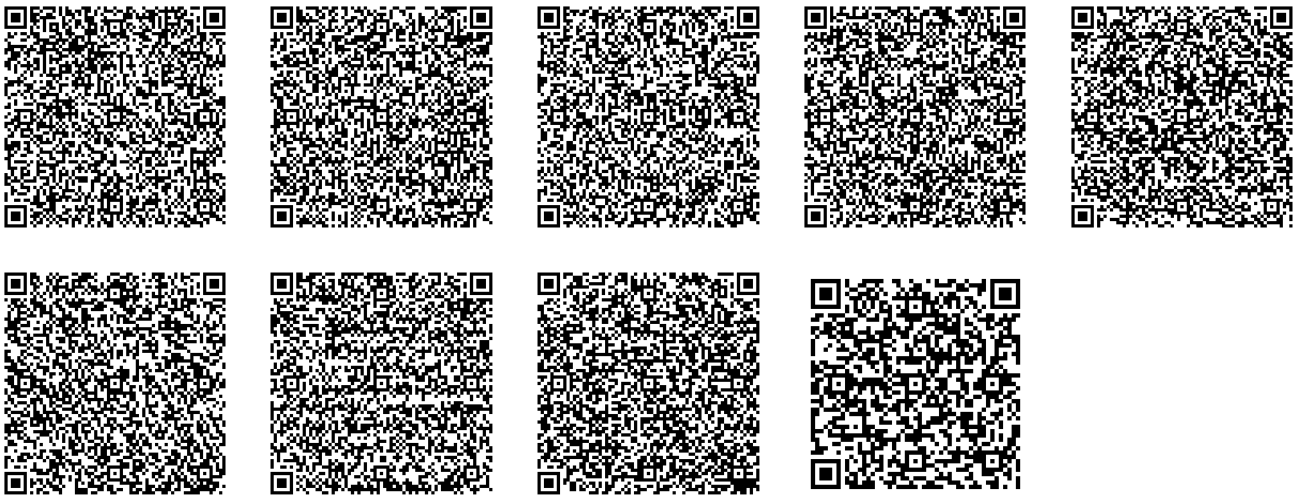

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок Ж				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-15 /4 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.79	72 352	129 510
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06453	336 921	21 741
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19229	325 873	62 662
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-15 /4 шт/				**213 913**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-16 /10 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	6.725	72 352	486 567
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.200175	336 921	67 443
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.480725	325 873	156 655
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-16 /10 шт/				**710 665**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-17 /4 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.64	72 352	191 009
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08007	336 921	26 977
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.24246	325 873	79 011
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-17 /4 шт/				**296 997**
			Подраздел: Стена монолитная См-2 /2 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.16	98 004	15 680
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00134	336 921	451
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04618	325 873	15 048
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-2 /2 шт/				**31 180**
			Итого по разделу: КАРКАС				**1 252 758**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: Балка монолитная Б-32 /6 шт/				
13	13	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	13.44	99 975	1 343 664
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.0804	336 921	364 009
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.2174	325 873	722 590
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-32 /6 шт/				**2 430 264**
			Подраздел: Балка монолитная Б-39 /6 шт/				
16	19	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.88	99 975	687 828
17	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5552	336 921	187 058
18	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1776	325 873	383 748
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-39 /6 шт/				**1 258 634**
			Итого по разделу: Балки				**3 688 898**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок Ж				**4 941 656**
			ИТОГО по акту:				**4 941 656**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	4941656.834 x 6.20%	306 382
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4941656.834 + 306382.714	5 248 039
	Сметная прибыль, 5.00%	5248039.549 x 5.00%	262 401
	Непредвиденные расходы, 5.000%	5248039.549 x 5.000%	262 401
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 772 843
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	5772843.503 x 1.0182	5 877 909
	НДС (12%)	5877909.255 x 12%	705 349
	Итого с НДС	5877909.255 + 705349.111	6 583 258

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	10.07.2024 14:08:51
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	10.07.2024 15:43:34
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	10.07.2024 15:33:59
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	11.07.2024 06:16:08
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	11.07.2024 07:57:54
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	10.07.2024 16:14:08
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	11.07.2024 05:25:31

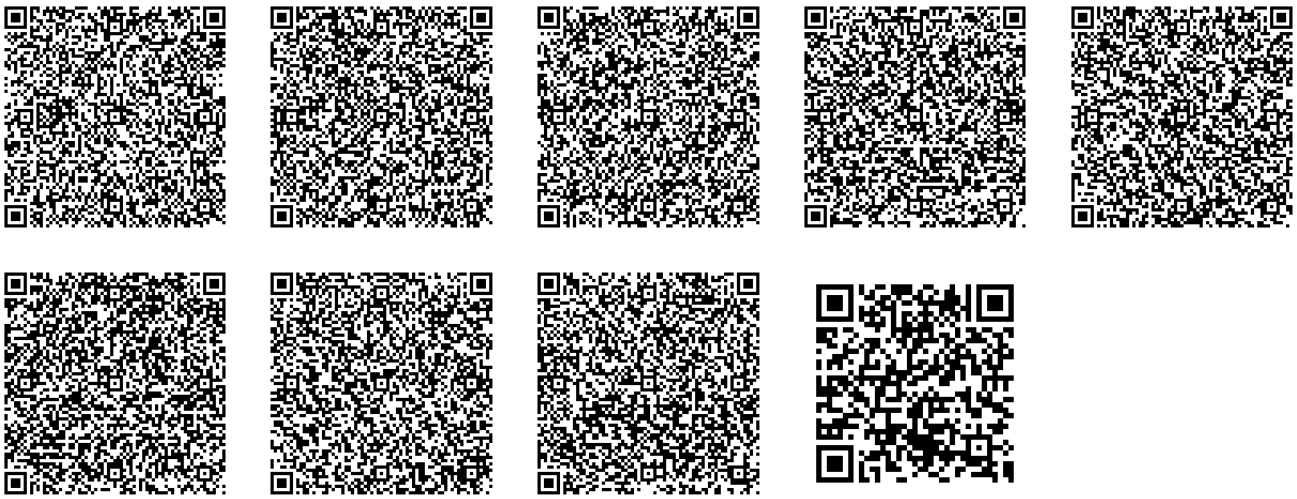

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок Б				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-15 /4 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.79	72 352	129 510
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06453	336 921	21 741
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19229	325 873	62 662
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-15 /4 шт/				**213 913**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-16 /4 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.69	72 352	194 626
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08007	336 921	26 977
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.19229	325 873	62 662
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-16 /4 шт/				**284 266**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-17 /1 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.6725	72 352	48 656
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0200175	336 921	6 744
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.060615	325 873	19 752
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-17 /1 шт/				**75 153**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-18 /3 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.0175	72 352	145 970
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0600525	336 921	20 232
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2242125	325 873	73 064
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-18 /3 шт/				**239 267**
			Подраздел: Стена монолитная См-2 /2 шт/				
13	13	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.16	98 004	15 680
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00134	336 921	451
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.04618	325 873	15 048
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-2 /2 шт/				**31 180**
			Итого по разделу: КАРКАС				**843 782**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: Балка монолитная Б-30 /6 шт/				
16	16	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.96	99 975	695 826
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5402	336 921	182 004
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.1228	325 873	365 890
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-30 /6 шт/				**1 243 720**
			Подраздел: Балка монолитная Б-37 /6 шт/				
19	22	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.88	99 975	687 828
20	23	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.5552	336 921	187 058
21	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.134	325 873	369 539
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-37 /6 шт/				**1 244 426**
			Итого по разделу: Балки				**2 488 147**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок Б				**3 331 930**
			ИТОГО по акту:				**3 331 930**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	3331930.090 x 6.20%	206 579
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	3331930.090 + 206579.659	3 538 509
	Сметная прибыль, 5.00%	3538509.750 x 5.00%	176 925
	Непредвиденные расходы, 5.000%	3538509.750 x 5.000%	176 925

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					3 892 360
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182				3892360.725 x 1.0182	3 963 201
		НДС (12%)				3963201.690 x 12%	475 584
		Итого с НДС				3963201.690 + 475584.203	4 438 785

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	10.07.2024 14:09:08
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	10.07.2024 15:44:04
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	10.07.2024 15:34:30
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	11.07.2024 07:59:06
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	11.07.2024 05:27:17
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	10.07.2024 16:12:51
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	11.07.2024 06:15:33

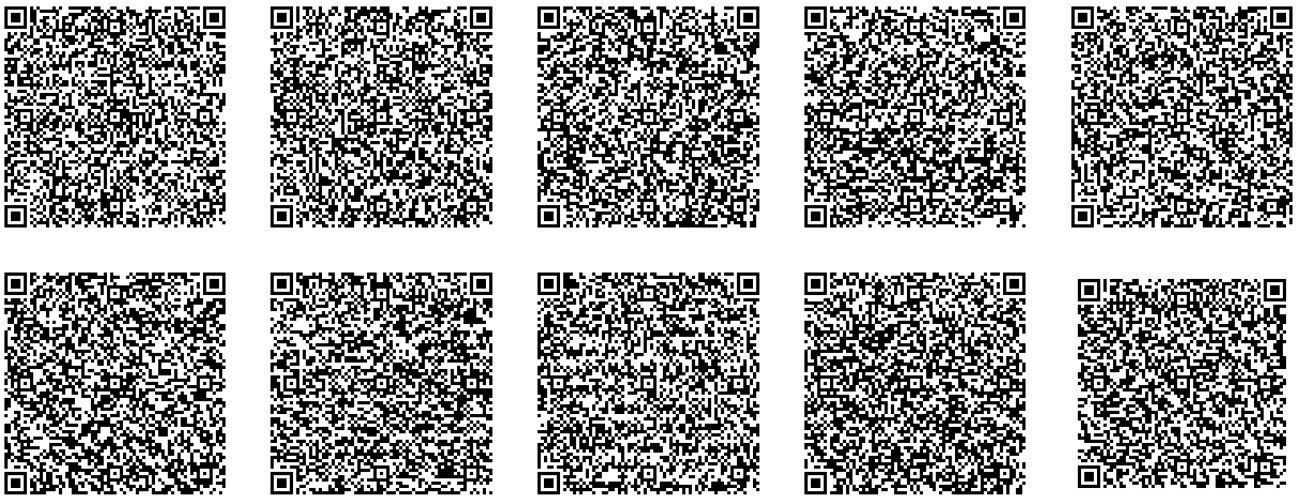

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок И				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-13 /2 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.08	72 352	78 140
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03892	336 921	13 112
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1	325 873	32 587
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-13 /2 шт/				**123 840**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-14 /2 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.01	72 352	73 075
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03687	336 921	12 422
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08967	325 873	29 221
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-14 /2 шт/				**114 718**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-22 /3 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.5825	72 352	114 497
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05838	336 921	19 669
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.168195	325 873	54 810
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-22 /3 шт/				**188 976**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-23 /1 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.525	72 352	37 984
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01946	336 921	6 556
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.055665	325 873	18 139
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-23 /1 шт/				**62 681**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-24 /2 шт/				
13	13	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.585	72 352	114 677
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0483	336 921	16 273
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.11213	325 873	36 540
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-24 /2 шт/				**167 491**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-25 /3 шт/				
16	16	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.3775	72 352	172 016
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07245	336 921	24 409
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2599725	325 873	84 718
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-25 /3 шт/				**281 144**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-26 /1 шт/				
19	19	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0.785	72 352	56 796
20	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02415	336 921	8 136
21	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0860625	325 873	28 045
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-26 /1 шт/				**92 978**
			Подраздел: Стена монолитная См-6 /1 шт/				
22	22	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.09	98 004	8 820
23	23	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00072	336 921	242
24	24	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01776	325 873	5 787
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-6 /1 шт/				**14 850**
			Подраздел: Стена монолитная См-7 /2 шт/				
25	25	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.22	98 004	21 560

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00182	336 921	613
27	27	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.03908	325 873	12 735
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-7 /2 шт/				**34 909**
			Подраздел: Стена монолитная См-11 /1 шт/				
28	28	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.09	98 004	8 820
29	29	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00075	336 921	252
30	30	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01776	325 873	5 787
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-11 /1 шт/				**14 860**
			Итого по разделу: КАРКАС				**1 096 451**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: Балка монолитная Б-18 /3 шт/				
31	40	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7.92	99 975	791 802
32	41	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6378	336 921	214 888
33	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.3028	325 873	424 547
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-18 /3 шт/				**1 431 237**
			Подраздел: Балка монолитная Б-26 /3 шт/				
34	46	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.96	99 975	395 901
35	47	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1032	336 921	34 770
36	48	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2108	325 873	68 694
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-26 /3 шт/				**499 365**
			Подраздел: Балка монолитная Б-27 /10 шт/				
37	49	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10.6	99 975	1 059 735
38	50	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8552	336 921	288 134
39	51	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.746	325 873	568 974
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-27 /10 шт/				**1 916 844**
			Подраздел: Балка монолитная Б-29 /4 шт/				
40	52	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.48	99 975	347 913

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	53	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2701	336 921	91 002
42	54	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.557	325 873	181 511
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-29 /4 шт/				**620 426**
			Итого по разделу: Балки				**4 467 873**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок И				**5 564 325**
			ИТОГО по акту:				**5 564 325**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	5564325.281 x 6.20%	344 988
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	5564325.281 + 344988.157	5 909 313
	Сметная прибыль, 5.00%	5909313.438 x 5.00%	295 465
	Непредвиденные расходы, 5.000%	5909313.438 x 5.000%	295 465
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		6 500 244
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	6500244.781 x 1.0182	6 618 549
	НДС (12%)	6618549.236 x 12%	794 225
	Итого с НДС	6618549.236 + 794225.908	7 412 775

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	10.07.2024 14:09:29
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	10.07.2024 15:42:26
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	10.07.2024 15:34:57
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	11.07.2024 08:00:08
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	10.07.2024 16:10:42
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	11.07.2024 06:15:17
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	11.07.2024 05:26:35

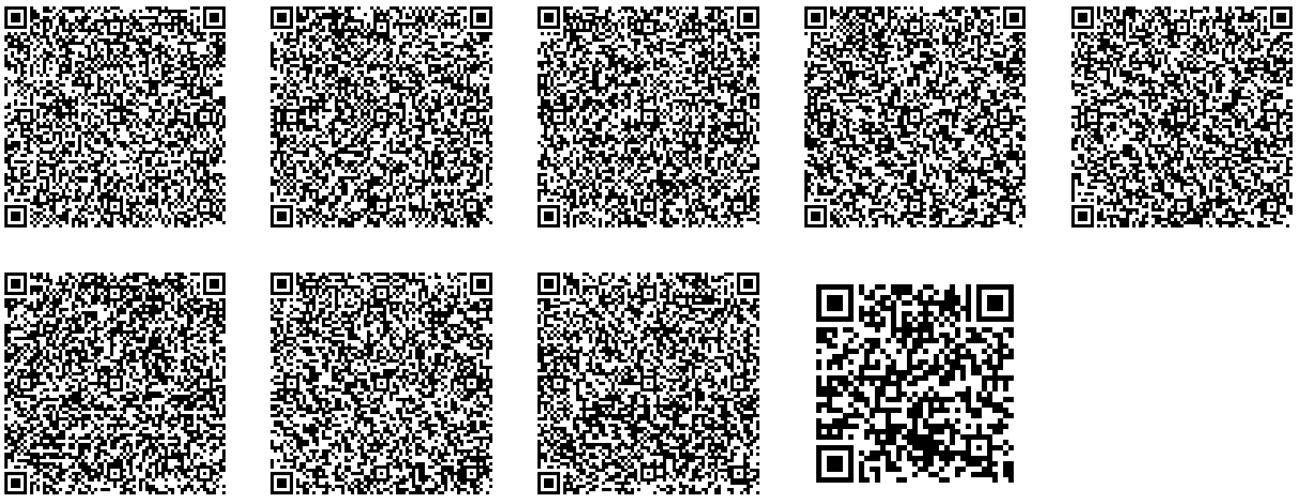

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок К				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-27 /26 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	12.48	72 352	902 952
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.45266	336 921	152 510
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.10344	325 873	359 581
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-27 /26 шт/				**1 415 044**
			Подраздел: Стена монолитная См-5 /2 шт/				
4	4	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.12	98 004	11 760
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0009	336 921	303
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.03552	325 873	11 575
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-5 /2 шт/				**23 638**
			Итого по разделу: КАРКАС				**1 438 683**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: Балка монолитная Б-28 /2шт/				
7	7	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.56	99 975	355 911
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2776	336 921	93 529
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.557	325 873	181 511

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-28 /2шт/				**630 951**
			Подраздел: Балка монолитная Б-31 /8 шт/				
10	10	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15.28	99 975	1 527 618
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.2304	336 921	414 547
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.5636	325 873	835 408
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-31 /8 шт/				**2 777 573**
			Подраздел: Балка монолитная Б-65 /8 шт/				
13	13	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	16.96	99 975	1 695 576
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.3804	336 921	465 085
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.5844	325 873	842 186
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-65 /8 шт/				**3 002 847**
			Подраздел: Балка монолитная Б-66 /2 шт/				
16	16	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.88	99 975	587 853
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4726	336 921	159 228
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.0596	325 873	345 295
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-66 /2 шт/				**1 092 376**
			Итого по разделу: Балки				**7 503 749**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок К				**8 942 433**
			ИТОГО по акту:				**8 942 433**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	8942433.618 x 6.20%	554 430
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	8942433.618 + 554430.867	9 496 864
	Сметная прибыль, 5.00%	9496864.485 x 5.00%	474 843
	Непредвиденные расходы, 5.000%	9496864.485 x 5.000%	474 843
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		10 446 550
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 1 квартал, к = 1.0182	10446550.933 x 1.0182	10 636 678
	НДС (12%)	10636678.160 x 12%	1 276 401
	Итого с НДС	10636678.160 + 1276401.379	11 913 079

Лист согласования
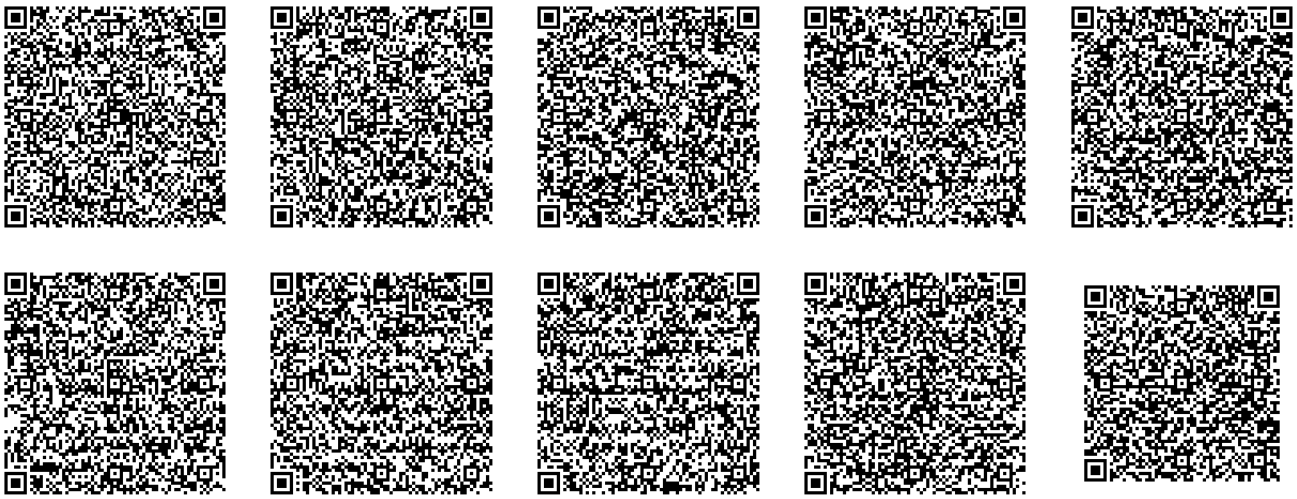
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	10.07.2024 14:09:47
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	10.07.2024 15:41:51
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	10.07.2024 15:35:28
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	11.07.2024 05:26:57
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	11.07.2024 08:01:10
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	10.07.2024 16:09:17
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Директор Регионального подразделения по Мангистауской и Атырауской области	11.07.2024 06:16:27
