# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20241011-33452341 | 1.1. | **Номер учетной системы** 00000000062 |
| 2. | **Дата выписки** 11.10.2024 | 2.1 | Дата выписки на бумажном носителе |
| 3. | **Дата совершения оборота** 10.10.2024 | | |
| 4. | Исправленный ☐ | 4.1 | Дата выписки |
| 4.2 | Номер учетной системы | 4.3 | Регистрационный номер |
| 5. | Дополнительный ☐ | 5.1 | Дата выписки |
| 5.2 | Номер учетной системы | 5.3 | Регистрационный номер |

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 **9.2.** номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Комитент | B | Комиссионер |
| C | Экспедитор | D | Лизингодатель |
| E | Участник СРП | 10.1. количество | |
| F | Участник договора о совместной деятельности | | |
| G | Экспортер | H | Международный перевозчик |
| I | Доверитель | | |

11. Дополнительные сведения

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | КБе 17 | 13. | ИИК KZ459650000072168167 |
| 14. | БИК IRTYKZKA | 15. | Наименование банка AO ForteBank |

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** **Доля участия**

Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction

18. Адрес места нахождения

г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Комитент | B | Комиссионер |
| C | Лизингополучатель | 20.1. количество | |
| D | Участник договора совместной деятельности | | |
| E | Государственное учреждение | F | Нерезидент |
| G | Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП | | |
| H | Доверитель | I | Розничная реализация |
| | | J | Физическое лицо |

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Грузоотправитель | | 26. | Грузополучатель | |
| 25.1 | ИИН/БИН | 060440002060 | 26.1 | ИИН/БИН | 090340012961 |
| 25.2 | Наименование | Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" | 26.2 | Наименование | Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction |
| 25.3 | Адрес отправки | Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5 | 26.3 | Адрес доставки | г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10 |
| | | | 26.4 | Код страны | KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378) |

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 117

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 29.06.2023

**27.5** Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер

32.2 дата

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Единица измерения | Количество (объем) | Количественная единица измерения | Количество товара в количественной единице измерения | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Идентификатор товара, работы, услуг | Код товара (GTIN) | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 6/1 | 6/2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17/1 | 18 |
| 1 | 6 | Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест" | | | работа | 1 | | | 35 633 078,57 | 35 633 078,57 | | 0 | 35 633 078,57 | 12% | 4 275 969,43 | 39 909 048 | | | 1 | | |
| | | | | **Всего по счету** | | | | | | **35 633 078,57** | | | **35 633 078,57** | | **4 275 969,43** | **39 909 048** | | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**

cfx7GA/gDXreP8beQBvDGuy2tRzJOBeP91URaCou78RR5s6Ssv/409SkwpZiINwk
K8XoJgmZNc0ZlsKuCRZ90w==

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

**Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**
**Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области**

# СПРАВКА №1

## о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
## за октябрь месяц 2024 года

| БИН | | КОПФ | | | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ специфики | код |
| 090340012961 | 060440002060 | | | **дог № 117** | **29.06.2023** | | |
| | | | | доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024 | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце, без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| **A** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Всего по стройке | 1 652 183 110 | 1 652 183 110 | 1 475 163 491,07 | | | | 177 019 618,93 | 1 652 183 110 |
| | | | | | | | | |
| в том числе: за октябрь месяц 2024 года | 82 784 856 | 82 784 856 | 73 915 050,00 | | | | 8 869 806,00 | 82 784 856 |

**Заказчик:** **Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Аршамов А.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

**Подрядчик:** **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

**Технический надзор:** **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати



Подписано через EQURYLYS.KZ (#3cac3b78-06ad-4f52-8aa8-70dfbfcc82aa)

**Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10**

**Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области**

# Реестр актов выполненных работ
## за октябрь месяц 2024 года

| № п/п | Номер акта выполненных работ | Наименование смет | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт №58 | Земельные работы | 9 819 684 |
| 2 | Акт №59 | Фундаменты | 3 332 572 |
| 3 | Акт №60 | Конструкции железобетонные. Блок Г. | 29 723 552 |
| 4 | Акт №61 | Конструкции железобетонные. Блок Г. | 39 909 048 |
| | | ИТОГО | 82 784 856 |

**Заказчик:**

**Директор департамента строительства по реализации национального проекта АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,**
**Аршамов А.Т.** _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,**
**Адилбеков Ж.З.** _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Технический надзор:**

**Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226,**
**Садвакасов К.Т.** _____

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)



Подписано через EQURYLYS.KZ (#3cac3b78-06ad-4f52-8aa8-70dfbfcc82aa)

## Лист согласования

| ФИО | Должность | Данные ЭЦП |
|---|---|---|
| Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null | Начальник Отдела смет и ценообразования | Подписано: 10.10.2024 17:36 |
| Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null | Директор | Подписано: 10.10.2024 15:31 |
| Заказчик: ИИН 601126301438 - АРШАМОВ АБДУКЕРИМ null | Директор департамента строительства по реализации национального проекта | Подписано: 10.10.2024 18:12 |
| Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null | Заместитель директора | Подписано: 10.10.2024 16:02 |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.


Подписано через EQURYLYS.KZ (#3cac3b78-06ad-4f52-8aa8-70dfbfcc82aa)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#3cac3b78-06ad-4f52-8aa8-70dfbfcc82aa)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#3cac3b78-06ad-4f52-8aa8-70dfbfcc82aa)

*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Октябрь 2024 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок Г** | | | | |
| | | | **Раздел: КАРКАС** | | | | |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-1 /11 шт/** | | | | |
| 1 | 1 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0.375 | 72 352 | 27 131 |
| 2 | 2 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.21406 | 336 921 | 72 121 |
| 3 | 3 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.612315 | 325 873 | 199 537 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-1 /11 шт/** | | | | **298 790** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-2 /5 шт/** | | | | |
| 4 | 4 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 2.625 | 72 352 | 189 924 |
| 5 | 5 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0973 | 336 921 | 32 782 |
| 6 | 6 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.35 | 325 873 | 114 055 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-2 /5 шт/** | | | | **336 762** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-3 /4 шт/** | | | | |
| 7 | 7 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 2.1 | 72 352 | 151 939 |
| 8 | 8 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.07784 | 336 921 | 26 226 |
| 9 | 9 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.28905 | 325 873 | 94 193 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-3 /4 шт/** | | | | **272 358** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-5 /1 шт/** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | 10 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0.525 | 72 352 | 37 984 |
| 11 | 11 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.01946 | 336 921 | 6 556 |
| 12 | 12 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.094155 | 325 873 | 30 682 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-5 /1 шт/** | | | | **75 223** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-6 /1 шт/** | | | | |
| 13 | 13 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 0.525 | 72 352 | 37 984 |
| 14 | 14 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.01946 | 336 921 | 6 556 |
| 15 | 15 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.11396 | 325 873 | 37 136 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-6 /1 шт/** | | | | **81 677** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-7 /3 шт/** | | | | |
| 16 | 16 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 1.575 | 72 352 | 113 954 |
| 17 | 17 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.05838 | 336 921 | 19 669 |
| 18 | 18 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.358815 | 325 873 | 116 927 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-7 /3 шт/** | | | | **250 552** |
| | | | **Подраздел: Колонна монолитная Км-9 /2 шт/** | | | | |
| 19 | 19 | 1106-0501-0106РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | м3 | 2.072 | 72 352 | 149 913 |
| 20 | 20 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.077024 | 336 921 | 25 951 |
| 21 | 21 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.227488 | 325 873 | 74 132 |
| | | | **Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-9 /2 шт/** | | | | **249 996** |
| | | | **Подраздел: Диафрагма жесткости Джм-5** | | | | |
| 22 | 40 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0.002 | 85 570 | 171 |
| | | | **Итого по подразделу: Диафрагма жесткости Джм-5** | | | | **171** |
| | | | **Итого по разделу: КАРКАС** | | | | **1 565 532** |
| | | | **Раздел: Балки** | | | | |
| | | | **Подраздел: Балка монолитная Б-2 /13 шт/** | | | | |
| 23 | 43 | 1106-0701-0201РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 10.8 | 99 975 | 1 079 730 |
| 24 | 44 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.8667 | 336 921 | 292 009 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 45 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.7307 | 325 873 | 563 988 |
| | | | **Итого по подразделу: Балка монолитная Б-2 /13 шт/** | | | | **1 935 727** |
| | | | **Подраздел: Балка монолитная Б-10 /3 шт/** | | | | |
| 26 | 46 | 1106-0701-0201РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 1.418274 | 99 975 | 141 791 |
| 27 | 47 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2307 | 336 921 | 77 727 |
| 28 | 48 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.4769 | 325 873 | 155 409 |
| | | | **Итого по подразделу: Балка монолитная Б-10 /3 шт/** | | | | **374 928** |
| | | | **Подраздел: Балка монолитная Б-20 /4 шт/** | | | | |
| 29 | 52 | 1106-0701-0201РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 4.99 | 99 975 | 498 875 |
| 30 | 53 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.3958 | 336 921 | 133 353 |
| 31 | 54 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.8065 | 325 873 | 262 816 |
| | | | **Итого по подразделу: Балка монолитная Б-20 /4 шт/** | | | | **895 045** |
| | | | **Подраздел: Балка монолитная Б-21 /12 шт/** | | | | |
| 32 | 55 | 1106-0701-0201РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 19.53 | 99 975 | 1 952 511 |
| 33 | 56 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1.5699 | 336 921 | 528 932 |
| 34 | 57 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3.0984 | 325 873 | 1 009 684 |
| | | | **Итого по подразделу: Балка монолитная Б-21 /12 шт/** | | | | **3 491 129** |
| | | | **Подраздел: Балка монолитная Б-56 /4 шт/** | | | | |
| 35 | 70 | 1106-0701-0201РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 0.4 | 99 975 | 39 990 |
| 36 | 71 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0131 | 336 921 | 4 413 |
| 37 | 72 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0467 | 325 873 | 15 218 |
| | | | **Итого по подразделу: Балка монолитная Б-56 /4 шт/** | | | | **59 622** |
| | | | **Подраздел: Балка монолитная Б-64 /1 шт/** | | | | |
| 38 | 76 | 1106-0701-0201РСНБ РК 2022 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 3.52 | 99 975 | 351 912 |
| 39 | 77 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.2851 | 336 921 | 96 056 |
| 40 | 78 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.5769 | 325 873 | 187 996 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Итого по подразделу: Балка монолитная Б-64 /1 шт/** | | | | **635 964** |
| | | | **Итого по разделу: Балки** | | | | **7 392 416** |
| | | | **Раздел: Перекрытия и покрытие** | | | | |
| | | | **Подраздел: Плиты сборные** | | | | |
| 41 | 79 | 6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2 | шт. | 59 | 9 671 | 570 589 |
| 42 | 80 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.15-8/ | м2 | 460.0226 | 10 622 | 4 886 360 |
| 43 | 81 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.12-8/ | м2 | 34.1768 | 10 622 | 363 025 |
| 44 | 82 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 72.10-8/ | м2 | 21.3246 | 10 622 | 226 509 |
| 45 | 83 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.15-8/ | м2 | 44.551 | 10 622 | 473 220 |
| 46 | 84 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 60.12-8/ | м2 | 7.1162 | 10 622 | 75 588 |
| 47 | 89 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.15-8/ | м2 | 20.1448 | 10 622 | 213 978 |
| 48 | 90 | 222-203-0404РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.12-8/ | м2 | 8.0444 | 10 622 | 85 447 |
| | | | **Итого по подразделу: Плиты сборные** | | | | **6 894 719** |
| | | | **Подраздел: А1,А2** | | | | |
| 49 | 92 | 6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка арматурных стыковых накладок | т | 0.05301 | 1 306 411 | 69 252 |
| 50 | 93 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.05301 | 336 921 | 17 860 |
| | | | **Итого по подразделу: А1,А2** | | | | **87 113** |
| | | | **Подраздел: Монолитные участки** | | | | |
| 51 | 94 | 1106-0801-0104РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 20.15 | 104 310 | 2 101 846 |
| 52 | 95 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1.1805 | 325 873 | 384 693 |
| | | | **Итого по подразделу: Монолитные участки** | | | | **2 486 539** |
| | | | **Подраздел: Млп-2Г /2 шт/** | | | | |
| 53 | 108 | 1106-0801-0104РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1.74 | 104 310 | 181 499 |
| 54 | 109 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0309 | 336 921 | 10 411 |
| 55 | 110 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.1744 | 325 873 | 56 832 |
| | | | **Итого по подразделу: Млп-2Г /2 шт/** | | | | **248 743** |
| | | | **Подраздел: Млп-3Г** | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | 111 | 1106-0801-0104РСНБ РК 2022 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | м3 | 1.04 | 104 310 | 108 482 |
| 57 | 112 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0239 | 336 921 | 8 052 |
| 58 | 113 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.0932 | 325 873 | 30 371 |
| | | | **Итого по подразделу: Млп-3Г** | | | | **146 905** |
| | | | **Подраздел: Парапет Н-900мм** | | | | |
| 59 | 117 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 8.5 | 57 425 | 488 112 |
| 60 | 118 | 212-101-0901РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 8.6275 | 27 729 | 239 232 |
| 61 | 119 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0233 | 336 921 | 7 850 |
| 62 | 120 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.8431 | 333 205 | 280 925 |
| | | | **Итого по подразделу: Парапет Н-900мм** | | | | **1 016 119** |
| | | | **Подраздел: Парапет Н-1200мм** | | | | |
| 63 | 121 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 7.3 | 57 425 | 419 202 |
| 64 | 122 | 212-101-0901РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 7.4095 | 27 729 | 205 458 |
| 65 | 123 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0384 | 336 921 | 12 938 |
| 66 | 124 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.5683 | 333 205 | 189 360 |
| | | | **Итого по подразделу: Парапет Н-1200мм** | | | | **826 958** |
| | | | **Подраздел: Парапет Н-1700мм** | | | | |
| 67 | 125 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 25 | 85 570 | 2 139 250 |
| 68 | 126 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0879 | 336 921 | 29 615 |
| 69 | 127 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 1.7847 | 333 205 | 594 671 |
| | | | **Итого по подразделу: Парапет Н-1700мм** | | | | **2 763 536** |
| | | | **Подраздел: Парапет Н-4300мм** | | | | |
| 70 | 128 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 19.8 | 85 570 | 1 694 286 |
| 71 | 129 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0417 | 336 921 | 14 050 |
| 72 | 130 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 1.2956 | 333 205 | 431 700 |
| | | | **Итого по подразделу: Парапет Н-4300мм** | | | | **2 140 036** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Подраздел: Парапет Н-1400мм** | | | | |
| 73 | 131 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 10.6 | 85 570 | 907 042 |
| 74 | 132 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0334 | 336 921 | 11 253 |
| 75 | 133 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.8021 | 333 205 | 267 264 |
| | | | **Итого по подразделу: Парапет Н-1400мм** | | | | **1 185 559** |
| | | | **Подраздел: Контрофорс Кф1 /2/** | | | | |
| 76 | 134 | 1106-0601-0205РСНБ РК 2022 | Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м3 | 0.96 | 85 570 | 82 147 |
| 77 | 135 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0024 | 336 921 | 809 |
| 78 | 136 | 214-210-0501РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0.1154 | 333 205 | 38 452 |
| | | | **Итого по подразделу: Контрофорс Кф1 /2/** | | | | **121 408** |
| | | | **Итого по разделу: Перекрытия и покрытие** | | | | **17 917 636** |
| | | | **Раздел: Лестница Л-3** | | | | |
| | | | **Подраздел: Лестничный марш ЛМ-4 /2 шт/** | | | | |
| 79 | 149 | 6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 1.59 | 32 338 | 51 417 |
| 80 | 150 | 6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 1.59 | 90 129 | 143 305 |
| 81 | 151 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.00464 | 336 921 | 1 563 |
| 82 | 152 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.32776 | 325 873 | 106 808 |
| 83 | 153 | 214-210-0601РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.01716 | 363 687 | 6 241 |
| 84 | 154 | 6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 1.59 | 13 096 | 20 822 |
| | | | **Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-4 /2 шт/** | | | | **330 157** |
| | | | **Подраздел: Лестничный марш ЛМ-6 /1 шт/** | | | | |
| 85 | 161 | 6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 2.01 | 32 338 | 64 999 |
| 86 | 162 | 6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 2.01 | 90 129 | 181 159 |
| 87 | 163 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.00522 | 336 921 | 1 758 |
| 88 | 164 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.41722 | 325 873 | 135 961 |
| 89 | 165 | 214-210-0601РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0.0198 | 363 687 | 7 201 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 90 | 166 | 6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного | м3 | 2.01 | 13 096 | 26 323 |
| | | | **Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-6 /1 шт/** | | | | **417 402** |
| | | | **Итого по разделу: Лестница Л-3** | | | | **747 559** |
| | | | **Раздел: Световой приямок П-1** | | | | |
| 91 | 179 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0.357 | 17 061 | 6 090 |
| 92 | 180 | 6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 0.6 | 15 255 | 9 153 |
| 93 | 181 | 6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 1.8 | 69 859 | 125 746 |
| 94 | 182 | 212-101-0901РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2.436 | 27 729 | 67 548 |
| 95 | 183 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.2916 | 325 873 | 95 025 |
| 96 | 184 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0248 | 336 921 | 8 356 |
| 97 | 185 | 6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 9.8 | 4 414 | 43 257 |
| 98 | 186 | 6121-0103-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0.0008 | 2 227 409 | 1 782 |
| 99 | 187 | 241-102-0137РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0.8 | 1 511 | 1 209 |
| 100 | 188 | 1108-0201-0703РСНБ РК 2022 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0.03328 | 1 479 078 | 49 224 |
| | | | **Подраздел: Световой приямок П-2** | | | | |
| 101 | 189 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0.272 | 17 061 | 4 641 |
| 102 | 190 | 6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 0.6 | 15 255 | 9 153 |
| 103 | 191 | 6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 2 | 69 859 | 139 718 |
| 104 | 192 | 212-101-0901РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2.639 | 27 729 | 73 177 |
| 105 | 193 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.3119 | 325 873 | 101 640 |
| 106 | 194 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0297 | 336 921 | 10 007 |
| 107 | 195 | 6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 10.78 | 4 414 | 47 583 |
| 108 | 196 | 6121-0103-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0.0008 | 2 227 409 | 1 782 |
| 109 | 197 | 241-102-0137РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0.8 | 1 511 | 1 209 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 110 | 198 | 1108-0201-0703РСНБ РК 2022 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0.03328 | 1 479 078 | 49 224 |
| | | | **Итого по подразделу: Световой приямок П-2** | | | | **438 134** |
| | | | **Подраздел: Световой приямок П-3** | | | | |
| 111 | 199 | 6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м3 | 0.272 | 17 061 | 4 641 |
| 112 | 200 | 6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 0.6 | 15 255 | 9 153 |
| 113 | 201 | 6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм | м3 | 1.9 | 69 859 | 132 732 |
| 114 | 202 | 212-101-0901РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 2.5375 | 27 729 | 70 362 |
| 115 | 203 | 214-210-0502РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0.3023 | 325 873 | 98 511 |
| 116 | 204 | 214-210-0101РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.0277 | 336 921 | 9 333 |
| 117 | 205 | 6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 | 10.78 | 4 414 | 47 583 |
| 118 | 206 | 6121-0103-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0.0008 | 2 227 409 | 1 782 |
| 119 | 207 | 241-102-0137РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 0.8 | 1 511 | 1 209 |
| 120 | 208 | 1108-0201-0703РСНБ РК 2022 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0.03328 | 1 479 078 | 49 224 |
| | | | **Итого по подразделу: Световой приямок П-3** | | | | **424 530** |
| | | | **Итого по разделу: Световой приямок П-1** | | | | **1 270 055** |
| | | | **Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок Г** | | | | **28 893 199** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **28 893 199** |

| | | |
|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 28893199.275 x 6.20% | 1 791 378 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 28893199.275 + 1791378.300 | 30 684 577 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 30684577.575 x 5.00% | 1 534 228 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 30684577.575 x 5.000% | 1 534 228 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 33 753 035 |
| | **НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557** | 33753035.332 x 1.0557 | 35 633 079 |
| | НДС (12%) | 35633079.400 x 12% | 4 275 969 |
| | **Итого с НДС** | 35633079.400 + 4275969.528 | 39 909 048 |

Лист согласования
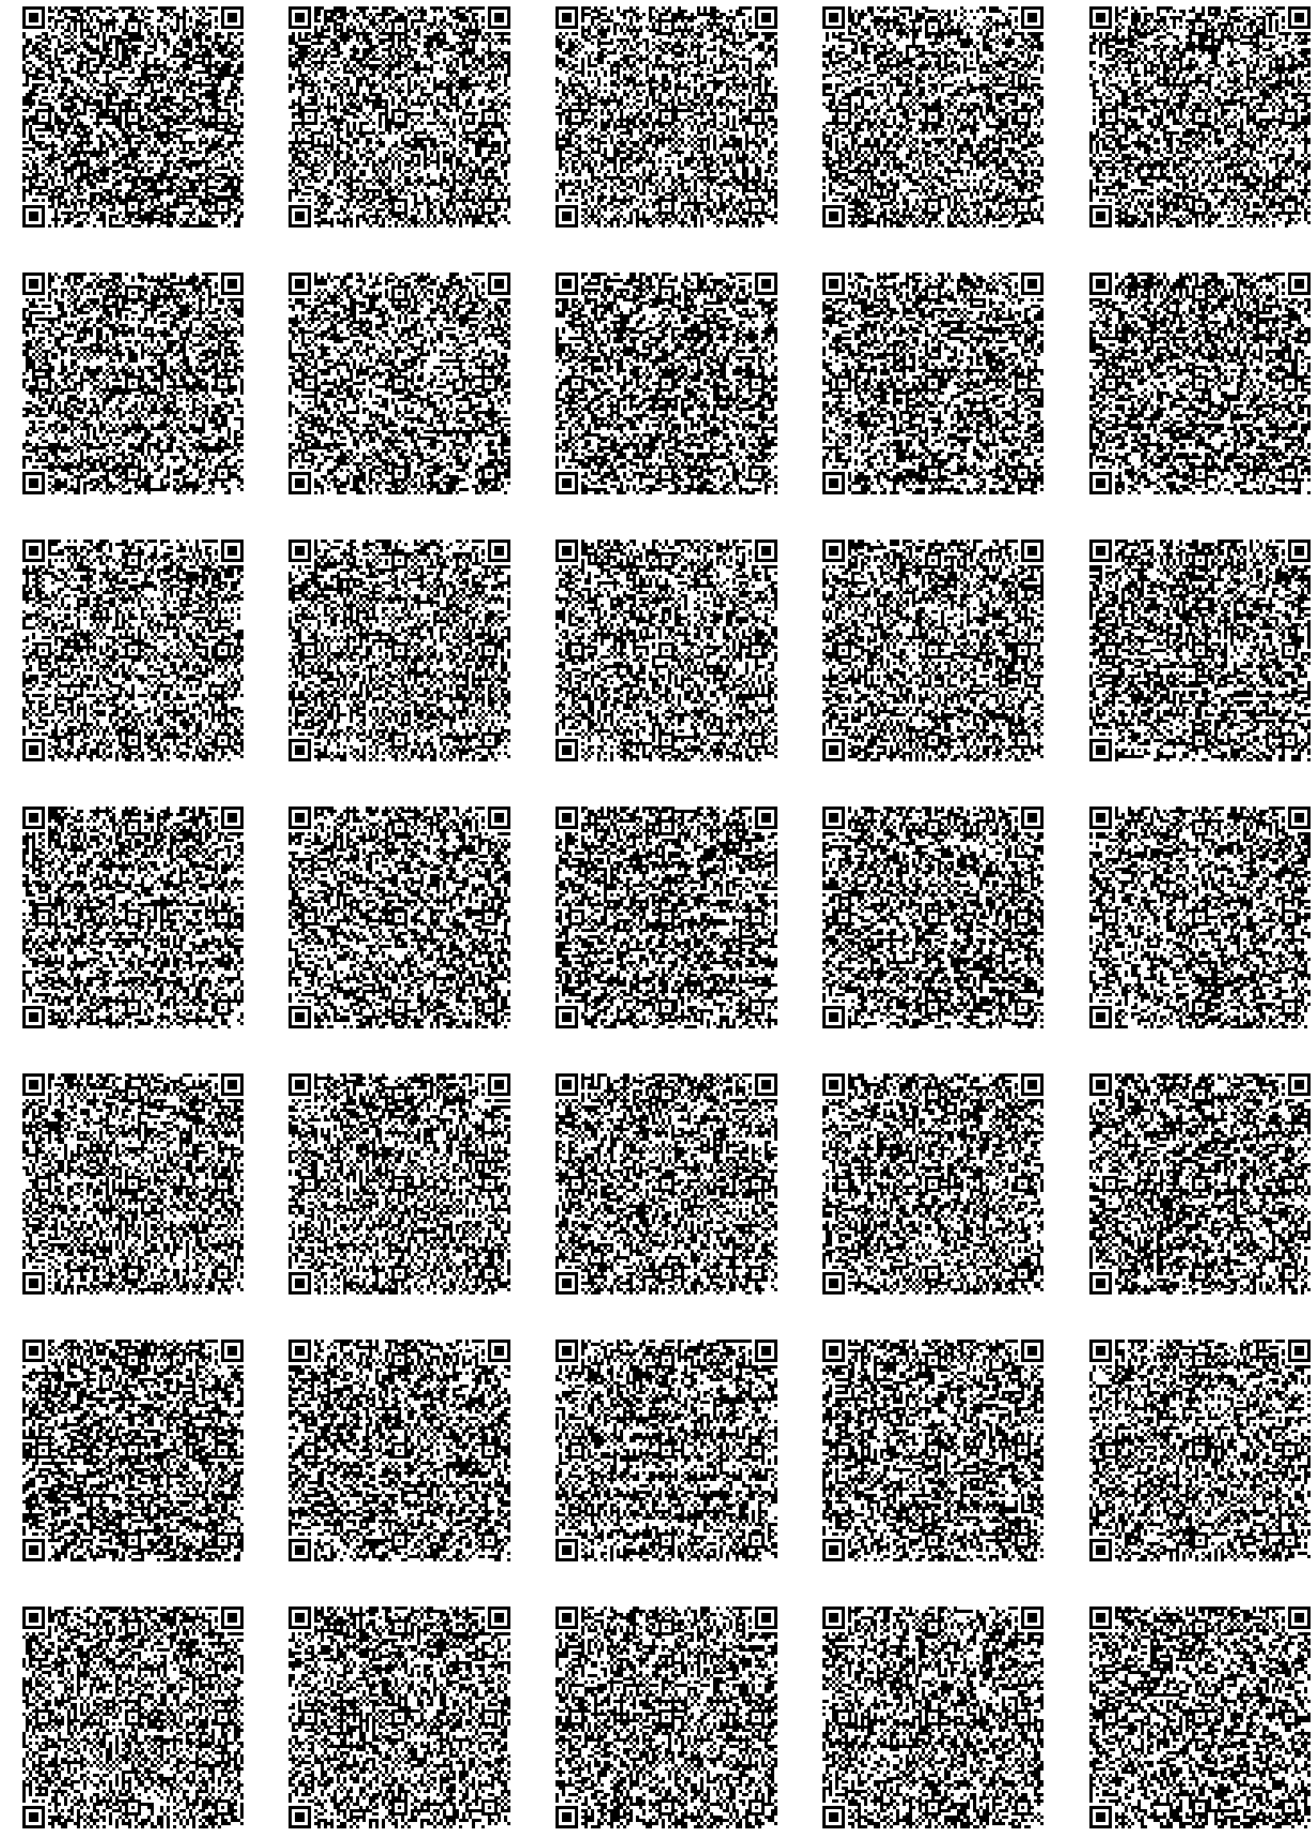
| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ | Директор | 07.10.2024 04:41:29 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ | Технический надзор | 08.10.2024 16:03:32 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ | Авторский надзор | 07.10.2024 07:24:45 |
| **Представители заказчика** | | |
| 621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ | Ведущий специалист | 09.10.2024 03:41:58 |
| 680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА | Ведущий специалист сметчик | 09.10.2024 04:31:10 |
| 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА | Начальник Отдела смет и ценообразования | 09.10.2024 11:48:45 |
| 750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null | Директор | 10.10.2024 04:47:22 |
