ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060440002060-20241214-73657792	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000080
2.	**Дата выписки** 14.12.2024 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 14.12.2024
4.	Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 **9.2.** номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Экспедитор	D	[ ] Лизингодатель
E	[ ] Участник СРП	10.1. количество	
F	[ ] Участник договора о совместной деятельности		
G	[ ] Экспортер	H	[ ] Международный перевозчик
I	[ ] Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction

18. Адрес места нахождения

г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Лизингополучатель	20.1. количество	
D	[ ] Участник договора совместной деятельности		
E	[ ] Государственное учреждение	F	[ ] Нерезидент
G	[ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	[ ] Доверитель	I	[ ] Розничная реализация
		J	[ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	090340012961
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5	26.3	Адрес доставки	г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 117

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 29.06.2023

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер

32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			56 017 518,75	56 017 518,75		0	56 017 518,75	12%	6 722 102,25	62 739 621			1		
				Всего по счету						**56 017 518,75**			**56 017 518,75**		**6 722 102,25**	**62 739 621**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	3p/HHCQSaw8UFnMCo1XIZ2C207+NRdnfgZvLnyowfeY0AuqanJFIKasV4SMgK5w6NY04/zaU2ga3C6e5mOCSwFDOtUB99qAEL28B+v2VbzmSYpUsM1VGJmbwdNGqJSELx/sTiTV2MHOMtbMdz8FGY0ZXUIgGHBcwKGazD+SC01c=
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	1 993 187 621	1 993 187 621	1 779 631 804,46				213 555 816,54	1 993 187 621
в том числе: за декабрь месяц 2024 года	140 406 163	140 406 163	125 362 645,54				15 043 517,46	140 406 163

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#baa0b736-d296-4c6c-897a-331de54f580b)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №76	Архитектурные решения Блок А	18 776 649
2	Акт №77	Архитектурные решения Блок Б,Д	16 216 443
3	Акт №78	Архитектурные решения Блок В	18 321 058
4	Акт №79	Архитектурные решения Блок Г,Ж	31 985 280
5	Акт №80	Архитектурные решения Блок Е	19 532 611
6	Акт №81	Архитектурные решения Блок И,К	14 537 898
7	Акт №82	Архитектурные решения Блок Л	21 036 224
		ИТОГО	140 406 163

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#baa0b736-d296-4c6c-897a-331de54f580b)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник Отдела смет и ценообразования	Подписано: 14.12.2024 12:52
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 14.12.2024 17:23
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 13.12.2024 16:05
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 13.12.2024 17:18

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#baa0b736-d296-4c6c-897a-331de54f580b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#baa0b736-d296-4c6c-897a-331de54f580b)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#baa0b736-d296-4c6c-897a-331de54f580b)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление				
			Отдел: (БЛОК И,К)				
			Раздел: Отопление (Блок И,К)				
1	511	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	8.67	4 469	38 746
2	512	245-104-0208РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	1	18 113	18 113
3	513	245-104-0210РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	21 165	21 165
4	514	245-104-0213РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	4	25 792	103 168
5	515	245-104-0214РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	27 367	54 734
6	516	245-104-0218РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	33 273	33 273
7	517	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	4.04	4 469	18 055
8	518	245-104-0243РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	комплект	1	75 450	75 450
9	519	245-104-0245РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	50 717	50 717
10	520	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	2.94	4 469	13 139
11	521	245-104-0308РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	1	20 086	20 086

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	522	245-104-0311РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	51 656	51 656
13	523	245-104-0312РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	54 625	54 625
14	524	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	2.11	4 469	9 430
15	525	245-104-0406РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	1	35 259	35 259
16	526	245-104-0411РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	53 765	53 765
17	527	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	10.23	4 469	45 718
18	528	245-104-0502РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм	комплект	1	18 724	18 724
19	529	245-104-0505РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	комплект	1	24 157	24 157
20	530	245-104-0506РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	1	25 968	25 968
21	531	245-104-0507РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	27 870	27 870
22	532	245-104-0510РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	33 214	33 214
23	533	245-104-0511РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	35 295	35 295
24	534	245-104-0512РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	36 926	36 926
25	535	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	31.35	4 469	140 103
26	536	245-104-0528РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	1	18 911	18 911
27	537	245-104-0529РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	21 901	21 901
28	538	245-104-0531РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	1	28 875	28 875
29	539	245-104-0535РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	42 552	85 104
30	540	245-104-0536РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	46 265	138 795
31	541	245-104-0537РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	50 158	100 316
32	542	245-104-0540РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	61 297	61 297

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	543	245-104-0541РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	2	65 010	130 020
34	544	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	6	2 867	17 202
35	545	242-312-0502РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15+/AB-QM LF/	шт.	1	101 155	101 155
36	546	242-312-1701СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	26 802	53 604
37	547	242-312-1702СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	30 547	61 094
38	548	242-312-1703СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	36 808	36 808
39	549	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	3	3 273	9 819
40	550	242-312-0101РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	84 708	254 124
41	551	6114-0203-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 628	7 256
42	552	242-312-0104РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	127 320	254 640
43	553	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	74	2 348	173 752
44	554	245-405-3401РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	37	7 353	272 061
45	555	245-510-0215СпрСЦ 02.2024	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	37	10 872	402 264
46	556	245-405-2103РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	шт.	37	13 093	484 441
47	557	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухоотводчиков	шт.	10	11 628	116 280
48	558	245-405-1504РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	3 338	33 380
49	559	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	18	2 530	45 540
50	560	242-207-3702РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	3 796	53 144
51	561	242-207-3703РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	8	7 365	58 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	562	242-207-3704РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	11 614	23 228
53	563	6114-0103-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм	м	375	2 507	940 125
54	564	241-205-0205РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	371.25	838	311 108
55	565	6114-0103-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм	м	140	2 509	351 260
56	566	241-205-0208РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	138.6	1 838	254 747
57	567	6114-0103-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм	м	20	2 521	50 420
58	568	241-205-0209РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	19.8	2 342	46 372
59	570	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	890	2 167	1 928 630
60	571	234-303-0107РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	412.5	186	76 725
61	572	234-303-0110РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	154	236	36 344
62	573	234-303-0112РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	22	303	6 666
63	574	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	395	2 590	1 023 050
64	575	241-101-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	125	633	79 125
65	576	241-101-0203РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	160	649	103 840
66	577	241-101-0204РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	105	1 172	123 060
67	578	241-101-0207РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	5	1 434	7 170
68	580	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	395	2 167	855 965
69	581	234-303-0306РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	137.5	316	43 450
70	582	234-303-0308РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	176	394	69 344

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	583	234-303-0310РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	115.5	470	54 285
72	584	234-303-0312РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5.5	515	2 833
73	585	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40.5	300	12 150
74	586	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	92	708	65 136
			Итого по разделу: Отопление (Блок И,К)				**10 525 092**
			Итого по отделу: (БЛОК И,К)				**10 525 092**
			Итого по локальной смете: Отопление				**10 525 092**
			ИТОГО по акту:				**10 525 092**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	10525092.000 x 6.20%	652 555
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	10525092.000 + 652555.684	11 177 647
	Сметная прибыль, 5.00%	11177647.684 x 5.00%	558 882
	Непредвиденные расходы, 5.000%	11177647.684 x 5.000%	558 882
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		12 295 412
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	12295412.452 x 1.0557	12 980 266
	НДС (12%)	12980266.926 x 12%	1 557 632
	Итого с НДС	12980266.926 + 1557632.031	14 537 898

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	12.12.2024 05:09
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	12.12.2024 10:35
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	12.12.2024 05:26
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	13.12.2024 14:19 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	12.12.2024 11:30
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	12.12.2024 11:59
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	14.12.2024 04:56
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	12.12.2024 11:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

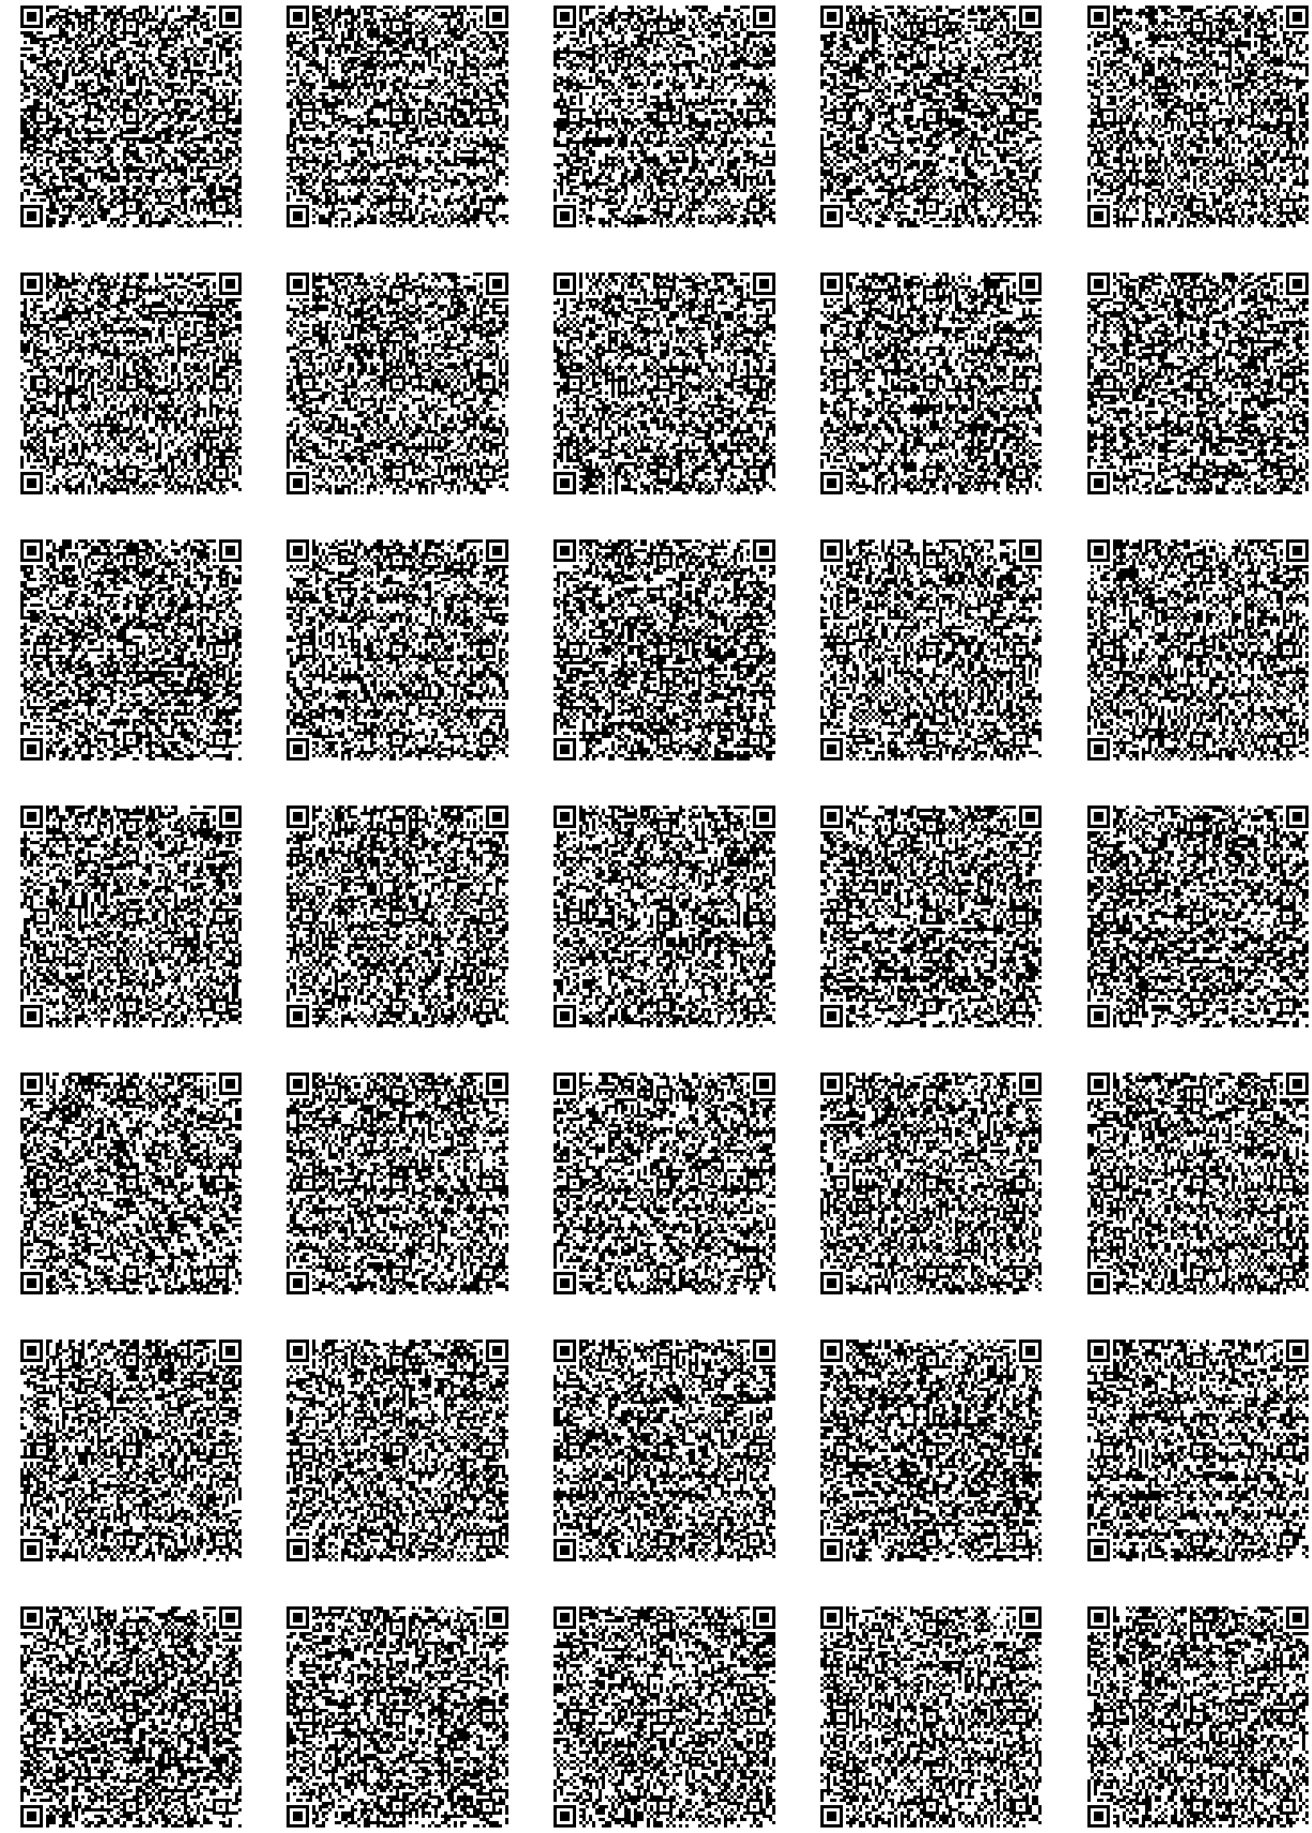

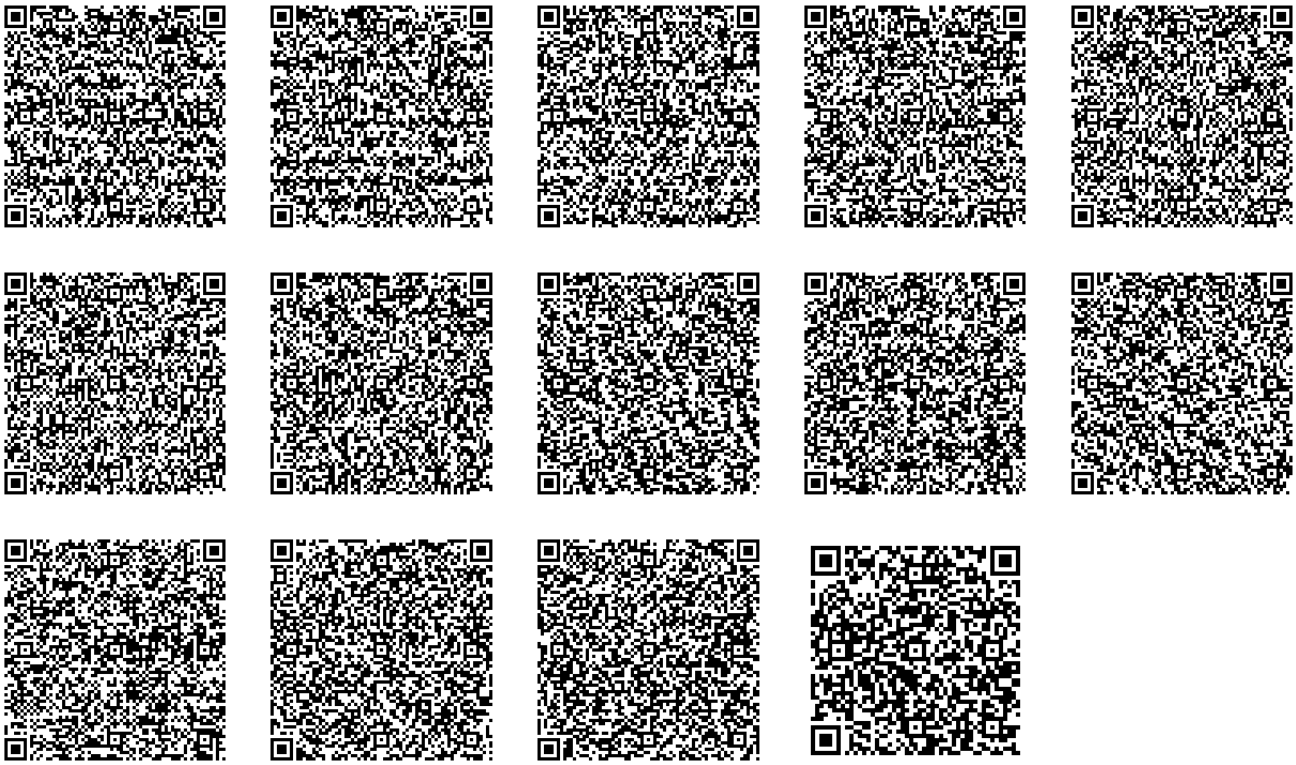

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление				
			Отдел: (Блок Б, Д)				
			Раздел: Отопление (Блок Б, Д)				
1	156	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	3.02	4 469	13 496
2	157	245-104-0208РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	1	18 113	18 113
3	158	245-104-0210РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	3	21 165	63 495
4	159	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	26.07	4 469	116 507
5	160	245-104-0228РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	1	13 835	13 835
6	161	245-104-0231РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	2	30 764	61 528
7	162	245-104-0242РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	7	71 678	501 746
8	163	245-104-0243РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1900 мм	комплект	6	75 450	452 700
9	164	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	13.96	4 469	62 386
10	165	245-104-0406РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	2	35 259	70 518
11	166	245-104-0411РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	2	53 765	107 530

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	167	245-104-0412РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	комплект	2	57 433	114 866
13	168	245-104-0413РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	60 925	60 925
14	169	245-104-0414РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	64 765	64 765
15	170	245-104-0417РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	75 765	75 765
16	171	245-104-0420РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	комплект	1	41 326	41 326
17	172	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	5.82	4 469	26 009
18	173	245-104-0436РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	2	56 305	112 610
19	174	245-104-0438РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	64 933	64 933
20	175	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	8.06	4 469	36 020
21	176	245-104-0508РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	29 681	59 362
22	177	245-104-0512РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	36 926	36 926
23	178	245-104-0519РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	комплект	1	49 962	49 962
24	179	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	26.39	4 469	117 937
25	180	245-104-0529РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	21 901	21 901
26	181	245-104-0534РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	39 020	39 020
27	182	245-104-0535РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	1	42 552	42 552
28	183	245-104-0536РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	1	46 265	46 265
29	184	245-104-0537РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	3	50 158	150 474
30	185	245-104-0539РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	57 403	57 403
31	186	245-104-0541РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	65 010	65 010
32	187	245-104-0542РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	68 361	68 361

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	188	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	8	2 867	22 936
34	189	242-312-0502РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15+/AB-QM LF/	шт.	3	101 155	303 465
35	190	242-312-1702СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	30 547	122 188
36	191	242-312-1703СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	36 808	36 808
37	192	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	5	3 273	16 365
38	193	242-312-0101РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	84 708	254 124
39	194	242-312-0102РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	91 228	91 228
40	195	242-312-0103РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	110 474	110 474
41	196	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	5 637	5 637
42	197	242-404-0804РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	22 279	22 279
43	198	242-303-1102РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	21 892	43 784
44	199	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	86	2 348	201 928
45	200	245-405-3401РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	43	7 353	316 179
46	201	245-510-0215СпрСЦ 02.2024	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	43	10 872	467 496
47	202	245-405-2103РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	шт.	43	13 093	562 999
48	203	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухоотводчиков	шт.	10	11 628	116 280
49	204	245-405-1504РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	3 338	33 380
50	205	6116-0701-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	шт.	2	25 340	50 680
51	206	6116-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры	шт.	2	30 390	60 780

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	207	245-509-0401РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	2	37 342	74 684
53	208	242-207-3701РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	2 530	55 660
54	209	242-207-3702РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	16	3 796	60 736
55	210	242-207-3703РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29 460
56	211	6114-0103-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	400	2 507	1 002 800
57	212	241-205-0205РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	396	838	331 848
58	213	6114-0103-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления, наружный диаметр 25 мм	м	320	2 509	802 880
59	214	241-205-0208РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	316.8	1 838	582 278
60	216	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	720	2 167	1 560 240
61	217	234-303-0107РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	440	186	81 840
62	218	234-303-0110РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	352	236	83 072
63	219	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	220	2 590	569 800
64	220	241-101-0202РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	115	633	72 795
65	221	241-101-0203РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	35	649	22 715
66	222	241-101-0204РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	25	1 172	29 300
67	223	241-101-0207РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	45	1 434	64 530
68	225	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	232	2 167	502 744
69	226	234-303-0306РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	115.5	316	36 498
70	227	234-303-0308РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	62.7	394	24 704

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	228	234-303-0310РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	44	470	20 680
72	229	234-303-0312РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	515	16 995
73	230	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 520	9 040
74	231	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	2 239	2 239
75	232	245-713-0202РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	1	4 130	4 130
76	233	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28	300	8 400
77	234	261-301-0219РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	708	16 992
			Итого по разделу: Отопление (Блок Б, Д)				**11 740 318**
			Итого по отделу: (Блок Б, Д)				**11 740 318**
			Итого по локальной смете: Отопление				**11 740 318**
			ИТОГО по акту:				**11 740 318**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	11740318.000 x 6.20%	727 899
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	11740318.000 + 727899.694	12 468 217
	Сметная прибыль, 5.00%	12468217.694 x 5.00%	623 410
	Непредвиденные расходы, 5.000%	12468217.694 x 5.000%	623 410
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		13 715 039
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	13715039.463 x 1.0557	14 478 967
	НДС (12%)	14478967.161 x 12%	1 737 476
	Итого с НДС	14478967.161 + 1737476.059	16 216 443

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	12.12.2024 05:10
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	12.12.2024 10:33
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	12.12.2024 05:26
Представители заказчика		
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	13.12.2024 14:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	12.12.2024 11:48 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	12.12.2024 11:28
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	12.12.2024 11:59
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	14.12.2024 04:58

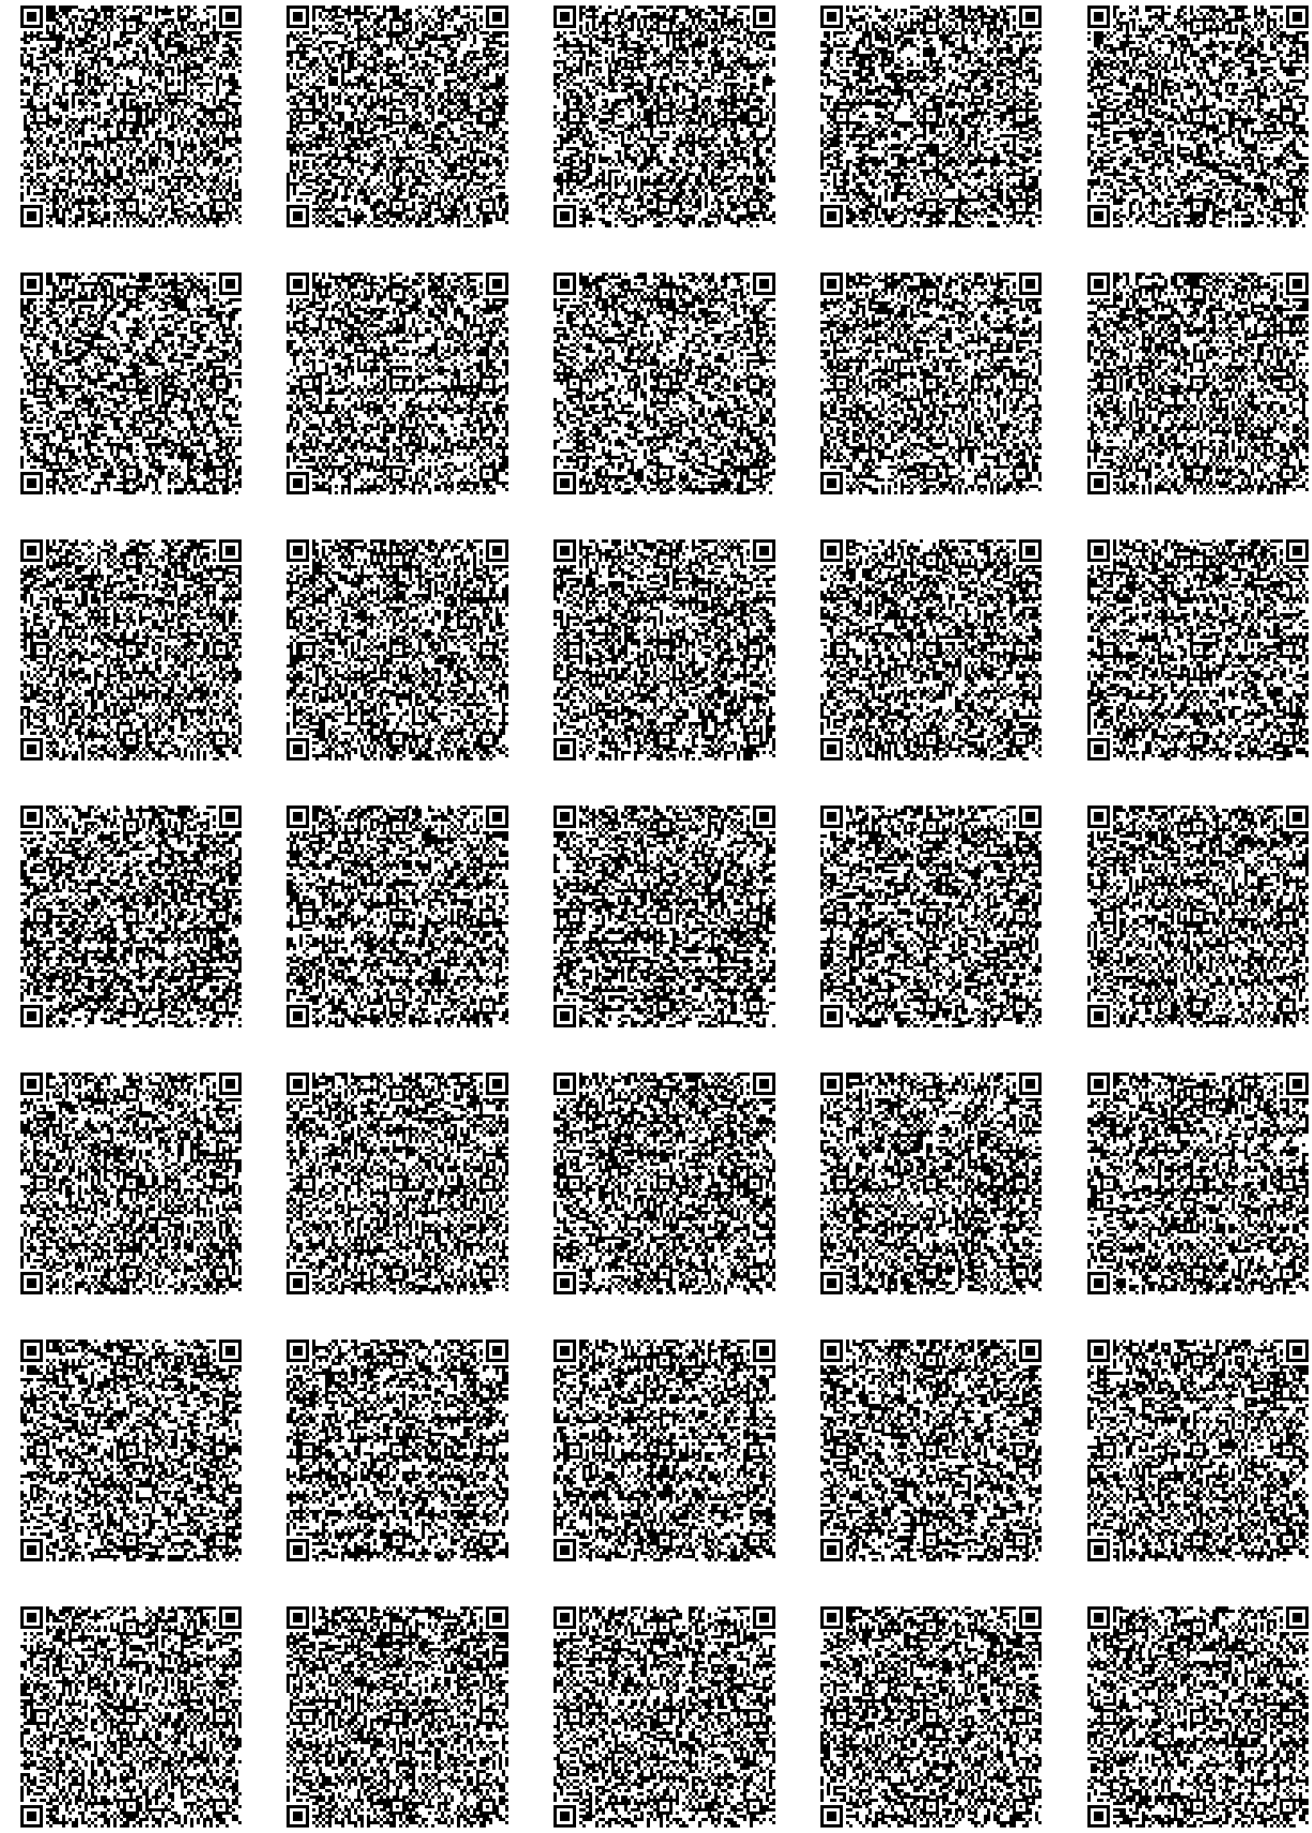

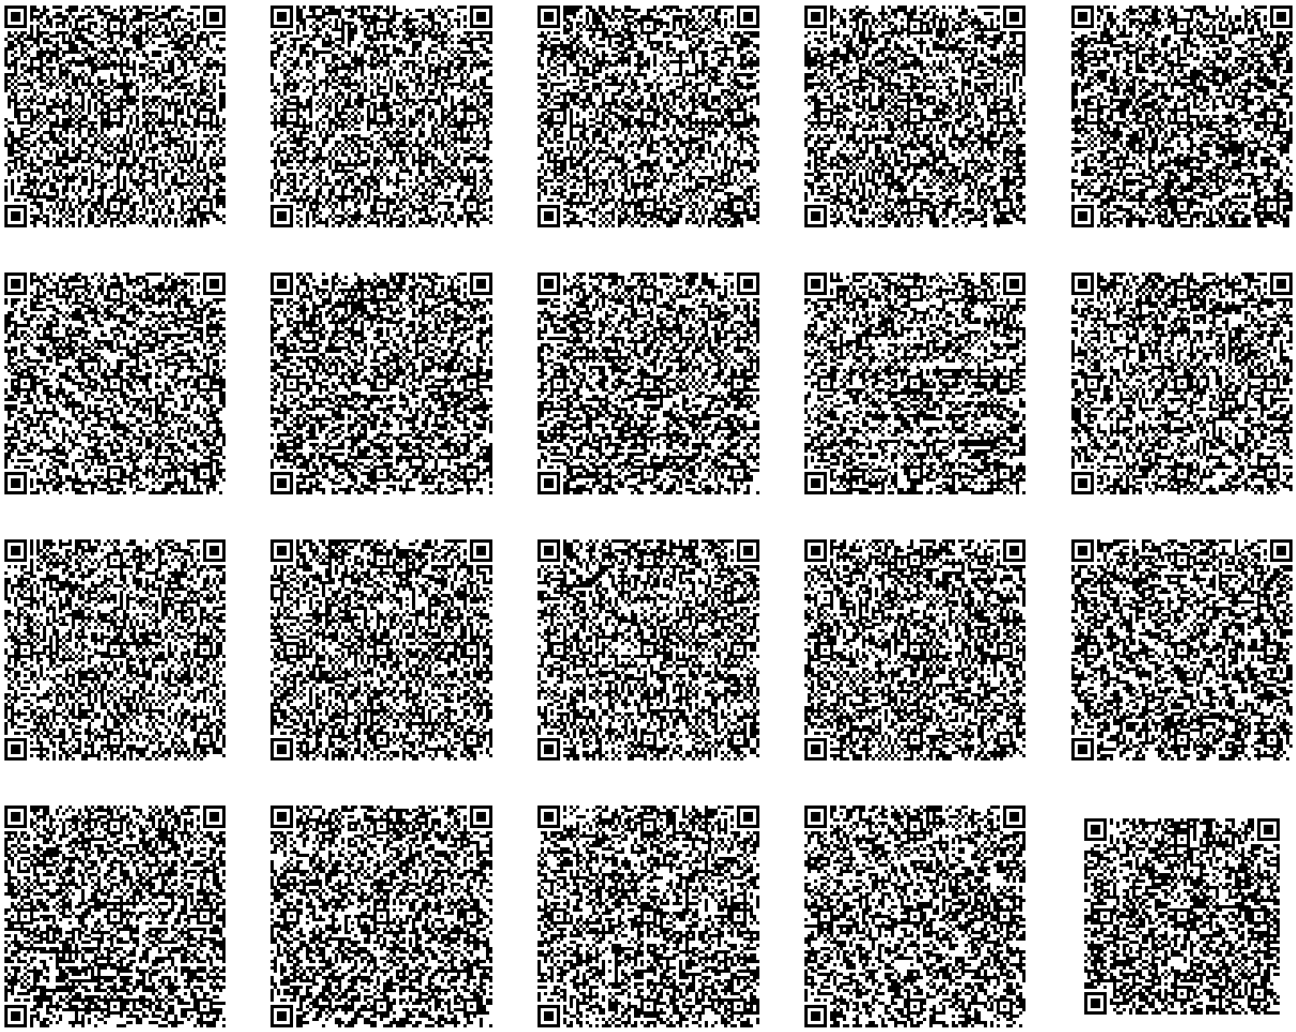

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Отопление				
			Отдел: (БЛОК Г,Ж)				
			Раздел: Отопление (Блок Г.Ж)				
1	315	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	0.85	4 469	3 799
2	316	245-104-0211 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	22 740	22 740
3	317	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	40.16	4 469	179 475
4	318	245-104-0239 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	6	60 064	360 384
5	319	245-104-0240 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	16	63 878	1 022 048
6	320	245-104-0241 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	3	67 664	202 992
7	321	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	8.73	4 469	39 014
8	322	245-104-0310 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	48 167	48 167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	323	245-104-0311 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	51 656	51 656
10	324	245-104-0313 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	2	58 813	117 626
11	325	245-104-0314 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	62 477	62 477
12	326	245-104-0318 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2100 мм	комплект	1	36 922	36 922
13	327	245-104-0319 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	комплект	1	38 102	38 102
14	328	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	32.02	4 469	143 097
15	329	245-104-0410 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	49 927	99 854
16	330	245-104-0411 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	53 765	53 765
17	331	245-104-0412 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1500 мм	комплект	2	57 433	114 866
18	332	245-104-0413 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	4	60 925	243 700
19	333	245-104-0415 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	68 605	137 210
20	334	245-104-0416 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	комплект	6	72 098	432 588
21	335	245-104-0417 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	75 765	75 765
22	336	245-104-0419 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	комплект	2	81 175	162 350
23	337	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	50.91	4 469	227 517

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	338	245-104-0505 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм	комплект	1	24 157	24 157
25	339	245-104-0506 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	1	25 968	25 968
26	340	245-104-0507 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	комплект	1	27 870	27 870
27	341	245-104-0508 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	2	29 681	59 362
28	342	245-104-0509 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	4	31 582	126 328
29	343	245-104-0510 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	33 214	66 428
30	344	245-104-0511 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	5	35 295	176 475
31	345	245-104-0513 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	38 827	38 827
32	346	245-104-0514 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	40 636	40 636
33	347	245-104-0515 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	42 539	42 539
34	348	245-104-0516 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1900 мм	комплект	1	44 530	44 530
35	349	245-104-0517 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	46 252	46 252
36	350	245-104-0519 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2200 мм	комплект	2	49 962	99 924
37	351	245-104-0520 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2300 мм	комплект	2	45 327	90 654
38	352	6116-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка радиаторов стальных панельных	кВт	21.2	4 469	94 743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	353	245-104-0528 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	1	18 911	18 911
40	354	245-104-0529 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	21 901	21 901
41	355	245-104-0537 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	50 158	50 158
42	356	245-104-0538 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	53 871	53 871
43	357	245-104-0539 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм	комплект	1	57 403	57 403
44	358	245-104-0540 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1600 мм	комплект	1	61 297	61 297
45	359	245-104-0541 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм	комплект	1	65 010	65 010
46	360	245-104-0542 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	1	68 361	68 361
47	361	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм	шт.	3	2 867	8 601
48	362	242-312-0502 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	101 155	101 155
49	363	242-312-0502 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15+/AB-QM LF/	шт.	2	101 155	202 310
50	364	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	7	3 269	22 883
51	365	242-312-1702 СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	30 547	30 547
52	366	242-312-1703 СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	36 808	184 040
53	367	242-312-1704 СпрСЦ 02.2024	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	54 922	54 922

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	368	6114-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	7	3 273	22 911
55	369	242-312-0102 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	4	91 228	364 912
56	370	242-312-0103 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	110 474	220 948
57	371	242-312-0104 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	127 320	127 320
58	372	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	4	5 720	22 880
59	373	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	4	28 637	114 548
60	374	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	10 599	21 198
61	375	242-312-1403 СпрСЦ 02.2024	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	30 842	61 684
62	376	6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	170	2 348	399 160
63	377	245-405-3401 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 15	шт.	85	7 353	625 005
64	378	245-510-0215 СпрСЦ 02.2024	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N UK	шт.	85	10 872	924 120
65	379	245-405-2103 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства	шт.	85	13 093	1 112 905
66	380	6116-0602-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухоотводчиков	шт.	12	11 628	139 536
67	381	245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	12	3 338	40 056
68	382	6116-0701-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	шт.	2	25 340	50 680

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	383	6116-0701-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сборка и установка обратного узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов	шт.	2	30 390	60 780
70	384	245-509-0401 РСНБ РК 2022	Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм	шт.	2	37 342	74 684
71	385	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2 530	40 480
72	386	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	3 796	22 776
73	387	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	14	7 365	103 110
74	388	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	11 614	69 684
75	389	242-207-3706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	26 886	53 772
76	390	6114-0103-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм.	м	615	2 507	1 541 805
77	391	241-205-0205 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	608.85	838	510 215
78	392	6114-0103-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм	м	405	2 509	1 016 145
79	393	241-205-0208 РСНБ РК 2022	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	400.95	1 838	736 946
80	394	6114-0103-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм	м	300	2 521	756 300
81	395	241-205-0209 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	297	2 342	695 574
82	397	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	1320	2 167	2 860 440
83	398	234-303-0107 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	676.5	186	125 829

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	399	234-303-0110 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм	м	445.5	236	105 138
85	400	234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	330	303	99 990
86	401	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	350	2 590	906 500
87	402	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	65	633	41 145
88	403	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	23	649	14 927
89	404	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	212	1 172	248 464
90	405	241-101-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	50	1 434	71 700
91	406	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	120	4 638	556 560
92	407	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	120	1 731	207 720
93	409	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м трубопровода	470	2 167	1 018 490
94	410	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	71.5	316	22 594
95	411	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	25.3	394	9 968
96	412	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	233.2	470	109 604
97	413	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	55	515	28 325
98	414	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	132	770	101 640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	415	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 520	9 040
100	416	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	2 239	4 478
101	417	245-713-0202 РСНБ РК 2022	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм	шт.	2	4 130	8 260
102	418	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	65	300	19 500
103	419	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	107	708	75 756
104	420	6118-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка агрегатов воздушно-отопительных масса до 0,25 т	шт.	2	51 084	102 168
105	421	245-901-0601 СпрСЦ 02.2024	Воздушный завес WING II с электродвигателем ЕС, с водяным теплообменником, контроллер, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов W100 (ЕС), мощностью 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/ч	комплект	2	298 016	596 032
			Итого по разделу: Отопление (Блок Г.Ж)				**23 156 580**
			Итого по отделу: (БЛОК Г,Ж)				**23 156 580**
			Итого по локальной смете: Отопление				**23 156 580**
			ИТОГО по акту:				**23 156 580**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	23156580.000 x 6.20%	1 435 707
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	23156580.000 + 1435707.916	24 592 287
	Сметная прибыль, 5.00%	24592287.916 x 5.00%	1 229 614
	Непредвиденные расходы, 5.000%	24592287.916 x 5.000%	1 229 614
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		27 051 516
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	27051516.707 x 1.0557	28 558 286
	НДС (12%)	28558286.188 x 12%	3 426 994
	Итого с НДС	28558286.188 + 3426994.343	31 985 280

Лист согласования
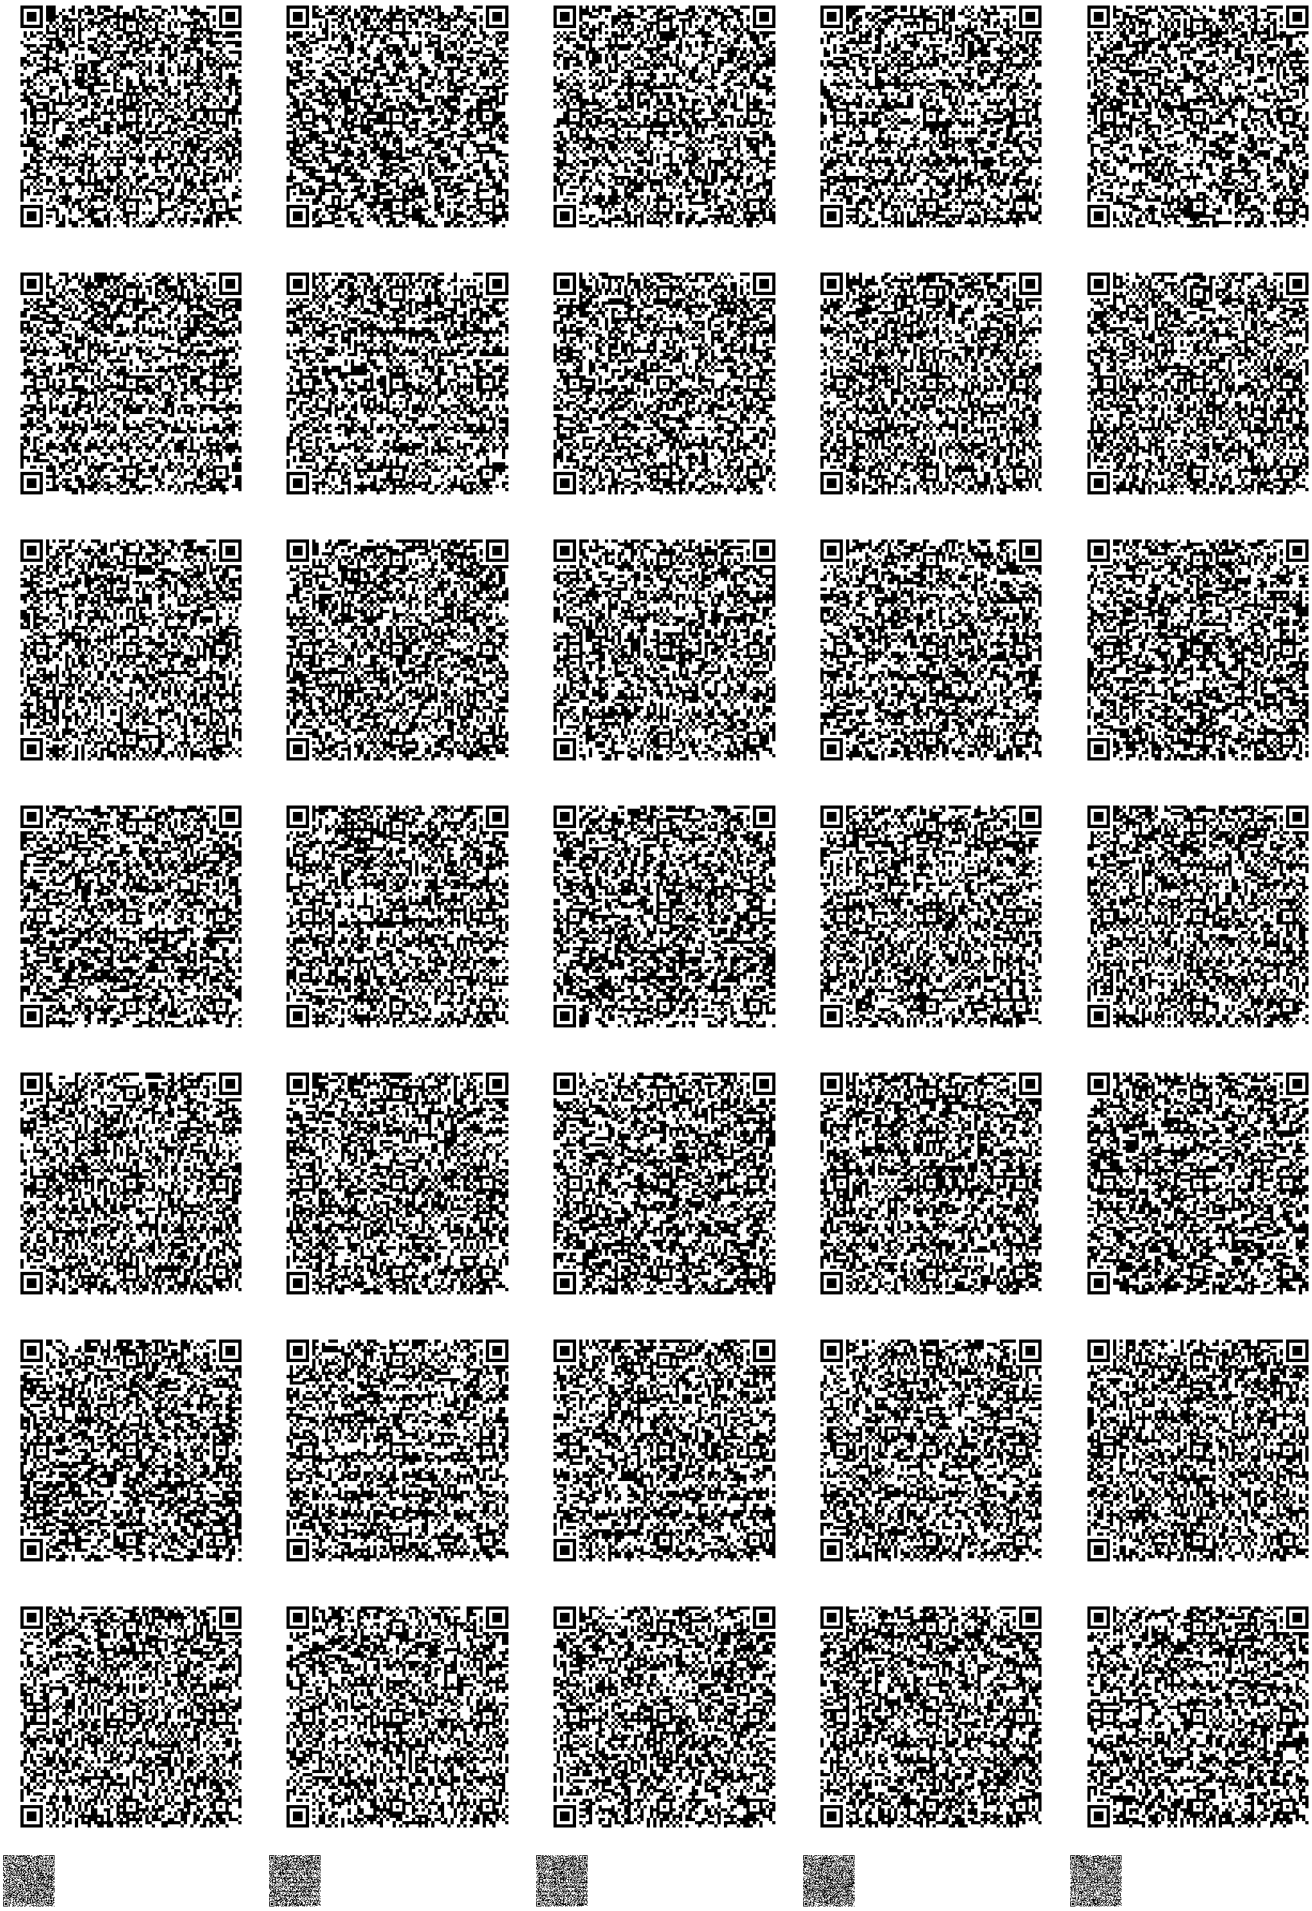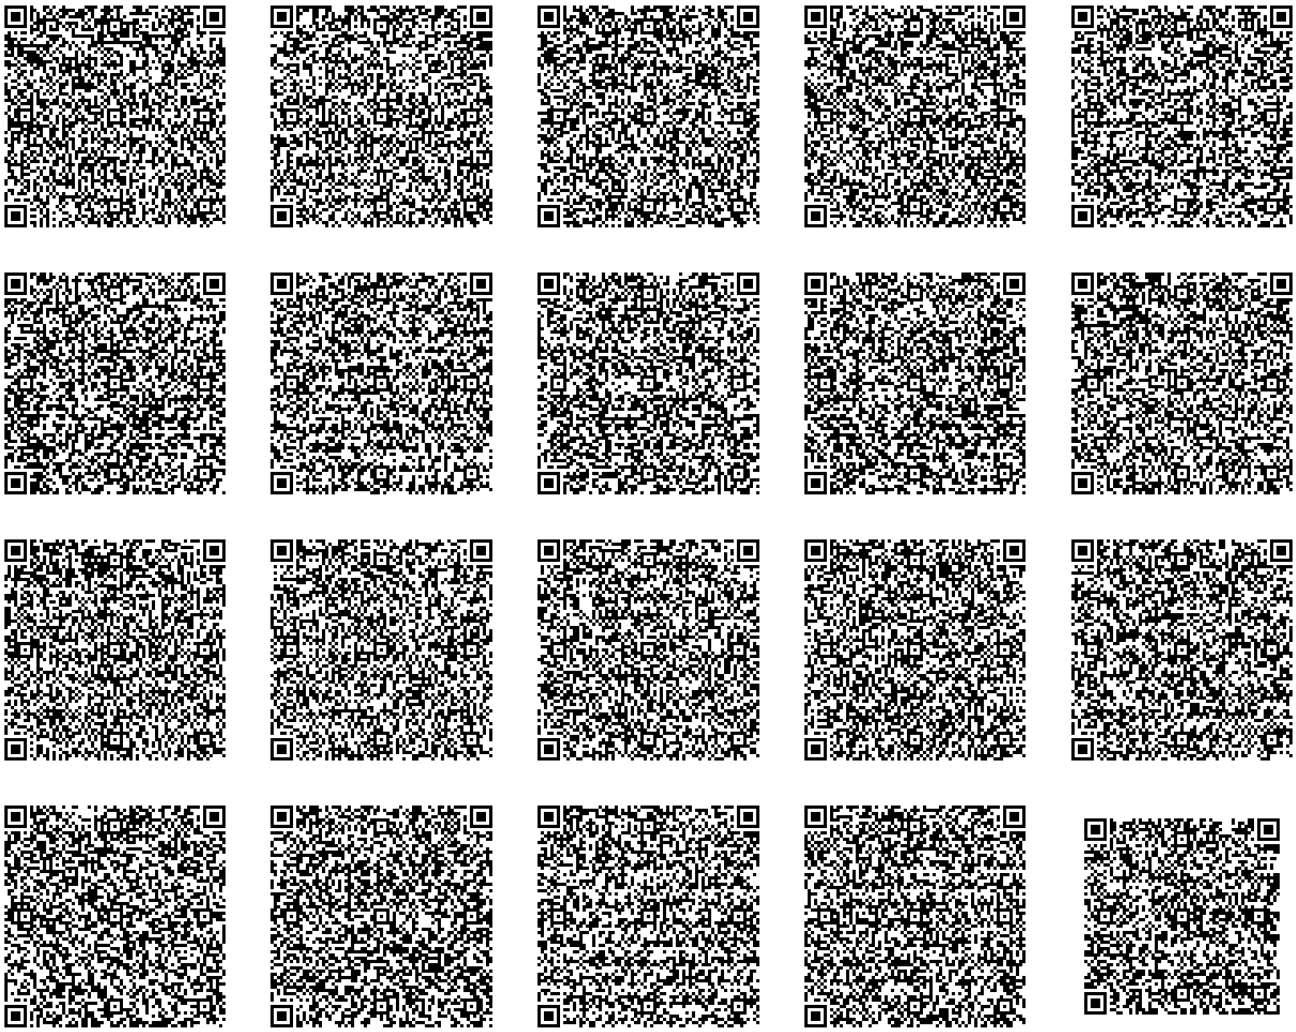
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	13.12.2024 10:15
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	13.12.2024 10:20
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	13.12.2024 10:18
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	13.12.2024 12:03
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	13.12.2024 12:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	13.12.2024 12:50
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	13.12.2024 14:24 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	14.12.2024 05:00
