ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20241219-91461201
1.1. **Номер учетной системы** 00000000082
2. **Дата выписки** 19.12.2024
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 19.12.2024
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
18. Адрес места нахождения
г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 090340012961
26.2 Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
26.3 Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 117
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.06.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			26 475 187,5	26 475 187,5		0	26 475 187,5	12%	3 177 022,5	29 652 210			1		
				Всего по счету						**26 475 187,5**			**26 475 187,5**		**3 177 022,5**	**29 652 210**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
011aaVdw51ZrQZyneLLPB086PV0ZaHEvG7v/3pl4okTLzNUr4Ru/7bFj8SNvahyITSLGJKV3FfBDaUpfEPjpCbMdURRZ23Zk102BnC3Tr1PkZOt+Vv+PciLF43dNk/6X9oaE64tp0Sma3jYYIYIIE+JXfKBSStSj0u81wMaVDY=
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 022 839 831	2 022 839 831	1 806 106 991,96				216 732 839,04	2 022 839 831
в том числе: за декабрь месяц 2024 года	29 652 210	29 652 210	26 475 187,50				3 177 022,50	29 652 210

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#598e46ea-1786-4498-b20f-0f78dd5bd2b5)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №83	Конструкции железобетонные Блок И	29 652 210
		ИТОГО	29 652 210

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#598e46ea-1786-4498-b20f-0f78dd5bd2b5)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 19.12.2024 15:04
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 19.12.2024 15:27
Заказчик: ИИН 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР null	Начальник Отдела смет и ценообразования	Подписано: 19.12.2024 16:27
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 20.12.2024 09:35

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#598e46ea-1786-4498-b20f-0f78dd5bd2b5)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#598e46ea-1786-4498-b20f-0f78dd5bd2b5)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#598e46ea-1786-4498-b20f-0f78dd5bd2b5)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструкции железобетонные. Блок И				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Колонна монолитная Км-13 /2 шт/				
1	1	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.16	72 352	156 280
2	2	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07784	336 921	26 226
3	3	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22512	325 873	73 360
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-13 /2 шт/				**255 866**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-14 /2 шт/				
4	4	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.01	72 352	73 075
5	5	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03687	336 921	12 422
6	6	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08967	325 873	29 220
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-14 /2 шт/				**114 719**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-22 /3 шт/				
7	7	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.7475	72 352	343 491
8	8	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.17514	336 921	59 008
9	9	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.504585	325 873	164 430
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-22 /3 шт/				**566 930**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-23 /1 шт/				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1.575	72 352	113 954
11	11	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05838	336 921	19 669
12	12	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.166995	325 873	54 419
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-23 /1 шт/				**188 043**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-24 /2 шт/				
13	13	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4.755	72 352	344 033
14	14	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1449	336 921	48 819
15	15	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.33639	325 873	109 620
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-24 /2 шт/				**502 474**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-25 /3 шт/				
16	16	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7.1325	72 352	516 051
17	17	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.21735	336 921	73 230
18	18	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7799175	325 873	254 154
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-25 /3 шт/				**843 435**
			Подраздел: Колонна монолитная Км-26 /1 шт/				
19	19	1106-0501-0106РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2.355	72 352	170 388
20	20	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07245	336 921	24 410
21	21	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.2581875	325 873	84 136
			Итого по подразделу: Колонна монолитная Км-26 /1 шт/				**278 935**
			Подраздел: Стена монолитная См-12 /1 шт/				
22	31	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.34	98 004	33 321
23	32	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00267	336 921	900
24	33	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01566	325 873	5 103
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-12 /1 шт/				**39 324**
			Подраздел: Стена монолитная См-13 /1 шт/				
25	34	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.19	98 004	18 621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	35	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0015	336 921	505
27	36	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.00876	325 873	2 855
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-13 /1 шт/				**21 981**
			Подраздел: Стена монолитная См-14 /1 шт/				
28	37	6103-0101-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм	м3	0.19	98 004	18 621
29	38	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0015	336 921	505
30	39	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.00876	325 873	2 855
			Итого по подразделу: Стена монолитная См-14 /1 шт/				**21 981**
			Итого по разделу: КАРКАС				**2 833 689**
			Раздел: Балки				
			Подраздел: Балка монолитная Б-18 /3 шт/				
31	40	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.96	99 975	395 901
32	41	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3189	336 921	107 444
33	42	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.6514	325 873	212 273
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-18 /3 шт/				**715 618**
			Подраздел: Балка монолитная Б-19 /1 шт/				
34	43	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0.6	99 975	59 985
35	44	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0488	336 921	16 442
36	45	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1164	325 873	37 932
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-19 /1 шт/				**114 359**
			Подраздел: Балка монолитная Б-26 /3 шт/				
37	46	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7.92	99 975	791 802
38	47	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2064	336 921	69 540
39	48	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4216	325 873	137 388
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-26 /3 шт/				**998 730**
			Подраздел: Балка монолитная Б-27 /10 шт/				
40	49	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	15.9	99 975	1 589 602

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	50	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.2828	336 921	432 202
42	51	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.619	325 873	853 461
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-27 /10 шт/				**2 875 266**
			Подраздел: Балка монолитная Б-29 /4 шт/				
43	52	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	10.44	99 975	1 043 739
44	53	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.8103	336 921	273 006
45	54	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.671	325 873	544 533
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-29 /4 шт/				**1 861 279**
			Подраздел: Балка монолитная Б-34 /2 шт/				
46	55	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8.36	99 975	835 791
47	56	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6312	336 921	212 665
48	57	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.358	325 873	442 536
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-34 /2 шт/				**1 490 992**
			Подраздел: Балка монолитная Б-36 /2 шт/				
49	58	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	9.5	99 975	949 762
50	59	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.1084	336 921	373 443
51	60	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.5818	325 873	515 465
			Итого по подразделу: Балка монолитная Б-36 /2 шт/				**1 838 671**
			Итого по разделу: Балки				**9 894 917**
			Раздел: Перекрытия и покрытие				
			Подраздел: Плиты сборные				
52	61	6104-0401-0106ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	58	9 671	560 918
53	62	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.15-8/	м2	40.2896	10 622	427 956
54	63	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.12-8/	м2	305.6872	10 622	3 247 009
55	64	222-203-0404РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016+/ПБ 68.10-8/	м2	107.0784	10 622	1 137 387
56	65	6104-0802-0401ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка арматурных стыковых накладок	т	0.04368	1 306 411	57 064

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	66	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04368	336 921	14 717
			Итого по подразделу: Плиты сборные				**5 445 051**
			Подраздел: Монолитные участки				
58	67	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	17.4	104 310	1 814 994
59	68	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.7352	325 873	239 582
			Итого по подразделу: Монолитные участки				**2 054 576**
			Подраздел: Плита монолитная Пм-1И				
60	69	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4.4	104 310	458 964
61	70	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1441	336 921	48 550
62	71	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.4103	325 873	133 706
			Итого по подразделу: Плита монолитная Пм-1И				**641 220**
			Подраздел: Млп-1И				
63	72	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.16	104 310	121 000
64	73	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0248	336 921	8 356
65	74	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1082	325 873	35 259
			Итого по подразделу: Млп-1И				**164 615**
			Подраздел: Млп-2И /1 шт/				
66	75	1106-0801-0104РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	1.38	104 310	143 948
67	76	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0272	336 921	9 164
68	77	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1287	325 873	41 940
69	78	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.0513	325 873	16 717
			Итого по подразделу: Млп-2И /1 шт/				**211 769**
			Итого по разделу: Перекрытия и покрытие				**8 517 231**
			Раздел: Лестница Л-6				
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-7 /1 шт/				
70	85	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	32 338	20 050
71	86	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	90 129	55 880

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	87	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00348	336 921	1 172
73	88	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.15619	325 873	50 898
74	89	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0096	363 687	3 491
75	90	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	13 096	8 119
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-7 /1 шт/				**139 611**
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-8 /1 шт/				
76	91	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.59	32 338	51 417
77	92	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.59	90 129	143 305
78	93	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00464	336 921	1 563
79	94	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.32528	325 873	106 000
80	95	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.01452	363 687	5 281
81	96	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	1.59	13 096	20 823
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-8 /1 шт/				**328 389**
			Подраздел: Лестничный марш ЛМ-9 /1 шт/				
82	97	6103-0601-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	32 338	20 050
83	98	6103-0601-0202ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	90 129	55 880
84	99	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00232	336 921	782
85	100	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.17389	325 873	56 666
86	101	214-210-0601РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0096	363 687	3 491
87	102	6103-0601-0203ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	м3	0.62	13 096	8 119
			Итого по подразделу: Лестничный марш ЛМ-9 /1 шт/				**144 989**
			Итого по разделу: Лестница Л-6				**612 989**
			Итого по локальной смете: Конструкции железобетонные. Блок И				**21 858 827**
			ИТОГО по акту:				**21 858 827**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				21858827.331 x 6.20%	1 355 247
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				21858827.331 + 1355247.253	23 214 074

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, 5.00%				23214074.584 x 5.00%	1 160 703
		Непредвиденные расходы, 5.000%				23214074.584 x 5.000%	1 160 703
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					25 535 482
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				25535482.042 x 1.0368	26 475 187
		НДС (12%)				26475187.781 x 12%	3 177 022
		Итого с НДС				26475187.781 + 3177022.534	29 652 210

Лист согласования
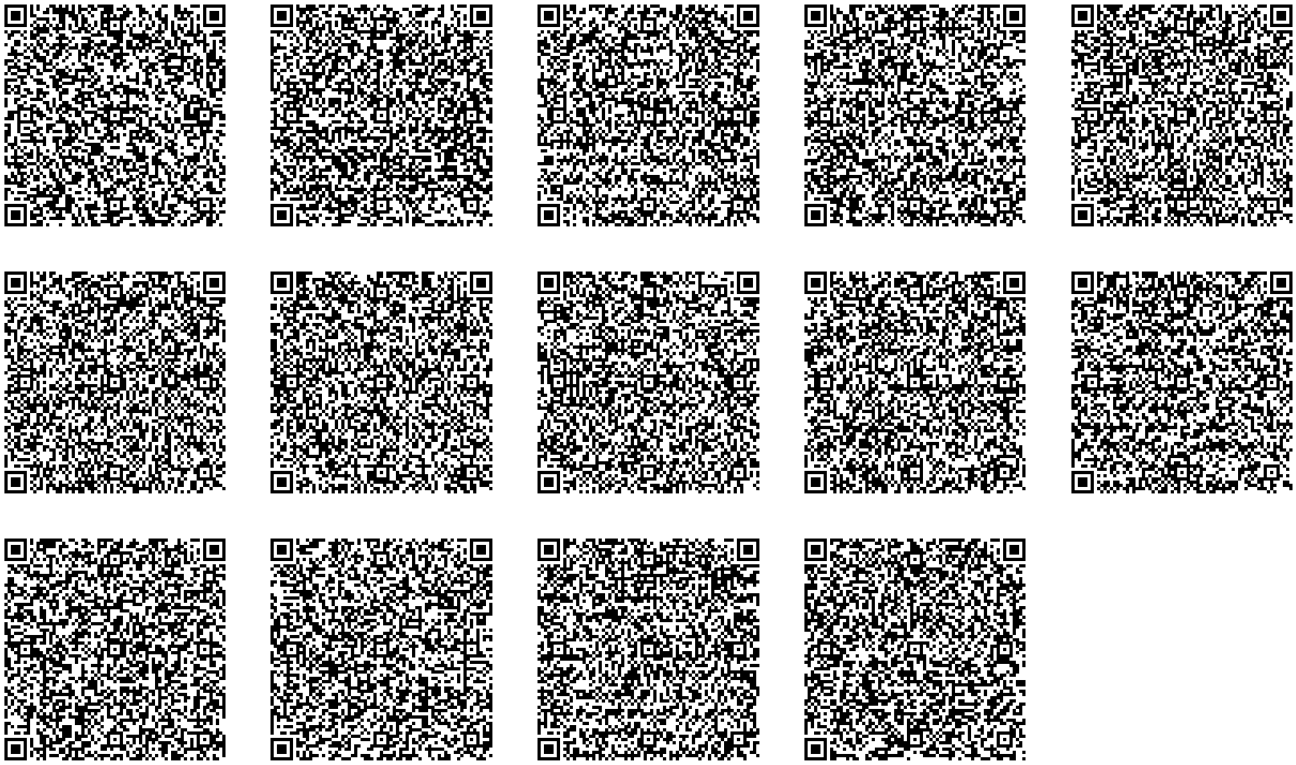
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	15.12.2024 10:11
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	16.12.2024 05:35
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	15.12.2024 10:14
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	16.12.2024 17:50
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	16.12.2024 17:49
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник Отдела смет и ценообразования	18.12.2024 13:13 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	19.12.2024 04:15
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	16.12.2024 17:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
