ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060440002060-20241225-97572202	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000087
2.	**Дата выписки**	25.12.2024	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	
3.	**Дата совершения оборота**	23.12.2024			
4.	Исправленный	v	4.1	Дата выписки	25.12.2024
4.2	Номер учетной системы	00000000084	4.3	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20241225-95256482
5.	Дополнительный		5.1	Дата выписки	
5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер	

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060440002060	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	**Доля участия**
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 43001	9.2.	номер 0010563
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента		
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 090340012961	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	**Доля участия**
	Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E		Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060440002060	26.1	ИИН/БИН 090340012961
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5	26.3	Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	117
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	29.06.2023
			27.5	Учетный номер	
28.	Условия оплаты по договору				
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности		30.1	номер	
			30.2	дата	
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)				
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер
		32.2	дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.		33.1	код валюты KZT	33.2	курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			210 343 083,04	210 343 083,04		0	210 343 083,04	12%	25 241 16 9,96	235 584 253			1		
				Всего по счету						**210 343 083,04**			**210 343 083,04**		**25 241 16 9,96**	**235 584 253**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	9i8XPWZT1+yC8O26Gwwr6YPzrhFH53Jyvjn3VLWWXiG+wcd7efKcxrIeHdTXxs2Z3rv+kZYGoBAQykvx0AeEI3ctt6Eqe68qIRTPA60iXd4mx5lmXafEu gR9XmTcC3lbv35pD1U10a3jJotMMM22P3DFIUYDZJZvp/jjMwis248=
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 304 016 031	2 304 016 031	2 057 157 170,54				246 858 860,46	2 304 016 031
в том числе: за декабрь месяц 2024 года	238 511 028	238 511 028	212 956 275,00				25 554 753,00	238 511 028

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#edf32460-f0be-4941-9068-0d5dda45d7e1)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №85	Архитектурные решения Блок Б,Д	72 557 807
2	Акт №86	Вентиляция	68 783 854
3	Акт №87	Вентиляция	6 068 834
4	Акт №88	Вентиляция	48 307 604
5	Акт №89	Вентиляция	2 854 423
6	Акт №90	Вентиляция	37 011 731
7	Акт №91	Вентиляция	2 926 775
		ИТОГО	238 511 028

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#edf32460-f0be-4941-9068-0d5dda45d7e1)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 26.12.2024 09:22
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 25.12.2024 18:19
Заказчик: ИИН 870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ null	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	Подписано: 25.12.2024 19:22
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 25.12.2024 18:32

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

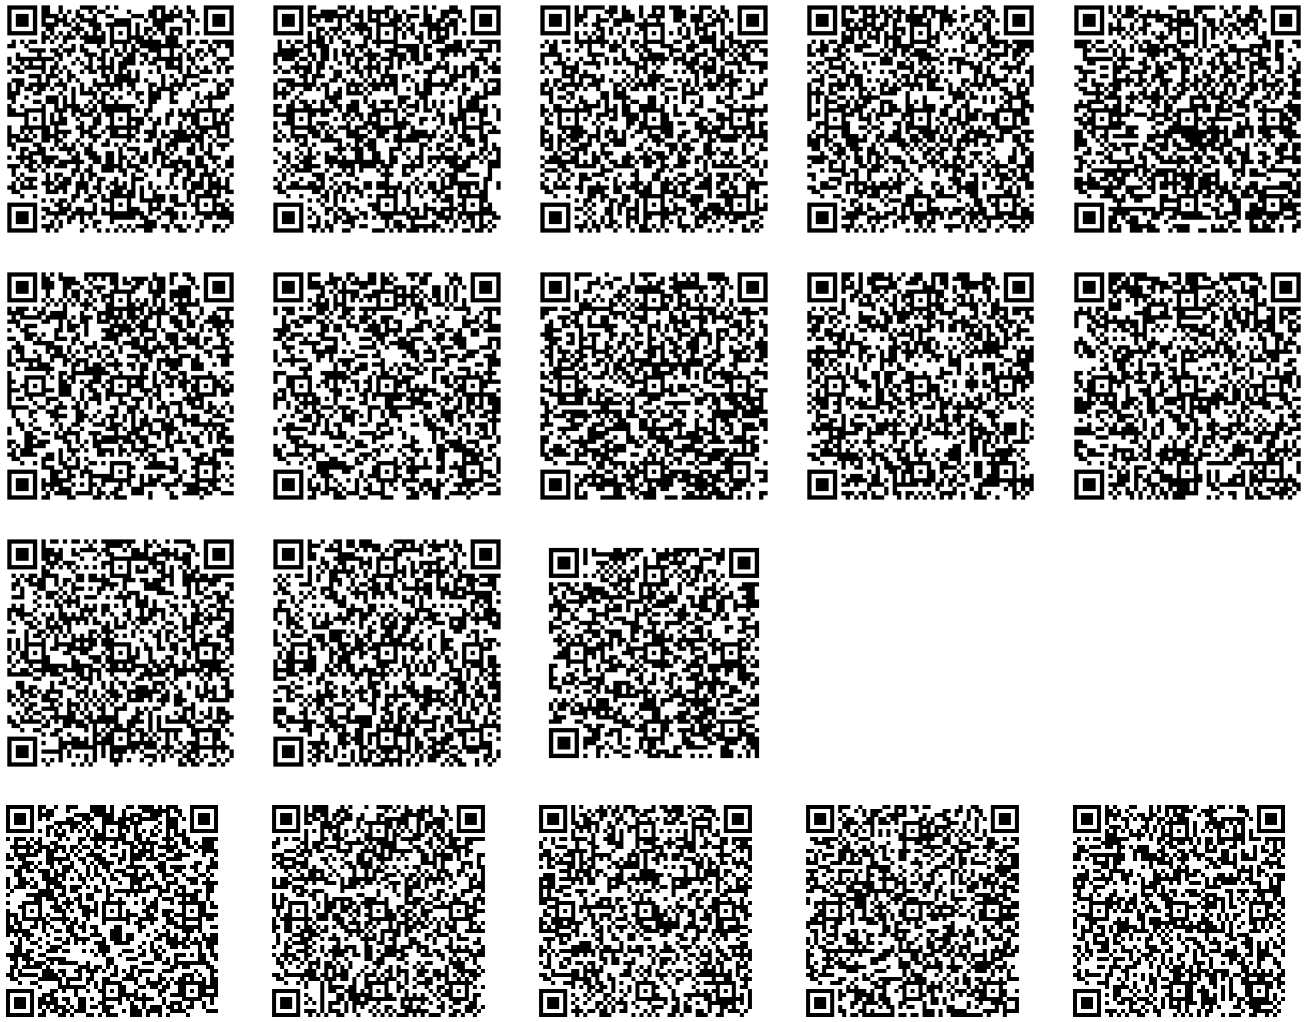

Подписано через EQURYLYS.KZ (#edf32460-f0be-4941-9068-0d5dda45d7e1)

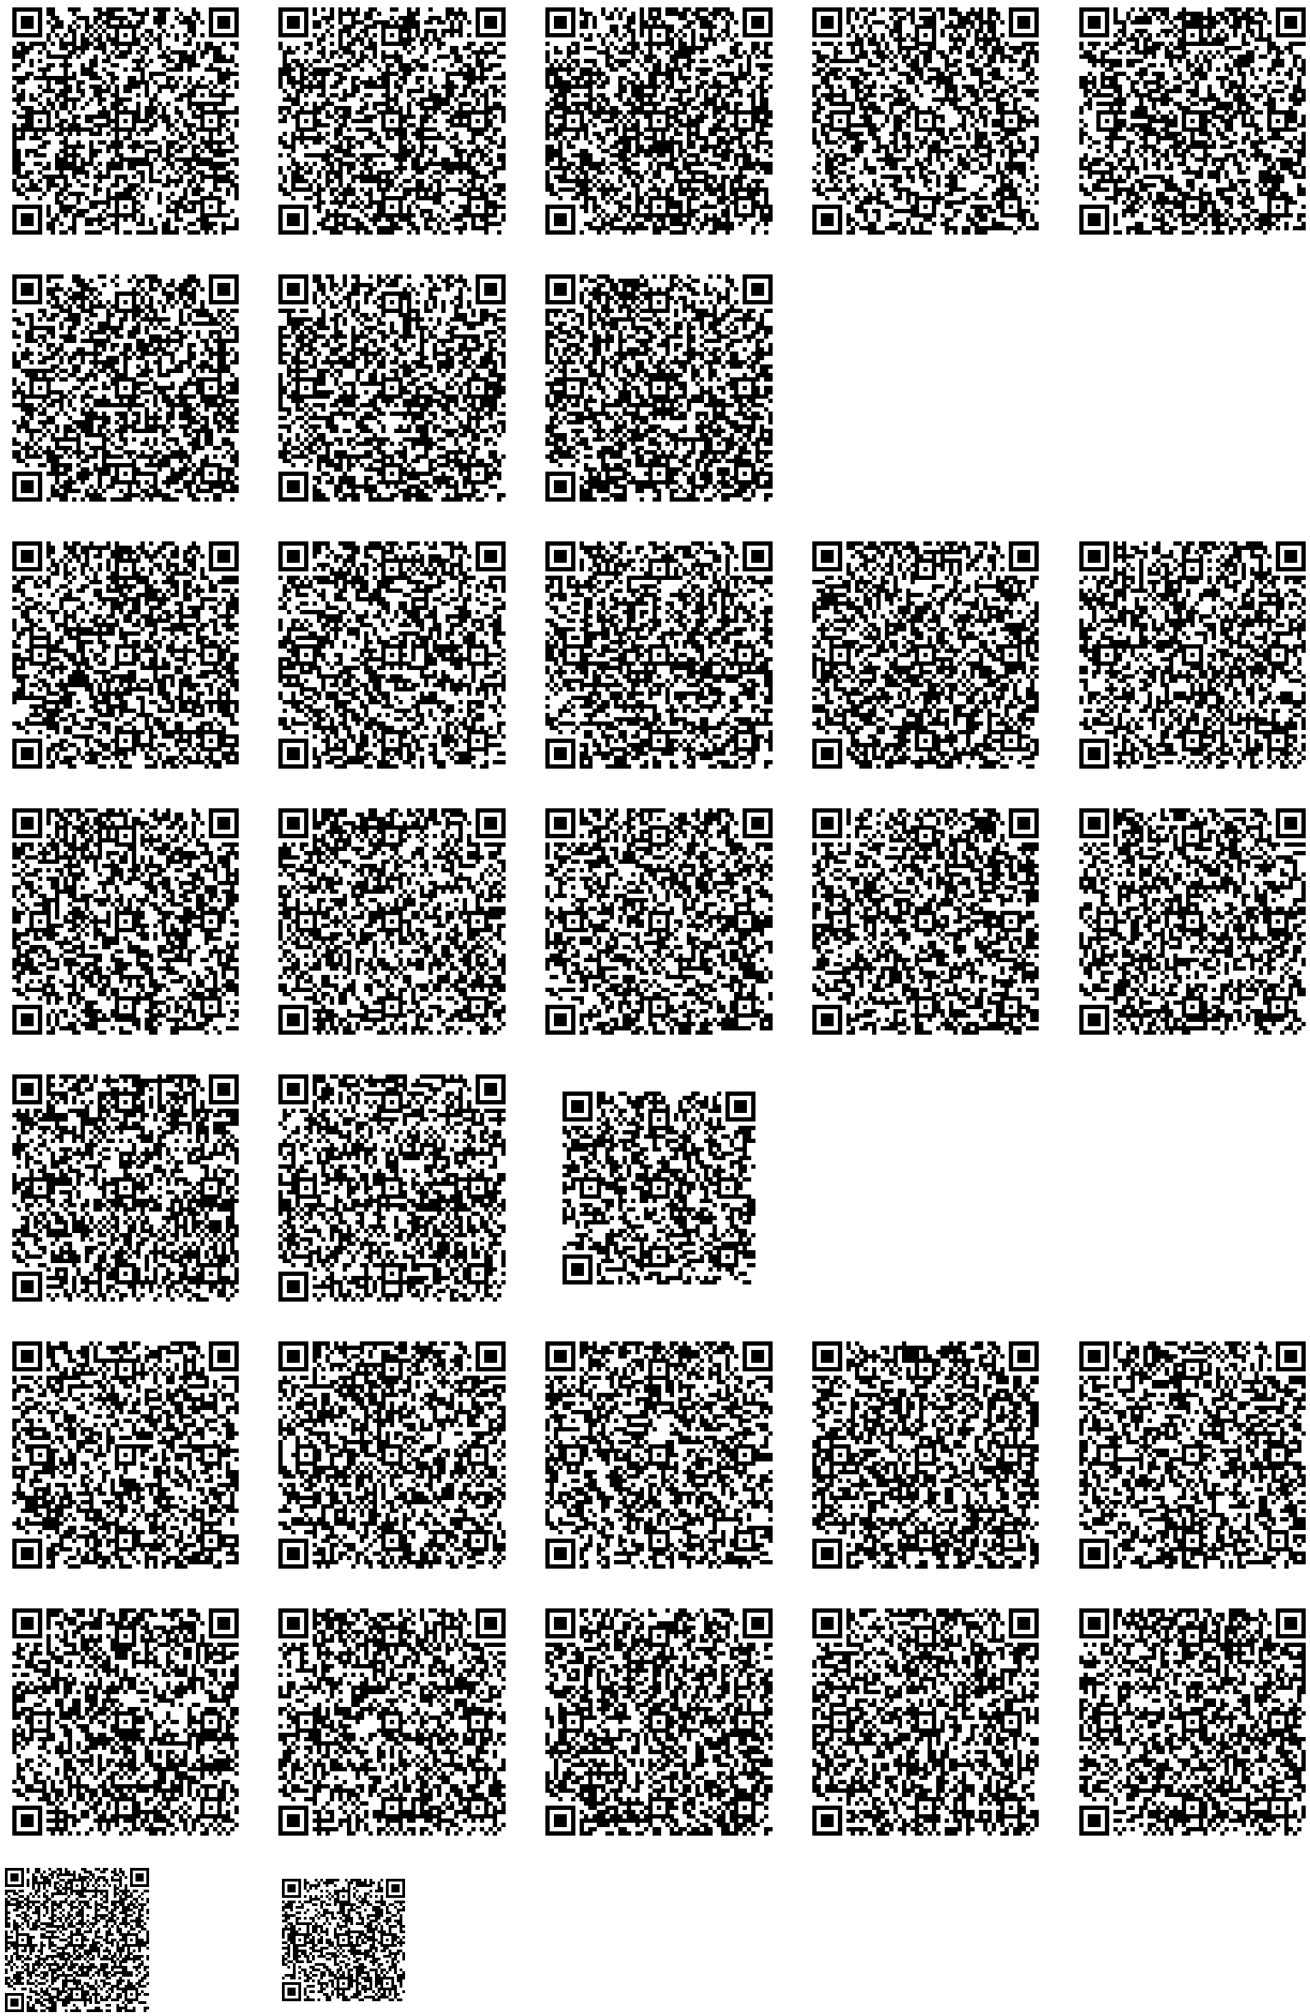

Подписано через EQURYLYS.KZ (#edf32460-f0be-4941-9068-0d5dda45d7e1)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#edf32460-f0be-4941-9068-0d5dda45d7e1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: П6				
1	218	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	130	5 877	764 010
2	219	234-304-0305 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	м2	143	9 372	1 340 196
			Итого по подразделу: П6				**2 104 206**
			Итого по разделу: Вентиляция				**2 104 206**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**2 104 206**
			ИТОГО по акту:				**2 104 206**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				2104206.000 x 6.20%	130 460
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				2104206.000 + 130460.768	2 234 666
		Сметная прибыль, 5.00%				2234666.768 x 5.00%	111 733
		Непредвиденные расходы, 5.000%				2234666.768 x 5.000%	111 733
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					2 458 133
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368				2458133.445 x 1.0368	2 548 592
		НДС (12%)				2548592.756 x 12%	305 831
		Итого с НДС				2548592.756 + 305831.131	2 854 423

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	21.12.2024 05:16
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	21.12.2024 15:26
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	21.12.2024 05:22
Представители заказчика		
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	23.12.2024 10:51 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	23.12.2024 11:50
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	23.12.2024 07:40
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	23.12.2024 07:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	23.12.2024 07:42

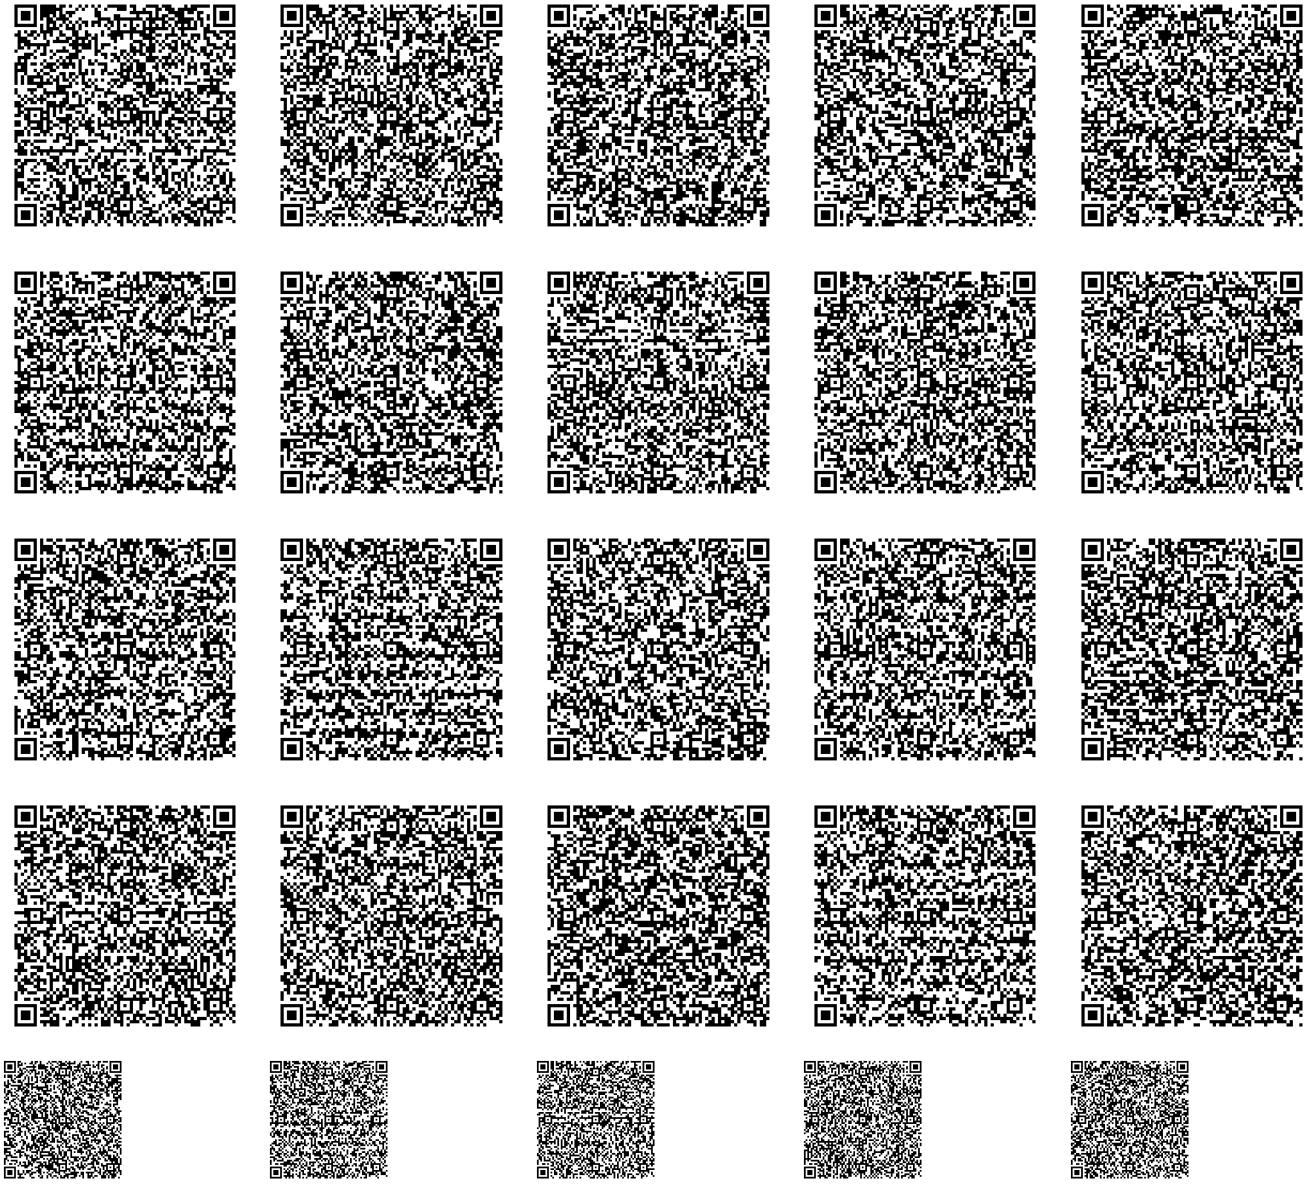

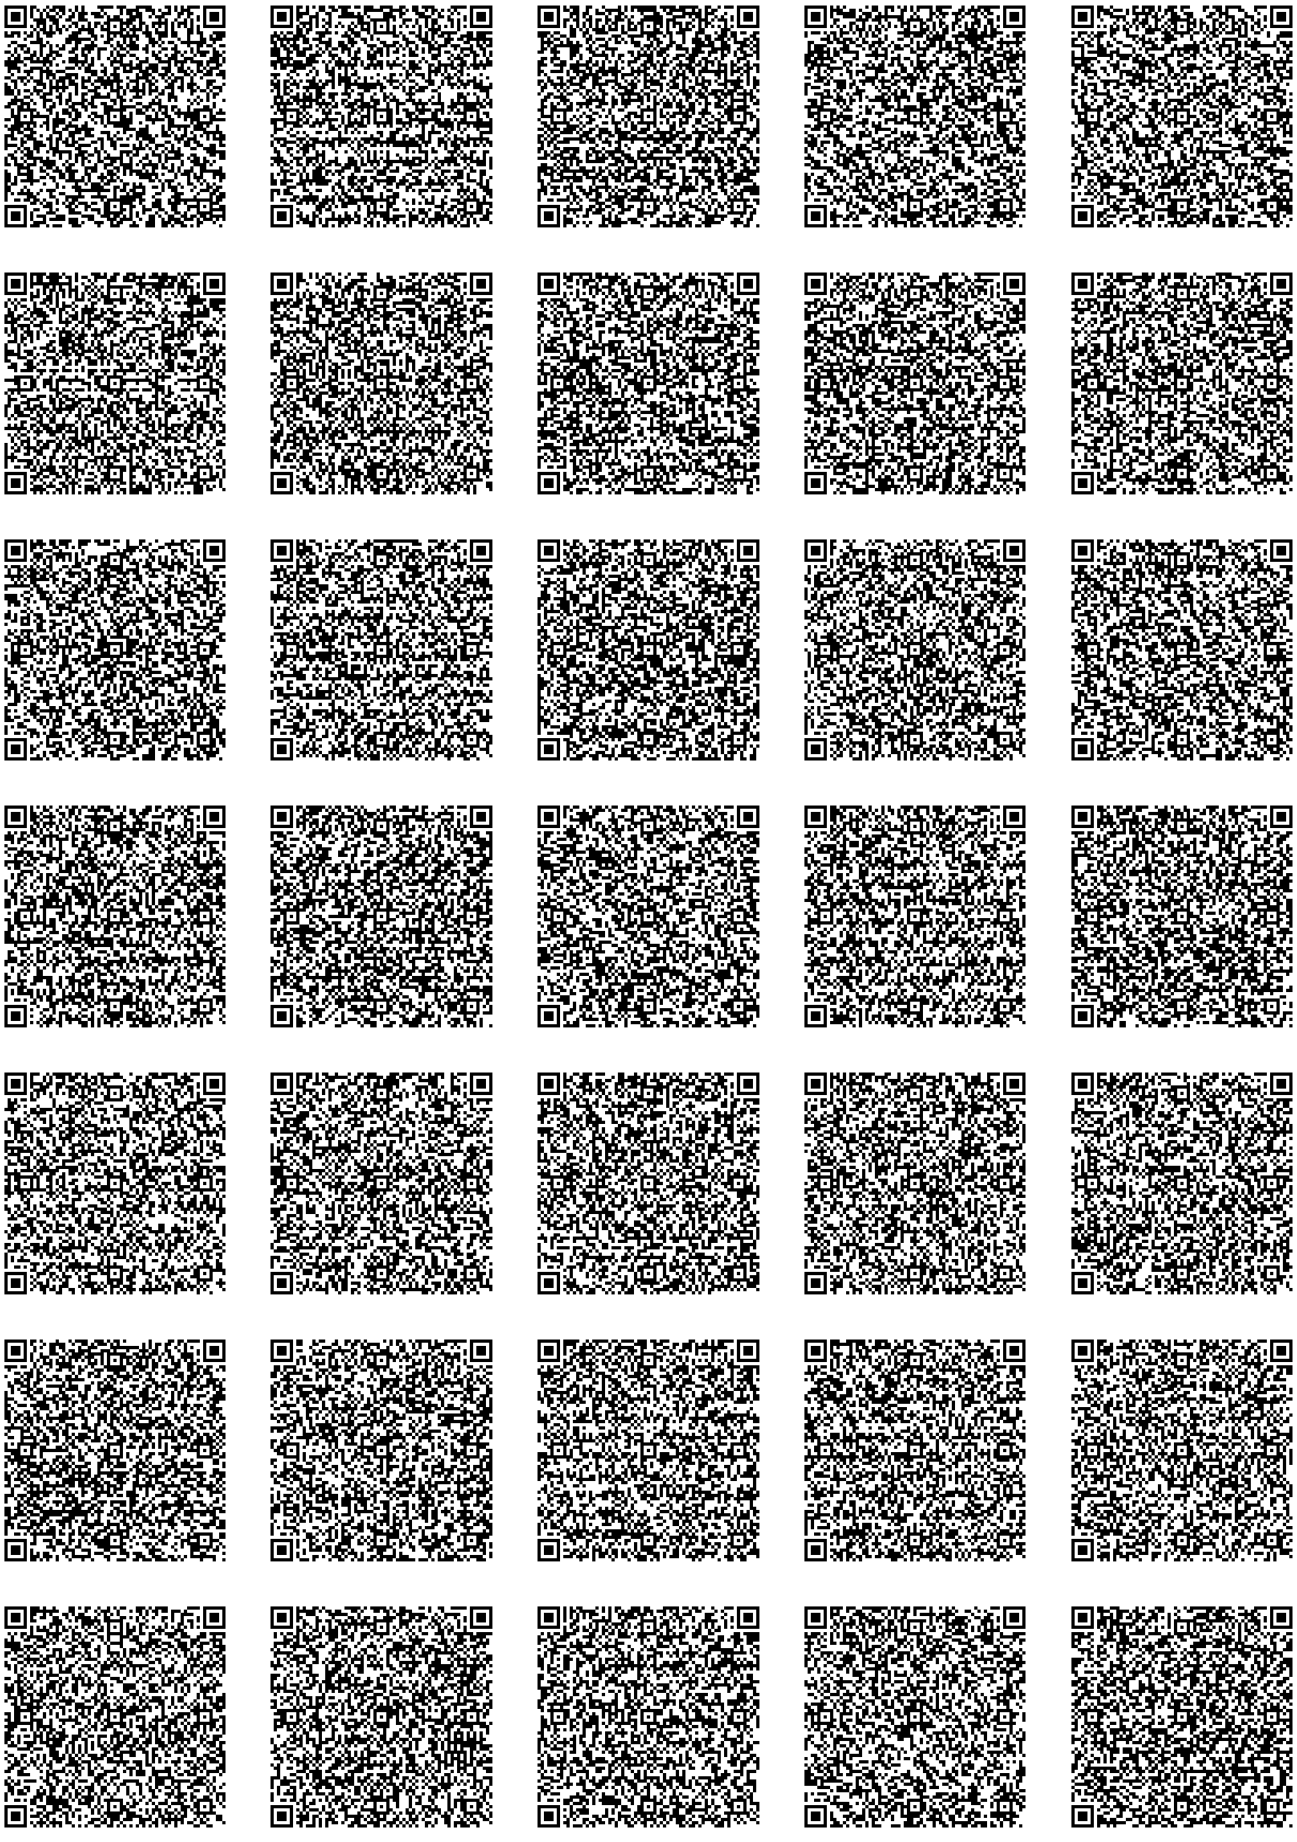

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: П1				
1	98	6118-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических неутепленных размер 1250х500 мм	шт.	2	73 970	147 940
2	99	6118-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 м2.	шт.	1	12 435	12 435
3	100	246-304-0969РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1300 мм	шт.	1	54 500	54 500
4	101	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	21	1 754	36 834
5	102	246-304-0528РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	7 338	14 676
6	103	246-304-0609РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	15	9 331	139 965
7	104	246-304-0959РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	4	32 073	128 292
			Итого по подразделу: П1				**534 642**
			Подраздел: П2				
8	115	6118-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 м2.	шт.	1	12 435	12 435
9	116	246-304-0969РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1000 мм/РН1400Х1200/Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1000 мм х 1300 мм	шт.	1	54 500	54 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	119	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	3	1 754	5 262
11	120	246-304-0526РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14 978
12	121	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
13	122	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	9	2 208	19 872
14	123	246-304-0609РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	9	9 331	83 979
15	124	6118-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических неутепленных размер 1250х500 мм	шт.	2	73 970	147 940
			Итого по подразделу: П2				**346 304**
			Подраздел: П3				
16	140	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	55	1 754	96 470
17	141	246-304-0528РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	33	7 338	242 154
18	142	246-304-0553РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	22	6 066	133 452
			Итого по подразделу: П3				**472 076**
			Подраздел: П4				
19	159	6118-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 1,5 м2.	шт.	1	12 435	12 435
20	160	246-304-0969РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 1500 мм х 1000 мм	шт.	1	54 500	54 500
21	164	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	74	1 754	129 796
22	165	246-304-0528РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	7 338	102 732
23	166	246-304-0553РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	60	6 066	363 960
			Итого по подразделу: П4				**663 423**
			Подраздел: ПВ5				
24	183	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	2	1 754	3 508

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	184	246-304-0526РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	7 489	14 978
26	185	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	18	2 208	39 744
27	186	246-304-0609РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	18	9 331	167 958
			Итого по подразделу: ПВ5				**226 188**
			Подраздел: П6				
28	200	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	1	7 555	7 555
29	201	246-304-0765РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 800 мм	шт.	1	29 801	29 801
30	202	6118-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических неутепленных размер 1250х500 мм	шт.	2	73 970	147 940
31	204	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	23	1 754	40 342
32	205	246-304-0526РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	11	7 489	82 379
33	206	246-304-0528РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	12	7 338	88 056
			Итого по подразделу: П6				**396 073**
			Подраздел: ДП1,ДП2				
34	226	6118-0206-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверей герметических неутепленных размер 1250х500 мм	шт.	2	73 970	147 940
			Итого по подразделу: ДП1,ДП2				**147 940**
			Подраздел: СИСТЕМА В1				
35	245	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	38	1 754	66 652
36	246	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	38	7 489	284 582
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В1				**351 234**
			Подраздел: СИСТЕМА В2				
37	254	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1 754	17 540
38	255	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	7 489	74 890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В2				**92 430**
			Подраздел: СИСТЕМА В4				
39	280	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	26	1 754	45 604
40	281	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	26	7 489	194 714
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В4				**240 318**
			Подраздел: СИСТЕМА В5				
41	292	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	30	1 754	52 620
42	293	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	29	7 489	217 181
43	294	246-304-0529РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 175 мм	шт.	1	3 658	3 658
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В5				**273 459**
			Подраздел: СИСТЕМА В6				
44	302	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	10	1 754	17 540
45	303	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	10	7 489	74 890
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В6				**92 430**
			Подраздел: СИСТЕМА В8				
46	323	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1 754	1 754
47	324	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	7 489	7 489
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В8				**9 243**
			Подраздел: СИСТЕМА В10				
48	339	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 754	7 016
49	340	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
50	341	246-304-0529РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 175 мм	шт.	1	3 658	3 658
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В10				**33 141**
			Подраздел: СИСТЕМА В13				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	372	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	3	1 754	5 262
52	373	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В13				**27 729**
			Подраздел: СИСТЕМА В14				
53	378	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1 754	1 754
54	379	246-304-0528РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	7 338	7 338
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В14				**9 092**
			Подраздел: СИСТЕМА ДВ15				
55	385	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 754	7 016
56	386	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	7 489	29 956
			Итого по подразделу: СИСТЕМА ДВ15				**36 972**
			Подраздел: СИСТЕМА В16				
57	394	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	8	1 754	14 032
58	395	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	7 489	59 912
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В16				**73 944**
			Подраздел: СИСТЕМА В17				
59	405	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	4	1 754	7 016
60	406	246-304-0653РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	4	9 398	37 592
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В17				**44 608**
			Подраздел: СИСТЕМА В23				
61	445	6118-0202-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	17	1 754	29 818
62	446	246-304-0526РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3	7 489	22 467
63	447	246-304-0528РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	7 338	102 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	448	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	1	2 208	2 208
65	449	246-304-0609РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	1	9 331	9 331
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В23				**166 556**
			Подраздел: СИСТЕМА В24				
66	465	6118-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	3	7 555	22 665
67	466	246-304-0713РСНБ РК 2022	Решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 500 мм	шт.	3	18 114	54 342
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В24				**77 007**
			Итого по разделу: Вентиляция				**4 314 809**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**4 314 809**
			ИТОГО по акту:				**4 314 809**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	4314809.000 x 6.20%	267 518
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4314809.000 + 267518.150	4 582 327
	Сметная прибыль, 5.00%	4582327.150 x 5.00%	229 116
	Непредвиденные расходы, 5.000%	4582327.150 x 5.000%	229 116
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 040 559
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750	5040559.865 x 1.0750	5 418 601
	НДС (12%)	5418601.855 x 12%	650 232
	Итого с НДС	5418601.855 + 650232.223	6 068 834

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	19.12.2024 06:13
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	20.12.2024 04:22
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	19.12.2024 06:47
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.12.2024 07:18
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	23.12.2024 10:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	23.12.2024 11:51
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.12.2024 07:32
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.12.2024 07:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

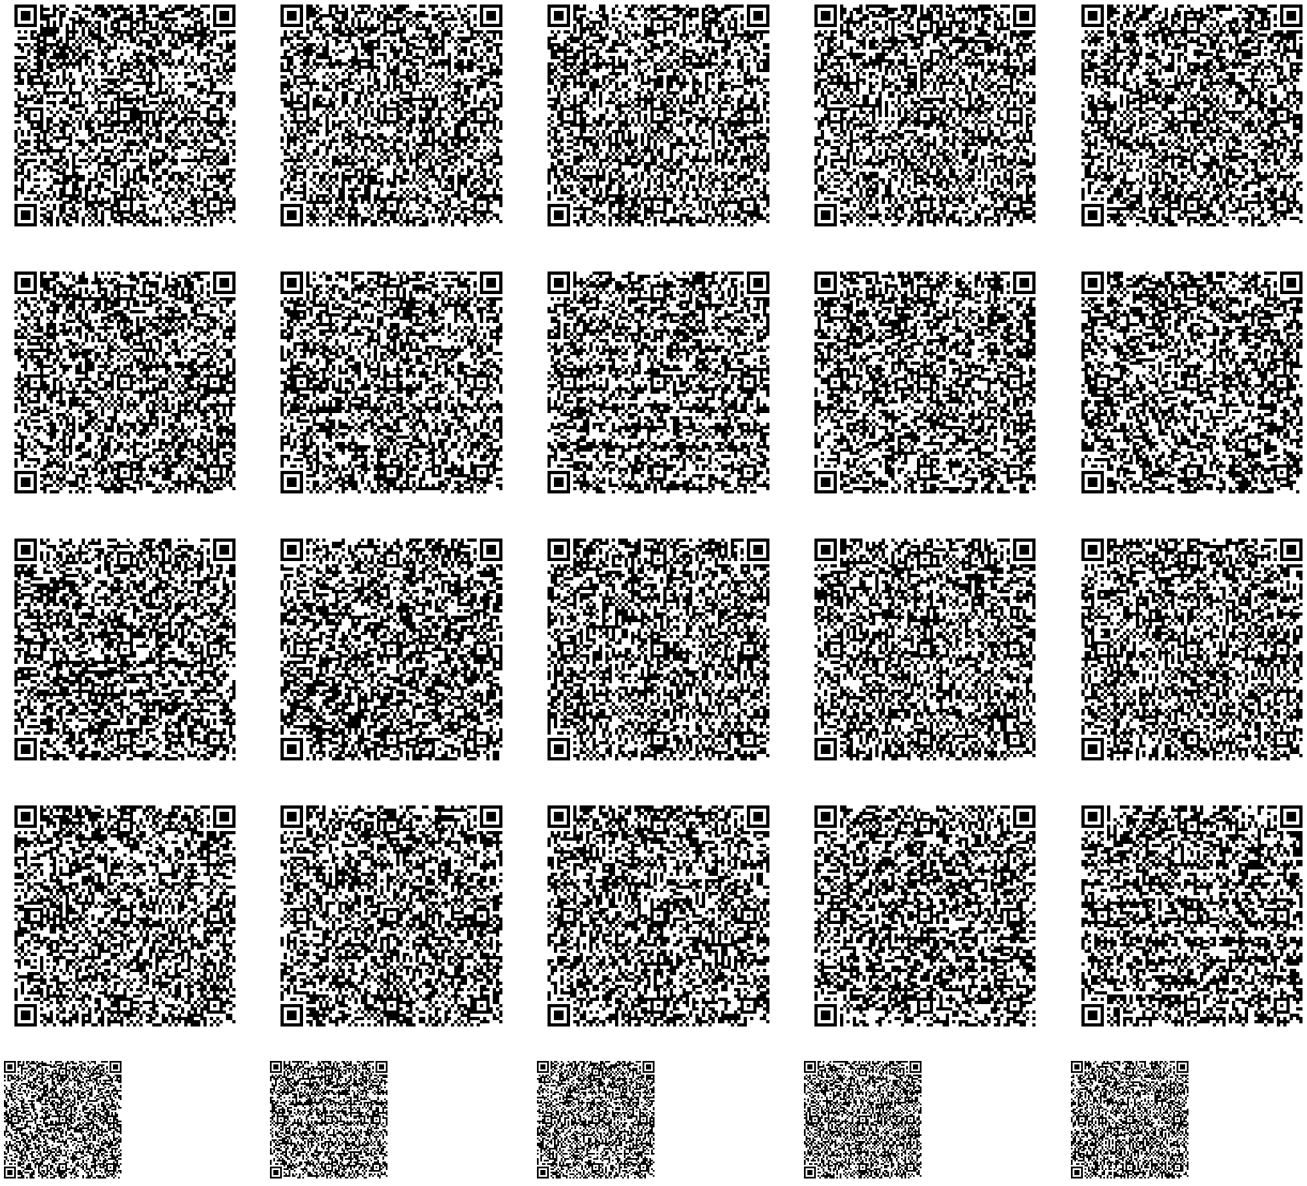

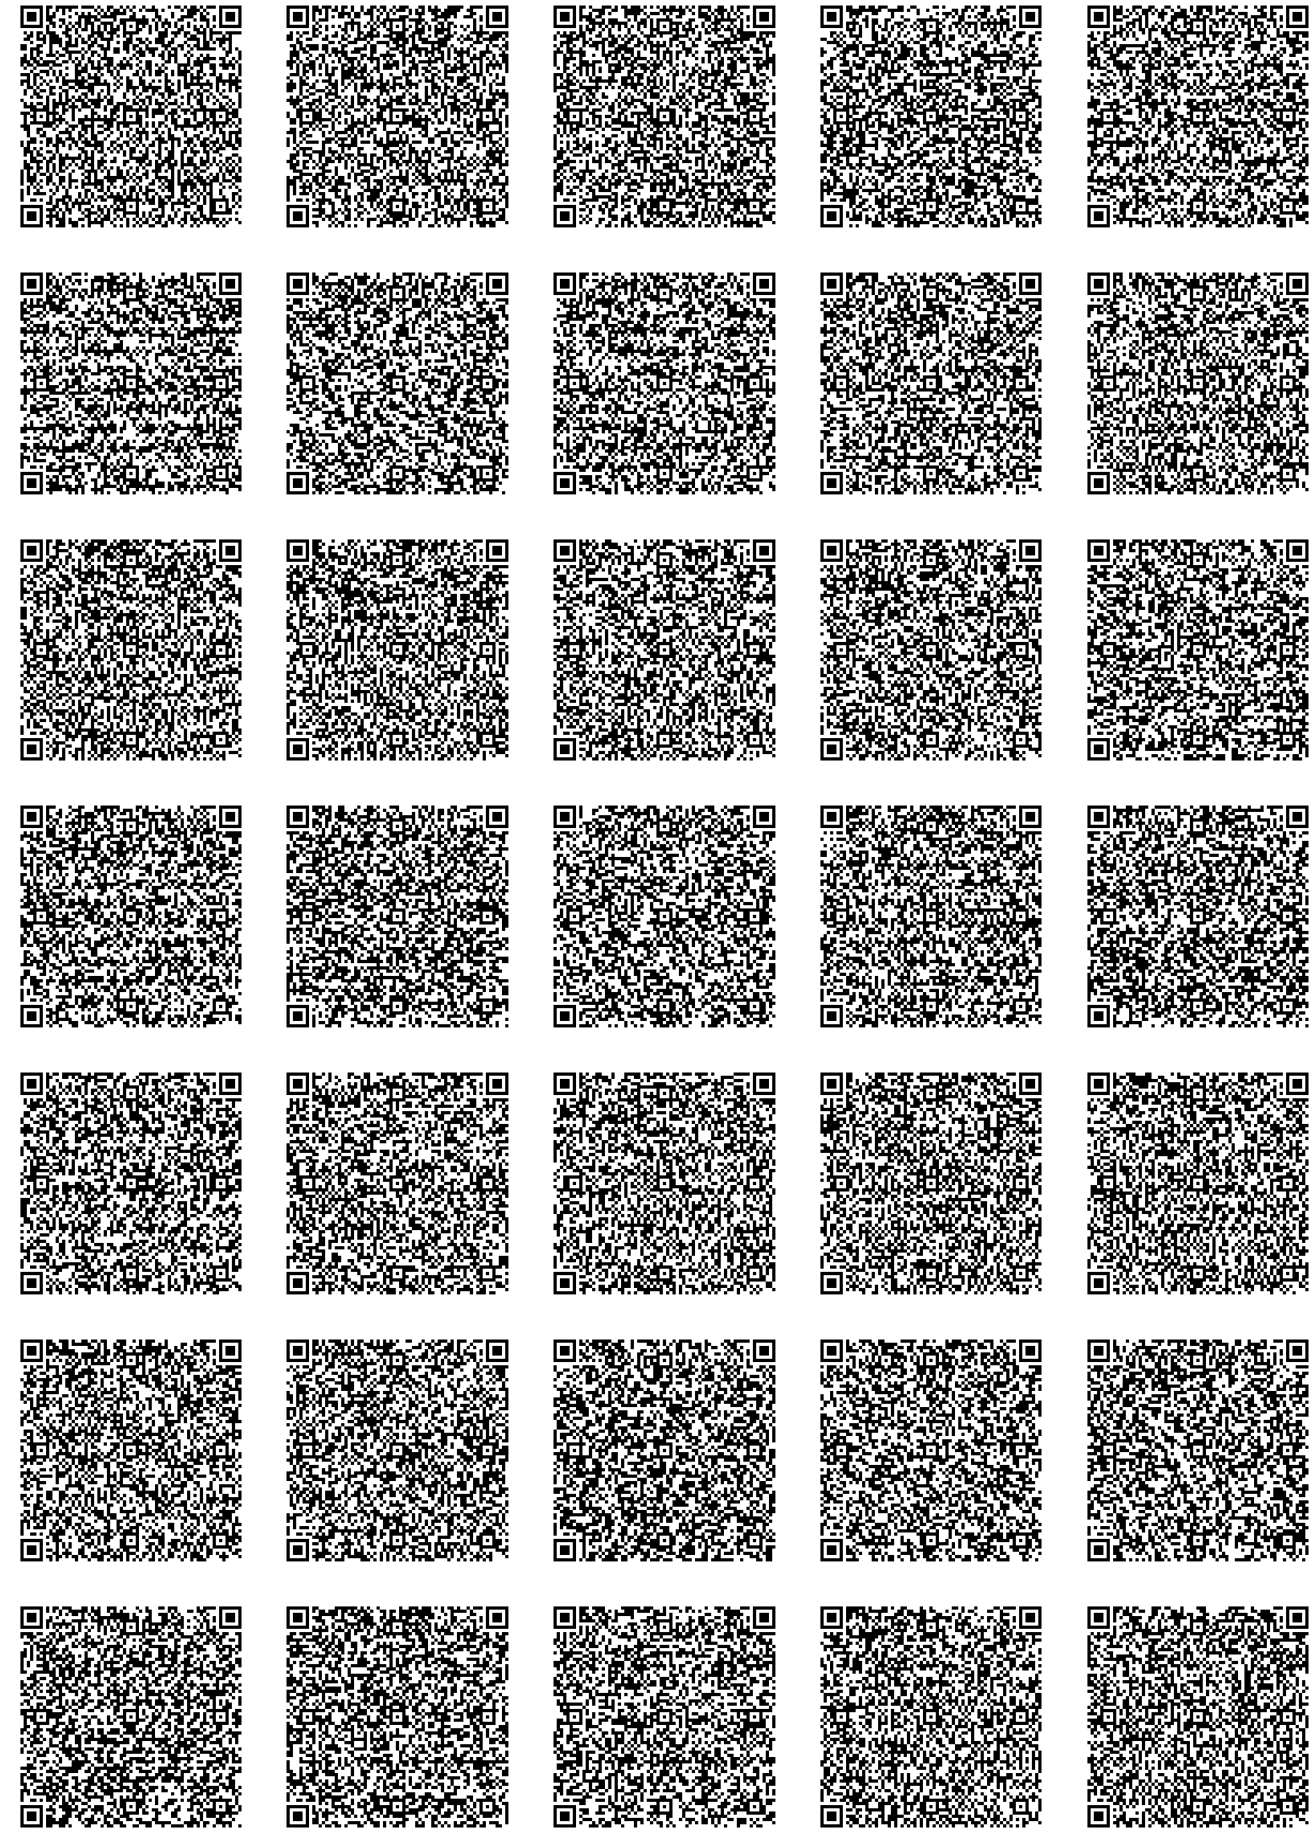

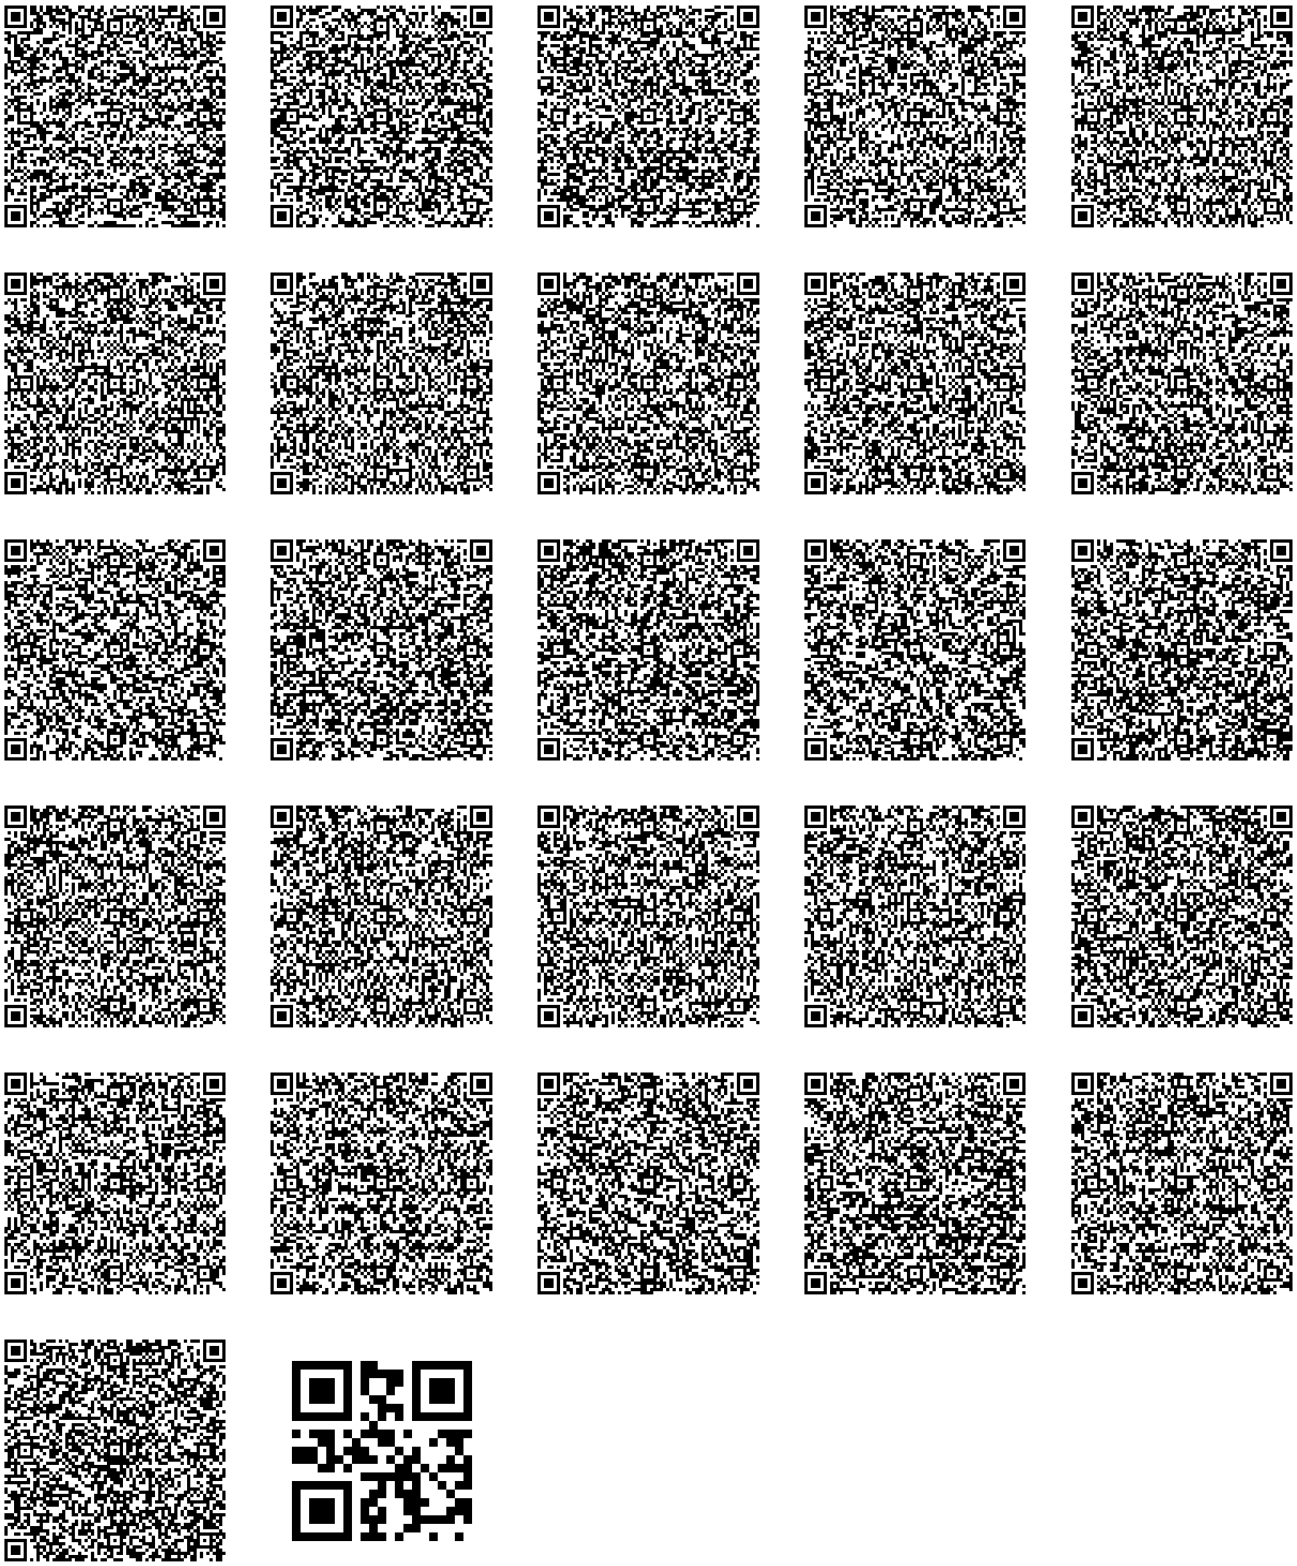

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: ПВ5				
1	181	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	290 377	290 377
2	182	514-401-0304 РСНБ РК 2022	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час	комплект	1	5 441 625	5 441 625
3	193	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка +/для изготовления коробов/	м2	5	6 821	34 105
4	194	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0.0314	577 796	18 143
			Итого по подразделу: ПВ5				**5 784 250**
			Подраздел: П6				
5	198	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	290 377	290 377
6	199	514-401-0704 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 6300 м3/час	комплект	1	3 595 233	3 595 233
			Итого по подразделу: П6				**3 885 610**
			Подраздел: ДП1,ДП2				
7	233	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	260	2 307	599 820

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	234	234-302-0201 РСНБ РК 2022	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм+/МБОР-8Ф/	м2	299	3 745	1 119 755
9	235	6111-0501-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	260	1 322	343 720
10	236	236-106-0901 РСНБ РК 2022	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001+/ПЛАЗАС/	кг	170	454	77 180
			Итого по подразделу: ДП1,ДП2				**2 140 475**
			Подраздел: СИСТЕМА В19				
11	419	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
12	422	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	7.85	15 762	123 732
13	423	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	775	4 650
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В19				**129 039**
			Подраздел: СИСТЕМА В20				
14	426	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
15	429	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	10.99	15 762	173 224
16	430	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775	7 750
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В20				**181 631**
			Подраздел: СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ48				
17	470	6118-0208-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дефлектора диаметр патрубка 1000 мм	шт.	4	89 182	356 728
18	471	246-301-0611 РСНБ РК 2022	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	4	37 617	150 468
19	472	6118-0208-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 1000 мм	шт.	4	33 784	135 136
20	473	246-308-0510 РСНБ РК 2022	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод модели УП 3-09, диаметром 1000 мм	шт.	4	329 225	1 316 900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	477	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	4	10 599	42 396
22	478	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	8 639	34 556
23	479	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	40	2 590	103 600
24	480	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	40	483	19 320
25	494	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	262.6	16 387	4 303 226
26	495	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	382.7	15 533	5 944 479
27	496	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	77.35	15 806	1 222 594
28	497	6118-0101-0319 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 1 мм диаметр до 1250 мм	м2	37.68	14 056	529 630
29	498	6111-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна фасонной поверхности	м3	5.5	144 296	793 628
30	499	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	5.94	51 061	303 302
31	500	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	100	2 307	230 700
32	501	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.115	552 642	63 553
33	502	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	50	775	38 750
			Итого по подразделу: СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ48				**15 588 967**
			Итого по разделу: Вентиляция				**27 709 972**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**27 709 972**
			ИТОГО по акту:				**27 709 972**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				18673114.000 x 6.20%	1 157 733

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				27709972.000 + 1157733.032	28 867 705
		Сметная прибыль, 5.00%				19830847.032 x 5.00%	991 542
		Непредвиденные расходы, 5.000%				28867705.032 x 5.000%	1 443 385
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					31 302 632
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				31302632.636 x 1.0557	33 046 189
		НДС (12%)				33046189.273 x 12%	3 965 542
		Итого с НДС				33046189.273 + 3965542.713	37 011 731

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	21.12.2024 05:16
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	21.12.2024 15:25
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	21.12.2024 05:23
Представители заказчика		
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	23.12.2024 11:52
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	23.12.2024 10:54 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	23.12.2024 07:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	23.12.2024 07:42
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	23.12.2024 07:39

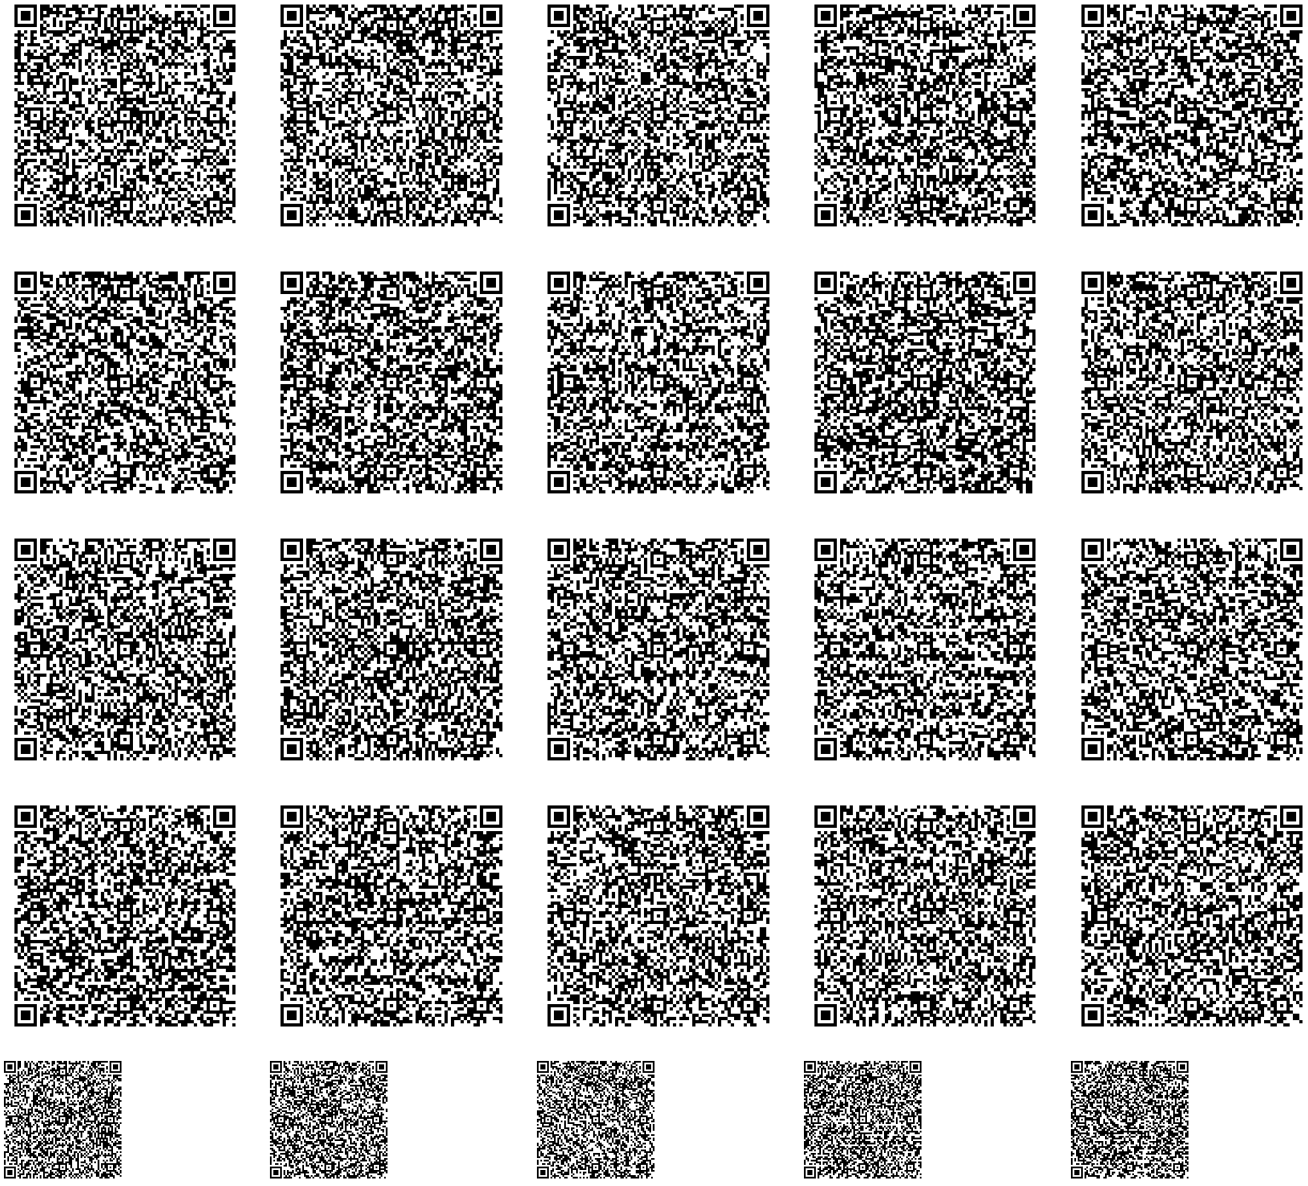

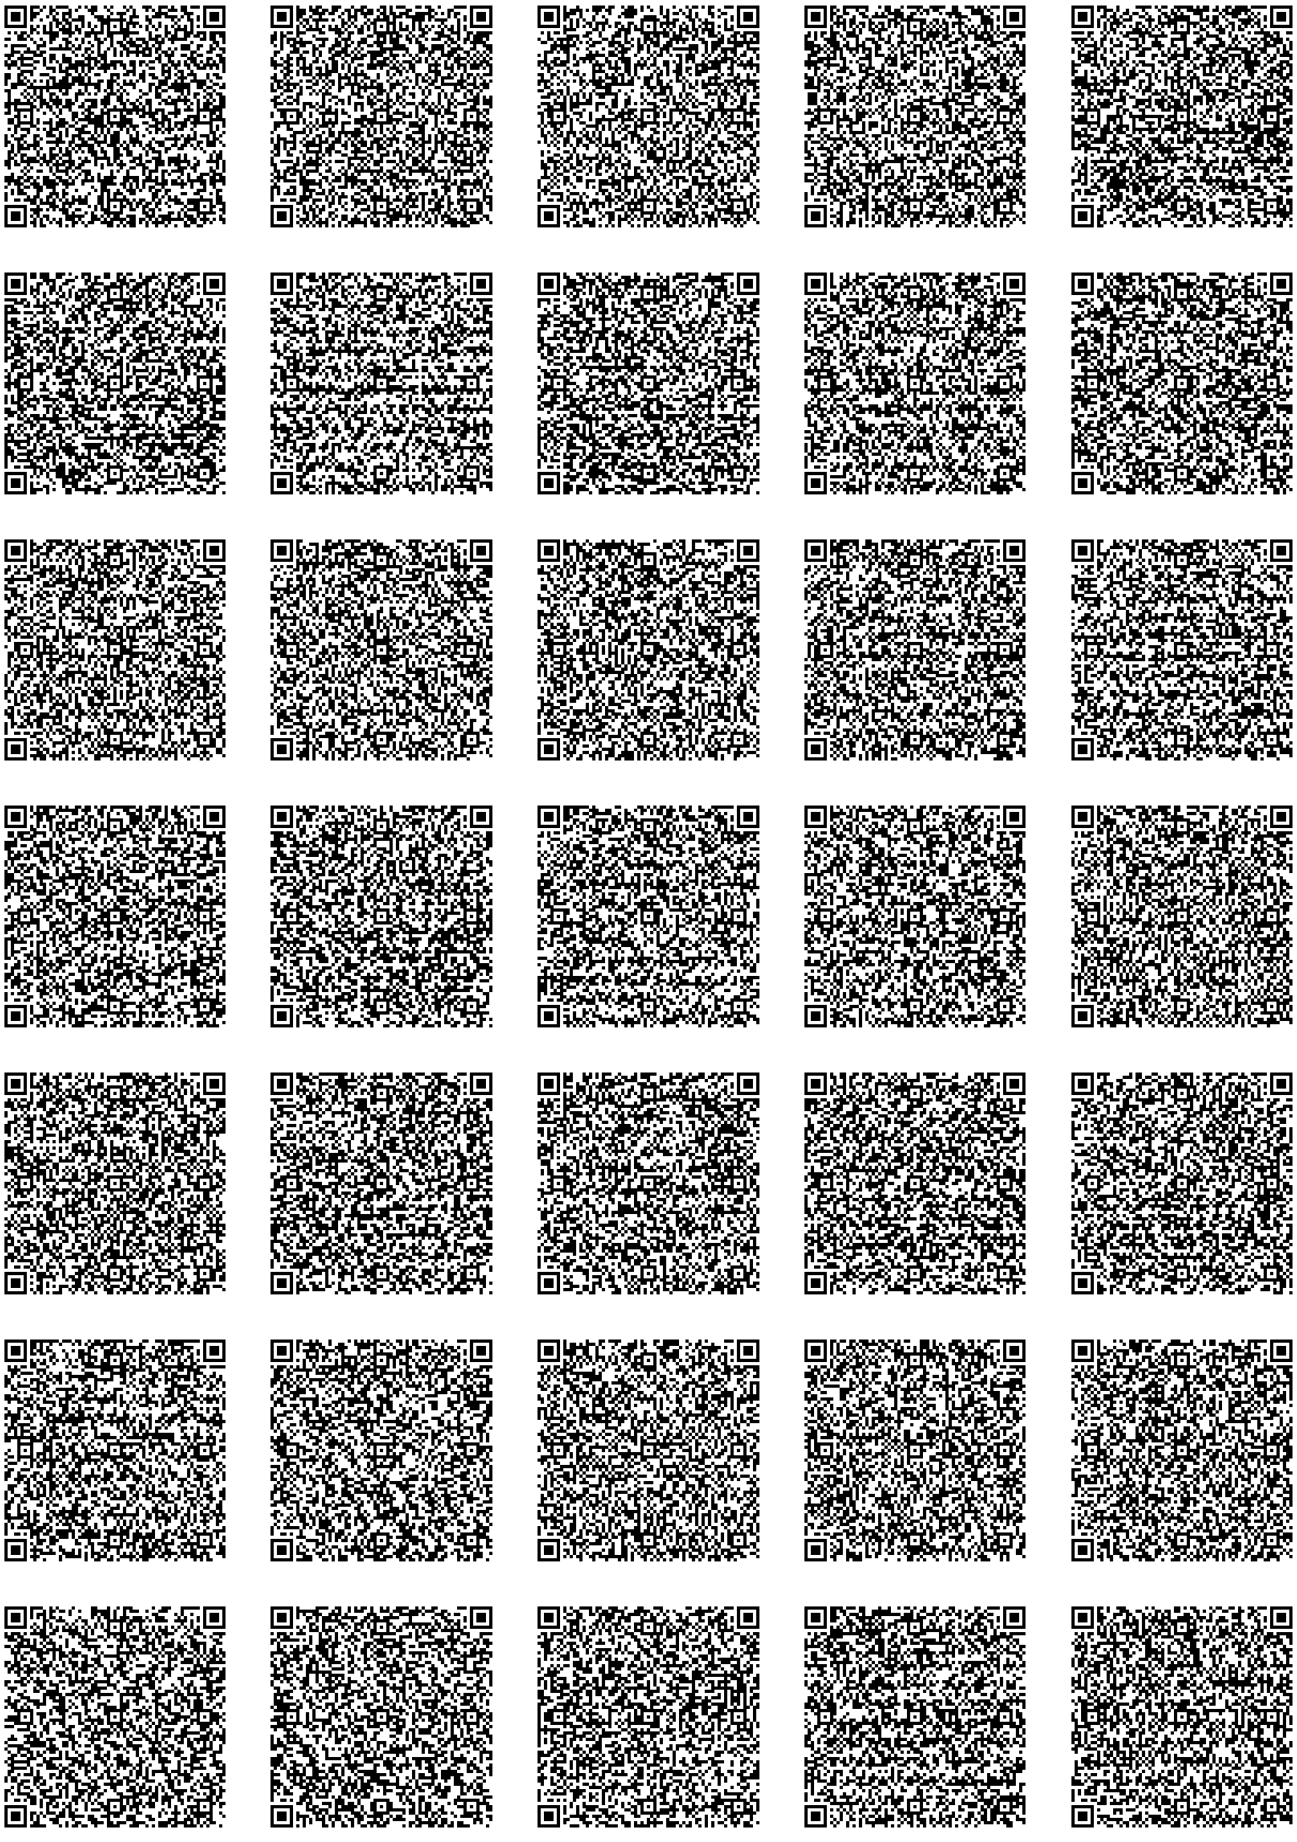

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: П1				
1	97	261-302-0159 РСНБ РК 2022	Заглушки питометражных лючков	шт.	5	806	4 030
2	105	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1.6	16 387	26 219
3	106	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	39.45	15 806	623 547
4	107	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	45.84	13 886	636 534
5	108	6118-0101-0312 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	м2	32.4	12 727	412 355
6	109	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м2	57.9644	13 385	775 853
7	110	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	250	5 877	1 469 250
8	111	234-304-0305 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	м2	275	9 372	2 577 300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	112	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: П1				**6 540 588**
			Подраздел: П2				
10	125	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	219	1 095
11	126	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	16.6	16 387	272 024
12	127	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	60.44	15 806	955 315
13	128	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	79.128	15 279	1 208 997
14	129	6111-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна фасонной поверхности	м3	5	144 296	721 480
15	130	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	5.4	51 061	275 729
16	131	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	104	2 307	239 928
17	132	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.1196	552 642	66 096
18	133	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: П2				**3 756 164**
			Подраздел: П3				
19	143	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	12	219	2 628
20	144	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	6.24	16 387	102 255
21	145	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	202.1	15 533	3 139 219

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	146	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	15.95	15 806	252 106
23	147	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	3.925	16 533	64 891
24	148	6118-0101-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	13.8631	15 643	216 860
25	149	6118-0101-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м2	6.28	14 429	90 614
26	150	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	39.5012	15 279	603 539
27	151	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м2	57.9016	13 385	775 013
28	152	6111-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна фасонной поверхности	м3	7.8	144 296	1 125 509
29	153	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	8.424	51 061	430 138
30	154	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	175	2 307	403 725
31	155	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.20125	552 642	111 219
32	156	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	100	775	77 500
			Итого по подразделу: П3				**7 395 217**
			Подраздел: П4				
33	167	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	14	219	3 066
34	168	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1.56	16 387	25 564
35	169	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	189.3	15 533	2 940 397

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	170	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	75.38	15 806	1 191 456
37	171	6118-0101-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	21.7602	15 643	340 395
38	172	6118-0101-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м2	18.84	14 429	271 842
39	173	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	75.7368	15 279	1 157 183
40	174	6118-0101-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м2	38.1196	13 385	510 231
41	175	6118-0101-0318 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 1 мм диаметр от 900 до 1000 мм	м2	16.956	14 388	243 963
42	176	6111-0101-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна фасонной поверхности	м3	9.5	144 296	1 370 812
43	177	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	10.26	51 061	523 886
44	178	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	225	2 307	519 075
45	179	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.25875	552 642	142 996
46	180	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	100	775	77 500
			Итого по подразделу: П4				**9 318 366**
			Подраздел: ПВ5				
47	187	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	219	1 314
48	188	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	10	16 387	163 870
49	189	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	15.22	15 806	240 567

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	190	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	54.61	13 886	758 314
51	191	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	34.54	15 279	527 737
52	192	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	96.44	13 722	1 323 350
53	195	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	230	5 877	1 351 710
54	196	234-304-0305 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 16 мм	м2	253	9 372	2 371 116
55	197	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	30	775	23 250
			Итого по подразделу: ПВ5				**6 761 228**
			Подраздел: П6				
56	203	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	10	219	2 190
57	210	6118-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	42.8	16 223	694 344
58	211	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	2.0096	14 724	29 589
59	212	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	15.7	15 089	236 897
60	213	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	1.57	15 089	23 690
61	214	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	9.891	14 292	141 362
62	215	6118-0101-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	28.8	12 430	357 984
63	216	6118-0101-0411 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	13.2	10 400	137 280

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	217	6118-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	15.7	12 783	200 693
65	220	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: П6				**1 839 529**
			Итого по разделу: Вентиляция				**35 611 092**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**35 611 092**
			ИТОГО по акту:				**35 611 092**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	35611092.000 x 6.20%	2 207 887
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	35611092.000 + 2207887.636	37 818 979
	Сметная прибыль, 5.00%	37818979.636 x 5.00%	1 890 948
	Непредвиденные расходы, 5.000%	37818979.636 x 5.000%	1 890 948
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		41 600 877
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 2 квартал, к = 1.0368	41600877.600 x 1.0368	43 131 789
	НДС (12%)	43131789.895 x 12%	5 175 814
	Итого с НДС	43131789.895 + 5175814.787	48 307 604

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	19.12.2024 07:51
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	20.12.2024 04:21
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	19.12.2024 11:38
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.12.2024 07:17
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.12.2024 07:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.12.2024 07:33
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	23.12.2024 10:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	23.12.2024 11:48

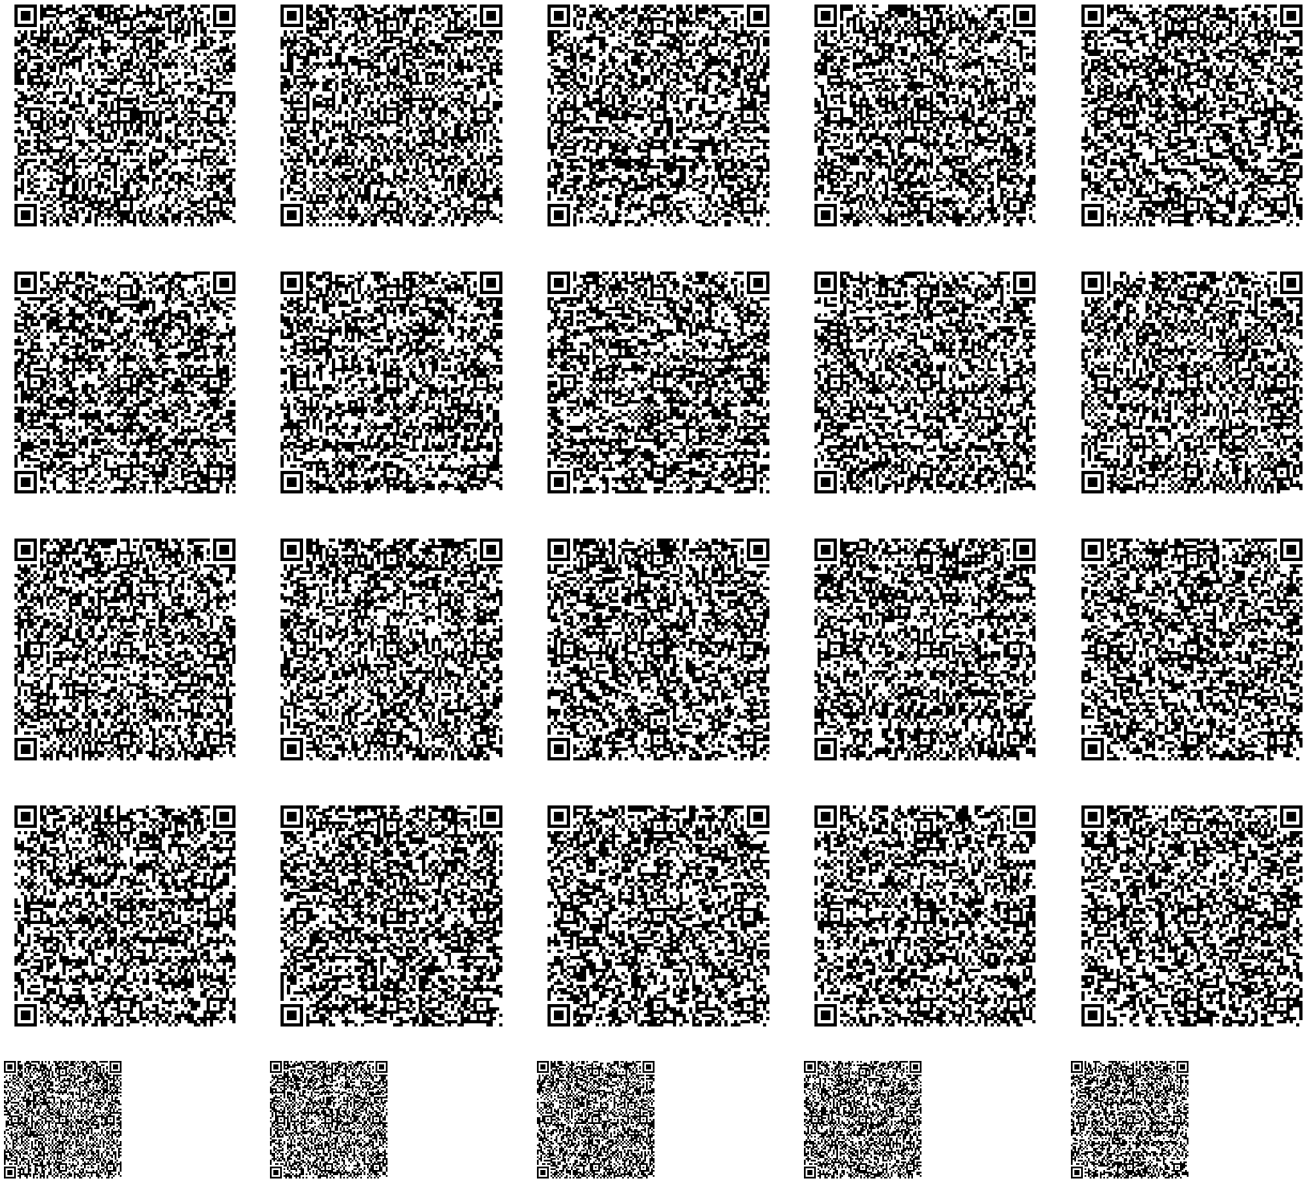

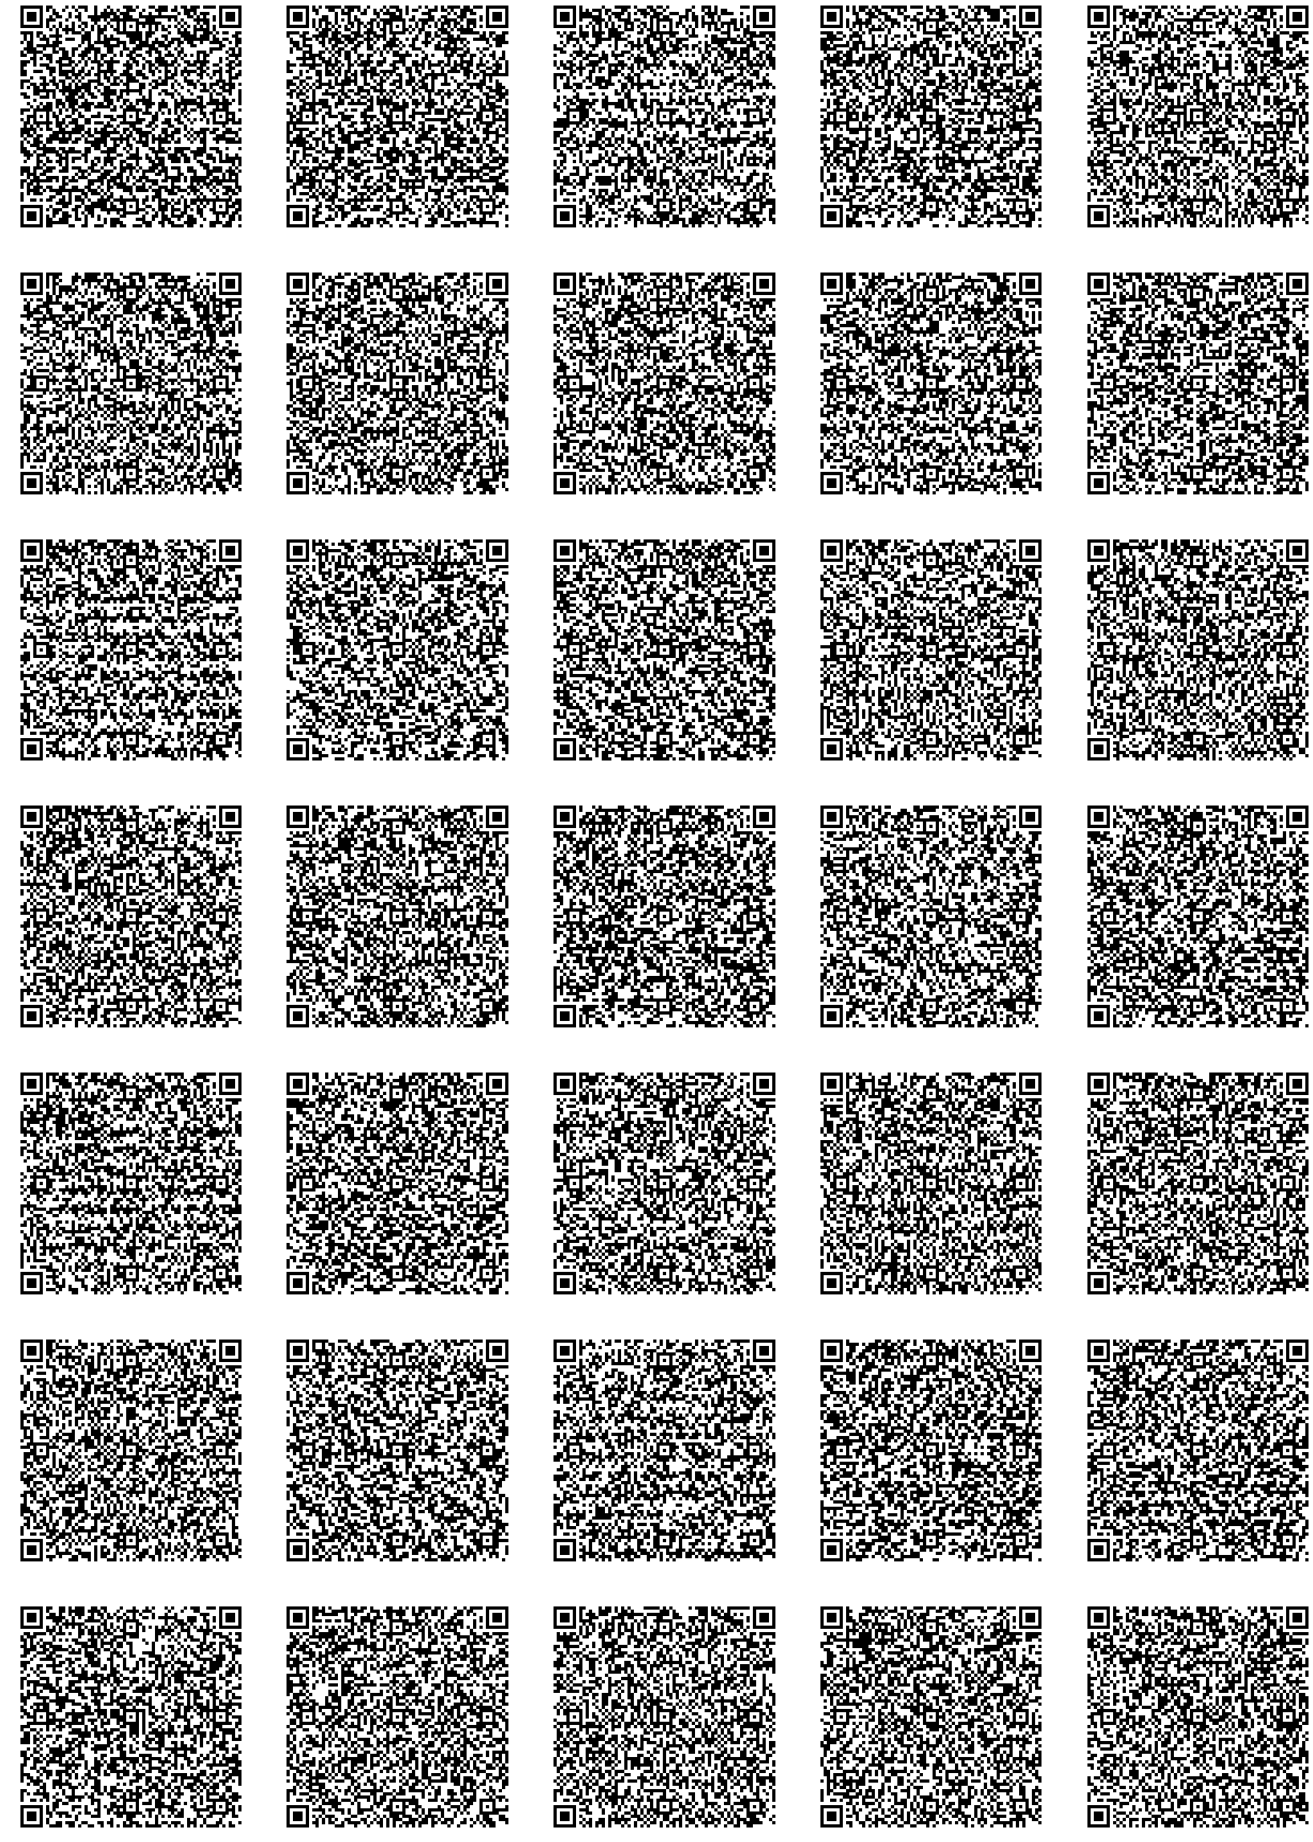

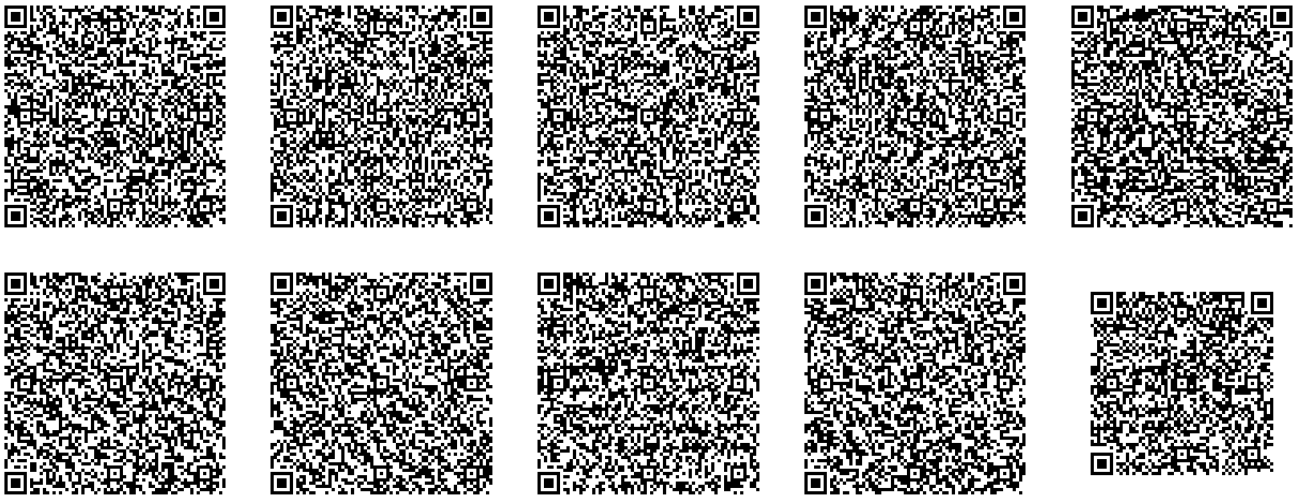

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: П1				
1	95	6118-0207-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м3/час	шт.	1	412 664	412 664
2	96	514-401-0707 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час	комплект	1	5 427 846	5 427 846
			Итого по подразделу: П1				**5 840 510**
			Подраздел: П2				
3	113	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	290 377	290 377
4	114	514-401-0205 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 8000 м3/час	комплект	1	2 335 478	2 335 478
5	117	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 949	27 949
6	118	246-306-0648 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 300 мм	шт.	1	104 649	104 649
			Итого по подразделу: П2				**2 758 453**
			Подраздел: П3				
7	134	6118-0207-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м3/час	шт.	1	412 664	412 664

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	135	514-401-0207 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 12500 м3/час	комплект	1	3 173 345	3 173 345
9	136	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	23	27 949	642 827
10	137	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм x 150 мм	шт.	3	91 709	275 127
11	138	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	8	93 365	746 920
12	139	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм x 200 мм	шт.	12	95 010	1 140 120
			Итого по подразделу: П3				**6 391 003**
			Подраздел: П4				
13	157	6118-0207-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 20 тыс м3/час	шт.	1	412 664	412 664
14	158	514-401-0209 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 20000 м3/час	комплект	1	3 967 999	3 967 999
15	161	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	33	27 949	922 317
16	162	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм x 150 мм	шт.	6	93 365	560 190
17	163	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм x 200 мм	шт.	27	95 010	2 565 270
			Итого по подразделу: П4				**8 428 440**
			Подраздел: П6				
18	207	6118-0203-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм	шт.	4	8 781	35 124
19	208	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	2	5 638	11 276
20	209	246-302-0507 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	2	9 105	18 210
			Итого по подразделу: П6				**64 610**
			Подраздел: ДП1,ДП2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	221	6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	2	290 377	580 754
22	222	514-401-0201 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 1600 м3/час/AHU 160R/	комплект	2	1 504 290	3 008 580
23	223	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	12	27 949	335 388
24	224	246-306-1209 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный дымоудаления КПЖ1-ДУ, настенные огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами 200 мм х 200 мм	шт.	12	89 508	1 074 096
25	225	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	8	219	1 752
26	227	6118-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр до 800, 1000 мм	м2	96	10 288	987 648
27	228	246-104-0109 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,9-1 мм прямоугольного сечения	м2	96	10 919	1 048 224
28	229	6118-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	133.45	10 950	1 461 277
29	230	246-104-0104 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 1,0 мм круглого сечения	м2	133.45	11 453	1 528 403
30	231	6118-0204-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка +/для изготовления коробов/	м2	8	6 821	54 568
31	232	224-104-0309 РСНБ РК 2022	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	8	4 515	36 120
			Итого по подразделу: ДП1,ДП2				**10 116 810**
			Подраздел: СИСТЕМА В1				
32	237	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
33	238	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	шт.	1	157 635	157 635
34	239	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.36	36 444	13 120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	240	246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544	31 088
36	241	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	3	27 949	83 847
37	242	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	93 365	186 730
38	243	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010	95 010
39	244	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	219	1 095
40	247	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	32	16 387	524 384
41	248	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	11.22	15 533	174 280
42	249	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	38.35	15 806	606 160
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В1				**1 912 324**
			Подраздел: СИСТЕМА В2				
43	251	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
44	252	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
45	253	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
46	256	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	5.2	16 387	85 212
47	257	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	11.52	15 533	178 940
48	258	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775	7 750
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В2				**339 714**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: СИСТЕМА В3				
49	259	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
50	260	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	шт.	1	157 635	157 635
51	261	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.36	36 444	13 120
52	262	246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544	31 088
53	263	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	3	27 949	83 847
54	264	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	93 365	186 730
55	265	246-306-0611 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	95 010	95 010
56	266	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	9	219	1 971
57	269	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	24.2	16 387	396 565
58	270	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	16.84	15 533	261 576
59	271	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В3				**1 282 017**
			Подраздел: СИСТЕМА В4				
60	272	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
61	273	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	шт.	1	157 635	157 635
62	274	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.36	36 444	13 120

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	275	246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544	31 088
64	276	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	3	27 949	83 847
65	277	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	91 709	183 418
66	278	246-306-0610 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	93 365	93 365
67	279	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	219	1 095
68	282	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	24.2	16 387	396 565
69	283	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	19.04	15 533	295 748
70	284	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В4				**1 310 356**
			Подраздел: СИСТЕМА В5				
71	285	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
72	286	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	шт.	1	157 635	157 635
73	287	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.36	36 444	13 120
74	288	246-305-0104 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	15 544	31 088
75	289	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 949	27 949
76	290	246-306-0618 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	96 900	96 900

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	291	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	219	1 314
78	295	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	29.4	16 387	481 778
79	296	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	16.04	15 533	249 149
80	297	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	22.66	15 806	358 164
81	298	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В5				**1 471 572**
			Подраздел: СИСТЕМА В6				
82	299	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
83	300	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
84	301	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
85	304	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	7.8	16 387	127 818
86	305	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	14.08	15 533	218 705
87	306	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	775	4 650
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В6				**418 548**
			Подраздел: СИСТЕМА В7				
88	307	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
89	308	246-401-0405 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1	115 706	115 706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	309	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.3	36 444	10 933
91	310	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	9 608	19 216
92	311	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
93	312	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
94	313	246-302-0506 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	1	7 936	7 936
95	314	6118-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	35.325	16 533	584 028
96	315	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	775	4 650
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В7				**789 877**
			Подраздел: СИСТЕМА В8				
97	316	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
98	317	246-401-0405 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	1	115 706	115 706
99	318	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.3	36 444	10 933
100	319	246-305-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 300 мм	шт.	2	9 608	19 216
101	320	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
102	321	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
103	322	246-302-0506 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм	шт.	1	7 936	7 936

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	325	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	0.8	16 387	13 110
105	326	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	25.905	11 051	286 276
106	327	246-104-0103 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	м2	25.905	8 927	231 254
107	328	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	6	775	4 650
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В8				**736 489**
			Подраздел: СИСТЕМА В9				
108	329	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
109	330	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
110	331	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
111	332	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
112	333	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	1	5 638	5 638
113	334	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	22.608	15 762	356 347
114	335	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775	7 750
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В9				**445 104**
			Подраздел: СИСТЕМА В10				
115	336	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
116	337	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	338	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
118	342	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	13.8	16 387	226 140
119	343	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	3.84	15 533	59 647
120	344	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	775	3 875
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В10				**357 037**
			Подраздел: СИСТЕМА В11				
121	345	6118-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,12	шт.	1	53 433	53 433
122	346	246-401-0421 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1	323 412	323 412
123	347	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.9	36 444	32 800
124	348	246-305-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 900 мм х 500 мм	шт.	2	22 713	45 426
125	349	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	16	219	3 504
126	350	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	12	7 776	93 312
127	351	246-302-0502 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм	шт.	4	5 085	20 340
128	352	246-302-0503 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм	шт.	6	5 638	33 828
129	353	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	2	6 181	12 362
130	354	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	8 639	8 639

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	355	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1	2 590	2 590
132	356	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1	483	483
133	357	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	49.455	14 724	728 175
134	358	6118-0101-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	м2	9.42	15 089	142 138
135	359	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	19.782	14 292	282 724
136	360	6118-0101-0407 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	14.13	12 783	180 624
137	361	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	15	775	11 625
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В11				**1 975 415**
			Подраздел: СИСТЕМА В12				
138	362	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
139	363	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
140	364	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
141	365	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
142	366	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	6 181	6 181
143	367	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	29.516	14 724	434 594
144	368	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775	7 750
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В12				**523 894**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: СИСТЕМА В13				
145	369	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
146	370	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
147	371	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
148	374	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	12	16 387	196 644
149	375	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	775	3 875
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В13				**263 368**
			Подраздел: СИСТЕМА В14				
150	376	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
151	377	246-409-0102 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 16 Вт	комплект	1	5 785	5 785
152	380	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	3.2	15 533	49 706
153	381	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	2	775	1 550
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В14				**84 198**
			Подраздел: СИСТЕМА ДВ15				
154	382	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
155	383	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
156	384	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
157	387	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	1	27 949	27 949

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
158	388	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	91 709	91 709
159	389	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	13	16 387	213 031
160	390	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	775	3 875
			Итого по подразделу: СИСТЕМА ДВ15				**399 632**
			Подраздел: СИСТЕМА В16				
161	391	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
162	392	246-401-0109 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	39 779	39 779
163	393	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
164	396	6118-0203-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов огнезадерживающих, периметр до 1600 мм	шт.	2	27 949	55 898
165	397	246-306-0602 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	2	91 709	183 418
166	398	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	14.08	16 387	230 729
167	399	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8	775	6 200
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В16				**544 057**
			Подраздел: СИСТЕМА В17				
168	400	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
169	401	246-401-0414 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В	комплект	1	157 635	157 635
170	402	6118-0208-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	0.42	36 444	15 306

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
171	403	246-305-0105 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм	шт.	2	16 261	32 522
172	404	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
173	407	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	5.5	15 533	85 432
174	408	6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	9.62	15 806	152 053
175	409	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	10	775	7 750
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В17				**490 549**
			Подраздел: СИСТЕМА В18				
176	410	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
177	411	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
178	412	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
179	413	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
180	414	246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795	4 795
181	415	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	10.99	15 762	173 224
182	416	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8	775	6 200
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В18				**255 063**
			Подраздел: СИСТЕМА В19				
183	417	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	418	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
185	420	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
186	421	246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795	4 795
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В19				**74 982**
			Подраздел: СИСТЕМА В20				
187	424	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
188	425	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
189	427	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
190	428	246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795	4 795
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В20				**74 982**
			Подраздел: СИСТЕМА В21				
191	431	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
192	432	246-401-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч	комплект	1	35 254	35 254
193	433	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
194	434	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	7 776	7 776
195	435	246-302-0501 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 100 мм	шт.	1	4 795	4 795
196	436	6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	7.85	15 762	123 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
197	437	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	8	775	6 200
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В21				**205 571**
			Подраздел: СИСТЕМА В22				
198	438	6118-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	27 157	27 157
199	439	246-409-0103 РСНБ РК 2022	Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 18 Вт	комплект	1	6 689	6 689
200	440	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	18.4	15 533	285 807
201	441	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	5	775	3 875
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В22				**323 528**
			Подраздел: СИСТЕМА В23				
202	442	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
203	443	246-403-0241 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 4 кВт, n 1000 об/мин, корпус №6,3	комплект	1	266 838	266 838
204	444	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	11	219	2 409
205	450	6118-0203-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	2	7 776	15 552
206	451	246-302-0504 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	2	6 181	12 362
207	452	6118-0203-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 355 мм	шт.	2	8 781	17 562
208	453	246-302-0508 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 355 мм	шт.	2	11 230	22 460
209	454	6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	8	16 387	131 096

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
210	455	6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	35.44	15 533	550 490
211	456	6118-0101-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	15.7	14 724	231 167
212	457	6118-0101-0405 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 355 мм	м2	20.7868	14 292	297 085
213	458	6118-0101-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	м2	7.536	12 512	94 290
214	459	6118-0101-0412 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200	м2	26.78	9 319	249 563
215	460	6118-0101-0408 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м2	33.6294	10 794	362 996
216	461	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В23				**2 308 345**
			Подраздел: СИСТЕМА В24				
217	462	6118-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	38 975	38 975
218	463	246-403-0235 РСНБ РК 2022	Вентилятор радиальный низкого давления из оцинкованной стали ГОСТ 5976-90 Р 2,2 кВт, n 1500 об/мин, корпус №5,0	комплект	1	447 472	447 472
219	464	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
220	467	6118-0101-0311 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	м2	20	13 886	277 720
221	468	6118-0101-0307 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр от 500 до 560 мм	м2	42.39	15 279	647 677
222	469	246-301-0503 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	15	775	11 625
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В24				**1 423 907**
			Итого по разделу: Вентиляция				**51 610 355**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**51 610 355**
			ИТОГО по акту:				**51 610 355**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				33697107.687 x 6.20%	2 089 220
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				51610355.687 + 2089220.612	53 699 576
		Сметная прибыль, 5.00%				35786328.299 x 5.00%	1 789 316
		Непредвиденные расходы, 5.000%				53699576.299 x 5.000%	2 684 978
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					58 173 871
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				58173871.529 x 1.0557	61 414 156
		НДС (12%)				61414156.173 x 12%	7 369 698
		Итого с НДС				61414156.173 + 7369698.741	68 783 854

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	19.12.2024 06:12
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	20.12.2024 04:25
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	19.12.2024 06:40
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.12.2024 07:21
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.12.2024 07:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.12.2024 07:32
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	23.12.2024 10:44 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	23.12.2024 11:49

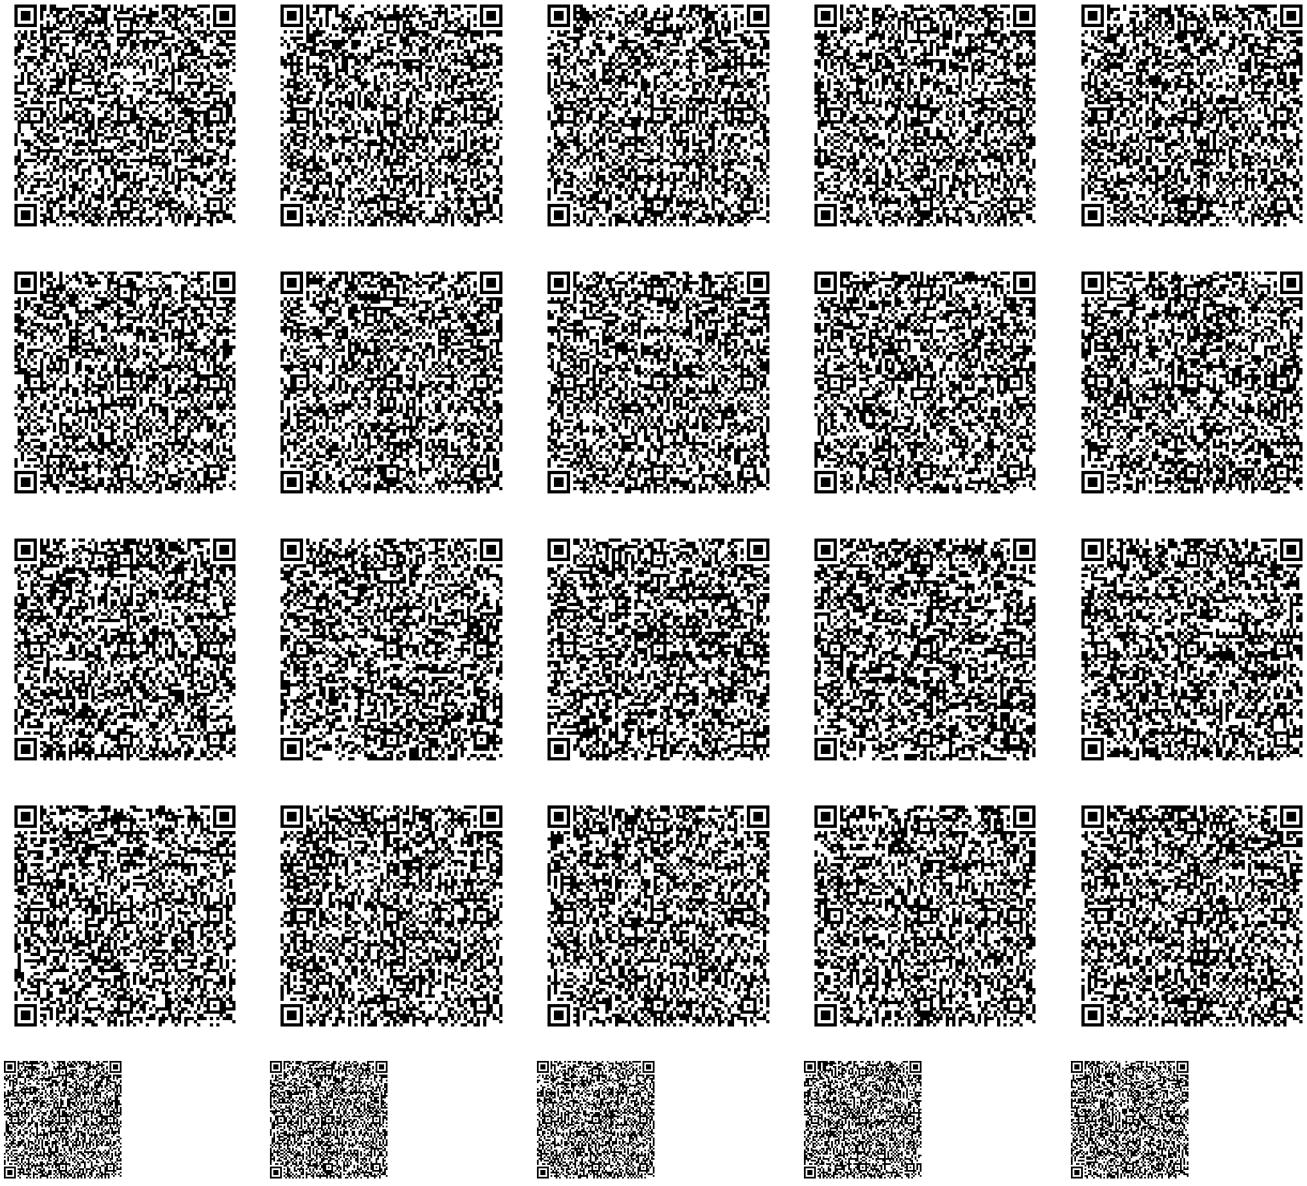

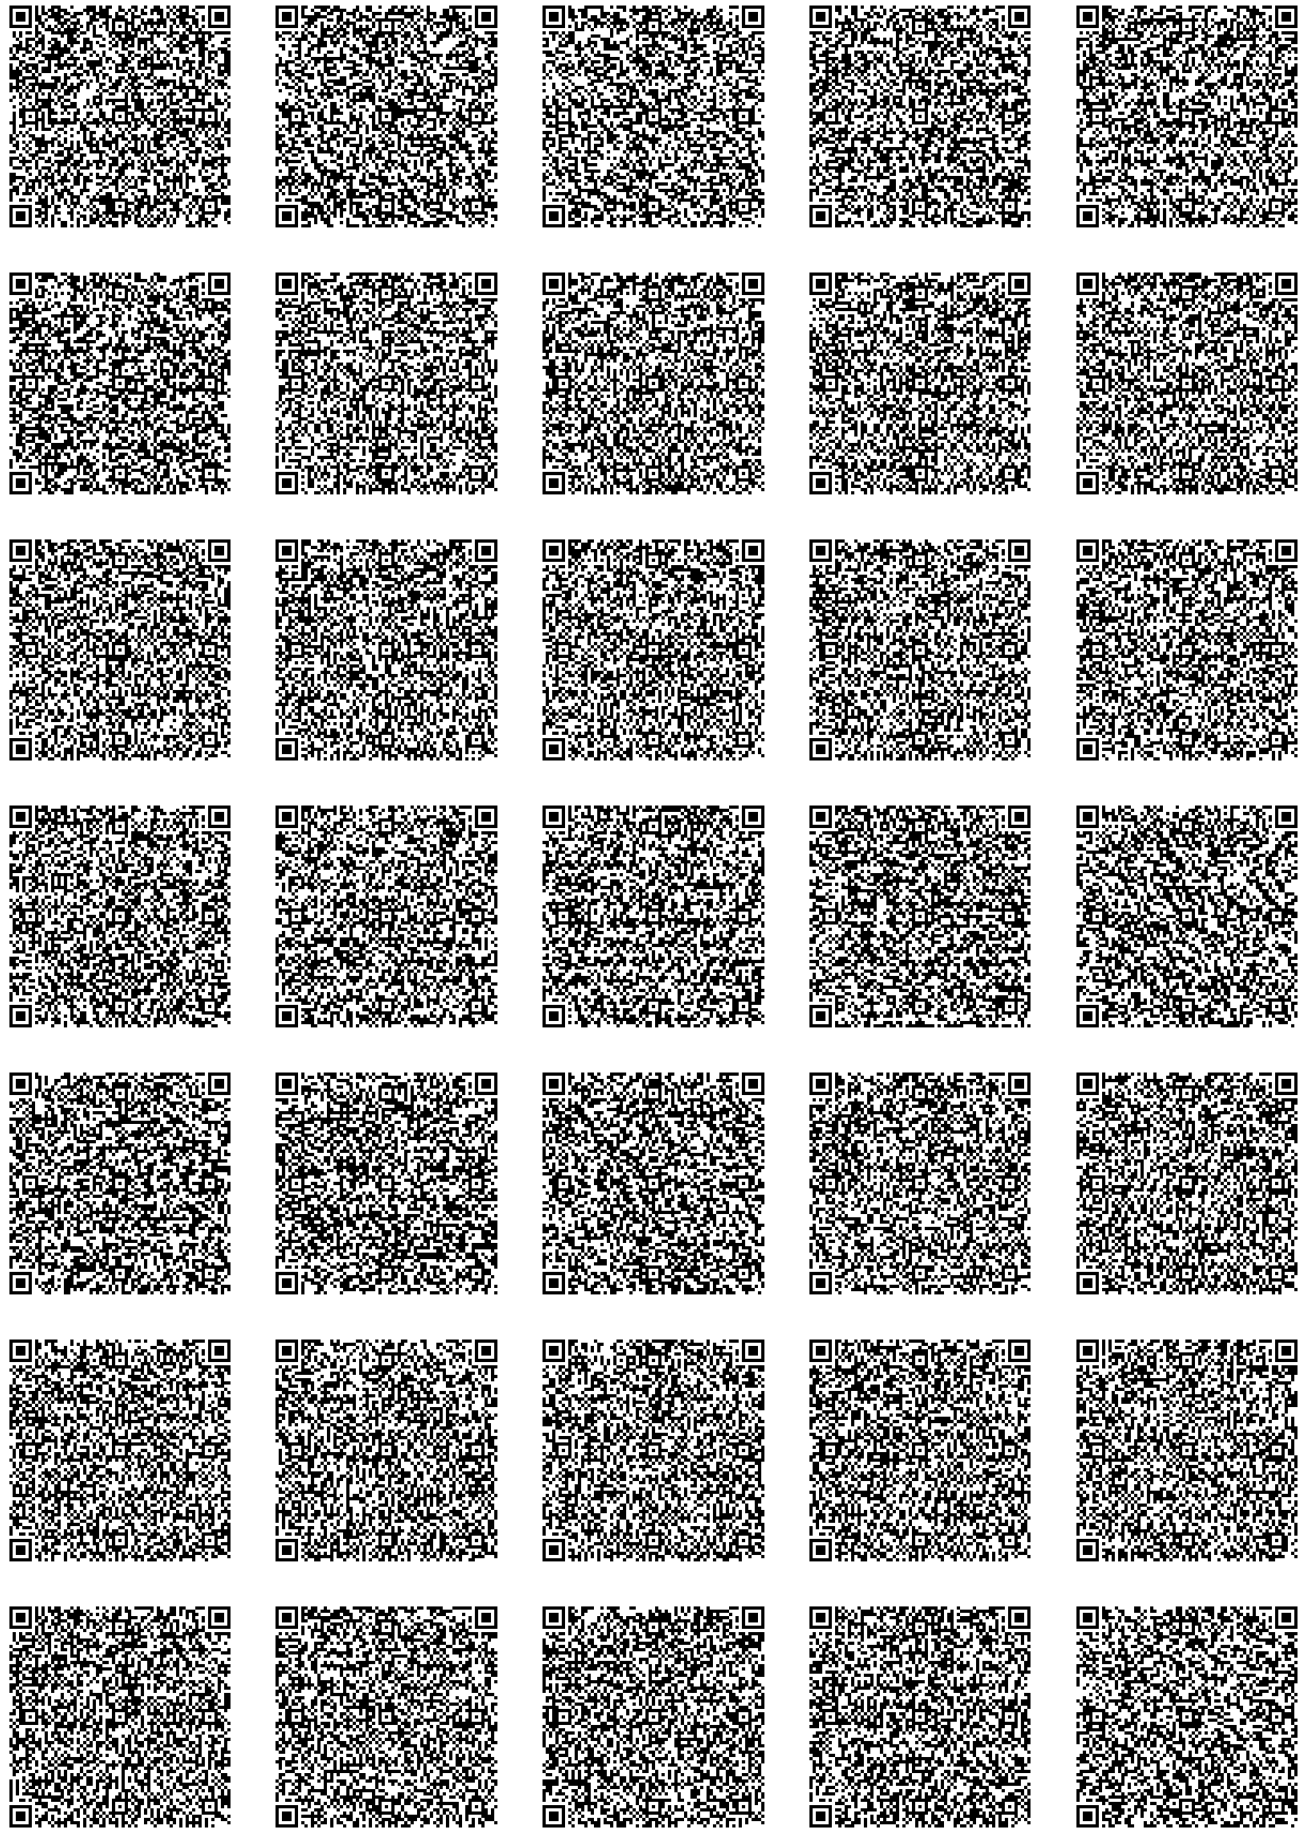

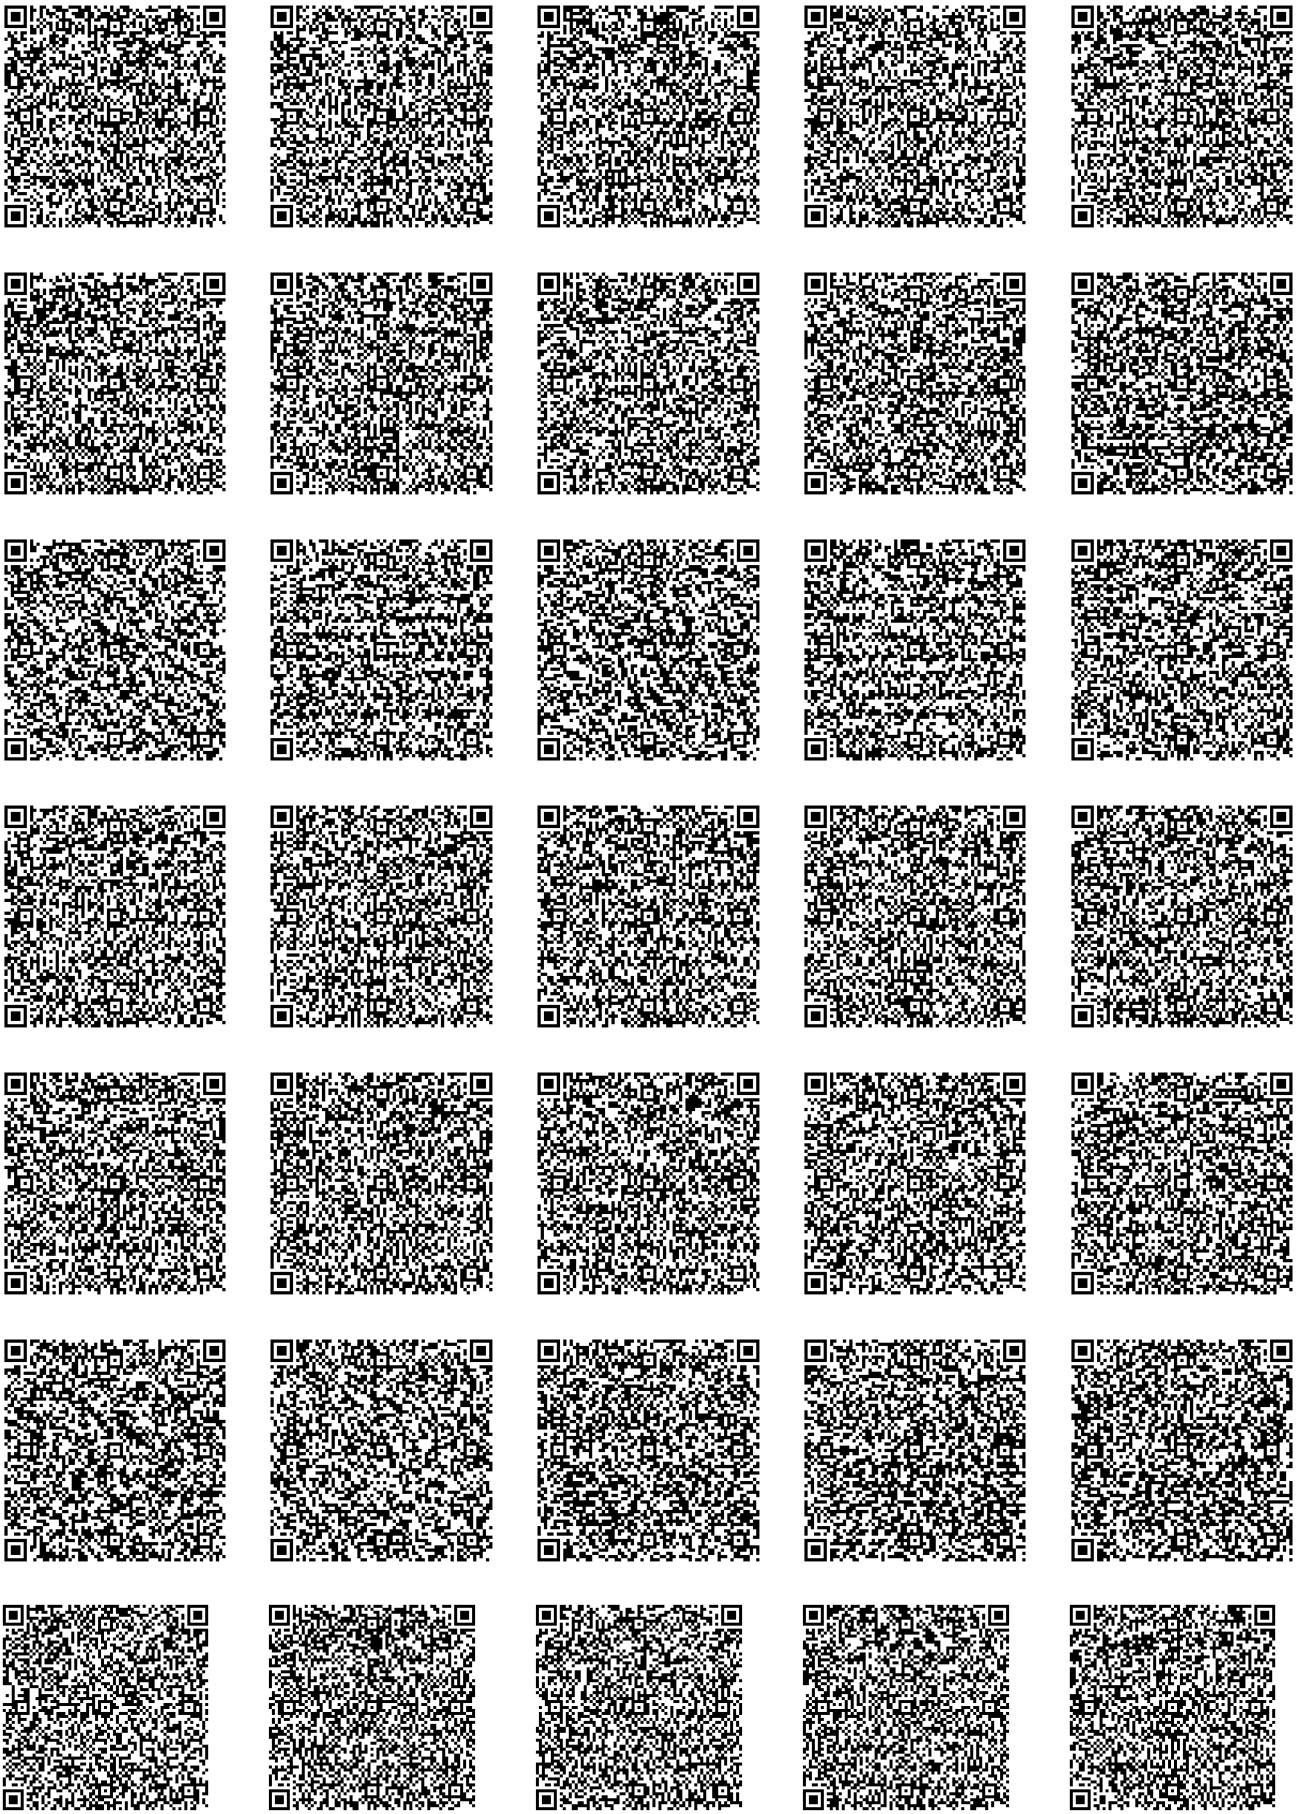

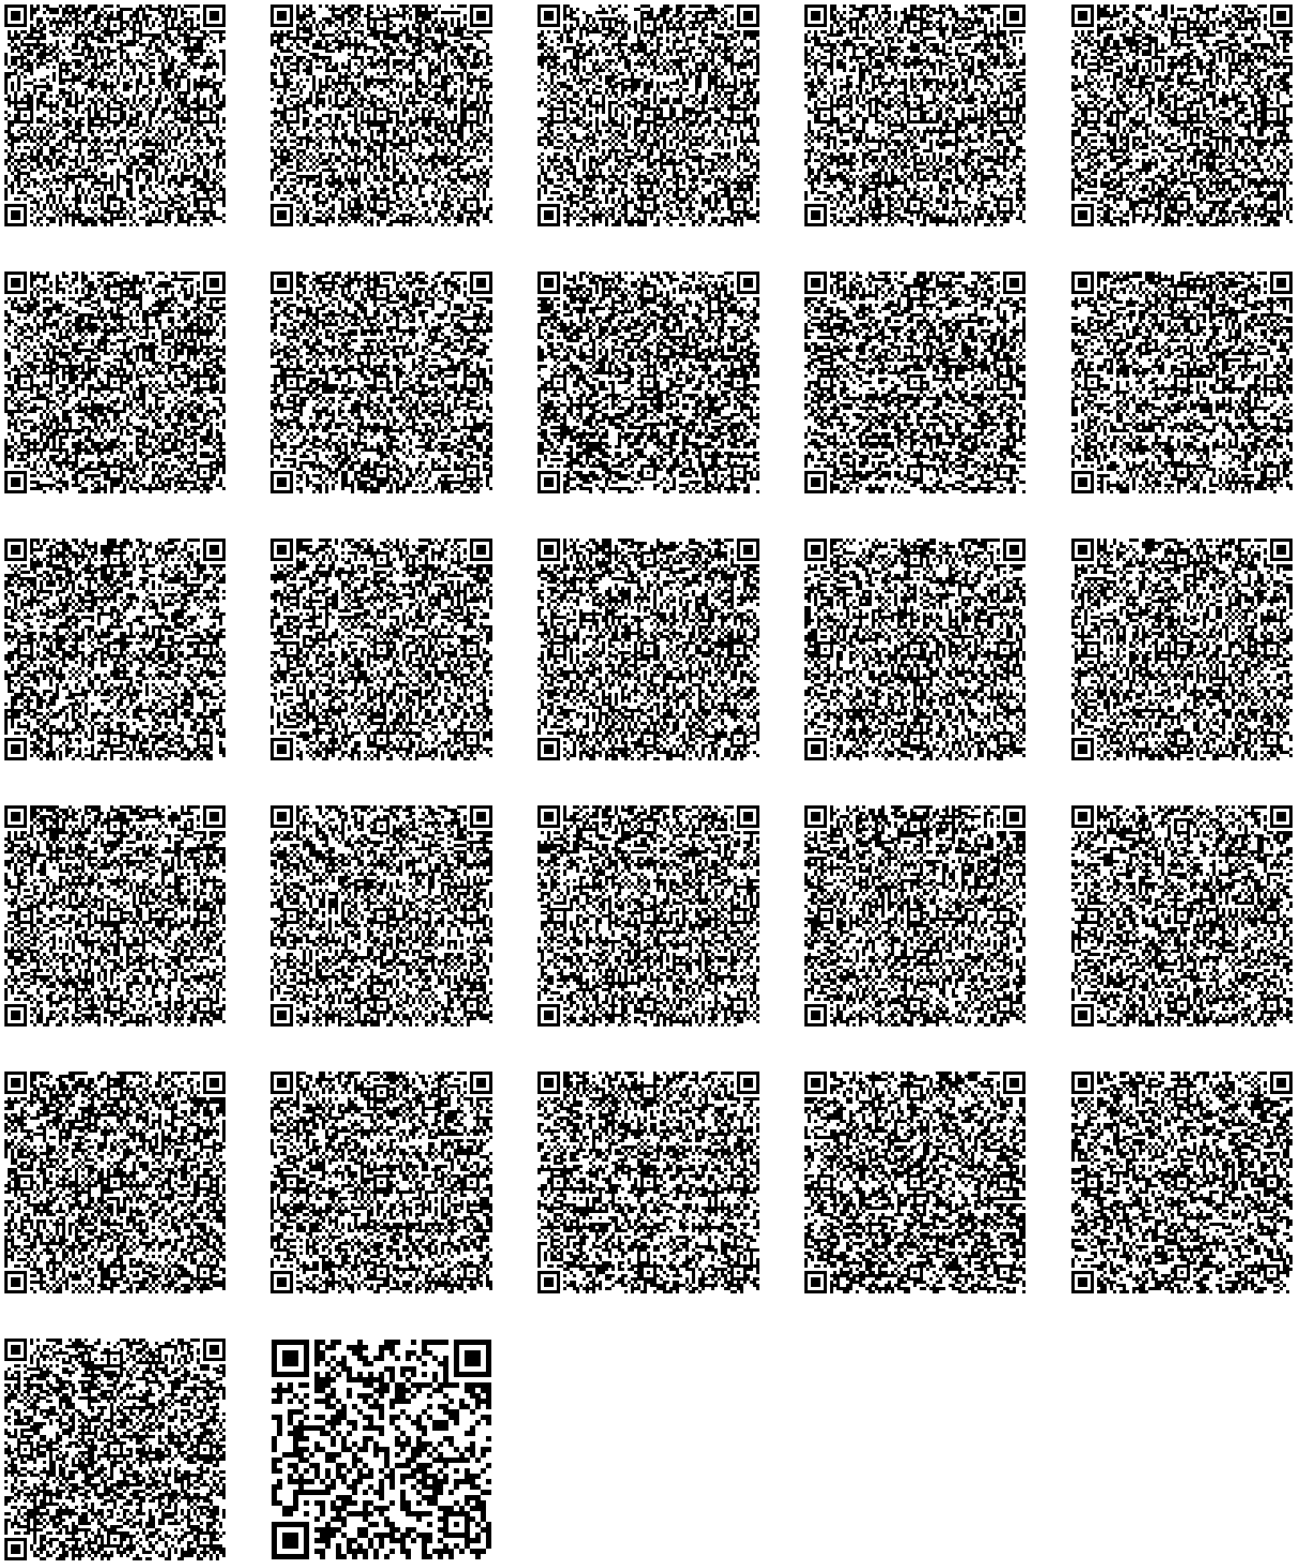

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Б, Д				
			Раздел: Полы РП15				
			Подраздел: Тип 3				
1	152	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	104.3	7 430	774 949
2	153	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	104.3	5 171	539 335
3	154	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	88.94	735	65 371
			Итого по подразделу: Тип 3				**1 379 655**
			Подраздел: Тип 5				
4	167	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	84.64	7 430	628 875
5	168	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	84.64	5 171	437 673
6	169	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	39.72	735	29 194
			Итого по подразделу: Тип 5				**1 095 742**
			Подраздел: Тип 7				
7	170	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4.65	1 828	8 500

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	171	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.09486	21 513	2 041
9	172	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4.65	184	856
10	173	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.118575	21 513	2 551
11	174	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр100х100	т	0.0127875	75 517	966
12	175	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0127875	391 444	5 006
13	176	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4.65	1 828	8 500
14	177	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.09486	21 513	2 041
15	178	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4.65	-74	-344
16	179	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.04743	-21 513	-1 020
17	180	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя	м2	5.724	5 385	30 824
18	181	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	4.65	7 414	34 475
19	182	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	4.743	3 632	17 227
20	183	СТРСНБ РК 2022	Грязезащитная решетка, алюминиевая, верхний слой резина + текстиль - до 20мм.	шт	4.65	56 676	263 546
21	184	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	9.06	1 592	14 424
22	185	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5.49036	1 416	7 774
			Итого по подразделу: Тип 7				**397 367**
			Подраздел: Тип 8				
23	186	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	335.57	1 663	558 053
24	187	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	10.268442	35 879	368 421

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	188	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	335.57	1 828	613 422
26	189	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.845628	21 513	147 270
27	190	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	335.57	184	61 745
28	191	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	8.557035	21 513	184 087
29	192	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр100х100	т	0.33557	75 517	25 341
30	193	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.33557	391 444	131 357
31	194	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	335.57	7 414	2 487 916
32	195	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	342.2814	3 632	1 243 166
33	196	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	292.79	1 592	466 122
34	197	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	177.43074	1 416	251 242
			Итого по подразделу: Тип 8				**6 538 142**
			Подраздел: Тип 10				
35	198	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	20.61	1 663	34 274
36	199	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0.840888	35 879	30 169
37	200	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	20.61	1 828	37 675
38	201	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.420444	21 513	9 045
39	202	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	20.61	221	4 555
40	203	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.630666	21 513	13 568
41	204	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр100х100	т	0.02061	75 517	1 555

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	205	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02061	391 444	8 068
43	206	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	20.61	2 874	59 233
44	207	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	20.61	235	4 843
45	208	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	78.318	112	8 772
46	209	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	20.61	2 208	45 506
47	210	233-101-0107РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	23.0832	3 215	74 212
48	211	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	18.36	1 833	33 654
			Итого по подразделу: Тип 10				**365 132**
			Подраздел: Тип 13				
49	212	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	33.365	30 054	1 002 752
50	213	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	333.65	365	121 782
51	214	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	33.365	25 159	839 430
52	215	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	34.0323	26 127	889 162
53	216	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	0.9175375	75 517	69 290
54	217	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.9175375	391 444	359 165
55	218	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	333.65	1 828	609 912
56	219	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.80646	21 513	146 427
57	220	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	333.65	221	73 737
58	221	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10.20969	21 513	219 641

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	222	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.33365	75 517	25 196
60	223	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.33365	391 444	130 605
61	224	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	333.65	2 874	958 910
62	225	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	333.65	353	117 778
63	226	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1901.805	112	213 002
64	227	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	333.65	2 208	736 699
65	228	233-101-0403СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	373.688	24 975	9 332 858
66	229	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	110.07	1 833	201 758
			Итого по подразделу: Тип 13				**16 048 104**
			Подраздел: Тип 14				
67	230	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	53.37	1 663	88 754
68	231	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.177496	35 879	78 125
69	232	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	53.37	1 828	97 560
70	233	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.088748	21 513	23 422
71	234	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	53.37	147	7 845
72	235	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.088748	21 513	23 422
73	236	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.05337	75 517	4 030
74	237	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.05337	391 444	20 891
75	238	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	53.37	2 874	153 385

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	239	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	53.37	353	18 840
77	240	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	304.209	112	34 071
78	241	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	53.37	2 208	117 841
79	242	233-101-0403СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	59.7744	24 975	1 492 866
80	243	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	56.22	1 833	103 051
			Итого по подразделу: Тип 14				**2 264 104**
			Подраздел: Тип 15				
81	244	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	89.45	1 663	148 755
82	245	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.73717	35 879	98 207
83	246	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	89.45	1 828	163 515
84	247	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.82478	21 513	39 256
85	248	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	89.45	184	16 459
86	249	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.280975	21 513	49 071
87	250	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.08945	75 517	6 755
88	251	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.08945	391 444	35 015
89	252	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя	м2	89.45	5 385	481 688
90	253	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	89.45	7 414	663 182
91	254	231-302-0102РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м2	91.239	2 938	268 060
92	255	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	140.72	1 592	224 026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	256	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	85.27632	1 416	120 751
			Итого по подразделу: Тип 15				**2 314 740**
			Подраздел: Тип 8				
94	257	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	240.25	1 663	399 536
95	258	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7.35165	35 879	263 770
96	259	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	240.25	1 828	439 177
97	260	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.9011	21 513	105 437
98	261	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	240.25	184	44 206
99	262	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.126375	21 513	131 797
100	263	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.24025	75 517	18 143
101	264	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.24025	391 444	94 044
102	265	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	240.25	7 414	1 781 214
103	266	231-302-0102РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м2	245.055	2 938	719 972
104	267	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	210.77	1 592	335 546
105	268	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	127.72662	1 416	180 861
			Итого по подразделу: Тип 8				**4 513 703**
			Подраздел: Тип 10				
106	269	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	64.97	1 663	108 045
107	270	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.988082	35 879	71 330
108	271	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	64.97	1 828	118 765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	272	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.325388	21 513	28 513
110	273	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	64.97	147	9 551
111	274	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.325388	21 513	28 513
112	275	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.06497	75 517	4 906
113	276	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06497	391 444	25 432
114	277	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	64.97	2 874	186 724
115	278	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	64.97	235	15 268
116	279	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	246.886	112	27 651
117	280	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	64.97	2 208	143 454
118	281	233-101-0403СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	72.7664	24 975	1 817 341
119	282	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	68.69	1 833	125 909
			Итого по подразделу: Тип 10				**2 711 402**
			Подраздел: Тип 14				
120	283	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	117.42	1 663	195 269
121	284	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	3.593052	35 879	128 915
122	285	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	117.42	1 828	214 644
123	286	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.395368	21 513	51 531
124	287	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	117.42	74	8 689
125	288	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.395368	21 513	51 531

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	289	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.11742	75 517	8 867
127	290	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.11742	391 444	45 963
128	291	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	117.42	2 874	337 465
129	292	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	117.42	353	41 449
130	293	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	669.294	112	74 961
131	294	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	117.42	2 208	259 263
132	295	233-101-0403СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	131.5104	24 975	3 284 472
133	296	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	51.15	1 833	93 758
			Итого по подразделу: Тип 14				**4 796 779**
			Подраздел: Тип 15				
134	297	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	61.08	1 663	101 576
135	298	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.869048	35 879	67 060
136	299	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	61.08	1 828	111 654
137	300	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.246032	21 513	26 806
138	301	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	61.08	111	6 780
139	302	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.180556	21 513	46 910
140	303	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.06108	75 517	4 613
141	304	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06108	391 444	23 909
142	305	6111-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм	м2	61.08	1 552	94 796

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	306	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	61.08	7 414	452 847
144	307	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	62.3016	3 632	226 279
145	308	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	108.46	1 592	172 668
146	309	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	65.72676	1 416	93 069
			Итого по подразделу: Тип 15				**1 428 967**
			Подраздел: Тип 8				
147	310	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	220.84	1 663	367 257
148	311	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	6.757704	35 879	242 460
149	312	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	220.84	1 828	403 696
150	313	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.505136	21 513	96 918
151	314	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	220.84	184	40 635
152	315	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.63142	21 513	121 149
153	316	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.22084	75 517	16 677
154	317	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.22084	391 444	86 446
155	318	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	220.84	7 414	1 637 308
156	319	231-302-0102РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м2	225.2568	2 938	661 804
157	320	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	134.83	1 592	214 649
158	321	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	81.70698	1 416	115 697
			Итого по подразделу: Тип 8				**4 004 697**
			Подраздел: Тип 9. коридор				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	322	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	68.77	1 663	114 365
160	323	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.104362	35 879	75 502
161	324	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	68.77	1 828	125 712
162	325	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.402908	21 513	30 181
163	326	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	68.77	221	15 198
164	327	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.104362	21 513	45 271
165	328	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.06877	75 517	5 193
166	329	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06877	391 444	26 920
167	330	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	68.77	2 874	197 644
168	331	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	68.77	588	40 437
169	332	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	653.315	112	73 171
			Итого по подразделу: Тип 9. коридор				**749 595**
			Подраздел: Тип 10				
170	336	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	49.71	1 663	82 668
171	337	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.028168	35 879	72 769
172	338	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	49.71	1 828	90 870
173	339	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.014084	21 513	21 816
174	340	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	49.71	184	9 147
175	341	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.267605	21 513	27 270

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	342	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.04971	75 517	3 754
177	343	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04971	391 444	19 459
178	344	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	49.71	2 874	142 867
179	345	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	49.71	235	11 682
180	346	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	188.898	112	21 157
181	347	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со сваривanием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	49.71	2 208	109 760
182	348	233-101-0107РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43	м2	55.6752	3 215	178 996
183	349	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	29.15	1 833	53 432
			Итого по подразделу: Тип 10				**845 647**
			Подраздел: Тип 15				
184	350	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	37.18	1 663	61 830
185	351	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.137708	35 879	40 820
186	352	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	37.18	1 828	67 965
187	353	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.758472	21 513	16 317
188	354	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	37.18	111	4 127
189	355	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.568854	21 513	12 238
190	356	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.03718	75 517	2 808
191	357	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03718	391 444	14 553
192	358	6111-0403-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм	м2	37.18	1 552	57 703

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	359	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	37.18	7 414	275 653
194	360	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	37.9236	3 632	137 739
195	361	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	57.52	1 592	91 572
196	362	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	34.85712	1 416	49 358
			Итого по подразделу: Тип 15				**832 684**
			Подраздел: Тип 23				
197	363	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	60.85	1 663	101 194
198	364	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	3.10335	35 879	111 345
199	365	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	5.4765	36 459	199 668
200	366	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.3438025	75 517	25 963
201	367	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.3438025	391 444	134 579
202	368	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	60.85	7 430	452 116
203	369	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	60.85	5 171	314 655
			Итого по подразделу: Тип 23				**1 339 520**
			Подраздел: Тип 19				
204	370	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	26.89	1 828	49 155
205	371	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.548556	21 513	11 801
206	372	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	26.89	478	12 853
207	373	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.782807	21 513	38 354

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
208	374	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.02689	75 517	2 030
209	375	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02689	391 444	10 526
210	376	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	26.89	7 414	199 362
211	377	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	27.4278	3 632	99 618
			Итого по подразделу: Тип 19				**423 700**
			Подраздел: Тип 20				
212	378	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	34.75	1 828	63 523
213	379	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.7089	21 513	15 251
214	380	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	34.75	111	3 857
215	381	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.531675	21 513	11 438
216	382	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	34.75	7 414	257 636
217	383	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	35.445	3 632	128 736
			Итого по подразделу: Тип 20				**480 441**
			Итого по разделу: Полы РП15				**52 530 121**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Б, Д				**52 530 121**
			ИТОГО по акту:				**52 530 121**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	52530121.325 x 6.20%	3 256 867
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	52530121.325 + 3256867.422	55 786 988
	Сметная прибыль, 5.00%	55786988.747 x 5.00%	2 789 349
	Непредвиденные расходы, 5.000%	55786988.747 x 5.000%	2 789 349
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		61 365 687
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	61365687.622 x 1.0557	64 783 756
	НДС (12%)	64783756.422 x 12%	7 774 050
	Итого с НДС	64783756.422 + 7774050.771	72 557 807

Лист согласования
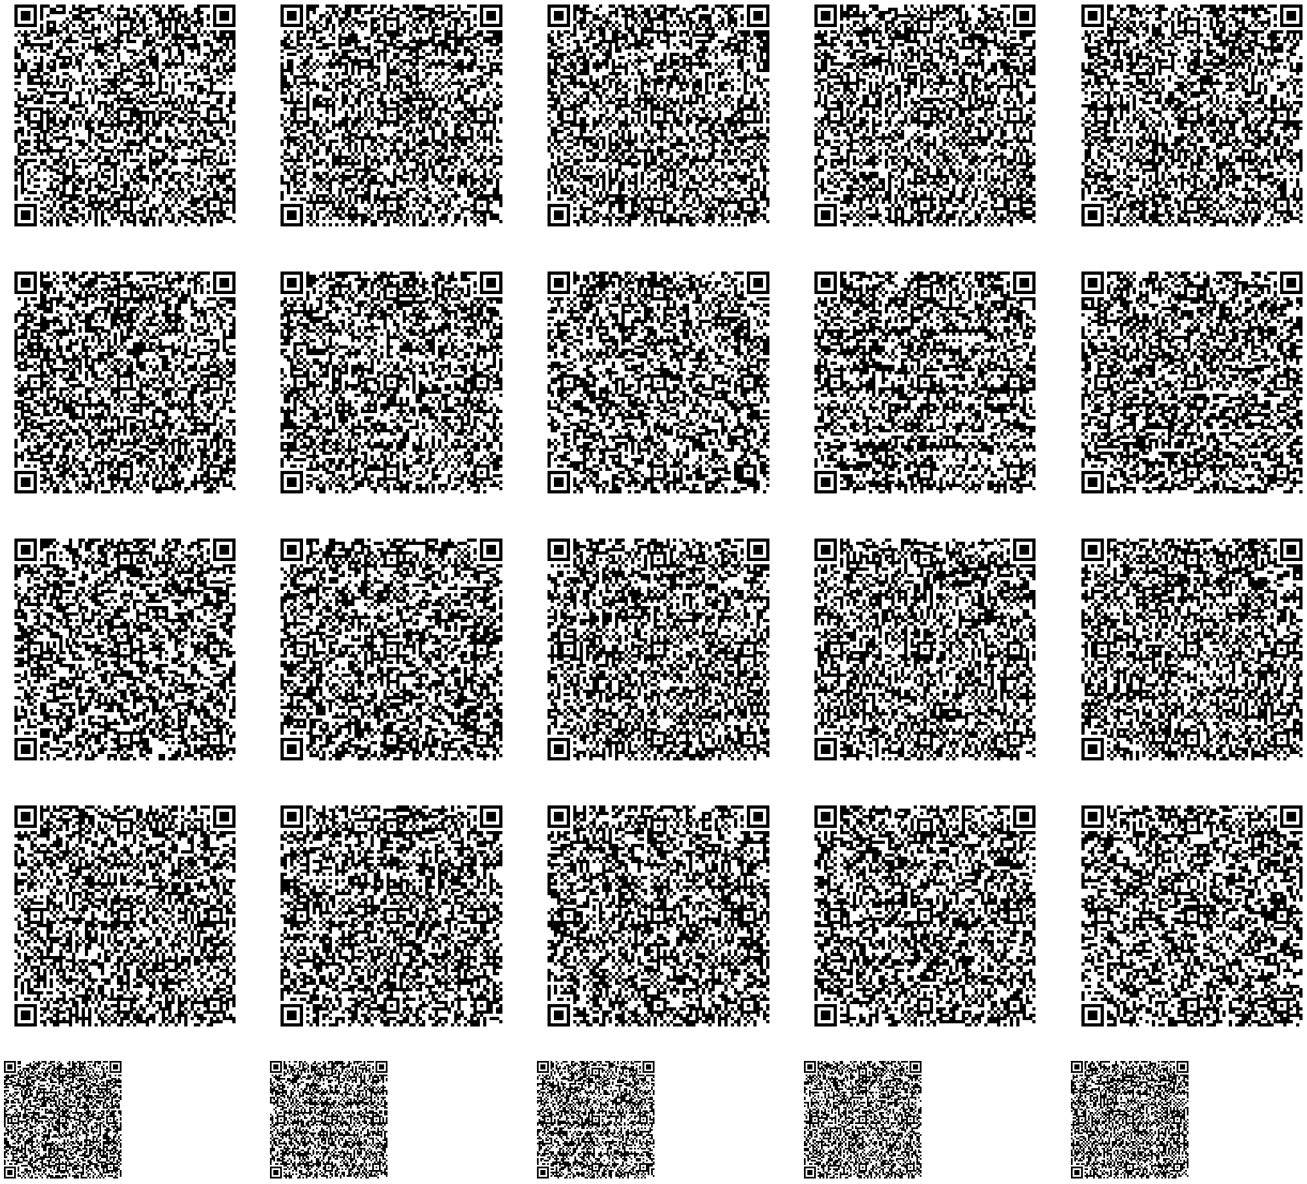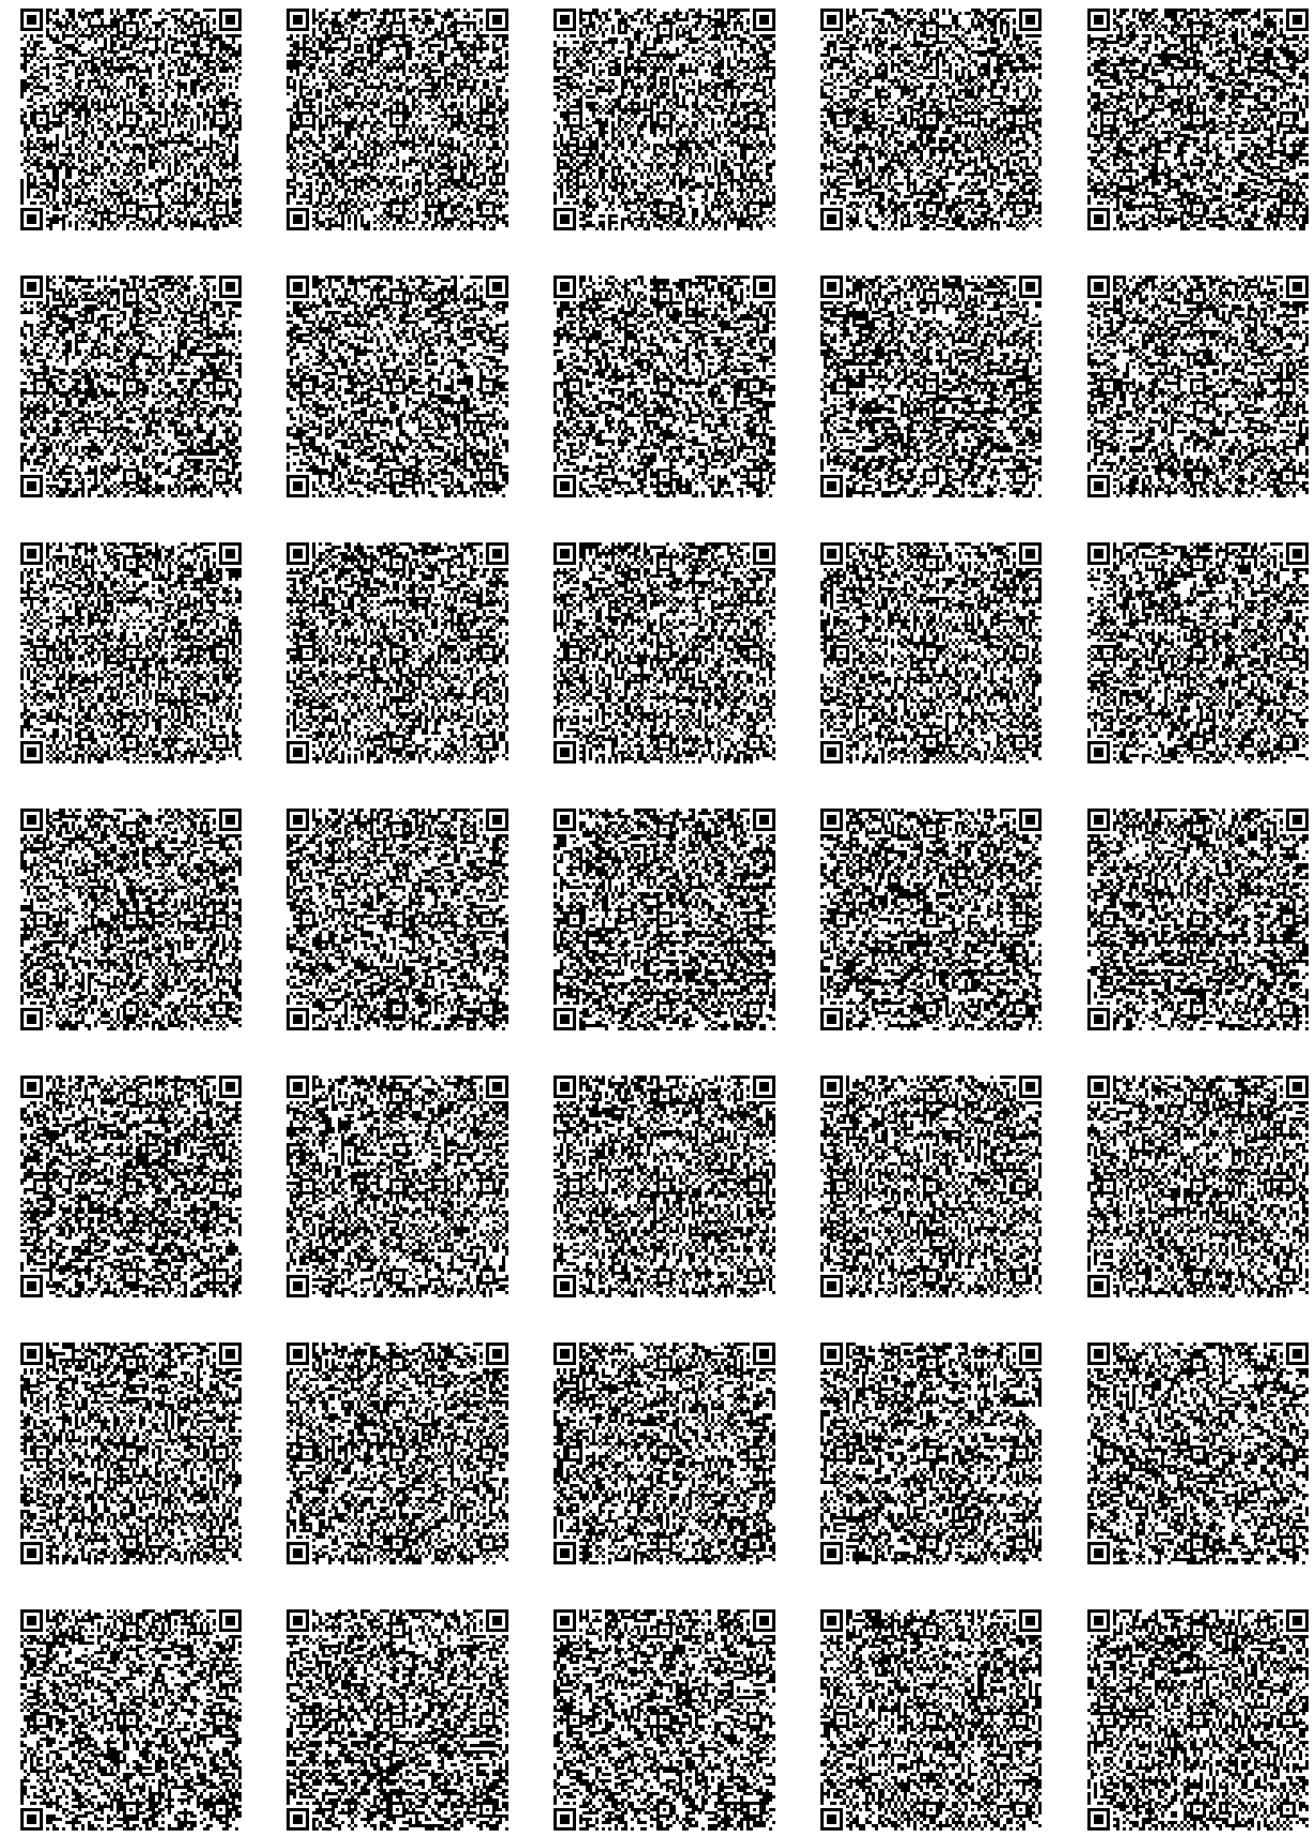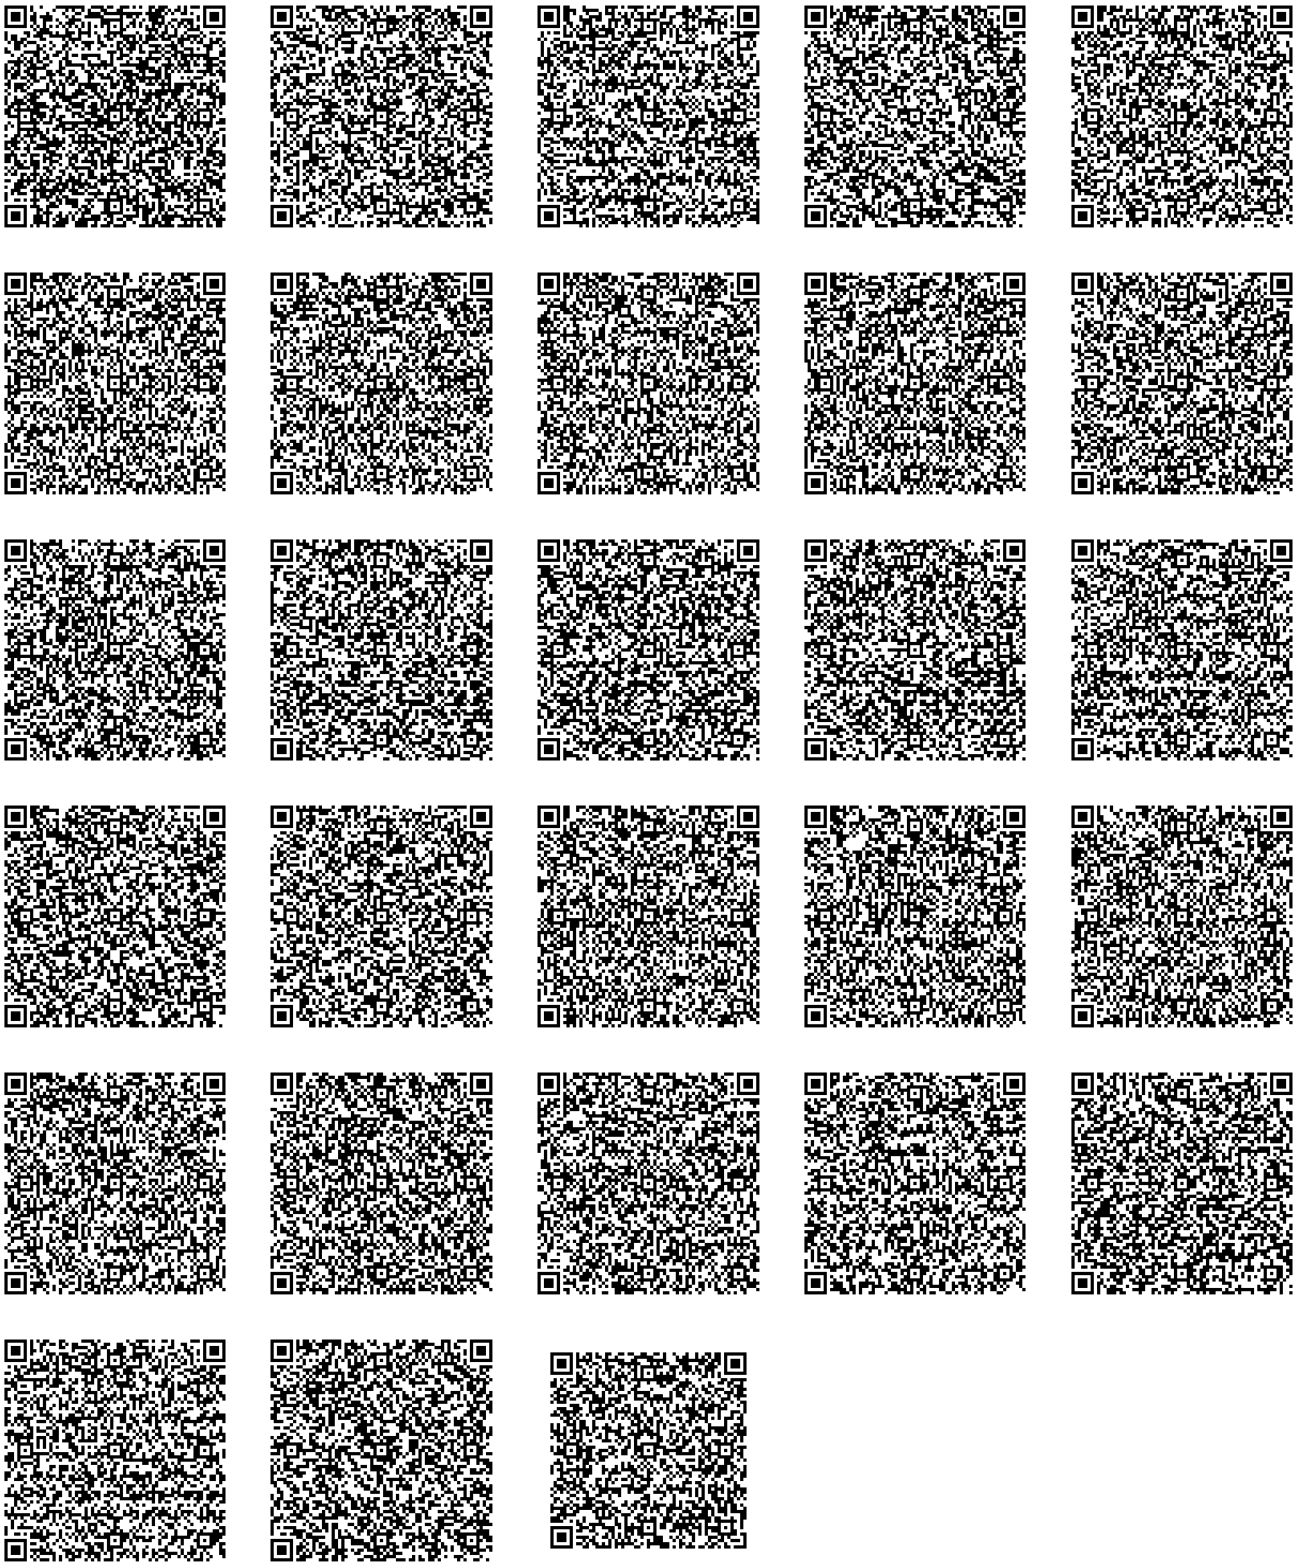
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	20.12.2024 05:56
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	21.12.2024 05:44
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	20.12.2024 06:36
Представители заказчика		
750406301328 - ТУЛЕГЕНОВ АСЛАНБЕК null	Директор	23.12.2024 11:47
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	23.12.2024 07:34 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	21.12.2024 06:41
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	23.12.2024 07:36
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	23.12.2024 10:50 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
