ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20250116-40197292
1.1. **Номер учетной системы** 00000000005
2. **Дата выписки** 16.01.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 15.01.2025
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
18. Адрес места нахождения
г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 090340012961
26.2 Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
26.3 Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 117
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.06.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			136 734 869,64	136 734 869,64		0	136 734 869,64	12%	16 408 184,36	153 143 054			1		
				Всего по счету						**136 734 869,64**			**136 734 869,64**		**16 408 184,36**	**153 143 054**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
9tSmq4iZH9B6BAMWv43hOr+RnBzyPhEPvzbuFlJ5NbgrDNwS273IIt7yY2ifRcPtJwMZVKF4uRl2ufkSG3UDDvPYQ7vqwDnjhDRMOgh0cWLGw5S
WmKn90aVSHv5VfC+XtdPOy8weMBWUiYIxHNbNhZoGr0qJc2iCSIIg7fRDK/0=
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024: №7 от 30.12.2024.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 457 159 085	153 143 054	2 193 892 040,18				263 267 044,82	2 457 159 085
в том числе: за январь месяц 2025 года	153 143 054	153 143 054	136 734 869,64				16 408 184,36	153 143 054

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#dbd12270-08a6-4f25-87ab-55e910f5a7eb)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №92	Архитектурные решения Блок Г,Ж	109 575 088
2	Акт №93	Архитектурные решения Блок Л	43 567 966
		ИТОГО	**153 143 054**

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#dbd12270-08a6-4f25-87ab-55e910f5a7eb)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 16.01.2025 15:11
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 16.01.2025 11:53
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 17.01.2025 10:01
Заказчик: ИИН 870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ null	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	Подписано: 16.01.2025 15:51

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#dbd12270-08a6-4f25-87ab-55e910f5a7eb)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#dbd12270-08a6-4f25-87ab-55e910f5a7eb)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#dbd12270-08a6-4f25-87ab-55e910f5a7eb)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Л				
			Раздел: Полы АР-15				
			Подраздел: Тип 7				
1	117	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	4.65	1 828	8 500
2	118	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.09486	21 513	2 041
3	119	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	4.65	111	516
4	120	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.071145	21 513	1 531
5	121	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0127875	75 517	966
6	122	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0127875	391 444	5 006
7	123	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	4.65	3 324	15 457
8	124	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	4.65	7 414	34 475
9	125	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	4.743	3 632	17 227
10	126	СТРСНБ РК 2022	Грязезащитная решетка, алюминиевая, верхний слой резина + текстиль - до 20мм.	шт	4.65	56 676	263 546

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	127	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	9.06	1 592	14 424
12	128	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	5.49036	1 416	7 774
			Итого по подразделу: Тип 7				**371 463**
			Подраздел: Тип 8				
13	129	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	177.84	1 663	295 748
14	130	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5.441904	35 879	195 250
15	131	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	177.84	1 828	325 092
16	132	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.627936	21 513	78 048
17	133	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	177.84	111	19 740
18	134	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.720952	21 513	58 536
19	135	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.17784	75 517	13 429
20	136	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.17784	391 444	69 614
21	137	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	177.84	7 414	1 318 506
22	138	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	181.3968	3 632	658 833
23	139	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	145.84	1 592	232 177
24	140	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	88.37904	1 416	125 145
			Итого по подразделу: Тип 8				**3 390 119**
			Подраздел: Тип 10				
25	141	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	323.95	1 663	538 729
26	142	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	9.91287	35 879	355 664

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	143	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	323.95	1 828	592 181
28	144	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.60858	21 513	142 170
29	145	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	323.95	147	47 621
30	146	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.60858	21 513	142 170
31	147	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.32395	75 517	24 464
32	148	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.32395	391 444	126 808
33	149	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	323.95	2 874	931 032
34	150	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	323.95	235	76 128
35	151	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1231.01	112	137 873
36	152	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	323.95	2 208	715 282
37	153	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	362.824	3 354	1 216 912
38	154	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	169.07	1 833	309 905
			Итого по подразделу: Тип 10				**5 356 939**
			Подраздел: Тип 15				
39	155	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	26.27	1 663	43 687
40	156	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0.803862	35 879	28 842
41	157	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	26.27	1 828	48 022
42	158	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.535908	21 513	11 529
43	159	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	26.27	111	2 916

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	160	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.401931	21 513	8 647
45	161	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.02627	75 517	1 984
46	162	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.02627	391 444	10 283
47	163	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	26.27	7 414	194 766
48	164	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	26.7954	3 632	97 321
49	165	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	56.78	1 592	90 394
50	166	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	34.40868	1 416	48 723
			Итого по подразделу: Тип 15				**587 114**
			Подраздел: Тип 8				
51	167	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	169.45	1 663	281 795
52	168	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5.18517	35 879	186 039
53	169	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	169.45	1 828	309 755
54	170	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.45678	21 513	74 366
55	171	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	169.45	111	18 809
56	172	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.592585	21 513	55 774
57	173	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.16945	75 517	12 796
58	174	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.16945	391 444	66 330
59	175	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	169.45	7 414	1 256 302
60	176	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	172.839	3 632	627 751

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	177	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	142.23	1 592	226 430
62	178	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	86.19138	1 416	122 047
			Итого по подразделу: Тип 8				**3 238 194**
			Подраздел: Тип 10				
63	179	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	275.67	1 663	458 439
64	180	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8.435502	35 879	302 657
65	181	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	275.67	1 828	503 925
66	182	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.623668	21 513	120 982
67	183	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	275.67	147	40 523
68	184	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.623668	21 513	120 982
69	185	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.27567	75 517	20 818
70	186	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.27567	391 444	107 909
71	187	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	275.67	2 874	792 276
72	188	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	275.67	235	64 782
73	189	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1047.546	112	117 325
74	190	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	275.67	2 208	608 679
75	191	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	308.7504	3 354	1 035 549
76	192	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	154.12	1 833	282 502
			Итого по подразделу: Тип 10				**4 577 348**
			Подраздел: Тип 11				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	193	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	46.27	1 663	76 947
78	194	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.415862	35 879	50 800
79	195	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	46.27	1 828	84 582
80	196	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.943908	21 513	20 306
81	197	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	46.27	147	6 802
82	198	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.943908	21 513	20 306
83	199	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.04627	75 517	3 494
84	200	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04627	391 444	18 112
85	201	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	46.27	2 874	132 980
86	202	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	46.27	235	10 873
87	203	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	175.826	112	19 693
88	204	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	46.27	2 208	102 164
89	205	233-101-0409СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S	м2	51.8224	24 403	1 264 622
90	206	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	28.9	1 833	52 974
			Итого по подразделу: Тип 11				**1 864 655**
			Подраздел: Тип 15				
91	207	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	34.09	1 663	56 692
92	208	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.043154	35 879	37 427
93	209	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	34.09	1 828	62 317

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	210	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.695436	21 513	14 961
95	211	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	34.09	111	3 784
96	212	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.521577	21 513	11 221
97	213	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.03409	75 517	2 574
98	214	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03409	391 444	13 344
99	215	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	34.09	7 414	252 743
100	216	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	34.7718	3 632	126 291
101	217	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	65.25	1 592	103 878
102	218	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	39.5415	1 416	55 991
			Итого по подразделу: Тип 15				**741 223**
			Подраздел: Тип 8				
103	219	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	179.18	1 663	297 976
104	220	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	5.482908	35 879	196 721
105	221	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	179.18	1 828	327 541
106	222	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.655272	21 513	78 636
107	223	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	179.18	111	19 889
108	224	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.741454	21 513	58 977
109	225	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.17918	75 517	13 531
110	226	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.17918	391 444	70 139

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	227	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	179.18	7 414	1 328 441
112	228	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	182.7636	3 632	663 797
113	229	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	130.97	1 592	208 504
114	230	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	79.36782	1 416	112 385
			Итого по подразделу: Тип 8				**3 376 537**
			Подраздел: Тип 10				
115	231	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	308.04	1 663	512 271
116	232	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	9.426024	35 879	338 195
117	233	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	308.04	1 828	563 097
118	234	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.284016	21 513	135 188
119	235	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	308.04	147	45 282
120	236	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.284016	21 513	135 188
121	237	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.30804	75 517	23 262
122	238	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.30804	391 444	120 580
123	239	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	308.04	2 874	885 307
124	240	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	308.04	235	72 389
125	241	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1170.552	112	131 102
126	242	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	308.04	2 208	680 152
127	243	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	345.0048	3 354	1 157 146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	244	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	164.43	1 833	301 400
			Итого по подразделу: Тип 10				**5 100 560**
			Подраздел: Тип 15				
129	245	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	38.28	1 663	63 660
130	246	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.171368	35 879	42 028
131	247	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	38.28	1 828	69 976
132	248	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.780912	21 513	16 800
133	249	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	38.28	111	4 249
134	250	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.585684	21 513	12 600
135	251	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.03828	75 517	2 891
136	252	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03828	391 444	14 984
137	253	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	38.28	7 414	283 808
138	254	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	39.0456	3 632	141 814
139	255	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	63.04	1 592	100 360
140	256	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	38.20224	1 416	54 094
			Итого по подразделу: Тип 15				**807 264**
			Подраздел: Тип 19				
141	257	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	41.9	1 828	76 593
142	258	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.85476	21 513	18 388
143	259	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	41.9	478	20 028

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	260	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.77797	21 513	59 762
145	261	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0419	75 517	3 164
146	262	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0419	391 444	16 402
147	263	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	41.9	7 414	310 647
148	264	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	42.738	3 632	155 224
149	265	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	59.9	1 592	95 361
150	266	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	36.2994	1 416	51 400
			Итого по подразделу: Тип 19				**806 969**
			Подраздел: Тип 20				
151	267	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	15.95	1 828	29 157
152	268	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.32538	21 513	7 000
153	269	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	15.95	111	1 770
154	270	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.244035	21 513	5 250
155	271	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	15.95	7 414	118 253
156	272	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	16.269	3 632	59 089
157	273	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	30.72	1 592	48 906
158	274	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	18.61632	1 416	26 361
			Итого по подразделу: Тип 20				**295 786**
			Подраздел: Отделка лестницы				
159	275	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней плитами керамогранитными	м2	53.52	12 557	672 051

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
160	276	231-302-0501РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	55.1256	6 457	355 946
			Итого по подразделу: Отделка лестницы				**1 027 997**
			Итого по разделу: Полы АР-15				**31 542 168**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Л				**31 542 168**
			ИТОГО по акту:				**31 542 168**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	31542168.325 x 6.20%	1 955 614
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	31542168.325 + 1955614.376	33 497 782
	Сметная прибыль, 5.00%	33497782.701 x 5.00%	1 674 889
	Непредвиденные расходы, 5.000%	33497782.701 x 5.000%	1 674 889
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		36 847 560
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	36847560.971 x 1.0557	38 899 970
	НДС (12%)	38899970.117 x 12%	4 667 996
	Итого с НДС	38899970.117 + 4667996.414	43 567 966

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	09.01.2025 05:06
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	10.01.2025 08:35
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	11.01.2025 08:11
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	13.01.2025 07:32
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	15.01.2025 12:16 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	15.01.2025 12:24
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	14.01.2025 06:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	14.01.2025 06:37

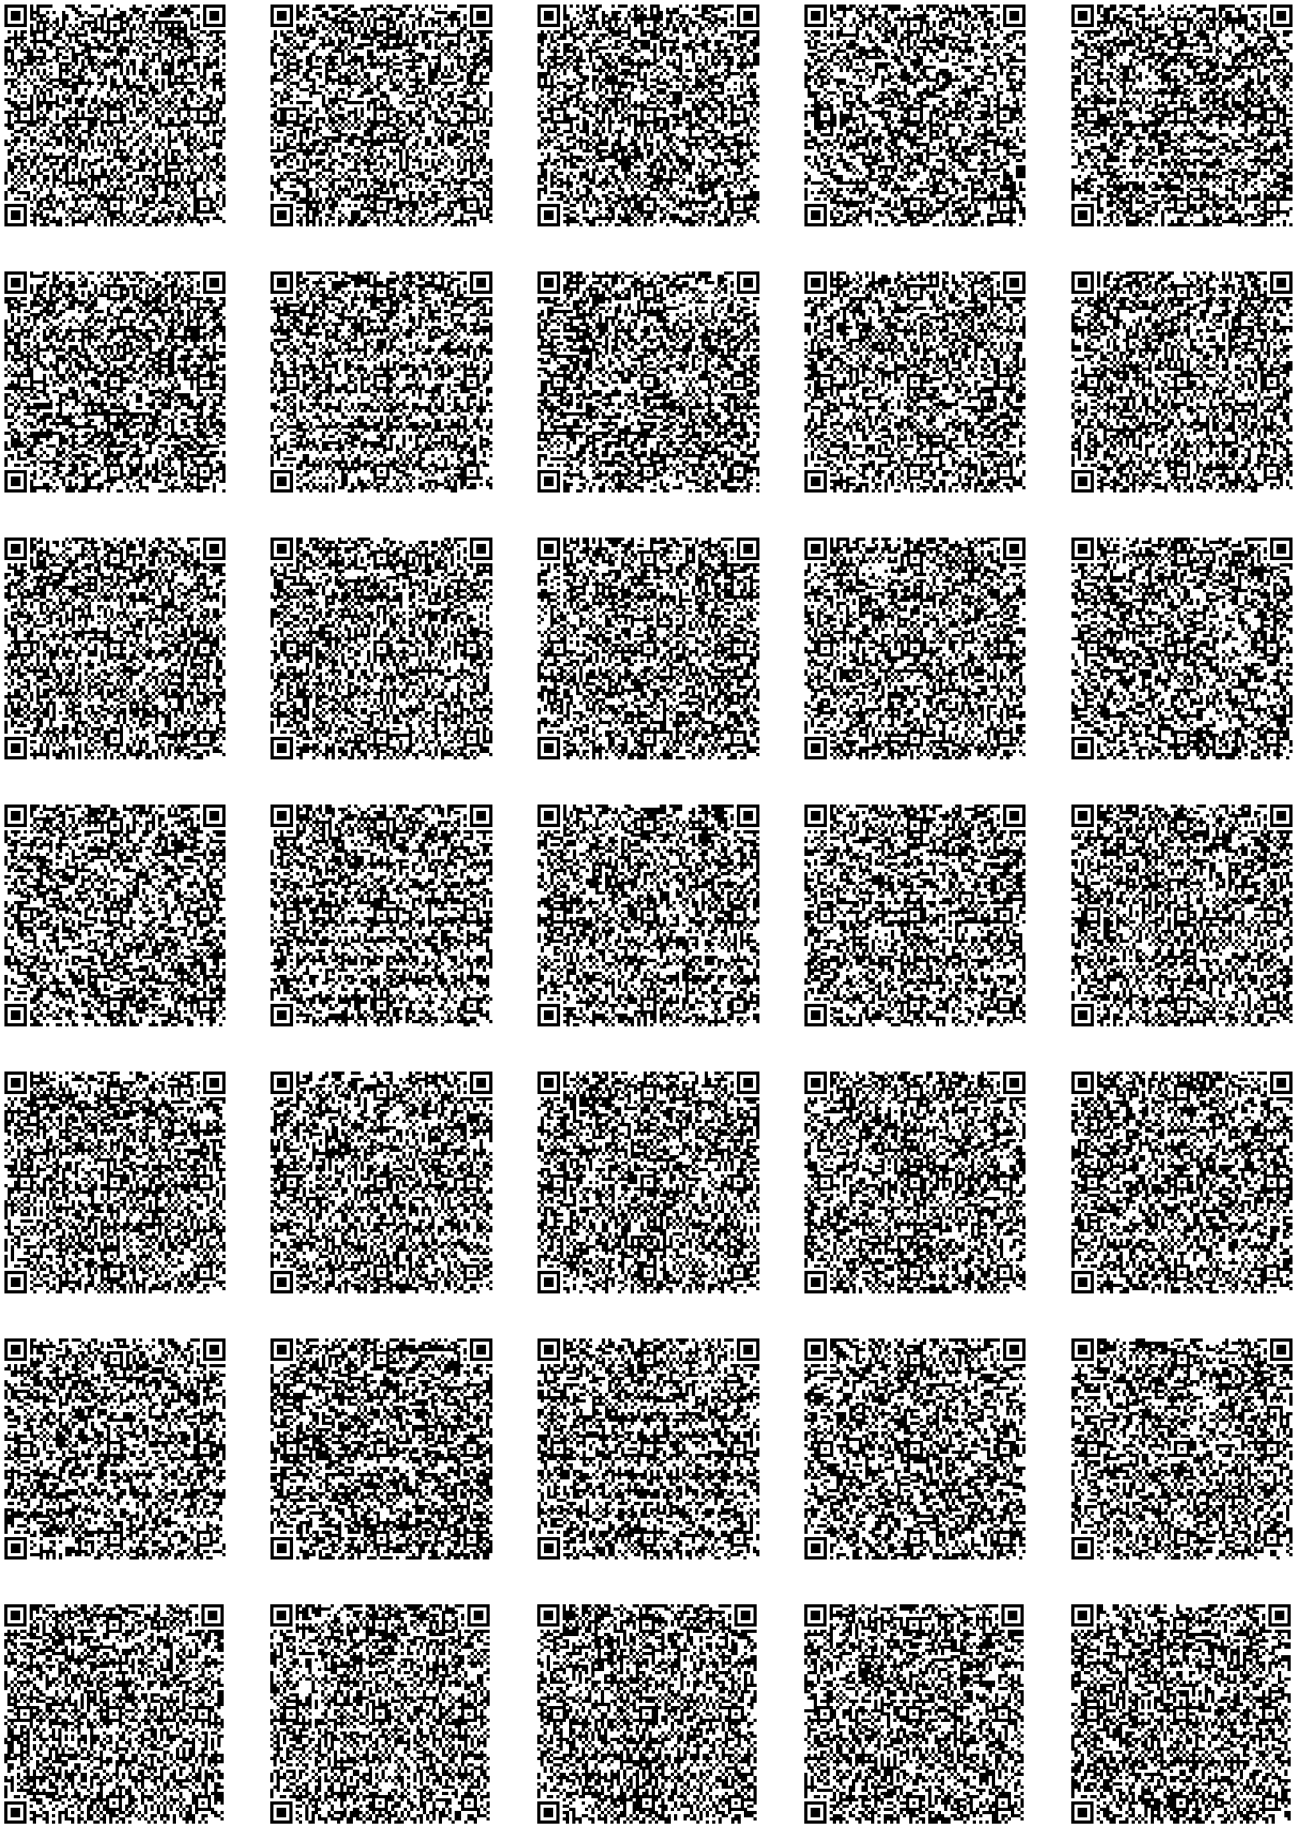

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				
			Раздел: Полы АР-17				
			Подраздел: Тип 3				
1	147	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	20.75	7 430	154 172
2	148	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	20.75	5 171	107 298
3	149	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	18.26	735	13 421
			Итого по подразделу: Тип 3				**274 891**
			Подраздел: Тип 5				
4	162	6109-0202-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм	м2	53.72	7 430	399 140
5	163	6109-0202-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203	м2	53.72	5 171	277 786
6	164	6109-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из раствора цементного	м	46.12	735	33 898
			Итого по подразделу: Тип 5				**710 824**
			Подраздел: Тип 7				
7	165	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	17.53	1 828	32 045

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	166	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.357612	21 513	7 693
9	167	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	17.53	111	1 946
10	168	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.268209	21 513	5 770
11	169	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0482075	75 517	3 640
12	170	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0482075	391 444	18 871
13	171	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	17.53	3 324	58 270
14	172	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	17.53	7 414	129 967
15	173	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	17.8806	3 632	64 942
16	174	СТПереченьРСНБ РК 2022	Грязезащитная решетка, алюминиевая, верхний слой резина + текстиль - до 20мм.	шт	17.53	56 676	993 538
17	175	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	18.57	1 592	29 563
18	176	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	11.25342	1 416	15 935
			Итого по подразделу: Тип 7				**1 362 180**
			Подраздел: Тип 8				
19	177	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	461.29	1 663	767 125
20	178	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	14.115474	35 879	506 449
21	179	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	461.29	1 828	843 238
22	180	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9.410316	21 513	202 444
23	181	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	461.29	111	51 203
24	182	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7.057737	21 513	151 833

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	183	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.46129	75 517	34 835
26	184	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.46129	391 444	180 569
27	185	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	461.29	7 414	3 420 004
28	186	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	470.5158	3 632	1 708 913
29	187	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	309.13	1 592	492 135
30	188	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	187.33278	1 416	265 263
			Итого по подразделу: Тип 8				**8 624 011**
			Подраздел: Тип 9				
31	197	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	62.4	2 874	179 338
32	198	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	62.4	588	36 691
33	199	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	592.8	112	66 394
34	200	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее	м2	62.4	3 279	204 610
35	201	233-202-0604СпрСЦ 02.2024	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,4 мм, класс 33 типа IVC	м2	63.648	17 144	1 091 181
36	202	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	32.98	631	20 810
			Итого по подразделу: Тип 9				**1 599 024**
			Подраздел: Тип 10				
37	203	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	67.49	1 663	112 236
38	204	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.065194	35 879	74 097
39	205	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	67.49	1 828	123 372

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	206	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.376796	21 513	29 619
41	207	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	67.49	147	9 921
42	208	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.376796	21 513	29 619
43	209	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.06749	75 517	5 097
44	210	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.06749	391 444	26 419
45	211	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	67.49	2 874	193 966
46	212	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	67.49	235	15 860
47	213	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	256.462	112	28 724
48	214	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	67.49	2 208	149 018
49	215	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	75.5888	3 354	253 524
50	216	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	67.86	1 833	124 387
			Итого по подразделу: Тип 10				**1 175 860**
			Подраздел: Тип 13				
51	217	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	65.437	30 054	1 966 644
52	218	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	654.37	365	238 845
53	219	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	65.437	25 159	1 646 329
54	220	212-101-2009РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	66.74574	26 127	1 743 866
55	221	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 200х200	т	1.7995175	75 517	135 894
56	222	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1.7995175	391 444	704 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	223	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	654.37	1 828	1 196 188
58	224	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13.349148	21 513	287 180
59	225	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	654.37	221	144 616
60	226	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	20.023722	21 513	430 770
61	227	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.65437	75 517	49 415
62	228	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.65437	391 444	256 149
63	229	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	654.37	2 874	1 880 659
64	230	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	654.37	353	230 993
65	231	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	3729.909	112	417 750
66	232	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	654.37	2 208	1 444 849
67	233	233-101-0403СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	732.8944	24 975	18 304 038
68	234	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	110.84	1 833	203 170
			Итого по подразделу: Тип 13				**31 281 766**
			Подраздел: Тип 14				
69	235	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	34.14	1 663	56 775
70	236	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.044684	35 879	37 482
71	237	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	34.14	1 828	62 407
72	238	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.696456	21 513	14 983
73	239	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	34.14	74	2 526

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	240	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.348228	21 513	7 491
75	241	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.03414	75 517	2 578
76	242	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03414	391 444	13 364
77	243	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	34.14	2 874	98 118
78	244	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	34.14	235	8 023
79	245	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	34.14	2 208	75 381
80	246	233-101-0403СпрСЦ 02.2024	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79 коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme	м2	38.2368	24 975	954 964
81	247	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	36.36	1 833	66 648
			Итого по подразделу: Тип 14				**1 400 741**
			Подраздел: Тип 15				
82	248	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	85.36	1 663	141 954
83	249	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	2.612016	35 879	93 717
84	250	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	85.36	1 828	156 038
85	251	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.741344	21 513	37 462
86	252	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	85.36	111	9 475
87	253	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.306008	21 513	28 096
88	254	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.08536	75 517	6 445
89	255	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.08536	391 444	33 414
90	256	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	85.36	3 324	283 737

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	257	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	85.36	7 414	632 859
92	258	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	87.0672	3 632	316 228
93	259	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	162.21	1 592	258 238
94	260	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	98.29926	1 416	139 192
			Итого по подразделу: Тип 15				**2 136 856**
			Подраздел: Тип 8				
95	261	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	267.45	1 663	444 769
96	262	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	8.18397	35 879	293 633
97	263	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	267.45	1 828	488 899
98	264	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.45598	21 513	117 374
99	265	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	267.45	111	29 687
100	266	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.091985	21 513	88 031
101	267	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.26745	75 517	20 197
102	268	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.26745	391 444	104 692
103	269	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	267.45	7 414	1 982 874
104	270	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	272.799	3 632	990 806
105	271	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	153.65	1 592	244 611
106	272	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	93.1119	1 416	131 846
			Итого по подразделу: Тип 8				**4 937 419**
			Подраздел: Тип 9				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	273	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	133.26	1 663	221 611
108	274	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.359252	35 879	48 769
109	275	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	133.26	1 828	243 599
110	276	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.718504	21 513	58 482
111	277	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	133.26	221	29 450
112	278	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.077756	21 513	87 725
113	279	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.13326	75 517	10 063
114	280	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.13326	391 444	52 164
115	281	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	133.26	2 874	382 989
116	282	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	133.26	588	78 357
117	283	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	1265.97	112	141 789
118	284	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее	м2	133.26	3 279	436 960
119	285	233-202-0604СпрСЦ 02.2024	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,4 мм, класс 33 типа IVC	м2	135.9252	17 144	2 330 302
120	286	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	68.2	631	43 034
			Итого по подразделу: Тип 9				**4 165 295**
			Подраздел: Тип 10				
121	287	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	245.38	1 663	408 067
122	288	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7.508628	35 879	269 402

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	289	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	245.38	1 828	448 555
124	290	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.005752	21 513	107 689
125	291	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	245.38	147	36 071
126	292	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	5.005752	21 513	107 689
127	293	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.24538	75 517	18 530
128	294	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.24538	391 444	96 053
129	295	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	245.38	2 874	705 222
130	296	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	245.38	235	57 664
131	297	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	932.444	112	104 434
132	298	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	245.38	2 208	541 799
133	299	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	274.8256	3 354	921 765
134	300	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	147.36	1 833	270 111
			Итого по подразделу: Тип 10				**4 093 051**
			Подраздел: Тип 11				
135	301	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	46.01	1 663	76 515
136	302	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.407906	35 879	50 514
137	303	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	46.01	1 828	84 106
138	304	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.938604	21 513	20 192
139	305	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	46.01	147	6 763

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
140	306	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.938604	21 513	20 192
141	307	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.04601	75 517	3 474
142	308	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04601	391 444	18 010
143	309	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	46.01	2 874	132 233
144	310	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	46.01	235	10 812
145	311	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	174.838	112	19 582
146	312	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	46.01	2 208	101 590
147	313	233-101-0108РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	51.5312	5 256	270 848
148	314	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	28.28	1 833	51 837
			Итого по подразделу: Тип 11				**866 669**
			Подраздел: Тип 15				
149	315	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	38.04	1 663	63 261
150	316	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.164024	35 879	41 764
151	317	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	38.04	1 828	69 537
152	318	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.776016	21 513	16 694
153	319	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	38.04	111	4 222
154	320	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.582012	21 513	12 520
155	321	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.03804	75 517	2 873
156	322	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.03804	391 444	14 891

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
157	324	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	38.04	7 414	282 029
158	325	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	38.8008	3 632	140 925
159	326	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	63.93	1 592	101 777
160	327	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	38.74158	1 416	54 858
			Итого по подразделу: Тип 15				**805 352**
			Подраздел: Тип 8				
161	328	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	231.36	1 663	384 752
162	329	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7.079616	35 879	254 010
163	330	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	231.36	1 828	422 926
164	331	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.719744	21 513	101 536
165	332	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	231.36	111	25 681
166	333	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.539808	21 513	76 152
167	334	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.23136	75 517	17 472
168	335	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.23136	391 444	90 564
169	336	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	231.36	7 414	1 715 303
170	337	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	235.9872	3 632	857 106
171	338	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	214.17	1 592	340 959
172	339	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	129.78702	1 416	183 778
			Итого по подразделу: Тип 8				**4 470 239**
			Подраздел: Тип 9				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
173	340	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	53.92	1 663	89 669
174	341	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	0.549984	35 879	19 733
175	342	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	53.92	1 828	98 566
176	343	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.099968	21 513	23 664
177	344	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	53.92	221	11 916
178	345	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.649952	21 513	35 495
179	346	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.05392	75 517	4 071
180	347	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.05392	391 444	21 107
181	348	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	53.92	2 874	154 966
182	349	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	53.92	588	31 704
183	350	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	512.24	112	57 371
184	351	6109-0308-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ковровых покрытий на клее	м2	53.92	3 279	176 804
185	352	233-202-0604СпрСЦ 02.2024	Плитка напольная модульная тафтинговая, толщиной 6,4 мм, класс 33 типа IVC	м2	54.9984	17 144	942 892
186	353	6109-0401-0802 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	30.12	631	19 006
			Итого по подразделу: Тип 9				**1 686 967**
			Подраздел: Тип 10				
187	354	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	242.84	1 663	403 843
188	355	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	7.430904	35 879	266 613

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	356	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	242.84	1 828	443 912
190	357	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.953936	21 513	106 573
191	358	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	242.84	147	35 697
192	359	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.953936	21 513	106 573
193	360	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.24284	75 517	18 339
194	361	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.24284	391 444	95 058
195	362	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	242.84	2 874	697 922
196	363	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	242.84	235	57 067
197	364	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	922.792	112	103 353
198	365	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	242.84	2 208	536 191
199	366	233-101-0106РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	271.9808	3 354	912 224
200	367	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	145.82	1 833	267 288
			Итого по подразделу: Тип 10				**4 050 655**
			Подраздел: Тип 11				
201	368	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	46.81	1 663	77 845
202	369	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.432386	35 879	51 393
203	370	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	46.81	1 828	85 569
204	371	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.954924	21 513	20 543
205	372	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	46.81	147	6 881

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	373	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.954924	21 513	20 543
207	374	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.04681	75 517	3 535
208	375	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04681	391 444	18 323
209	376	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	46.81	2 874	134 532
210	377	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	46.81	235	11 000
211	378	233-401-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	177.878	112	19 922
212	379	1111-0101-3610РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее со свариванием полотнищ на стыках с заведением края на стену и с установкой коннелюрного профиля	м2 покрытия	46.81	2 208	103 356
213	380	233-101-0108РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43	м2	52.4272	5 256	275 557
214	381	233-204-0105РСНБ РК 2022	Плинтус коннелюрный профиль	м	28.5	1 833	52 240
			Итого по подразделу: Тип 11				**881 239**
			Подраздел: Тип 15				
215	382	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	38.34	1 663	63 759
216	383	234-102-0303РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	1.173204	35 879	42 093
217	384	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	38.34	1 828	70 086
218	385	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.782136	21 513	16 826
219	386	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	38.34	111	4 256
220	387	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.586602	21 513	12 620
221	388	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.105435	75 517	7 961
222	389	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.105435	391 444	41 272

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	390	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	38.34	3 324	127 442
224	391	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	38.34	7 414	284 253
225	392	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	39.1068	3 632	142 036
226	393	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	61.72	1 592	98 258
227	394	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.40232	1 416	52 962
			Итого по подразделу: Тип 15				**963 825**
			Подраздел: Тип 19				
228	395	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	47.6	1 828	87 013
229	396	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.97104	21 513	20 890
230	397	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	47.6	478	22 753
231	398	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.15588	21 513	67 892
232	399	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.0476	75 517	3 595
233	400	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0476	391 444	18 633
234	401	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	47.6	7 414	352 906
235	402	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	48.552	3 632	176 341
236	403	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	56.48	1 592	89 916
237	404	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	34.22688	1 416	48 465
			Итого по подразделу: Тип 19				**888 404**
			Подраздел: Тип 20				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
238	405	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	26.36	1 828	48 186
239	406	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.537744	21 513	11 568
240	407	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	26.36	111	2 926
241	408	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.403308	21 513	8 676
242	409	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	26.36	7 414	195 433
243	410	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	26.8872	3 632	97 654
244	411	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	39.54	1 592	62 948
245	412	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23.96124	1 416	33 929
			Итого по подразделу: Тип 20				**461 320**
			Подраздел: Тип 21				
246	413	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней плитами керамогранитными	м2	50.15	12 557	629 734
247	414	231-302-0501РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	51.6545	6 457	333 533
248	415	1113-0701-0701РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м2	3.4	289	983
			Итого по подразделу: Тип 21				**964 250**
			Подраздел: Примечание п.7				
249	416	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	138	991	136 758
250	417	233-204-0201РСНБ РК 2022	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	138	957	132 066
			Итого по подразделу: Примечание п.7				**268 824**
			Подраздел: Примечание п.8				
251	418	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	70.2	991	69 568
252	419	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Закладной профиль Dewmark Standart SV 21/50/80.	м	22	16 301	358 635

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
253	420	СТПереченьЕСЦ РСНБ РК 2023	Угловой закладной профиль Dewmark Standart SV-E 21/50/80.	м	48.2	17 259	831 883
			Итого по подразделу: Примечание п.8				**1 260 086**
			Итого по разделу: Полы АР-17				**79 329 749**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				**79 329 749**
			ИТОГО по акту:				**79 329 749**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				79329749.772 x 6.20%	4 918 444
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				79329749.772 + 4918444.335	84 248 194
		Сметная прибыль, 5.00%				84248194.107 x 5.00%	4 212 409
		Непредвиденные расходы, 5.000%				84248194.107 x 5.000%	4 212 409
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					92 673 013
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				92673013.517 x 1.0557	97 834 900
		НДС (12%)				97834900.370 x 12%	11 740 188
		Итого с НДС				97834900.370 + 11740188.044	109 575 088

Лист согласования
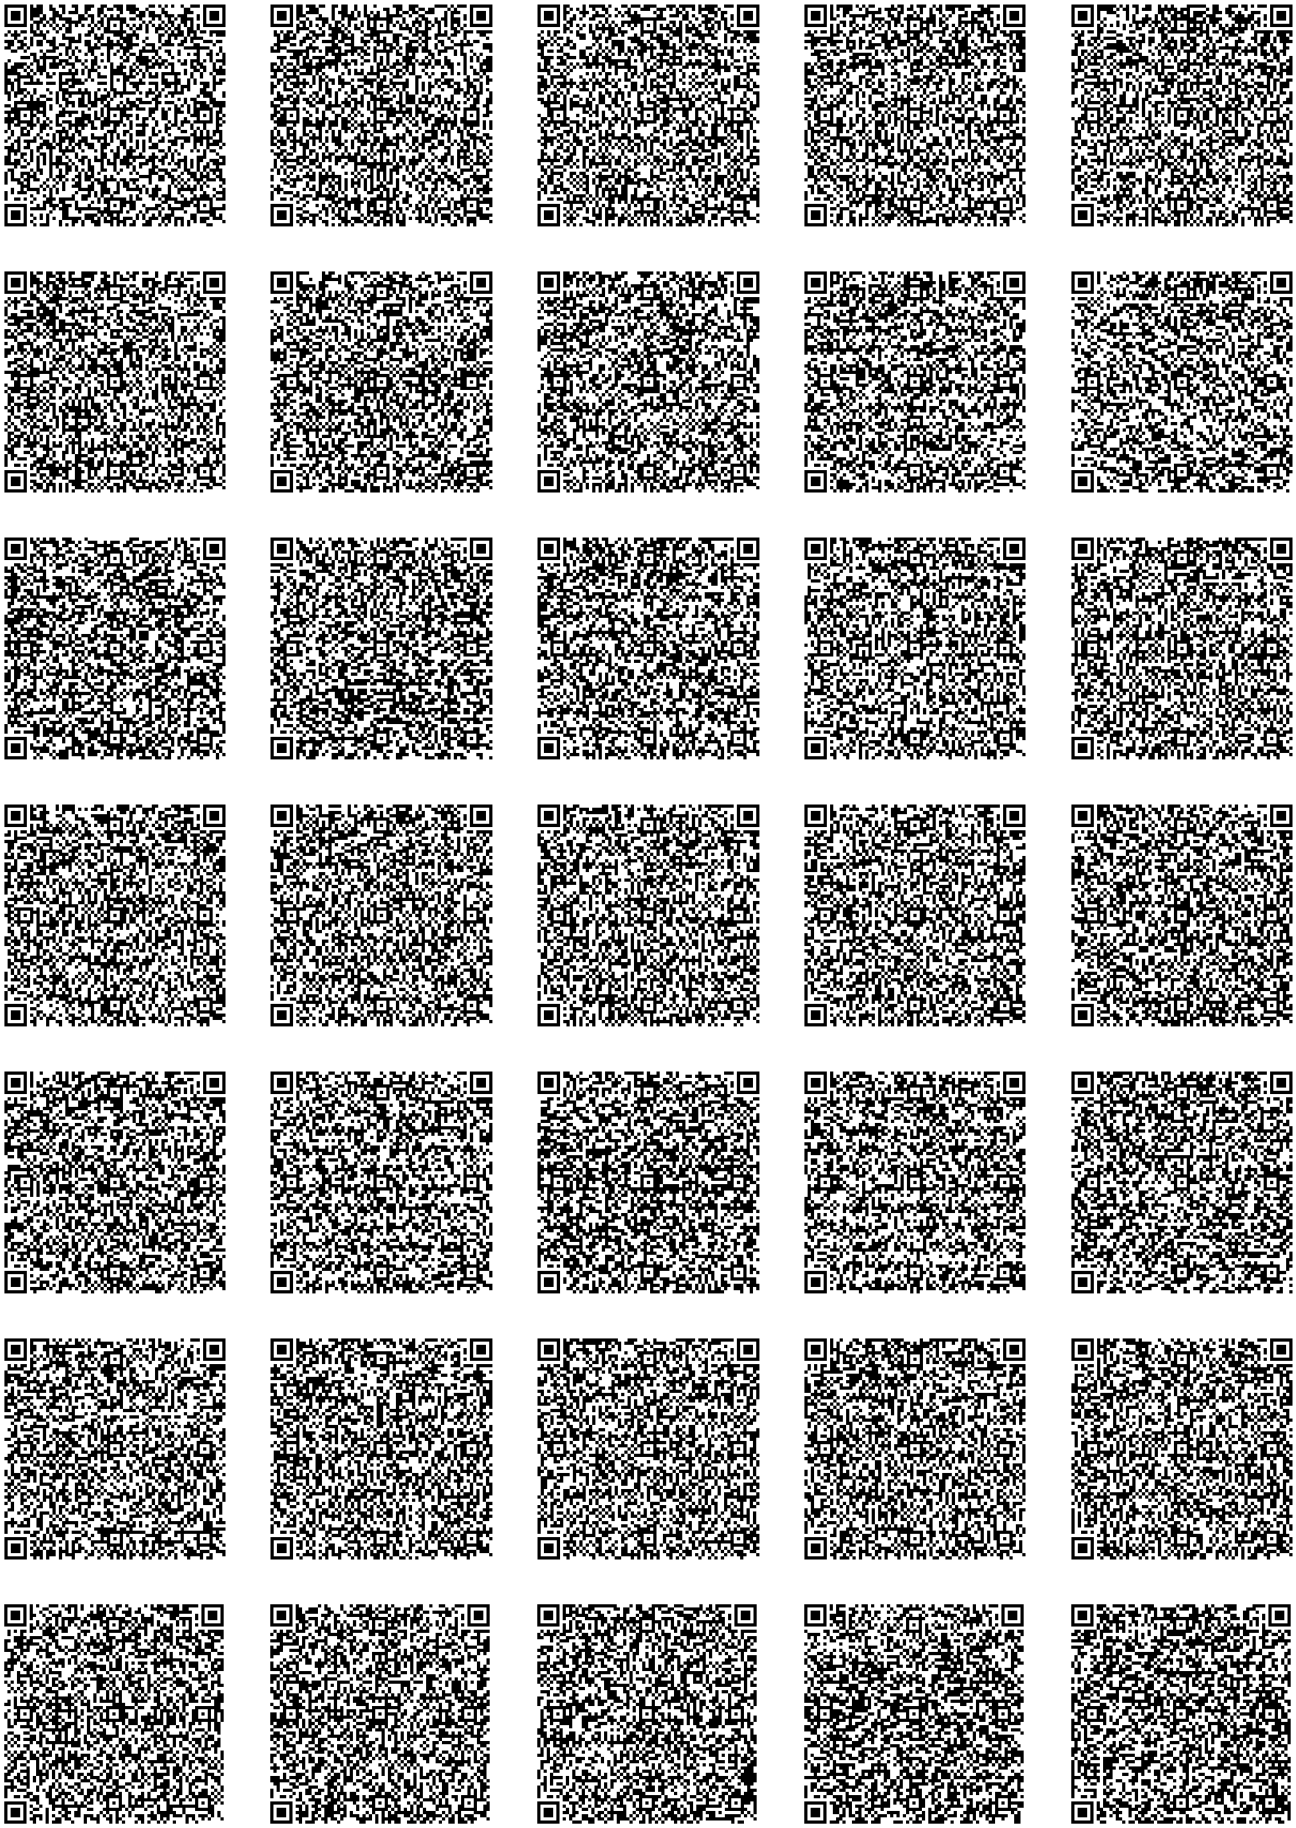
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	11.01.2025 10:29
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	13.01.2025 09:44
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	13.01.2025 04:19
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	14.01.2025 06:34
870910303001 - ТАЛДЫБАЕВ АБАЙ ТОРЕКУЛОВИЧ	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	15.01.2025 12:18 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	13.01.2025 10:39
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	14.01.2025 06:33 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	15.01.2025 12:25
