ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20250122-60228073
1.1. **Номер учетной системы** 00000000007
2. **Дата выписки** 22.01.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 21.01.2025
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
18. Адрес места нахождения
г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 090340012961
26.2 Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
26.3 Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 117
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.06.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			175 234 675	175 234 675		0	175 234 675	12%	21 028 161	196 262 836			1		
				Всего по счету						**175 234 675**			**175 234 675**		**21 028 161**	**196 262 836**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
UBsgj5pI7k0hxiAPHbzARlcZT8FzdolK2cao2X4TwaH2ydIMQhadtFFZrv3yWBA9eQUJiYKlSkVGZ/V7eStM4+15IpbzTTNCXGCF4SQtQuDY5QZm5H2YOKoRya6sVvc9IfEKnvyIFpHP8a44u+fa83ga1hhLvtiE5HVWbEEjc6U=
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024: №7 от 30.12.2024.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	2 805 307 137	501 291 106	2 504 738 515,18				300 568 621,82	2 805 307 137
в том числе: за январь месяц 2025 года	196 262 836	196 262 836	175 234 675,00				21 028 161,00	196 262 836

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#384bb800-9f82-4e85-b400-939c43a0fa93)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сы ғанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №99	Архитектурные решения Блок Е	31 566 378
2	Акт №100	Архитектурные решения Блок И,К	33 518 399
3	Акт №101	Архитектурные решения Блок Г,Ж	70 505 301
4	Акт №102	Архитектурные решения Блок А	31 060 256
5	Акт №103	Теплоснабжение, Строительная часть	29 612 502
		ИТОГО	**196 262 836**

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,**
Джилкибаев К. А. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,**
Адилбеков Ж.З. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226,**
Садвакасов К.Т. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#384bb800-9f82-4e85-b400-939c43a0fa93)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 21.01.2025 18:31
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 21.01.2025 20:55
Заказчик: ИИН 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР null	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	Подписано: 22.01.2025 09:53
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 22.01.2025 16:18

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#384bb800-9f82-4e85-b400-939c43a0fa93)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#384bb800-9f82-4e85-b400-939c43a0fa93)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#384bb800-9f82-4e85-b400-939c43a0fa93)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Теплоснабжение. Строительная часть				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 2.	м3	540.9719657	344	186 094
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.	м3	16.7310917	12 207	204 236
			Подраздел: Перемещение лишнего грунта во временный отвал				
3	7	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	278.75232	506	141 049
4	8	412-102-0101РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /во временный отввал/	т·км	487.81656	276	134 637
5	9	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	278.75232	83	23 136
			Итого по подразделу: Перемещение лишнего грунта во временный отвал				**298 822**
			Итого по разделу: Земляные работы				**689 152**
			Раздел: Конструкции железобетонные				
			Подраздел: Канал /сечение 1-1/				
6	10	6113-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания из песка	м3	20.26416	14 952	302 990
7	11	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	65.496	40 370	2 644 074

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	12	225-203-0103РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	40.276	109 687	4 417 754
9	13	225-202-1107РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	25.22	143 001	3 606 485
10	14	1106-1301-0303РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	2.6	116 697	303 412
11	15	214-403-0102РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.51094	498 796	254 855
12	16	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	256.428	6 008	1 540 619
13	17	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	589.7844	435	256 556
14	18	6105-0201-1102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стенки прижимной кирпичной неармированной 1/4 (в 1/2 кирпича на растворе)	м2	211.176	10 409	2 198 131
15	19	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	216.204	2 290	495 106
16	20	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	216.204	5 218	1 128 152
17	21	235-102-0101РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	497.2692	435	216 312
18	22	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	216.204	2 290	495 106
19	23	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/бетонкл.С8/10 -прижимн./Устройство бетонной подготовки	м3	6.63696	35 509	235 672
20	24	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	266.24	4 414	1 175 183
21	25	6105-0201-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стенки прижимной кирпичной гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	9.4	14 059	132 155
			Итого по подразделу: Канал /сечение 1-1/				**19 402 564**
			Подраздел: Теплофикационная камера УТ-1				
22	26	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м3	2.1	53 387	112 113
23	27	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04336	336 921	14 609
24	28	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1932288	325 873	62 968

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	29	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.02472	96 837	2 394
26	30	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00576	336 921	1 941
27	31	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.01896	325 873	6 179
28	32	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.7	35 952	25 166
29	33	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	1.1	37 700	41 470
30	34	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00432	336 921	1 455
31	35	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1228992	325 873	40 050
32	36	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0.74	52 606	38 928
33	37	225-202-1107РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0.7	143 001	100 101
34	38	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 130	8 260
35	39	261-107-0626РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	5	785	3 925
36	40	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	2	10 682	21 364
37	41	244-202-0101РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46 078
38	42	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	12.58	3 324	41 816
			Итого по подразделу: Теплофикационная камера УТ-1				**568 817**
			Подраздел: Дренажный колодец ДК1				
39	43	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.5	17 061	8 531
40	44	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5	2 267	11 335
41	45	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	5	6 219	31 095

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	46	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	5	2 267	11 335
43	47	6122-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	0.73	105 175	76 778
44	48	212-101-1809РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0.6	25 137	15 082
45	49	225-101-0601РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14 381	14 381
46	50	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9 398	9 398
47	51	225-101-0106РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	16 318	32 636
48	52	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 130	4 130
49	53	244-202-0108РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	63 066	63 066
50	54	261-107-0626РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	8	785	6 280
51	55	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	1.76625	2 267	4 003
52	56	6111-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов цементная	м2	10.9272	6 387	69 792
53	57	6111-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	10.9272	7 009	76 589
54	58	6105-0201-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стенки прижимной кирпичной гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	м2	10.9272	14 059	153 626
55	61	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0.533	30 409	16 208
56	62	6109-0303-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий асфальтобетонных, жестких, толщина 25 мм	м2	5.33	2 507	13 362
			Итого по подразделу: Дренажный колодец ДК1				**617 628**
			Подраздел: Неподвижная опора Н-1, Н-2				
57	63	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.255	35 952	9 168
58	64	1106-1301-0303РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	м3	0.84	118 069	99 178

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	65	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0051	336 921	1 718
60	66	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.09138	325 873	29 778
61	69	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	6.24	3 324	20 742
			Итого по подразделу: Неподвижная опора Н-1, Н-2				**160 584**
			Итого по разделу: Конструкции железобетонные				**20 749 593**
			Итого по локальной смете: Теплоснабжение. Строительная часть				**21 438 745**
			ИТОГО по акту:				**21 438 745**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	21438745.000 x 6.20%	1 329 202
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	21438745.000 + 1329202.149	22 767 947
	Сметная прибыль, 5.00%	22767947.149 x 5.00%	1 138 397
	Непредвиденные расходы, 5.000%	22767947.149 x 5.000%	1 138 397
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		25 044 741
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	25044741.864 x 1.0557	26 439 733
	НДС (12%)	26439733.986 x 12%	3 172 768
	Итого с НДС	26439733.986 + 3172768.078	29 612 502

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	20.01.2025 13:07
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	21.01.2025 04:06
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	21.01.2025 09:06
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	21.01.2025 11:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	21.01.2025 12:51 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	21.01.2025 10:42
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	21.01.2025 11:11
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	21.01.2025 13:08

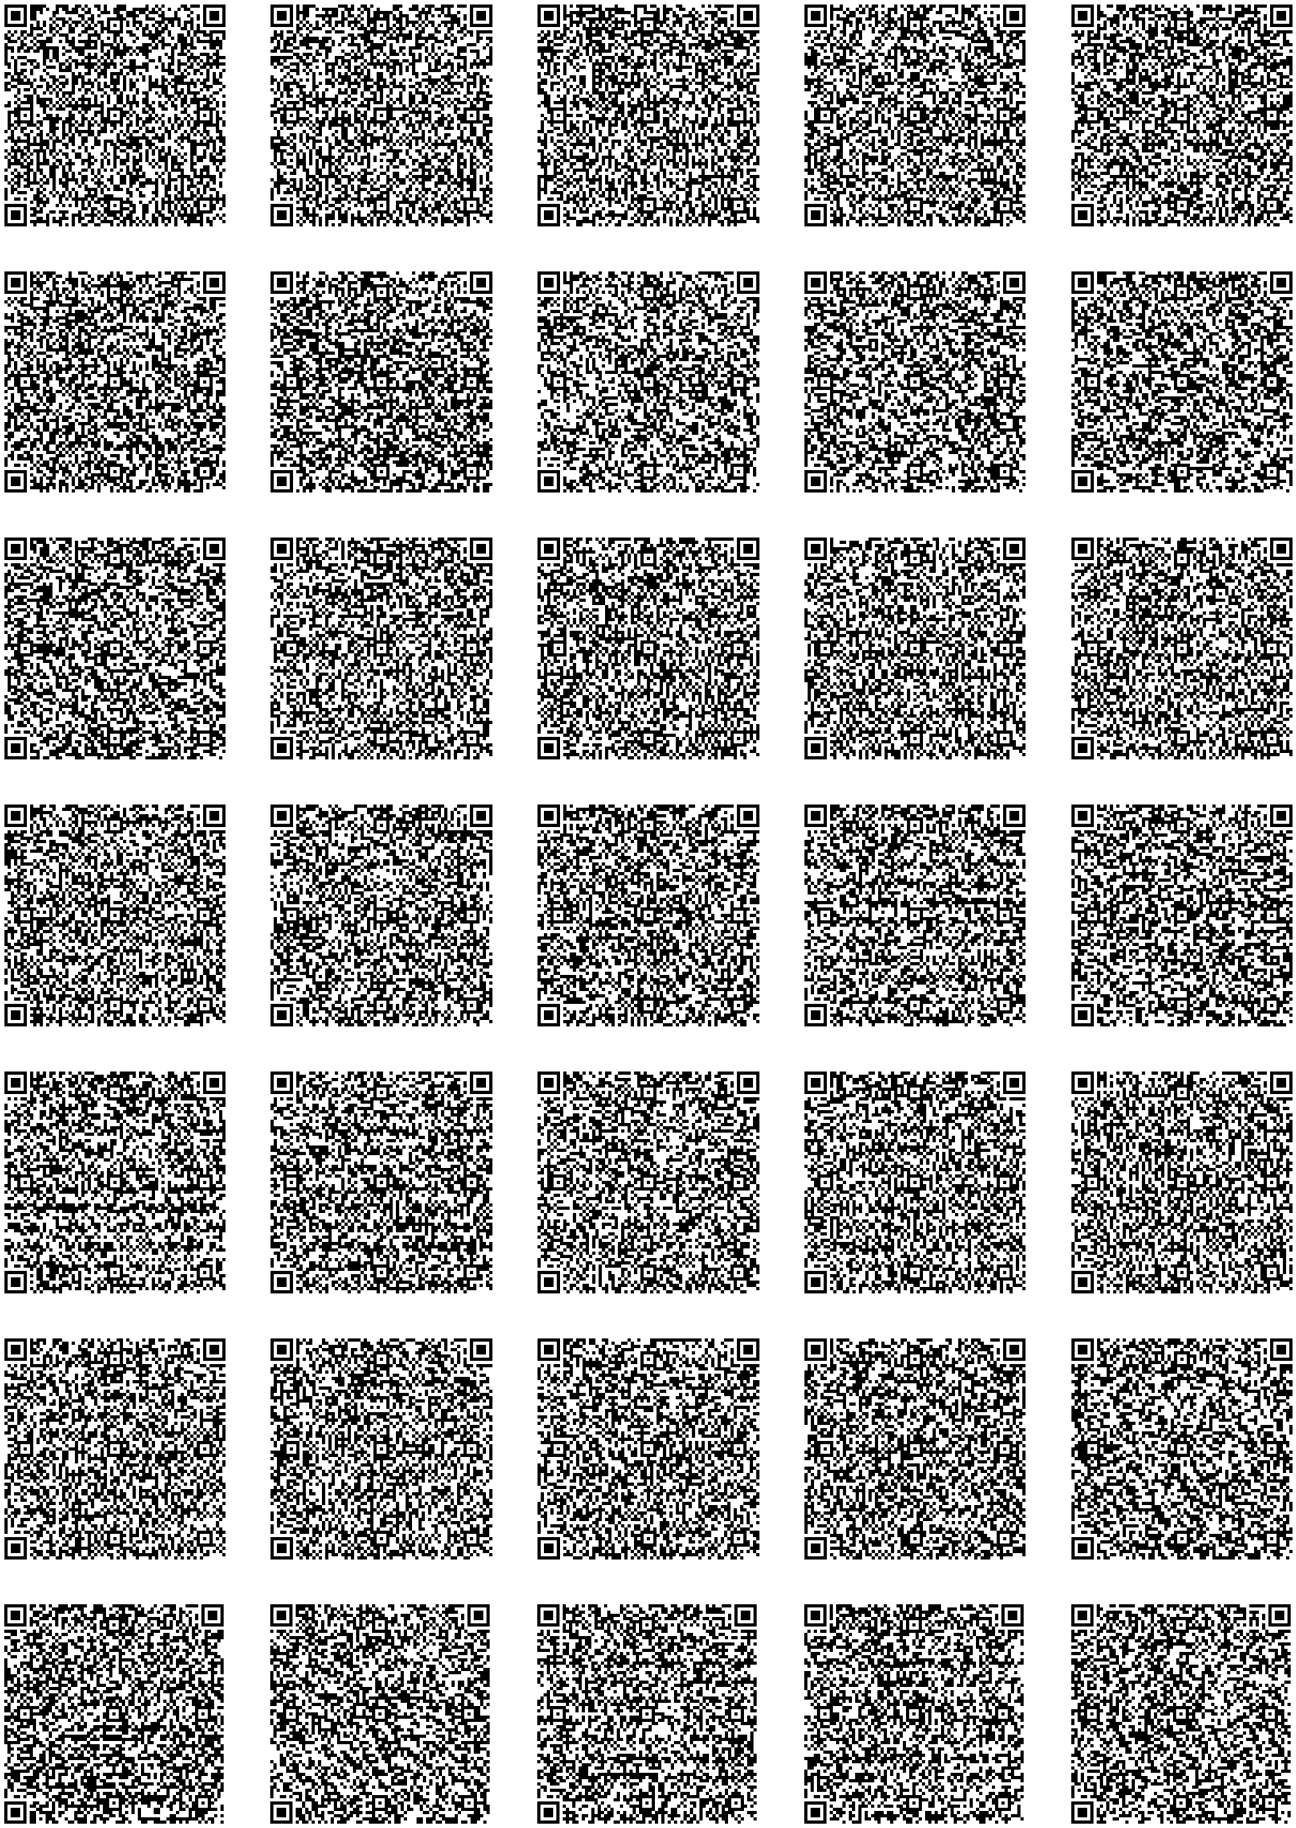

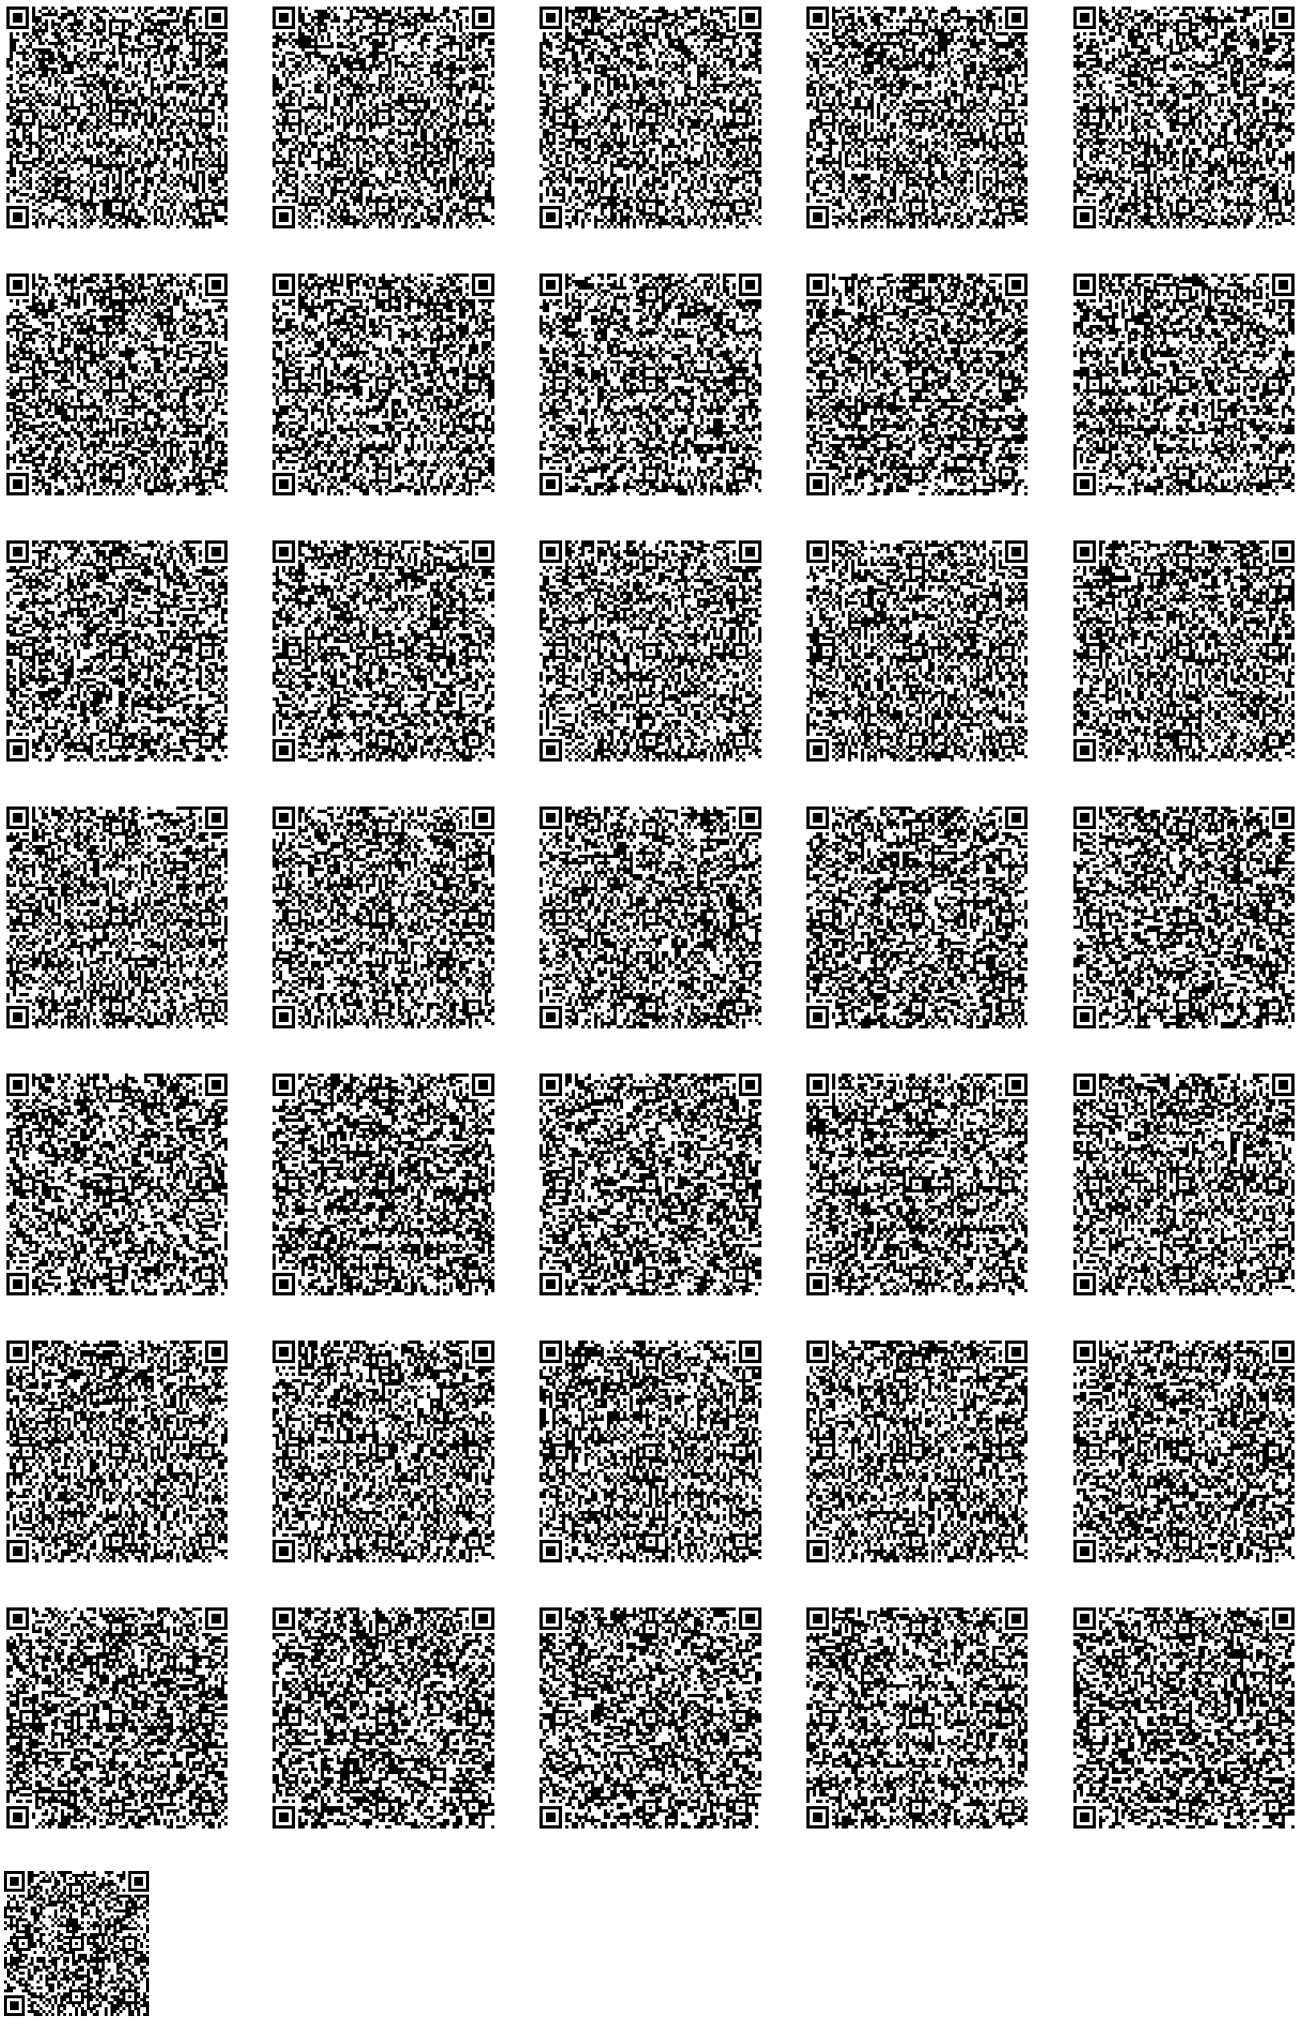

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок А				
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
1	317	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	363.45	3 897	1 416 365
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 416 365**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
2	318	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	372.69	2 920	1 088 255
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 088 255**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
3	319	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	363.45	1 753	637 128
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**637 128**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
4	320	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	112.02	6 504	728 578
5	321	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	117.621	4 122	484 833
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 213 412**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	322	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	9.24	7 975	73 689
7	323	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0.94248	66 535	62 708
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**136 397**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
8	324	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	9.24	3 584	33 116
9	325	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	38.09652	76	2 895
10	326	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	м2	9.702	1 797	17 434
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**53 445**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				
11	327	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/атмосферостойкая/Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	9.24	1 935	17 879
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				**17 879**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
12	328	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	376.38	3 897	1 466 753
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 466 753**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
13	329	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	376.38	2 920	1 099 030
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 099 030**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
14	330	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	376.38	1 753	659 794
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**659 794**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
15	331	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	110.37	6 504	717 846

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	332	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	115.8885	4 122	477 692
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 195 538**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
17	333	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	376.43	3 897	1 466 948
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 466 948**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
18	334	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	376.43	2 920	1 099 176
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 099 176**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
19	335	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	376.43	1 753	659 882
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**659 882**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
20	336	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	109.11	6 504	709 651
21	337	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	114.5655	4 122	472 239
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 181 890**
			Подраздел: венткамера				
22	338	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	51.25	2 920	149 650
23	339	214-401-0103 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,4 мм х 12 мм	м2	53.8125	1 797	96 701
24	340	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	51.25	1 565	80 206
25	341	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	51.25	841	43 101
			Итого по подразделу: венткамера				**369 658**
			Подраздел: лестничная клетка				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	342	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	24.12	3 897	93 996
27	343	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	24.12	2 920	70 430
28	344	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	24.12	1 753	42 282
			Итого по подразделу: лестничная клетка				**206 708**
			Подраздел: Откосы				
29	345	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 20 мм	м2	59.05	5 161	304 757
30	346	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	59.05	1 823	107 648
31	347	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	59.05	1 566	92 472
			Итого по подразделу: Откосы				**504 877**
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**14 473 135**
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Двери АР-20				
32	358	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.75	-17 514	-30 650
33	359	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/Д1/	м2	1.75	52 373	91 653
34	360	6108-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	3.15	8 426	26 541
35	361	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ,ДГ 21-15/Д19/	м2	3.15	19 229	60 571
36	362	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	58.38	7 285	425 298
37	363	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д20,22/	м2	8.4	19 229	161 524
38	364	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-14/Д21	м2	49.98	19 229	961 065

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	365	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	670.8	907	608 416
40	366	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	80	601	48 080
41	367	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	22	3 380	74 360
42	368	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	22	3 410	75 020
43	369	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	5.25	7 708	40 467
44	370	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	2.1	139 871	293 729
45	371	223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.15	83 965	264 490
46	372	6108-0203-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	2.1	11 981	25 160
47	373	223-205-1401 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	2.1	164 198	344 816
48	374	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.8	17 514	31 524
49	375	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/Д2/	м2	1.8	64 046	115 283
50	376	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	3.78	19 053	72 020
51	377	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный/Д56/	м2	3.78	58 080	219 542
			Итого по подразделу: Двери АР-20				**3 908 911**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1 АР-21				
52	378	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	21.23	24 673	523 807

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	379	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	17.82	130 304	2 322 017
54	380	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3.41	146 170	498 440
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1 АР-21				**3 344 265**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-2 АР-21				
55	381	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.71	4 268	3 030
56	382	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2.98	3 874	11 545
57	383	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	0.71	130 304	92 516
58	384	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2.98	146 170	435 587
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-2 АР-21				**542 678**
			Подраздел: Перемычки АР-28				
59	385	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.38558	117 997	45 497
60	386	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0072	467 480	3 366
61	387	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.35513	429 921	152 678
62	388	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.02325	325 873	7 577
63	389	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	16.7833	300	5 035
64	390	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	16.7833	223	3 743
			Итого по подразделу: Перемычки АР-28				**217 896**
			Итого по разделу: Проемы				**8 013 750**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок А				**22 486 885**
			ИТОГО по акту:				**22 486 885**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				22486885.000 x 6.20%	1 394 186
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				22486885.000 + 1394186.827	23 881 071
		Сметная прибыль, 5.00%				23881071.827 x 5.00%	1 194 053
		Непредвиденные расходы, 5.000%				23881071.827 x 5.000%	1 194 053
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					26 269 179
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				26269179.010 x 1.0557	27 732 372
		НДС (12%)				27732372.281 x 12%	3 327 884
		Итого с НДС				27732372.281 + 3327884.674	31 060 256

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	20.01.2025 07:15
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	20.01.2025 07:57
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	20.01.2025 11:50
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.01.2025 12:25
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.01.2025 12:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	21.01.2025 13:08
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.01.2025 12:35
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	21.01.2025 12:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

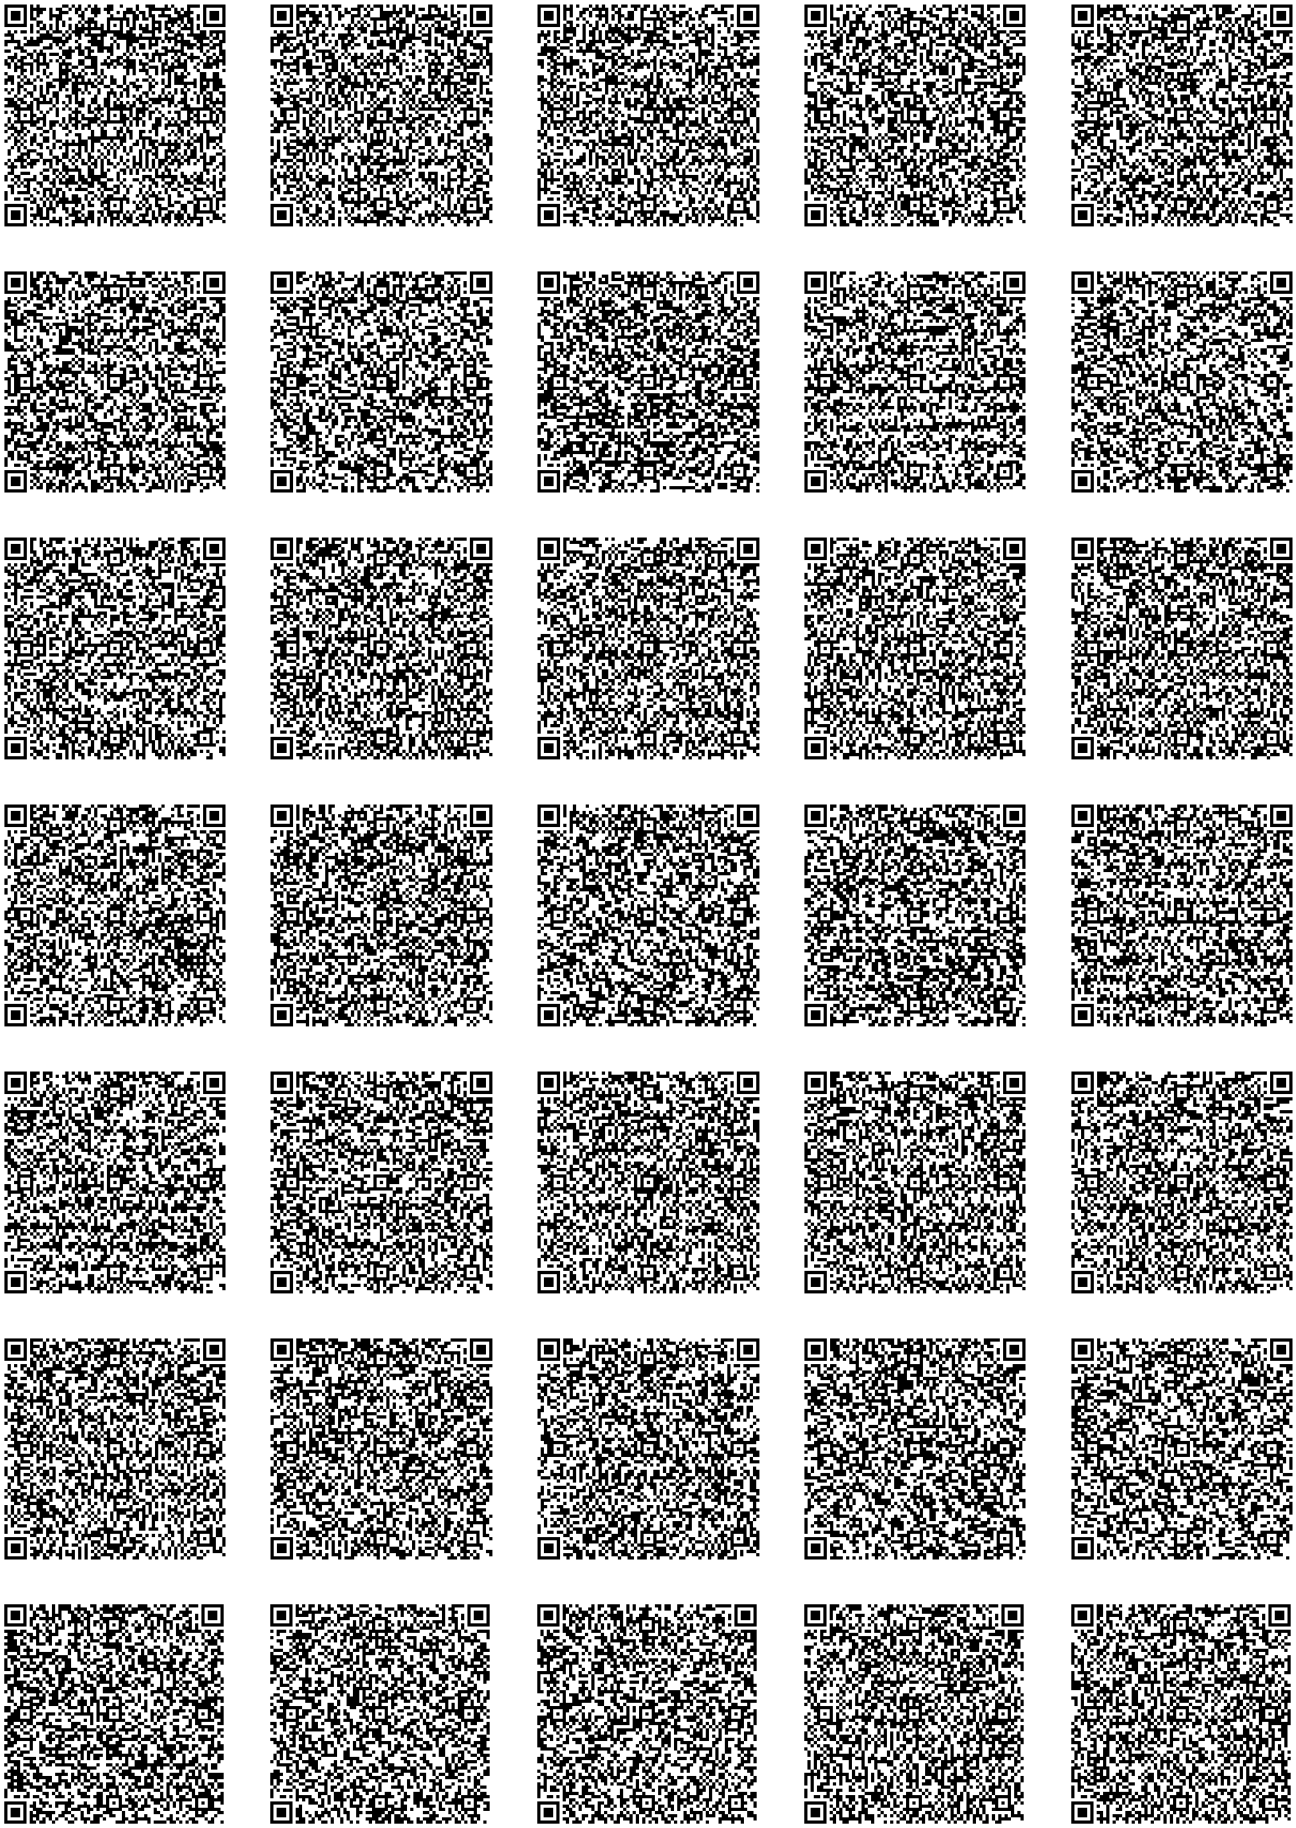

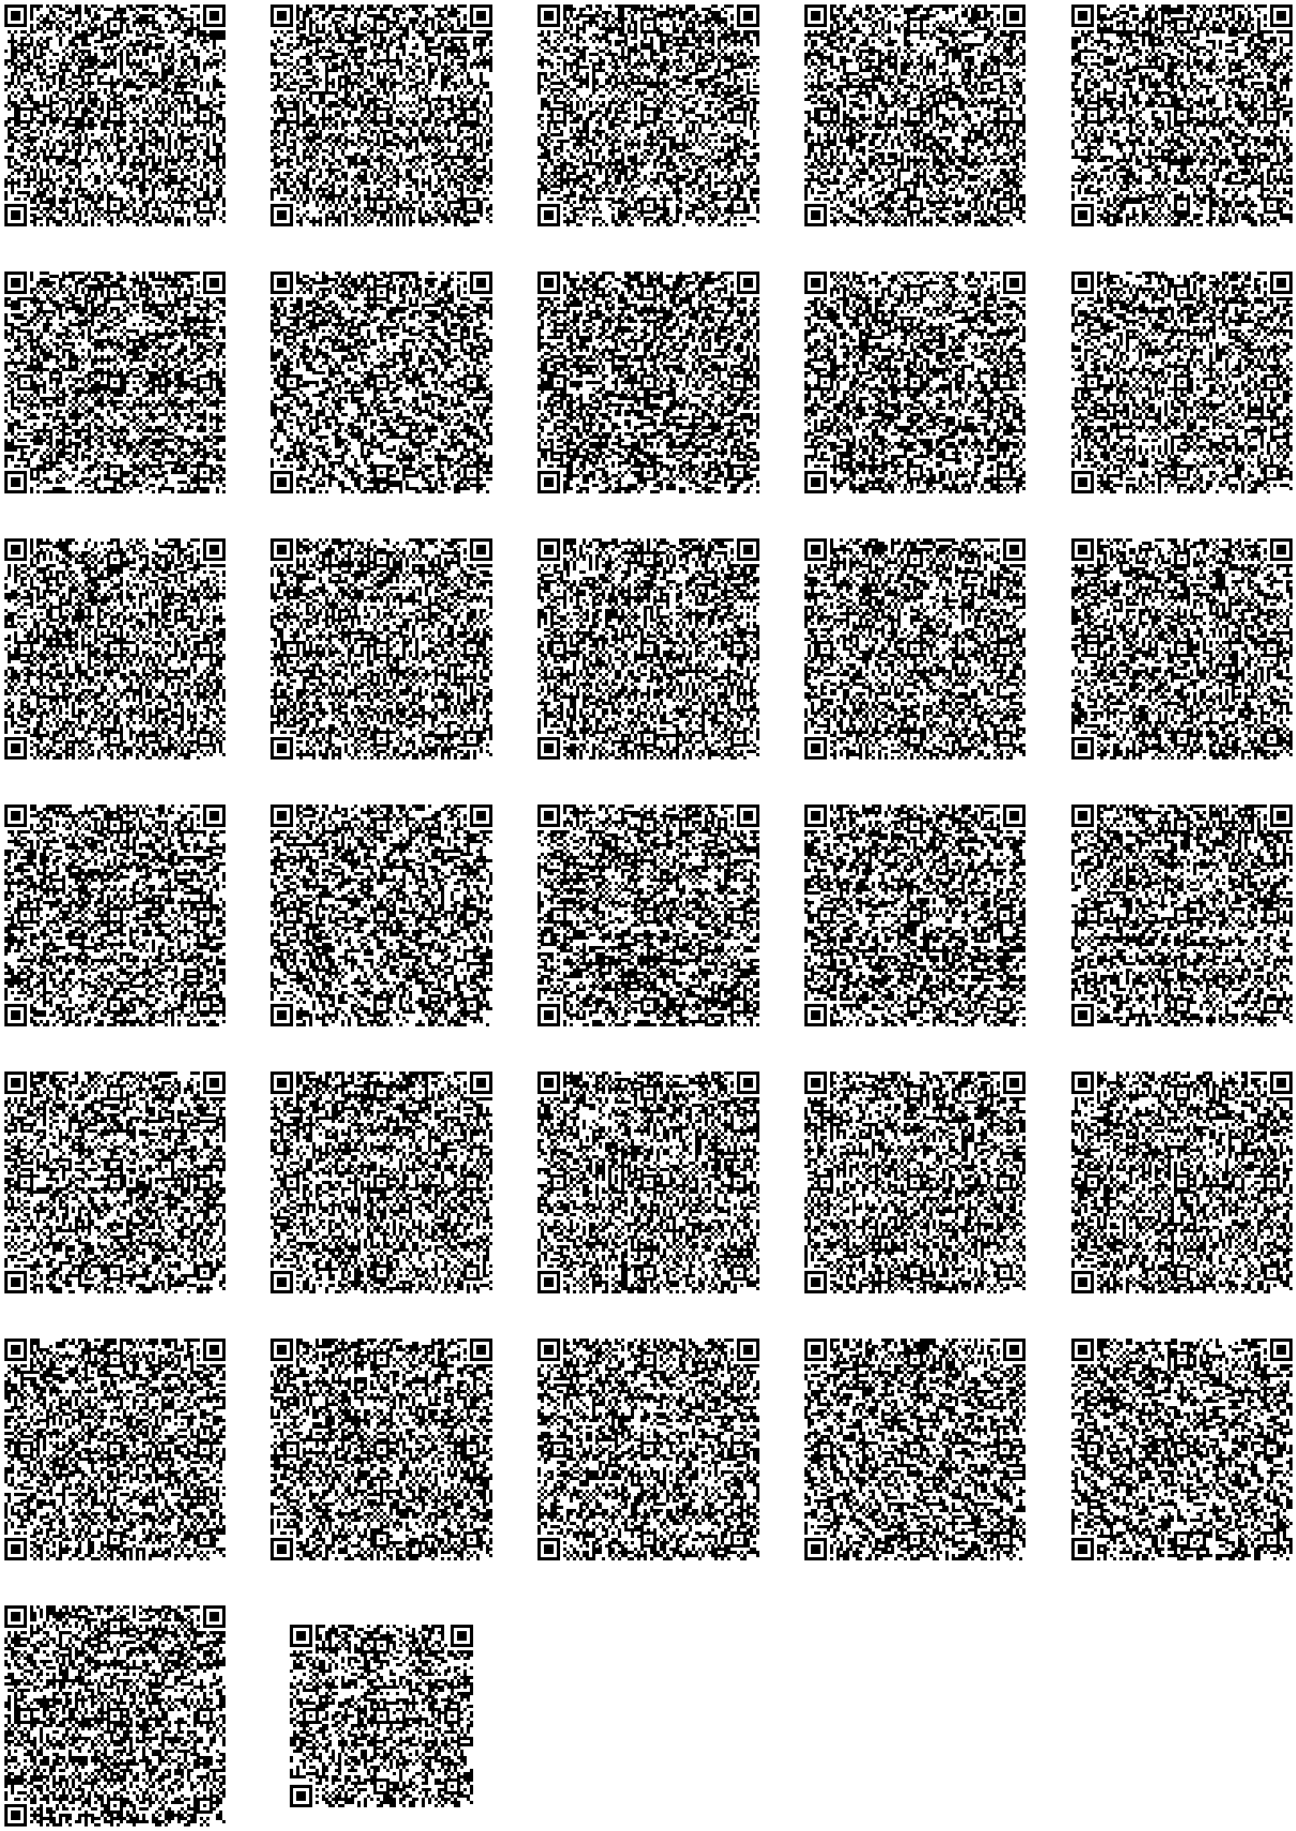

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Е				
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
1	370	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	44.5	7 975	354 888
2	371	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4.539	66 535	302 002
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**656 890**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
3	372	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	44.5	3 584	159 488
4	373	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	183.4735	76	13 944
5	374	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	44.5	145	6 453
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**179 885**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза				
6	375	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	44.5	1 495	66 528
7	376	236-202-0403РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	11.125	278	3 093
8	377	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	44.5	799	35 556

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	378	236-202-0403РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	6.675	278	1 856
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза				**107 033**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
10	379	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	167.99	3 897	654 657
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**654 657**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
11	380	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	193.85	2 920	566 042
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**566 042**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
12	381	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	167.99	1 753	294 486
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**294 486**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
13	382	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	464.03	6 504	3 018 051
14	383	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	487.2315	4 122	2 008 367
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**5 026 419**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
15	384	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	25.86	7 975	206 234
16	385	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2.63772	66 535	175 501
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**381 735**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
17	386	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	25.86	3 584	92 682
18	387	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	106.62078	76	8 103
19	388	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	25.86	145	3 750
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**104 535**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				
20	389	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/атмосферостойкая/Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	25.86	1 935	50 039
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				**50 039**
			Подраздел: Реечный потолок				
21	390	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	23.06	7 125	164 302
22	391	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	24.213	6 053	146 561
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**310 863**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
23	392	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	374.8	3 897	1 460 596
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 460 596**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
24	393	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	374.8	2 920	1 094 416
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 094 416**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
25	394	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	374.8	1 753	657 024
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**657 024**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
26	395	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	313.03	6 504	2 035 946
27	396	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	328.6815	4 122	1 354 825
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**3 390 772**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
28	397	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	371.56	3 897	1 447 969
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 447 969**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	398	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	371.56	2 920	1 084 955
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 084 955**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
30	399	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	371.56	1 753	651 345
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**651 345**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
31	400	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	319.3	6 504	2 076 727
32	401	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	335.265	4 122	1 381 962
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**3 458 689**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
33	402	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	28.42	7 975	226 650
34	403	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2.89884	66 535	192 874
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**419 524**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
35	404	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	28.42	3 584	101 857
36	405	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	117.17566	76	8 905
37	406	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	28.42	145	4 121
38	407	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	28.42	1 565	44 477
39	408	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	28.42	841	23 901
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**183 261**
			Подраздел: лестничная клетка				
40	409	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	24.12	3 897	93 996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	410	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	24.12	2 920	70 430
42	411	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	24.12	1 753	42 282
			Итого по подразделу: лестничная клетка				**206 708**
			Подраздел: Откосы				
43	412	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 20 мм	м2	54.44	5 161	280 965
44	413	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	54.44	1 823	99 244
45	414	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	54.44	1 566	85 253
			Итого по подразделу: Откосы				**465 462**
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**22 853 305**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Е				**22 853 305**
			ИТОГО по акту:				**22 853 305**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	22853305.000 x 6.20%	1 416 904
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	22853305.000 + 1416904.866	24 270 209
	Сметная прибыль, 5.00%	24270209.866 x 5.00%	1 213 510
	Непредвиденные расходы, 5.000%	24270209.866 x 5.000%	1 213 510
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		26 697 230
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	26697230.853 x 1.0557	28 184 266
	НДС (12%)	28184266.612 x 12%	3 382 111
	Итого с НДС	28184266.612 + 3382111.993	31 566 378

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	20.01.2025 04:49
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	20.01.2025 08:04
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	20.01.2025 06:56
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.01.2025 09:54
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.01.2025 11:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.01.2025 11:31
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	21.01.2025 12:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	21.01.2025 13:06

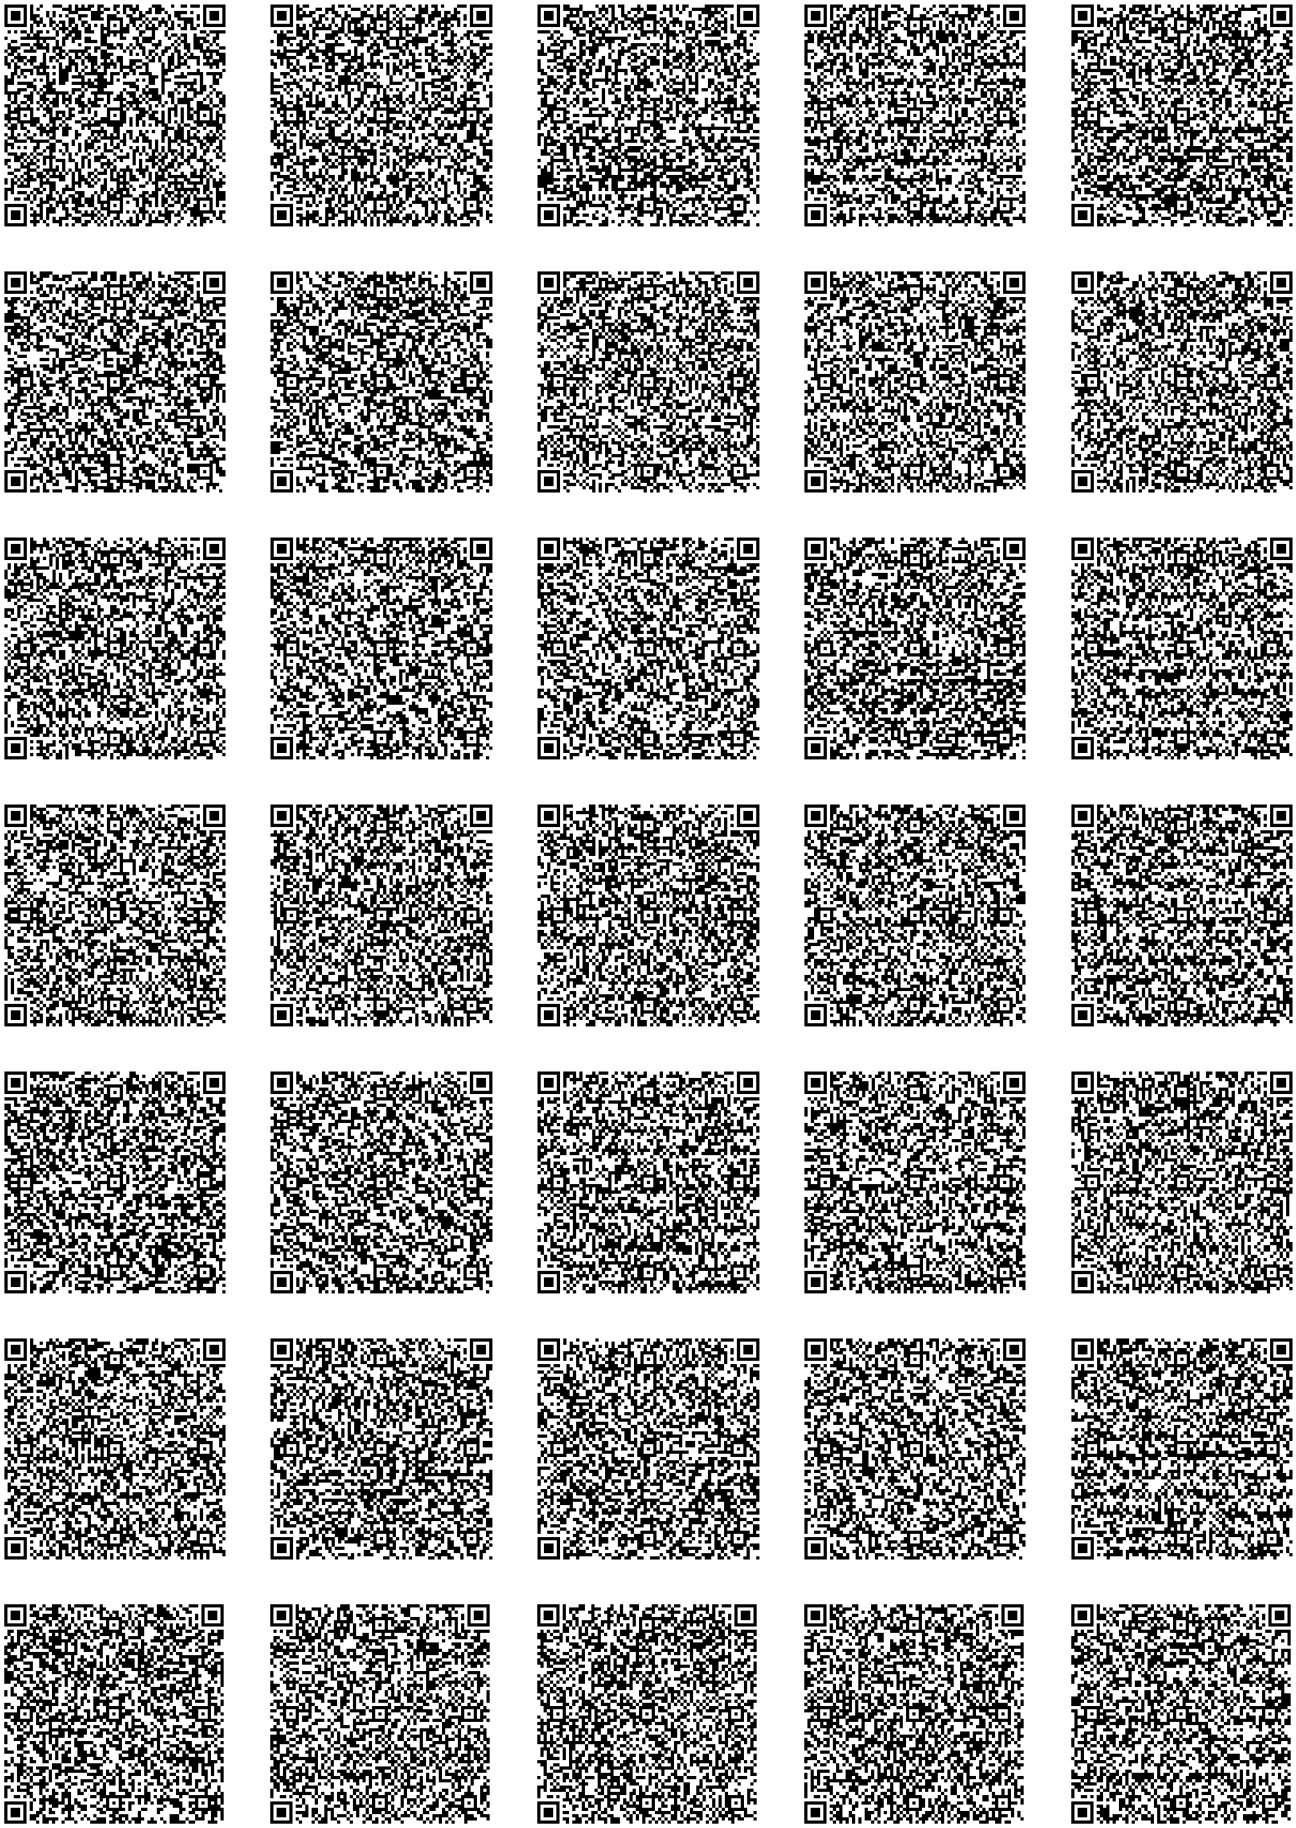

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок И, К				
			Раздел: Ведомость отделки стен АР-17				
			Подраздел: Затирка поверхности				
1	307	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	25.321	549	13 901
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**13 901**
			Подраздел: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				
2	308	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	223.902	5 623	1 259 000
			Итого по подразделу: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				**1 259 000**
			Подраздел: Известковая побелка (за 2 раза)				
3	309	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	284.9	520	148 148
			Итого по подразделу: Известковая побелка (за 2 раза)				**148 148**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
4	310	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	153.14	1 330	203 676
5	311	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	153.14	683	104 595
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**308 271**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	312	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	45.75	7 142	326 746
7	313	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	36.70065	167	6 128
8	314	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	96.3129	267	25 716
9	315	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	96.075	1 080	103 761
10	316	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	45.75	1 528	69 906
11	317	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62.8605	76	4 777
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**537 035**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
12	318	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	507.55	1 566	794 823
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**794 823**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
13	319	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	517.845	1 823	944 031
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**944 031**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
14	320	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	286.68	1 957	561 033
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**561 033**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
15	321	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	471.464	549	258 833
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**258 833**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
16	322	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	50.19	7 142	358 457
17	323	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	40.262418	167	6 724
18	324	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	105.659988	267	28 211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	325	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	105.399	1 080	113 831
20	326	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	50.19	1 528	76 690
21	327	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	68.96106	76	5 241
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**589 154**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
22	328	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	464.88	1 330	618 290
23	329	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	464.88	683	317 513
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**935 803**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
24	331	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	321.26	12 370	3 973 986
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**3 973 986**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
25	332	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	95.008	5 623	534 230
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**534 230**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
26	333	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1.48	4 336	6 417
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**6 417**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				
27	334	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	218.64	1 260	275 486
28	335	236-202-0402РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	54.66	497	27 166
29	336	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	218.64	641	140 148
30	337	236-202-0402РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	32.796	497	16 300

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				**459 100**
			Подраздел: Отделка Панель SOUNDBOARD				
31	338	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	534.78	3 496	1 869 591
32	339	222-529-0103РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	457.985592	333	152 509
33	340	222-529-0302РСНБ РК 2022	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1134.428814	404	458 309
34	341	СТПереченьРСНБ РК 2022	Панели SOUNDBOARD 1200х600х20	шт	748.692	9 867	7 387 344
35	342	1134-0108-0401РСНБ РК 2022	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	534.78	2 238	1 196 838
36	343	СТПереченьРСНБ РК 2022	Акустическая минеральная плита на основе кварца АКУЛАЙТ SE 50 мм	м3	27.54117	55 096	1 517 429
			Итого по подразделу: Отделка Панель SOUNDBOARD				**12 582 020**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
37	344	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	66.67	549	36 602
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**36 602**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
38	345	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	70.63	1 823	128 758
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**128 758**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
39	346	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	9.07	1 566	14 204
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**14 204**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
40	347	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	3.96	4 336	17 171
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**17 171**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
41	348	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	61.56	1 330	81 875

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	349	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	61.56	683	42 045
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**123 920**
			Подраздел: Фартук				
43	350	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	3.24	12 370	40 079
			Итого по подразделу: Фартук				**40 079**
			Итого по разделу: Ведомость отделки стен АР-17				**24 266 521**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок И, К				**24 266 521**
			ИТОГО по акту:				**24 266 521**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				24266521.500 x 6.20%	1 504 524
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				24266521.500 + 1504524.287	25 771 045
		Сметная прибыль, 5.00%				25771045.787 x 5.00%	1 288 552
		Непредвиденные расходы, 5.000%				25771045.787 x 5.000%	1 288 552
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					28 348 150
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				28348150.365 x 1.0557	29 927 142
		НДС (12%)				29927142.341 x 12%	3 591 257
		Итого с НДС				29927142.341 + 3591257.081	33 518 399

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	20.01.2025 05:17
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	20.01.2025 08:02
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	20.01.2025 06:59
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.01.2025 09:52
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	21.01.2025 13:07
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	21.01.2025 12:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.01.2025 11:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.01.2025 11:32

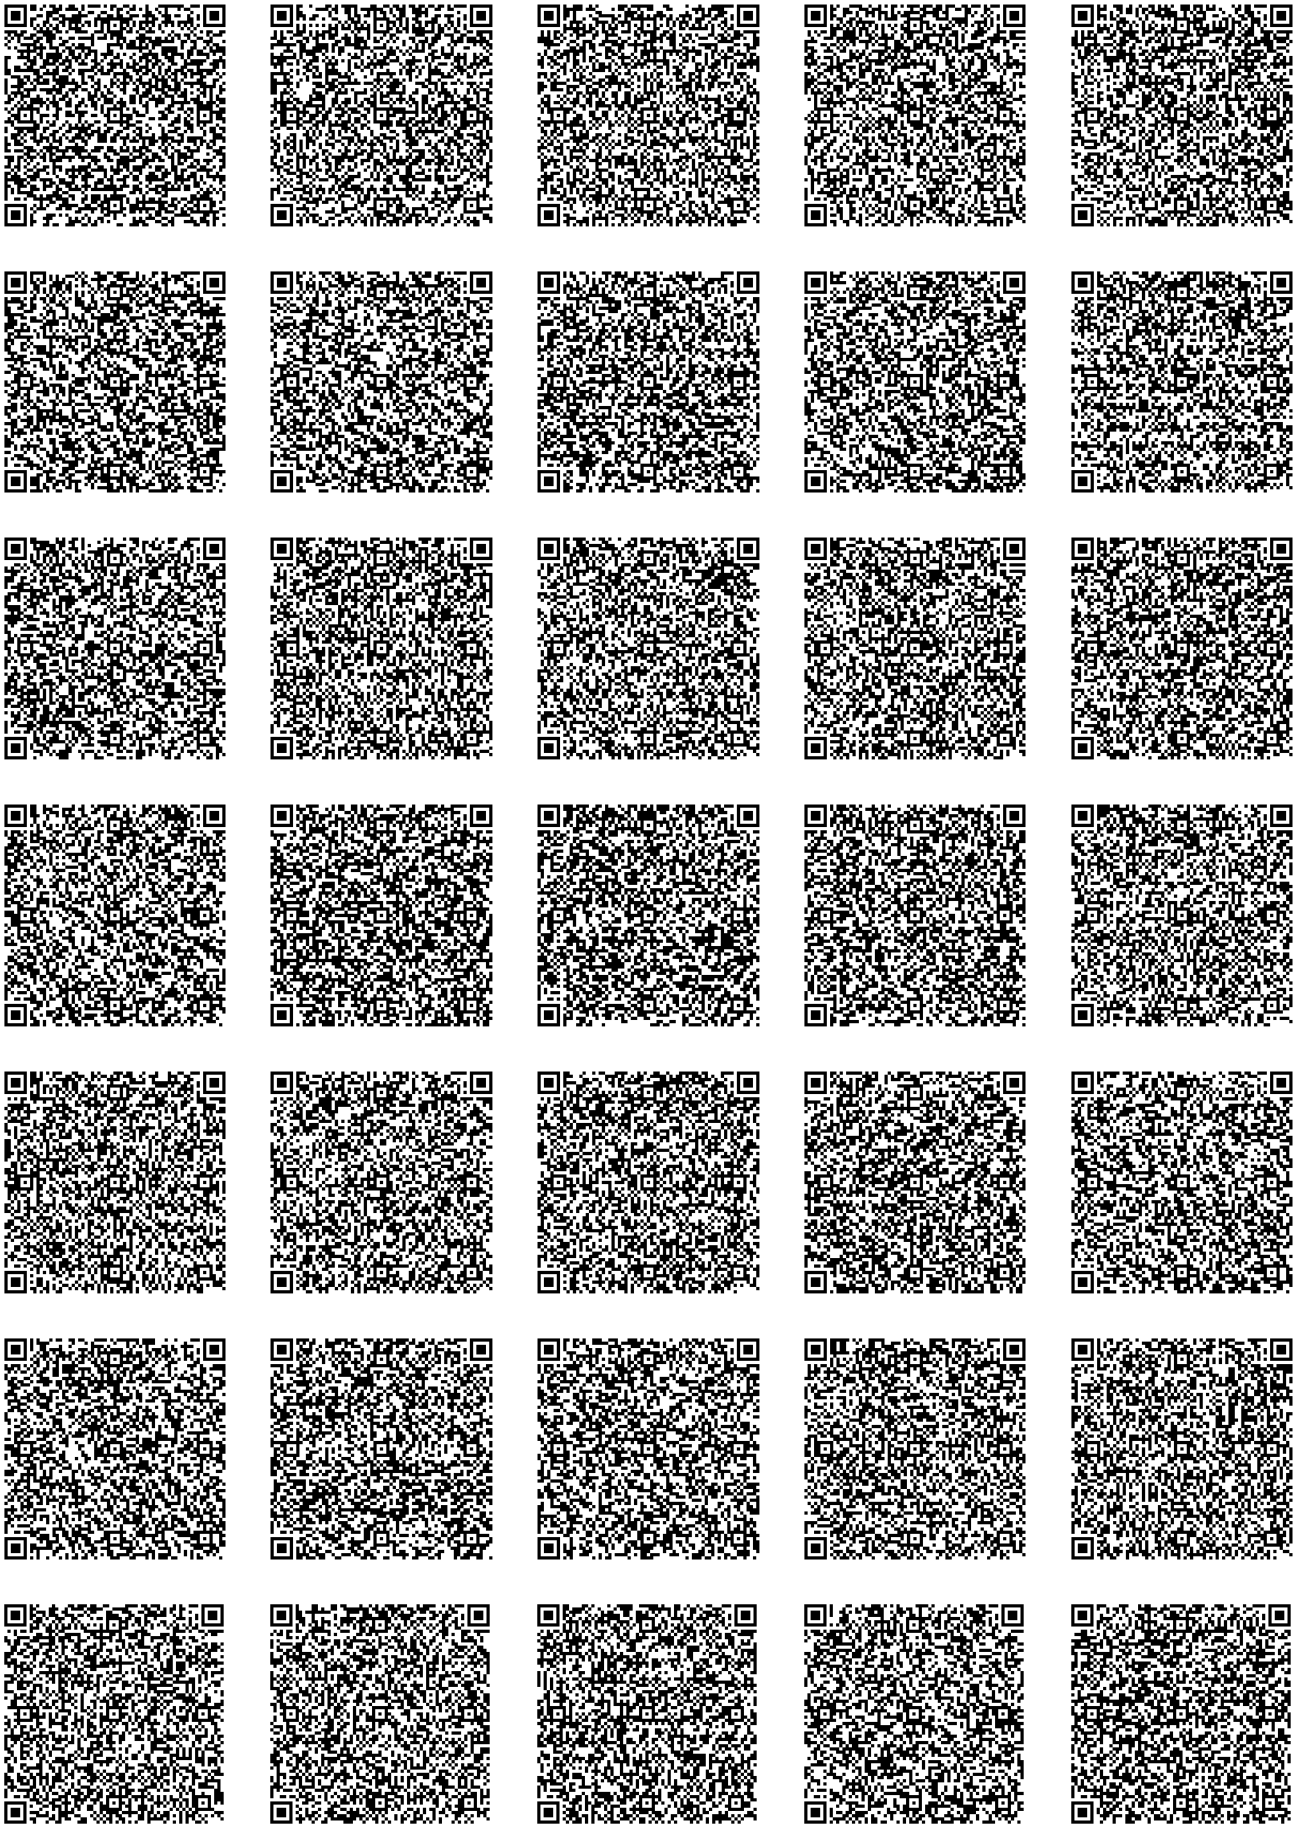

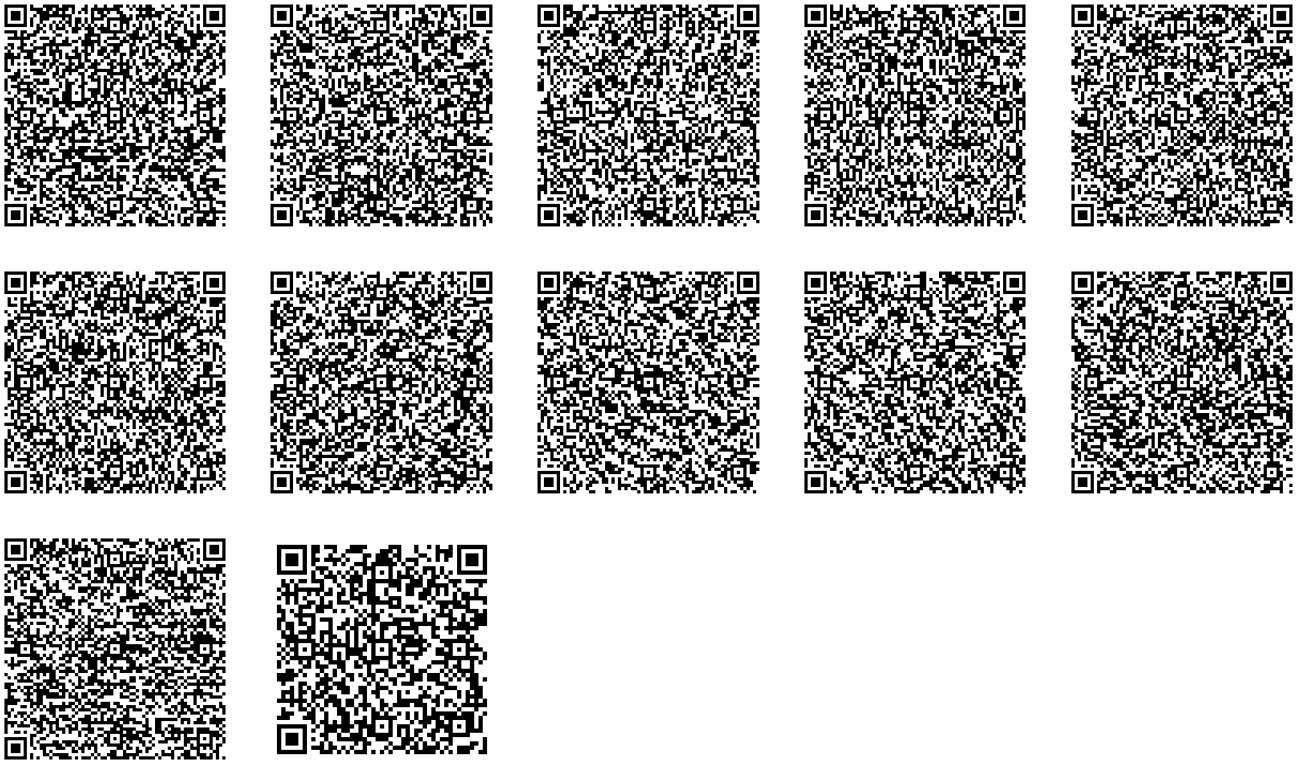

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				
			Раздел: Ведомость отделки стен АР-17				
			Подраздел: Затирка поверхности				
1	421	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	277.56	549	152 380
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**152 380**
			Подраздел: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				
2	422	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	14.524	5 623	81 668
3	423	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	10.19	145	1 477
			Итого по подразделу: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				**83 146**
			Подраздел: Известковая побелка (за 2 раза)				
4	424	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	98.45	520	51 194
			Итого по подразделу: Известковая побелка (за 2 раза)				**51 194**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
5	425	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	62.91	1 330	83 670
6	426	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	62.91	683	42 968
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**126 638**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
7	427	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	209.195	1 823	381 362
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**381 362**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
8	428	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1837.09	1 957	3 595 185
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**3 595 185**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
9	429	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	366.4	1 566	573 782
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**573 782**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
10	430	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	448.37	549	246 155
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**246 155**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
11	431	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	1806.69	1 330	2 402 898
12	432	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1806.69	683	1 233 969
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**3 636 867**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
13	433	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	168.731	5 623	948 774
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**948 774**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
14	434	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	74.1	7 142	529 222
15	435	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	59.44302	167	9 927
16	436	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	155.99532	267	41 651

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	437	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	155.61	1 080	168 059
18	438	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	74.1	1 528	113 225
19	439	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	101.8134	76	7 738
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**869 822**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
20	440	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	23.03	7 142	164 480
21	441	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	18.474666	167	3 085
22	442	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	48.482756	267	12 945
23	443	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	48.363	1 080	52 232
24	444	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	23.03	1 528	35 190
25	445	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	31.64322	76	2 405
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**270 337**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
26	447	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	213.5	12 370	2 640 995
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**2 640 995**
			Подраздел: Затирка поверхности				
27	448	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	12.11	1 823	22 077
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**22 077**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				
28	449	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	13.45	1 260	16 947
29	450	236-202-0402РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3.3625	497	1 671
30	451	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	13.45	641	8 621

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	452	236-202-0402РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2.0175	497	1 003
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				**28 242**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
32	453	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	100.65	7 142	718 842
33	454	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	80.74143	167	13 484
34	455	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	211.88838	267	56 573
35	456	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	211.365	1 080	228 274
36	457	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	100.65	1 528	153 793
37	458	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	138.2931	76	10 510
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**1 181 477**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
38	459	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	635.86	1 330	845 694
39	460	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	635.86	683	434 292
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**1 279 986**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
40	461	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	99.149	1 823	180 748
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**180 748**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
41	462	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	528.3	1 957	1 033 883
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**1 033 883**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
42	464	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	465.33	1 566	728 707
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**728 707**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
43	467	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	16.53	7 142	118 057
44	468	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13.260366	167	2 214
45	469	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	34.798956	267	9 291
46	470	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	34.713	1 080	37 490
47	471	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	16.53	1 528	25 258
48	472	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	22.71222	76	1 726
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**194 036**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
49	474	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	75.82	12 370	937 893
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**937 893**
			Подраздел: Затирка поверхности				
50	475	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1.66	1 823	3 026
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**3 026**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
51	476	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	492.075	1 823	897 052
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**897 052**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
52	477	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	430.84	1 957	843 154
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**843 154**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
53	478	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	532.65	1 566	834 130
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**834 130**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	479	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	446.41	549	245 078
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**245 078**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
55	480	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	536.29	1 330	713 266
56	481	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	536.29	683	366 286
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**1 079 552**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
57	482	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	167.505	4 336	726 301
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**726 301**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
58	483	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	81.48	5 623	458 162
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**458 162**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
59	484	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	84.79	7 142	605 570
60	485	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	68.018538	167	11 359
61	486	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	178.499908	267	47 659
62	487	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	178.059	925	164 705
63	488	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	84.79	1 528	129 559
64	489	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	116.50146	76	8 854
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**967 706**
			Подраздел: Затирка поверхности				
65	490	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	1.61	1 823	2 935
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**2 935**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
66	492	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	77.52	12 370	958 921
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**958 921**
			Подраздел: Затирка поверхности				
67	493	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	14.015	549	7 693
68	494	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	65.31	520	33 961
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**41 655**
			Подраздел: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				
69	495	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	23.51	5 623	132 196
			Итого по подразделу: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				**132 196**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
70	496	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	4.87	1 823	8 878
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**8 878**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
71	497	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	9.74	1 330	12 954
72	498	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	9.74	683	6 652
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**19 606**
			Подраздел: Фартук				
73	499	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	11.88	12 370	146 956
			Итого по подразделу: Фартук				**146 956**
			Итого по разделу: Ведомость отделки стен АР-17				**26 528 999**
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
74	500	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	47.85	7 975	381 604

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	501	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	4.8807	66 535	324 737
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**706 341**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
76	502	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	47.85	3 584	171 494
77	503	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	197.28555	76	14 994
78	504	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	47.85	145	6 937
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**193 426**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза				
79	505	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	47.85	1 495	71 536
80	506	236-202-0403РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	11.9625	278	3 326
81	507	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	47.85	799	38 232
82	508	236-202-0403РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	7.1775	278	1 995
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза				**115 089**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
83	509	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	226.47	3 897	882 554
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**882 554**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
84	510	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	244	2 920	712 480
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**712 480**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
85	511	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	226.47	1 753	397 002
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**397 002**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	512	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	425.47	6 504	2 767 257
87	513	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	446.7435	4 122	1 841 477
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**4 608 734**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
88	514	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	17.53	7 975	139 802
89	515	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	1.78806	66 535	118 969
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**258 771**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
90	516	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	17.53	3 584	62 827
91	517	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	72.27619	76	5 493
92	518	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	17.53	145	2 542
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**70 863**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				
93	519	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/атмосферостойкая/Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	17.53	1 935	33 921
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				**33 921**
			Подраздел: Реечный потолок				
94	520	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	85.3	7 125	607 762
95	521	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	89.565	6 053	542 137
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**1 149 899**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
96	522	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	318.14	3 897	1 239 792
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 239 792**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	523	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	318.14	2 920	928 969
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**928 969**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
98	524	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	318.14	1 753	557 699
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**557 699**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
99	525	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	400.71	6 504	2 606 218
100	526	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	420.7455	4 122	1 734 313
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**4 340 531**
			Подраздел: Реечный потолок				
101	527	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	38.04	7 125	271 035
102	528	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	39.942	6 053	241 769
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**512 804**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
103	529	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	315.27	3 897	1 228 607
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 228 607**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
104	530	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	315.27	2 920	920 588
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**920 588**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
105	531	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	315.27	1 753	552 668
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**552 668**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
106	532	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	285.27	6 504	1 855 396

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	533	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	299.5335	4 122	1 234 677
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**3 090 073**
			Подраздел: Реечный потолок				
108	534	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	38.34	7 125	273 172
109	535	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	40.257	6 053	243 675
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**516 848**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
110	536	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	30.26	7 975	241 324
111	537	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3.08652	66 535	205 362
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**446 686**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
112	538	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	30.26	3 584	108 452
113	539	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	124.76198	76	9 482
114	540	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	30.26	145	4 388
115	541	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	30.26	1 565	47 357
116	542	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	30.26	841	25 449
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**195 128**
			Подраздел: Откосы				
117	543	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 20 мм	м2	100.08	5 161	516 513
118	544	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	100.08	1 823	182 446
119	545	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	100.08	1 566	156 725
			Итого по подразделу: Откосы				**855 684**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**24 515 157**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				**51 044 156**
			ИТОГО по акту:				**51 044 156**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)			51044156.100 x 6.20%	3 164 737
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			51044156.100 + 3164737.581	54 208 893
			Сметная прибыль, 5.00%			54208893.681 x 5.00%	2 710 444
			Непредвиденные расходы, 5.000%			54208893.681 x 5.000%	2 710 444
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				59 629 783
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557			59629783.049 x 1.0557	62 951 161
			НДС (12%)			62951161.965 x 12%	7 554 139
			Итого с НДС			62951161.965 + 7554139.436	70 505 301

Лист согласования
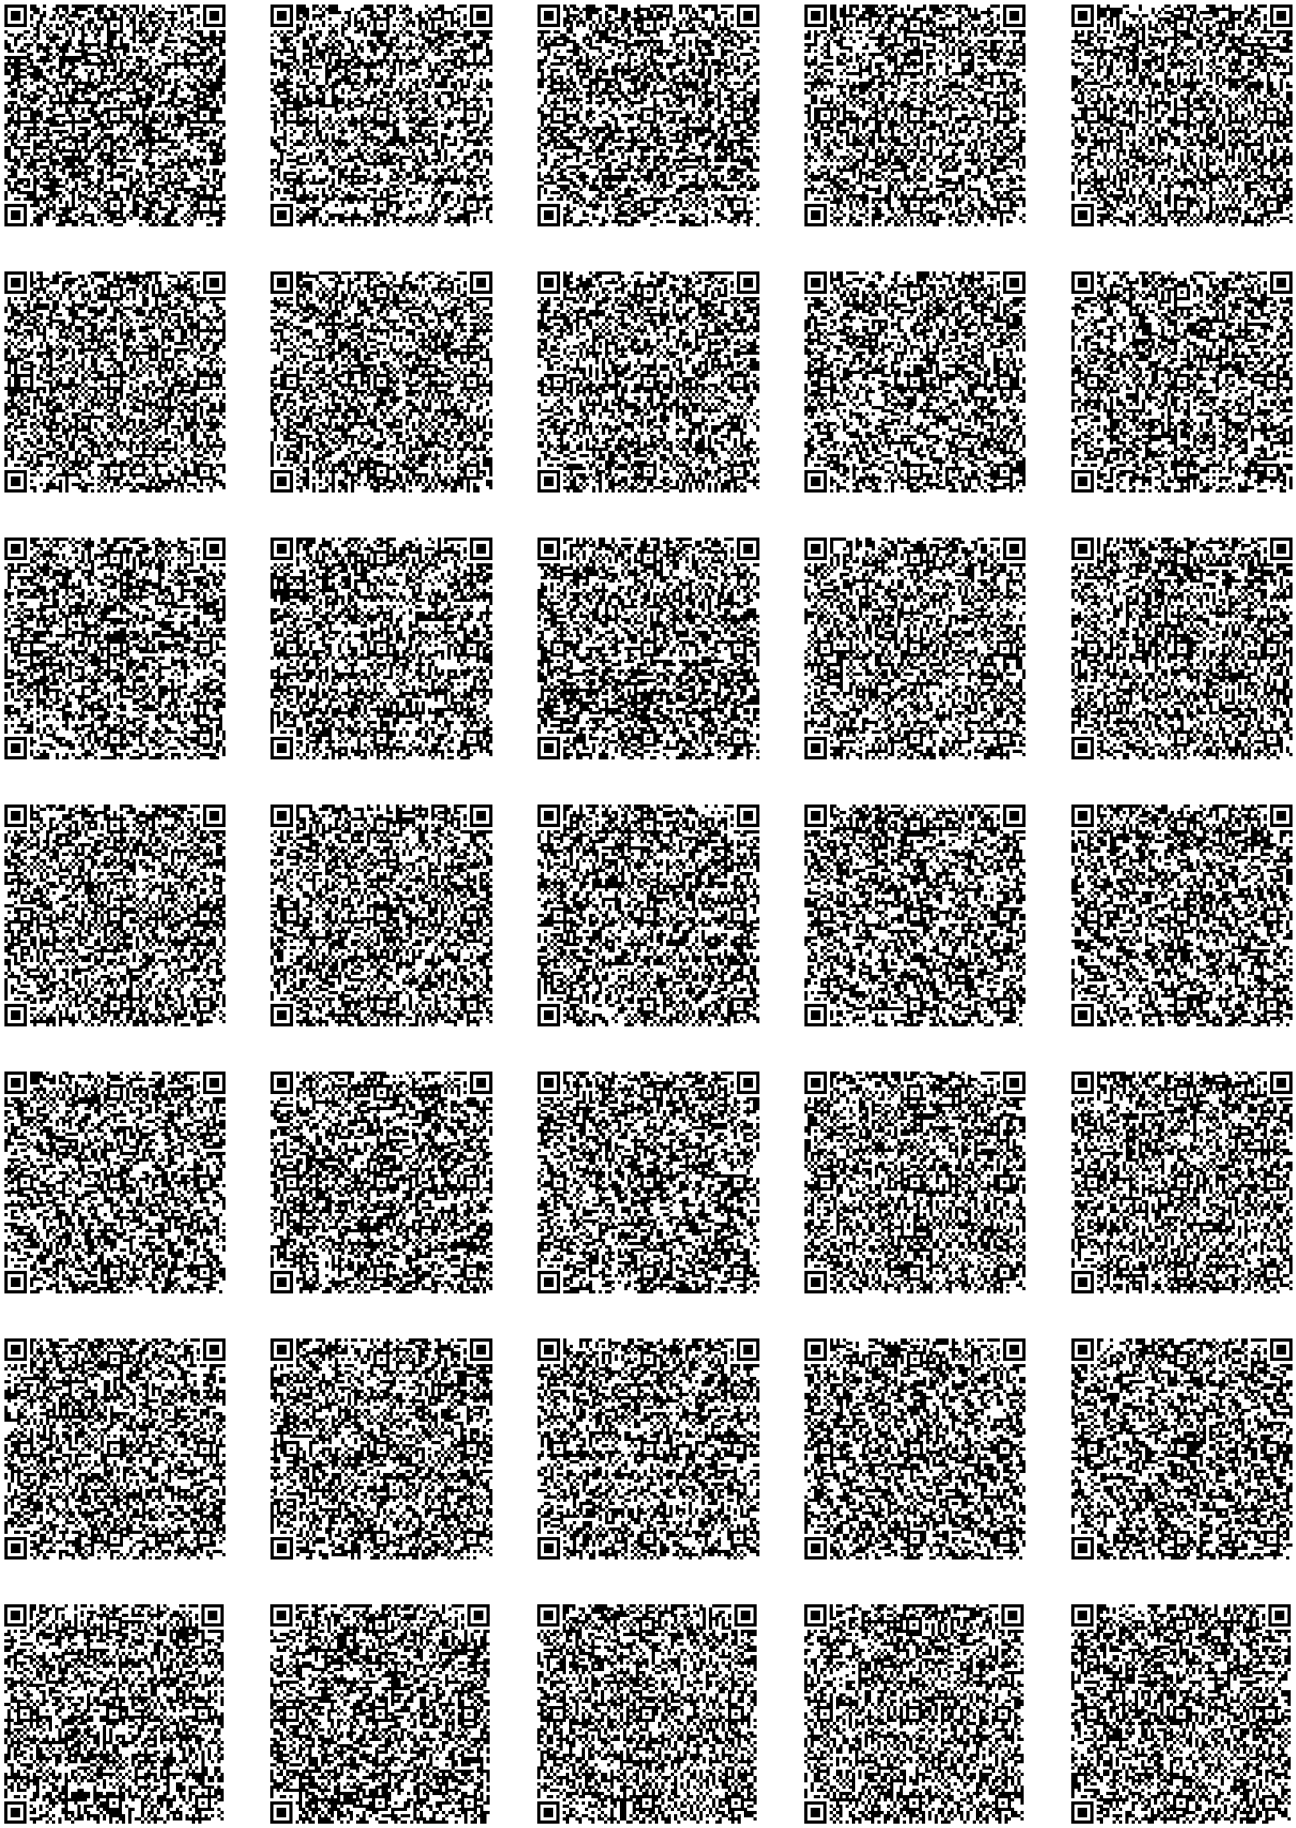
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	20.01.2025 05:15
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	20.01.2025 08:03
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	20.01.2025 06:58
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.01.2025 09:53
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.01.2025 11:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.01.2025 11:32
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	21.01.2025 12:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	21.01.2025 13:06
