ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-060440002060-20250127-63277411
1.1. **Номер учетной системы** 00000000008
2. **Дата выписки** 27.01.2025
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 25.01.2025
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
18. Адрес места нахождения
г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [ ] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 090340012961
26.2 Наименование Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
26.3 Адрес доставки г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 117
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 29.06.2023
27.5 Учетный номер
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			186 936 045,54	186 936 045,54		0	186 936 045,54	12%	22 432 325,46	209 368 371			1		
				Всего по счету						**186 936 045,54**			**186 936 045,54**		**22 432 325,46**	**209 368 371**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
0tkRVL4BCPFCqkivjk5onZ7fDpX8jvzUxnUEacHpXRCa9Ob/ZMgP8kno9pIivaNQB86htn1E5G6Ak37z7zRQynKJ5p7xCiQ/9khAZFGmCJoMvHyu8i8jt
aWlvbl8mQhTBzFnua92fIrTyeszCVRvYFkJHANWbpsXpzw4pr8q0wEY=
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Подписано через EQURYLYS.KZ (#371329d9-ca75-403a-8361-1944e8156e86)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024: №7 от 30.12.2024.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	3 014 675 508	710 659 477	2 691 674 560,71				323 000 947,29	3 014 675 508
в том числе: за январь месяц 2025 года	209 368 371	209 368 371	186 936 045,54				22 432 325,46	209 368 371

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сы ғанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №104	Архитектурные решения Блок Е	35 123 228
2	Акт №105	Архитектурные решения Блок Б,Д	119 991 241
3	Акт №106	Архитектурные решения Блок В	54 253 902
		ИТОГО	**209 368 371**

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#371329d9-ca75-403a-8361-1944e8156e86)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 27.01.2025 09:37
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 27.01.2025 10:06
Заказчик: ИИН 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР null	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	Подписано: 27.01.2025 18:01
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 28.01.2025 11:23

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#371329d9-ca75-403a-8361-1944e8156e86)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#371329d9-ca75-403a-8361-1944e8156e86)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#371329d9-ca75-403a-8361-1944e8156e86)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Е				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна АС-21				
1	416	СТПРАЙС-ЛИСТ ЕСЦ РСНБ РК 2023	Жалюзийная решетка алюминивая размером 1000х1900.	шт	1	128 624	128 624
2	425	6108-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2	м2	8.9856	7 830	70 357
3	426	223-103-0117 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	8.9856	84 099	755 680
			Итого по подразделу: Окна АС-21				**954 661**
			Подраздел: Двери АР-22				
4	430	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.75	17 514	30 650
5	431	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/Д1/	м2	1.75	52 373	91 653
6	432	6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	2.05	14 734	30 205
7	433	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2.05	58 830	120 601
8	434	6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м2	2.46	13 530	33 284

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	435	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2.46	68 169	167 696
10	436	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	105	7 285	764 925
11	437	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	10.5	19 229	201 904
12	438	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	11.76	20 902	245 808
13	439	223-201-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П+/21-15/	м2	47.25	21 694	1 025 042
14	440	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	129.7	907	117 638
15	441	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	90	601	54 090
16	442	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	29	3 380	98 020
17	443	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	29	3 410	98 890
18	444	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	5.67	7 708	43 704
19	445	223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15+Д42	м2	5.67	83 965	476 082
20	446	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 22-09+Д40	м2	2.52	139 871	352 475
21	447	6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	2.425	14 734	35 730
22	448	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2.425	58 830	142 663
23	449	6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м2	2.16	13 530	29 225

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	450	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	2.16	67 178	145 103
			Итого по подразделу: Двери АР-22				**4 305 389**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1 АР-23				
25	451	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19.62	4 268	83 738
26	452	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	6.58	3 874	25 491
27	453	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	19.62	130 304	2 556 564
28	454	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6.58	146 170	961 799
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1 АР-23				**3 627 592**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1				
29	455	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71.03	4 268	303 156
30	456	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	13.33	3 874	51 640
31	457	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	71.03	110 393	7 841 215
32	458	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	13.33	123 298	1 643 562
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1				**9 839 573**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1				
33	459	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	14.2	24 673	350 357
34	460	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	16.51	3 874	63 960
35	461	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14.2	130 304	1 850 317
36	462	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	16.51	146 170	2 413 267

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1				**4 677 901**
			Подраздел: Перемычки АР-28				
37	463	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.36897	117 997	43 537
38	464	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.31422	429 921	135 090
39	465	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.05475	325 873	17 842
40	466	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	15.46818	300	4 640
41	467	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	15.46818	223	3 449
			Итого по подразделу: Перемычки АР-28				**204 558**
			Итого по разделу: Проемы				**23 609 674**
			Раздел: Вентшахты /АР-30/				
42	468	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	33.26	5 699	189 549
43	469	261-105-0183 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0.189582	179 342	34 000
44	470	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.1901	252 369	47 975
45	471	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.12038	429 921	51 754
46	472	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.06972	467 480	32 593
47	473	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	10.714868	300	3 214
48	474	214-402-0302 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	2.05	20 670	42 373
			Итого по разделу: Вентшахты /АР-30/				**401 458**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Ограждение лестницы Л-1 АР-36				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	475	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	37.295	8 188	305 371
50	476	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	37.295	29 813	1 111 876
			Итого по подразделу: Ограждение лестницы Л-1 АР-36				**1 417 247**
			Итого по разделу: Разные работы				**1 417 247**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Е				**25 428 379**
			ИТОГО по акту:				**25 428 379**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				25428379.324 x 6.20%	1 576 559
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				25428379.324 + 1576559.470	27 004 938
		Сметная прибыль, 5.00%				27004938.794 x 5.00%	1 350 246
		Непредвиденные расходы, 5.000%				27004938.794 x 5.000%	1 350 246
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					29 705 432
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				29705432.673 x 1.0557	31 360 025
		НДС (12%)				31360025.273 x 12%	3 763 203
		Итого с НДС				31360025.273 + 3763203.033	35 123 228

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	23.01.2025 07:01
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	23.01.2025 14:52
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	23.01.2025 11:42
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	24.01.2025 11:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	24.01.2025 11:11
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	24.01.2025 05:17
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	25.01.2025 11:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	25.01.2025 18:07

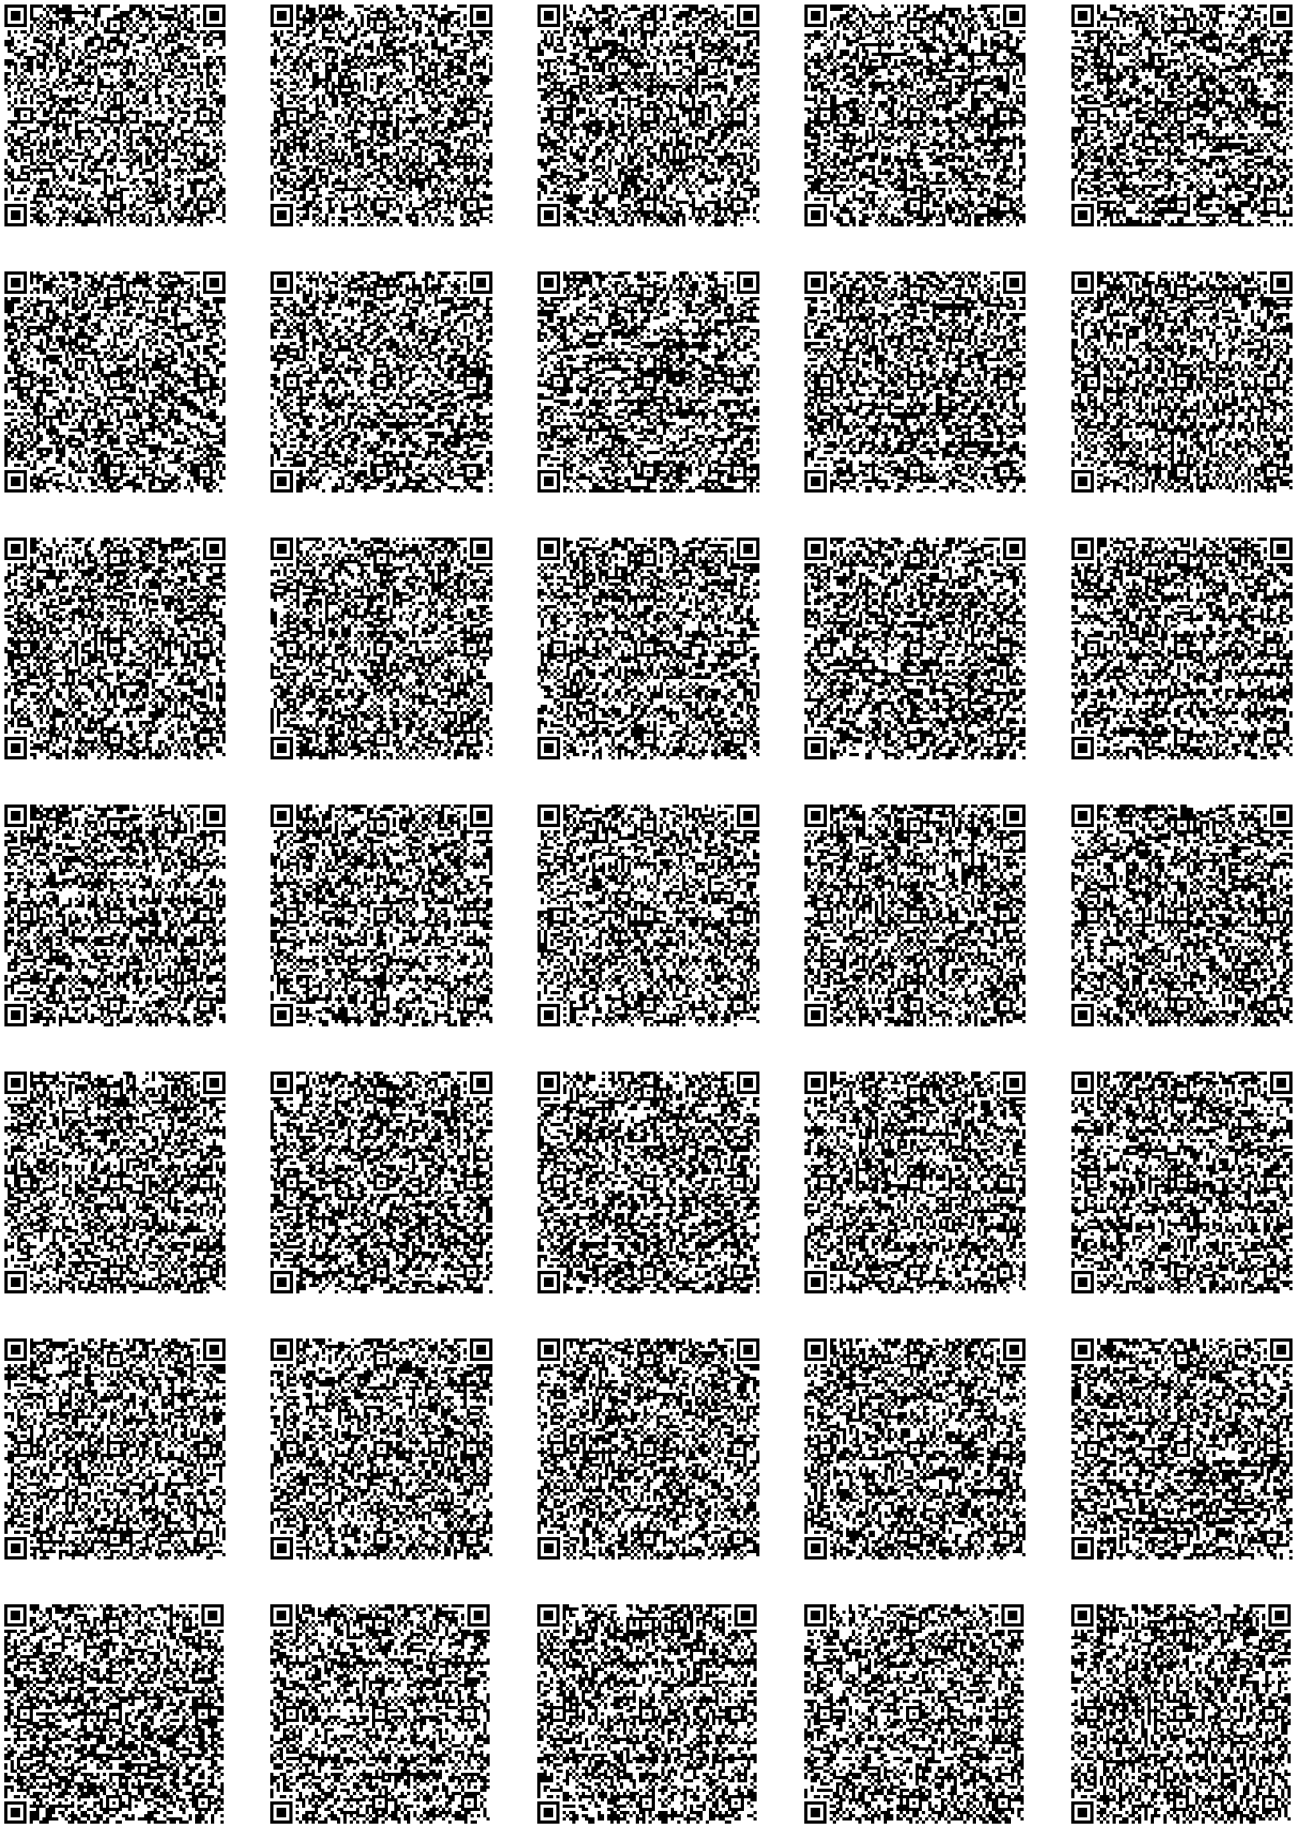

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок В				
			Раздел: Ведомость отделки стен АР-17				
			Подраздел: Затирка поверхности				
1	296	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	226.27	549	124 221
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**124 221**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
2	297	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	47.78	7 142	341 245
3	298	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38.329116	167	6 401
4	299	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	100.586456	267	26 857
5	300	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	100.338	1 080	108 364
6	301	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	47.78	1 528	73 008
7	302	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	65.64972	76	4 989
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**560 865**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
8	303	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	421.93	1 330	561 167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	304	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	421.93	683	288 178
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**849 345**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
10	305	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	767	1 823	1 398 241
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 398 241**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
11	306	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	284.61	1 957	556 982
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**556 982**
			Подраздел: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				
12	307	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	74.57	1 823	135 941
			Итого по подразделу: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				**135 941**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
13	308	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	322.8	5 623	1 815 104
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**1 815 104**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
14	309	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	12.42	7 142	88 704
15	310	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	9.963324	167	1 664
16	311	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	26.146584	267	6 981
17	312	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	26.082	1 080	28 169
18	313	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	12.42	1 528	18 978
19	314	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	17.06508	76	1 297
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**145 793**
			Подраздел: Обмазочная гидроизоляция				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	315	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	80.92	4 414	357 181
			Итого по подразделу: Обмазочная гидроизоляция				**357 181**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
21	316	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	74.13	12 370	916 988
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**916 988**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
22	317	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	399.64	1 566	625 836
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**625 836**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
23	318	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	379.23	549	208 197
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**208 197**
			Подраздел: Выравнивающий шпатлёвочный слой,				
24	319	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	15.04	1 823	27 418
			Итого по подразделу: Выравнивающий шпатлёвочный слой,				**27 418**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
25	320	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	35.38	4 336	153 408
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**153 408**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				
26	321	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	15.04	1 260	18 950
27	322	236-202-0402РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3.76	497	1 869
28	323	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	15.04	641	9 641
29	324	236-202-0402РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2.256	497	1 121
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				**31 581**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	325	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	760.43	1 823	1 386 264
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 386 264**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
31	326	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	280.8	1 957	549 526
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**549 526**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
32	327	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	533.1	1 566	834 835
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**834 835**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
33	328	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	436.61	549	239 699
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**239 699**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
34	329	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	259.09	5 623	1 456 863
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**1 456 863**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
35	330	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	48.18	4 336	208 908
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**208 908**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
36	331	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	320.61	1 330	426 411
37	332	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	320.61	683	218 977
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**645 388**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
38	333	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	72.24	7 142	515 938

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	334	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	57.950928	167	9 678
40	335	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	152.079648	267	40 605
41	336	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	151.704	1 080	163 840
42	337	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	72.24	1 528	110 383
43	338	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	99.25776	76	7 544
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**847 988**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
44	339	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	9.39	7 142	67 063
45	340	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7.532658	167	1 258
46	341	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19.767828	267	5 278
47	342	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	19.719	1 080	21 297
48	343	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	9.39	1 528	14 348
49	344	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12.90186	76	981
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**110 225**
			Подраздел: Обмазочная гидроизоляция				
50	345	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	78.56	4 414	346 764
			Итого по подразделу: Обмазочная гидроизоляция				**346 764**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
51	346	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	73.4	12 370	907 957
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**907 957**
			Подраздел: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				
52	347	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	167.31	1 823	305 006
			Итого по подразделу: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				**305 006**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Затирка поверхности				
53	348	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	29.57	1 823	53 906
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**53 906**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
54	349	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	83.31	7 142	595 000
55	350	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	66.831282	167	11 161
56	351	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	175.384212	267	46 828
57	352	232-101-0202РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	174.951	925	161 830
58	353	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	83.31	1 528	127 297
59	354	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	114.46794	76	8 700
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**950 817**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
60	355	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	549.12	1 566	859 922
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**859 922**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
61	356	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	748.18	1 823	1 363 932
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 363 932**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
62	357	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	436.29	549	239 522
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**239 522**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
63	358	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	268.87	1 957	526 179
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**526 179**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	359	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	48.18	4 336	208 908
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**208 908**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
65	360	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	291.58	1 330	387 801
66	361	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	291.58	683	199 149
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**586 950**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
67	362	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	253.76	5 623	1 426 892
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**1 426 892**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
68	363	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	9.39	7 142	67 063
69	364	222-529-0101РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	7.532658	167	1 258
70	365	222-529-0201РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19.767828	267	5 278
71	366	232-101-0302РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	19.719	1 080	21 297
72	367	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	9.39	1 528	14 348
73	368	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	12.90186	76	981
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**110 225**
			Подраздел: Обмазочная гидроизоляция				
74	369	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	81.32	4 414	358 945
			Итого по подразделу: Обмазочная гидроизоляция				**358 945**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
75	370	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	81.32	12 370	1 005 928
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**1 005 928**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Затирка поверхности				
76	371	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	29.51	1 823	53 797
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**53 797**
			Подраздел: Фартук				
77	372	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	16.2	12 370	200 394
			Итого по подразделу: Фартук				**200 394**
			Итого по разделу: Ведомость отделки стен АР-17				**23 692 845**
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
78	373	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	291.02	3 897	1 134 105
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 134 105**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
79	374	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	295.67	2 920	863 356
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**863 356**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
80	375	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	291.02	1 753	510 158
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**510 158**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
81	376	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	166.86	6 504	1 085 257
82	377	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	175.203	4 122	722 187
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 807 444**
			Подраздел: Реечный потолок				
83	378	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	38.1	7 125	271 462
84	379	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	40.005	6 053	242 150
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**513 612**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
85	380	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	4.65	7 975	37 084
86	381	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0.4743	66 535	31 558
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**68 642**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
87	382	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	4.65	3 584	16 666
88	383	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19.17195	76	1 457
89	384	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4.65	145	674
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**18 797**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				
90	385	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/атмосферостойкая/Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	4.65	1 935	8 998
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				**8 998**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
91	386	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	343.77	3 897	1 339 672
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 339 672**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
92	387	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	343.77	2 920	1 003 808
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 003 808**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
93	388	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	343.77	1 753	602 629
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**602 629**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
94	389	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	117.54	6 504	764 480
95	390	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	123.417	4 122	508 725

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 273 205**
			Подраздел: Реечный потолок				
96	391	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	37.8	7 125	269 325
97	392	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	39.69	6 053	240 244
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**509 569**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
98	393	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	343.34	3 897	1 337 996
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 337 996**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
99	394	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	343.34	2 920	1 002 553
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 002 553**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
100	395	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	343.34	1 753	601 875
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**601 875**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
101	396	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	116.71	6 504	759 082
102	397	232-401-0101РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	122.5455	4 122	505 133
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 264 215**
			Подраздел: Реечный потолок				
103	398	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	37.18	7 125	264 908
104	399	232-401-0301РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	39.039	6 053	236 303
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**501 211**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
105	400	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	23.81	7 975	189 885

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	401	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2.42862	66 535	161 588
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**351 473**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
107	402	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	23.81	3 584	85 335
108	403	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	98.16863	76	7 460
109	404	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	23.81	145	3 452
110	405	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	23.81	1 565	37 263
111	406	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	23.81	841	20 024
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**153 535**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
112	407	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	23.07	3 897	89 904
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**89 904**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
113	408	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	23.07	2 920	67 364
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**67 364**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
114	409	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	23.07	1 753	40 442
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**40 442**
			Подраздел: Откосы				
115	410	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 20 мм	м2	60.95	5 161	314 563
116	411	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	60.95	1 823	111 112
117	412	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	60.95	1 566	95 448

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Откосы				**521 123**
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**15 585 686**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок В				**39 278 531**
			ИТОГО по акту:				**39 278 531**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)			39278531.000 x 6.20%	2 435 268
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			39278531.000 + 2435268.847	41 713 799
			Сметная прибыль, 5.00%			41713799.847 x 5.00%	2 085 689
			Непредвиденные расходы, 5.000%			41713799.847 x 5.000%	2 085 689
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				45 885 179
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557			45885179.832 x 1.0557	48 440 984
			НДС (12%)			48440984.348 x 12%	5 812 918
			Итого с НДС			48440984.348 + 5812918.122	54 253 902

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	23.01.2025 07:14
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	23.01.2025 14:51
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	23.01.2025 11:43
Представители заказчика		
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	25.01.2025 18:08
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	25.01.2025 11:07 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	24.01.2025 11:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	24.01.2025 11:11
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	24.01.2025 05:14

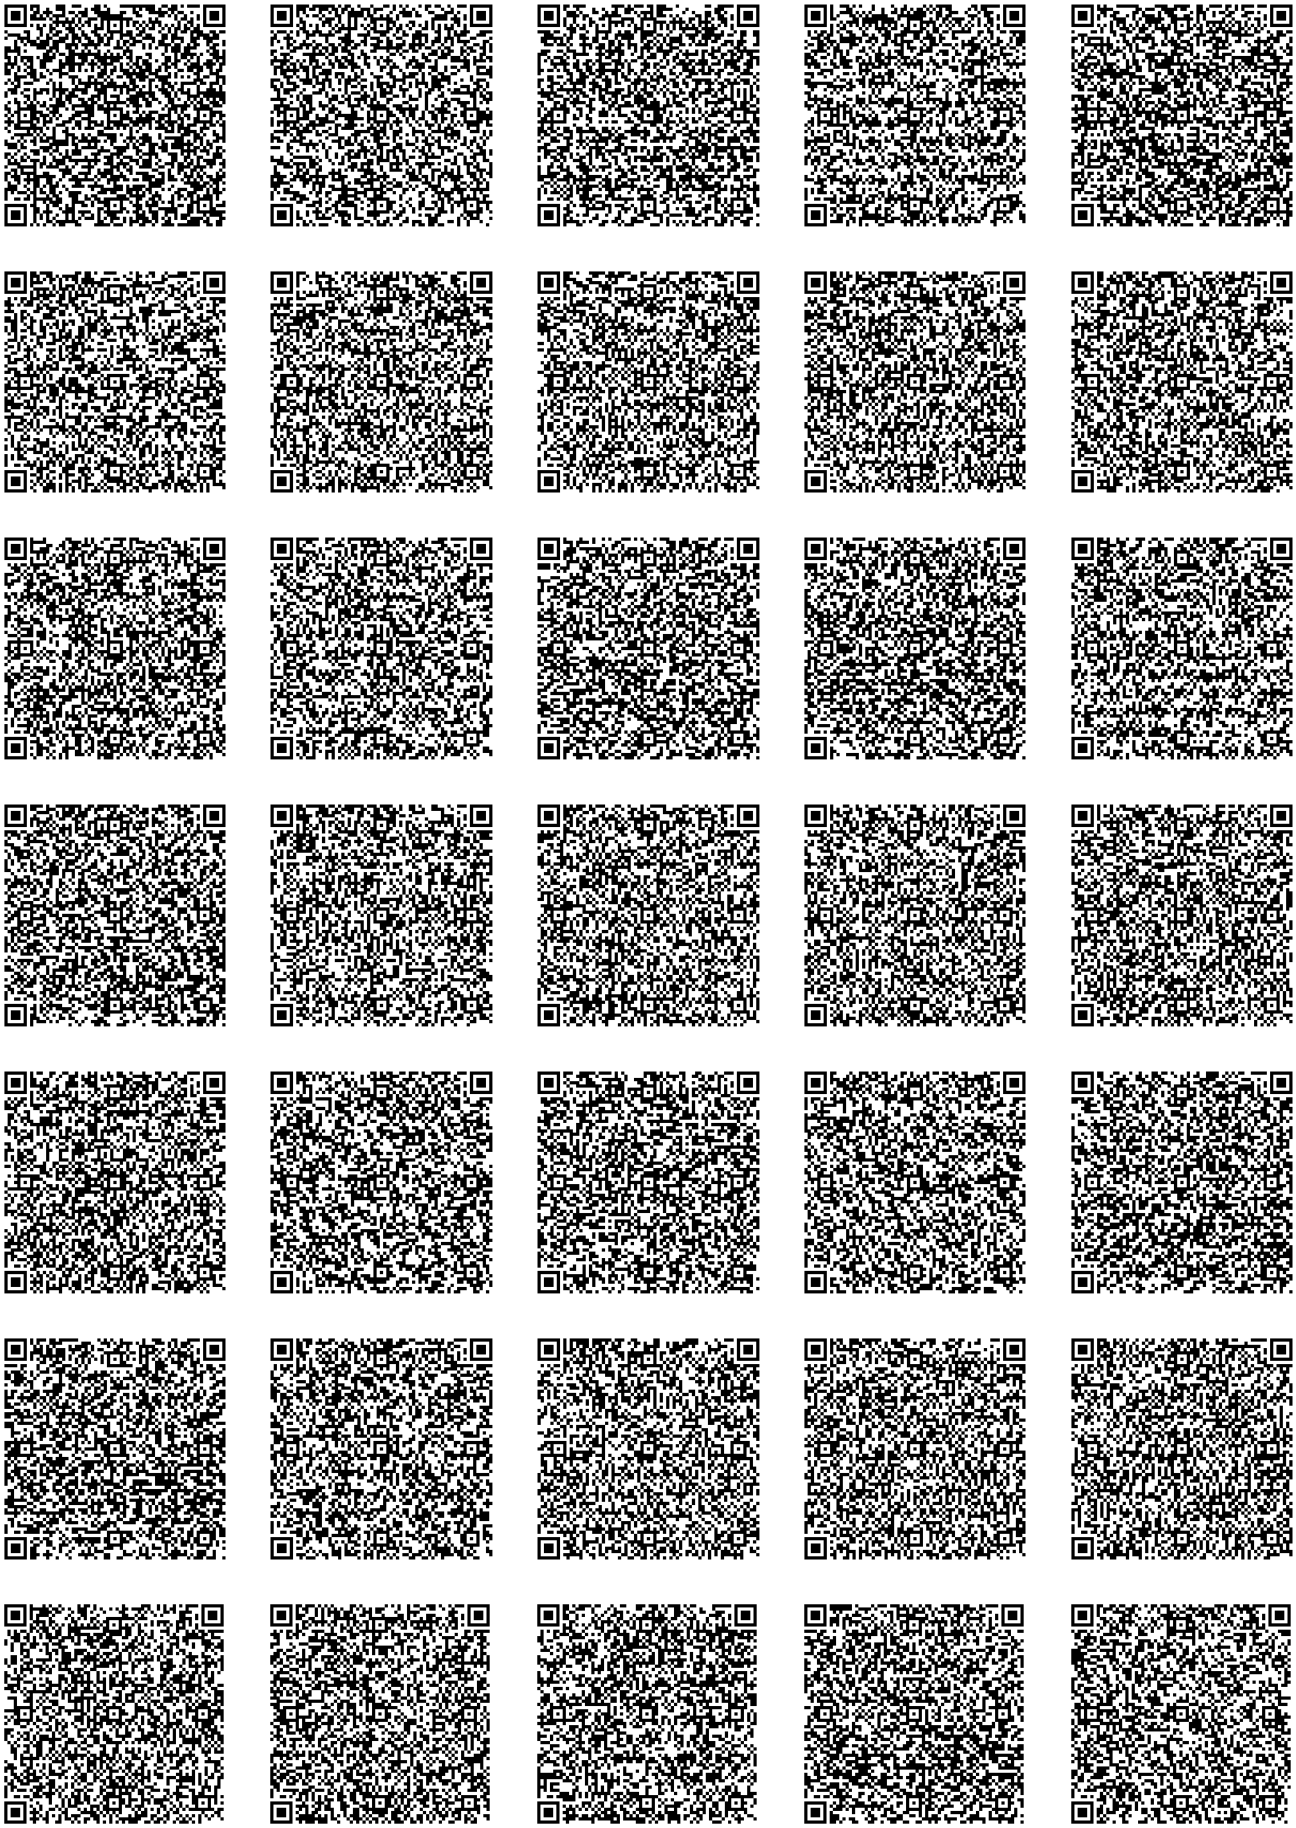

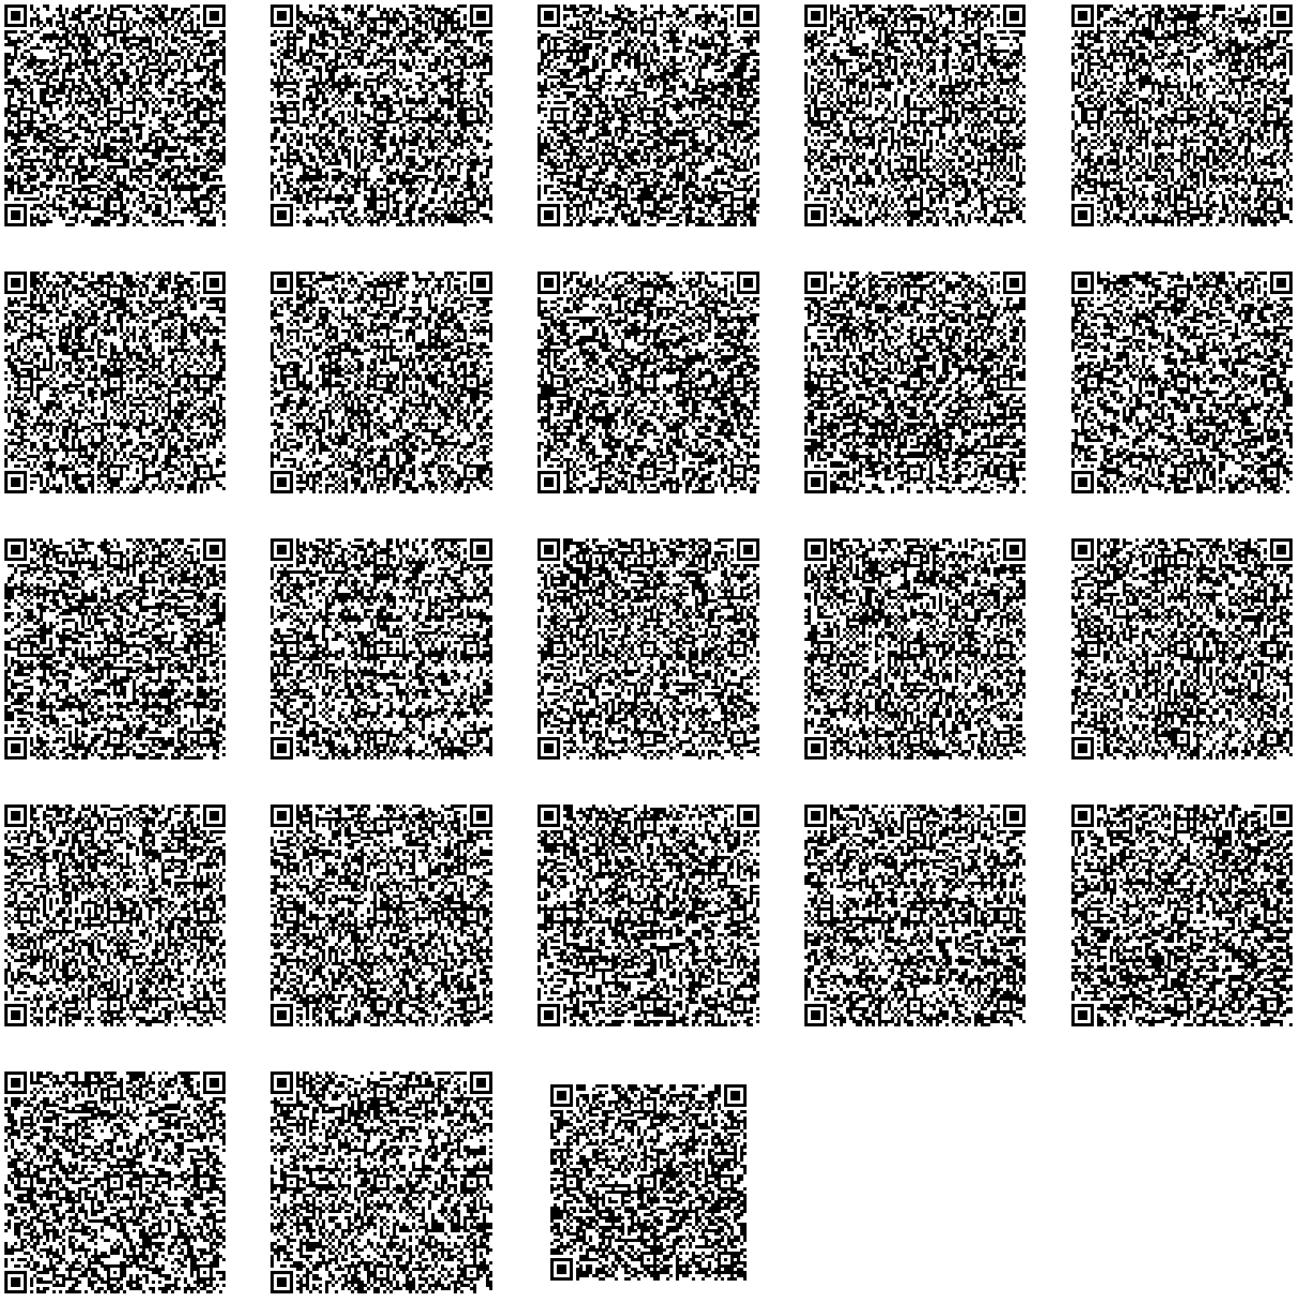

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Б, Д				
			Раздел: Ведомость отделки стен АР-17				
			Подраздел: Затирка поверхности				
1	390	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	136.07	549	74 702
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**74 702**
			Подраздел: Известковая побелка (за 2 раза)				
2	392	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	269.63	520	140 208
			Итого по подразделу: Известковая побелка (за 2 раза)				**140 208**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
3	393	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	149.04	1 330	198 223
4	394	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	149.04	683	101 794
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**300 017**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	395	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	69.27	7 142	494 726
6	396	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	55.568394	167	9 280
7	397	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	145.827204	267	38 936
8	398	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	145.467	1 080	157 104
9	399	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	69.27	1 528	105 845
10	400	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	95.17698	76	7 233
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**813 124**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
11	401	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	1322.32	1 330	1 758 686
12	402	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1322.32	683	903 144
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**2 661 831**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
13	404	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1083.21	1 957	2 119 842
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**2 119 842**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
14	406	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	21.75	7 142	155 338
15	407	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	17.44785	167	2 914

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	408	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	45.7881	267	12 224
17	409	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	45.675	1 080	49 329
18	410	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	21.75	1 528	33 234
19	411	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	29.8845	76	2 271
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**255 311**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
20	413	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	200.67	12 370	2 482 288
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**2 482 288**
			Подраздел: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				
21	414	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	232.05	1 823	423 027
			Итого по подразделу: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				**423 027**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
22	415	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	530.11	1 566	830 152
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**830 152**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				
23	419	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	14.16	1 260	17 842
24	420	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3.54	497	1 759
25	421	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	14.16	641	9 077

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	422	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2.124	497	1 056
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				**29 734**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
27	423	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	6.267	4 336	27 173
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**27 173**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
28	424	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	103.707	1 823	189 057
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**189 057**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
29	425	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	508.57	1 566	796 421
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**796 421**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
30	426	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	45.464	549	24 959
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**24 959**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
31	427	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	152.71	7 142	1 090 655
32	428	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	122.503962	167	20 458
33	429	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	321.485092	267	85 837
34	430	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	320.691	1 080	346 346

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	431	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	152.71	1 528	233 341
36	432	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	209.82354	76	15 946
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**1 792 584**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
37	433	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	690.43	1 330	918 272
38	434	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	690.43	683	471 564
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**1 389 836**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
39	435	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	361.67	1 957	707 788
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**707 788**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
40	436	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	16.9	7 142	120 700
41	437	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	13.55718	167	2 264
42	438	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	35.57788	267	9 499
43	439	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	35.49	1 080	38 329
44	440	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	16.9	1 528	25 823
45	441	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	23.2206	76	1 765

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**198 380**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
46	443	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	145.52	12 370	1 800 082
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**1 800 082**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
47	444	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	30.121	5 623	169 370
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**169 370**
			Подраздел: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				
48	445	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	16.731	1 823	30 500
			Итого по подразделу: Слой влагостойкой п/п шпатлёвки				**30 500**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
49	446	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	11.26	7 142	80 419
50	447	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	9.032772	167	1 508
51	448	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	23.704552	267	6 329
52	449	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	23.646	1 080	25 538
53	450	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	11.26	1 528	17 205
54	451	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	15.47124	76	1 176
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**132 175**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	453	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	73.94	12 370	914 638
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**914 638**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
56	454	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	57.66	1 823	105 114
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**105 114**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
57	455	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	363.16	1 957	710 704
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**710 704**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
58	456	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	519.94	1 330	691 520
59	457	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	519.94	683	355 119
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**1 046 639**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
60	458	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	34.82	5 623	195 792
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**195 792**
			Подраздел: Затирка поверхности				
61	459	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	2.78	549	1 525
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**1 525**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
62	460	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	129.27	1 566	202 437

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**202 437**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
63	461	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	17.129	549	9 403
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**9 403**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
64	462	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	66.47	7 142	474 729
65	463	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	53.322234	167	8 905
66	464	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	139.932644	267	37 361
67	465	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	139.587	925	129 118
68	466	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	66.47	1 528	101 566
69	467	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	91.32978	76	6 941
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**758 621**
			Подраздел: Затирка поверхности				
70	468	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	28.11	549	15 432
71	469	6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	28.11	520	14 617
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**30 049**
			Подраздел: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				
72	470	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	7.538	5 623	42 386

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				**42 386**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
73	471	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	75.38	1 330	100 255
74	472	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	75.38	683	51 485
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**151 740**
			Подраздел: Фартук				
75	473	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	3.24	12 370	40 079
			Итого по подразделу: Фартук				**40 079**
			Итого по разделу: Ведомость отделки стен АР-17				**21 597 694**
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
76	474	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	166.7	7 975	1 329 432
77	475	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	17.0034	66 535	1 131 321
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**2 460 753**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
78	476	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	166.7	3 584	597 453
79	477	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	687.3041	76	52 235
80	478	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	166.7	145	24 172
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**673 860**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	479	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	166.7	1 495	249 216
82	480	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	41.675	278	11 586
83	481	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	166.7	799	133 193
84	482	236-202-0403 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	25.005	278	6 950
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза				**400 946**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
85	483	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	205.71	3 897	801 652
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**801 652**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
86	484	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	186.05	2 920	543 266
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**543 266**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
87	485	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	181.4	1 753	317 994
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**317 994**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
88	486	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	245.46	6 504	1 596 472
89	487	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	257.733	4 122	1 062 375
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**2 658 847**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	488	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	4.65	7 975	37 084
91	489	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0.4743	66 535	31 558
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**68 642**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
92	490	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	4.65	3 584	16 666
93	491	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19.17195	76	1 457
94	492	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4.65	145	674
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**18 797**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				
95	493	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/атмосферостойкая/Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	4.65	1 935	8 998
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				**8 998**
			Подраздел: Реечный потолок				
96	494	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	89.45	7 125	637 331
97	495	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	93.9225	6 053	568 513
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**1 205 844**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
98	496	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	262.46	3 897	1 022 807
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 022 807**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	497	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	262.46	2 920	766 383
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**766 383**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
100	498	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	262.46	1 753	460 092
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**460 092**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
101	499	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	184.5	6 504	1 199 988
102	500	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	193.725	4 122	798 534
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 998 522**
			Подраздел: Реечный потолок				
103	501	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	61.08	7 125	435 195
104	502	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	64.134	6 053	388 203
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**823 398**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
105	503	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	83.26	3 897	324 464
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**324 464**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
106	504	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	83.26	2 920	243 119
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**243 119**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	505	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	83.26	1 753	145 955
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**145 955**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
108	506	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	279.04	6 504	1 814 875
109	507	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	292.992	4 122	1 207 713
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**3 022 589**
			Подраздел: Реечный потолок				
110	508	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	37.18	7 125	264 908
111	509	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	39.039	6 053	236 303
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**501 211**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
112	510	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	60.85	7 975	485 279
113	511	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	6.2067	66 535	412 963
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**898 242**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
114	512	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	60.85	3 584	218 086
115	513	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	250.88455	76	19 067
116	514	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	60.85	145	8 823

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
117	515	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	60.85	1 565	95 230
118	516	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	60.85	841	51 175
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**392 381**
			Подраздел: Откосы				
119	517	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 20 мм	м2	54.41	5 161	280 810
120	518	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	54.41	1 823	99 189
121	519	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	54.41	1 566	85 206
			Итого по подразделу: Откосы				**465 205**
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**20 223 967**
			Раздел: Проемы РП19				
			Подраздел: Окна				
122	520	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	24.774	13 826	342 525
123	521	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	1.0836	41 150	44 590
124	522	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	5.7384	43 802	251 353
125	523	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	3.5712	39 032	139 391
126	524	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	14.3808	49 937	718 134

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	525	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	82.7184	10 112	836 448
128	526	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	82.7184	41 701	3 449 440
129	527	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	8.4072	10 112	85 014
130	528	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	8.4072	47 013	395 248
131	529	6108-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	21.6384	9 313	201 518
132	530	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	21.6384	36 908	798 630
			Итого по подразделу: Окна				**7 262 291**
			Подраздел: Подоконники				
133	531	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	71	4 596	326 316
134	532	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	1.8	1 655	2 979
135	533	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 300 мм	м	69.2	1 986	137 431
			Итого по подразделу: Подоконники				**466 726**
			Подраздел: Двери				
136	534	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	5.67	13 955	79 125
137	535	223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный+/Д2/	м2	5.67	33 823	191 776
138	536	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	5.6	13 955	78 148

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	537	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный+/Д3,Д6/	м2	5.6	58 830	329 448
140	538	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	4.8	19 053	91 454
141	539	223-207-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный+/Д4/	м2	4.8	58 080	278 784
142	540	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	5.35	17 514	93 700
143	541	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный+/Д5/	м2	3.6	52 373	188 543
144	542	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный+/Д7/	м2	1.75	64 046	112 080
145	543	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	130.81	7 285	952 951
146	544	223-201-0118 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	15.75	15 603	245 747
147	545	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	50.4	19 229	969 142
148	546	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-14	м2	8.82	19 229	169 600
149	547	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 с глухими полотнами ДГ 21-12	м2	15.12	19 229	290 742
150	548	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 с глухими полотнами ДГ 21-12	м2	8.8	19 229	169 215
151	549	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	31.92	20 902	667 192
152	550	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	134.7	907	122 173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
153	551	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	204	601	122 604
154	552	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	59	3 380	199 420
155	553	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	59	3 410	201 190
			Итого по подразделу: Двери				**5 553 034**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1..ВВ-3				
156	554	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16.27	4 268	69 440
157	555	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	18.7	3 874	72 444
158	556	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	16.27	110 393	1 796 094
159	557	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	9.4	123 298	1 159 001
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1..ВВ-3				**3 096 979**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-4				
160	558	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23.97	4 268	102 304
161	559	223-301-0603 СпрСЦ 02.2024	/ВВ-4/Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный EIW 60, с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.	м2	23.97	357 173	8 561 437
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-4				**8 663 741**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1				
162	560	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19.94	24 673	491 980
163	561	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	16.77	130 304	2 185 198
164	562	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3.17	146 170	463 359

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1				**3 140 537**
			Подраздел: Сантехнические кабины АР26.1				
165	563	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	79.2792	13 538	1 073 282
			Итого по подразделу: Сантехнические кабины АР26.1				**1 073 282**
			Подраздел: Перемычки АР-28				
166	564	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.31468	117 997	37 131
167	565	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.23943	429 921	102 936
168	566	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07525	325 873	24 522
169	567	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.79242	300	3 838
170	568	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.79242	223	2 853
			Итого по подразделу: Перемычки АР-28				**171 280**
			Итого по разделу: Проемы РП19				**29 427 870**
			Раздел: Вентшахты /АР-31/				
171	569	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	23.66	5 699	134 838
172	570	261-105-0183 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0.134862	179 342	24 186
173	571	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.2037888	252 369	51 430
174	572	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.12834	429 921	55 176
175	573	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0754488	467 480	35 271

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	574	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8.94	1 069	9 557
			Подраздел: Ограждение				
177	575	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	37.315	38 001	1 418 007
			Итого по подразделу: Ограждение				**1 418 007**
			Итого по разделу: Вентшахты /АР-31/				**1 728 465**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Крыльцо Кр-1				
178	576	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.58	17 061	78 139
179	577	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	9.16	43 400	397 544
180	578	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.9614376	452 925	435 459
181	579	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07486	336 921	25 221
182	580	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	35.954	4 414	158 701
183	581	6112-0103-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ступени цельной гранитной толщина 150 мм	м2	3.91	34 272	134 004
184	582	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	3.9882	18 095	72 166
185	583	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2	5.33	32 629	173 913
186	584	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	5.3833	15 753	84 803

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	585	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	31.14	32 629	1 016 067
188	586	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	31.9185	18 095	577 565
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1				**3 153 583**
			Подраздел: Крыльцо Кр-2				
189	587	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.358	17 061	40 230
190	588	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	9.16	43 400	397 544
191	589	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.9614376	452 925	435 459
192	590	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07474	336 921	25 181
193	591	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	36.114	4 414	159 407
194	592	6112-0103-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ступени цельной гранитной толщина 150 мм	м2	3.91	34 272	134 004
195	593	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	3.9882	18 095	72 166
196	594	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены гранитными полированными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2 до 6	м2	5.33	32 629	173 913
197	595	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	5.3833	15 753	84 803
198	596	6112-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 до 4	м2	31.14	32 629	1 016 067

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	597	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	31.9185	18 095	577 565
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-2				**3 116 339**
			Подраздел: Ограждение крылец				
200	598	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	55.95	38 001	2 126 156
			Итого по подразделу: Ограждение крылец				**2 126 156**
			Итого по разделу: Крыльца				**8 396 078**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Спортивный зал				
201	599	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка, HPL панели, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	108.01	8 417	909 120
202	600	231-102-0103 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	м2	108.01	5 430	586 494
203	601	231-301-0501 РСНБ РК 2022	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 6 мм	м2	108.01	19 264	2 080 705
204	602	522-101-1091002 СпрСЦ 02.2024	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	м2	235.15	6 441	1 514 836
			Итого по подразделу: Спортивный зал				**5 091 155**
			Подраздел: Стремянка СМ-1. ар34				
205	603	1139-0501-0109 РСНБ РК 2022	Стремянки. Устройство	т конструкций	0.46592	104 380	48 633
206	604	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0.46592	1 075 341	501 023
207	605	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	20.50048	448	9 184
			Итого по подразделу: Стремянка СМ-1. ар34				**558 840**
			Итого по разделу: Разные работы				**5 649 995**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Б, Д				**87 024 069**
			ИТОГО по акту:				**87 024 069**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)			85509233.400 x 6.20%	5 301 572
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			87024069.400 + 5301572.308	92 325 641
			Сметная прибыль, 5.00%			90810805.708 x 5.00%	4 540 540
			Непредвиденные расходы, 5.000%			92325641.708 x 5.000%	4 616 282
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				101 482 464
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557			101482464.078 x 1.0557	107 135 037
			НДС (12%)			107135037.328 x 12%	12 856 204
			Итого с НДС			107135037.328 + 12856204.479	119 991 241

Лист согласования
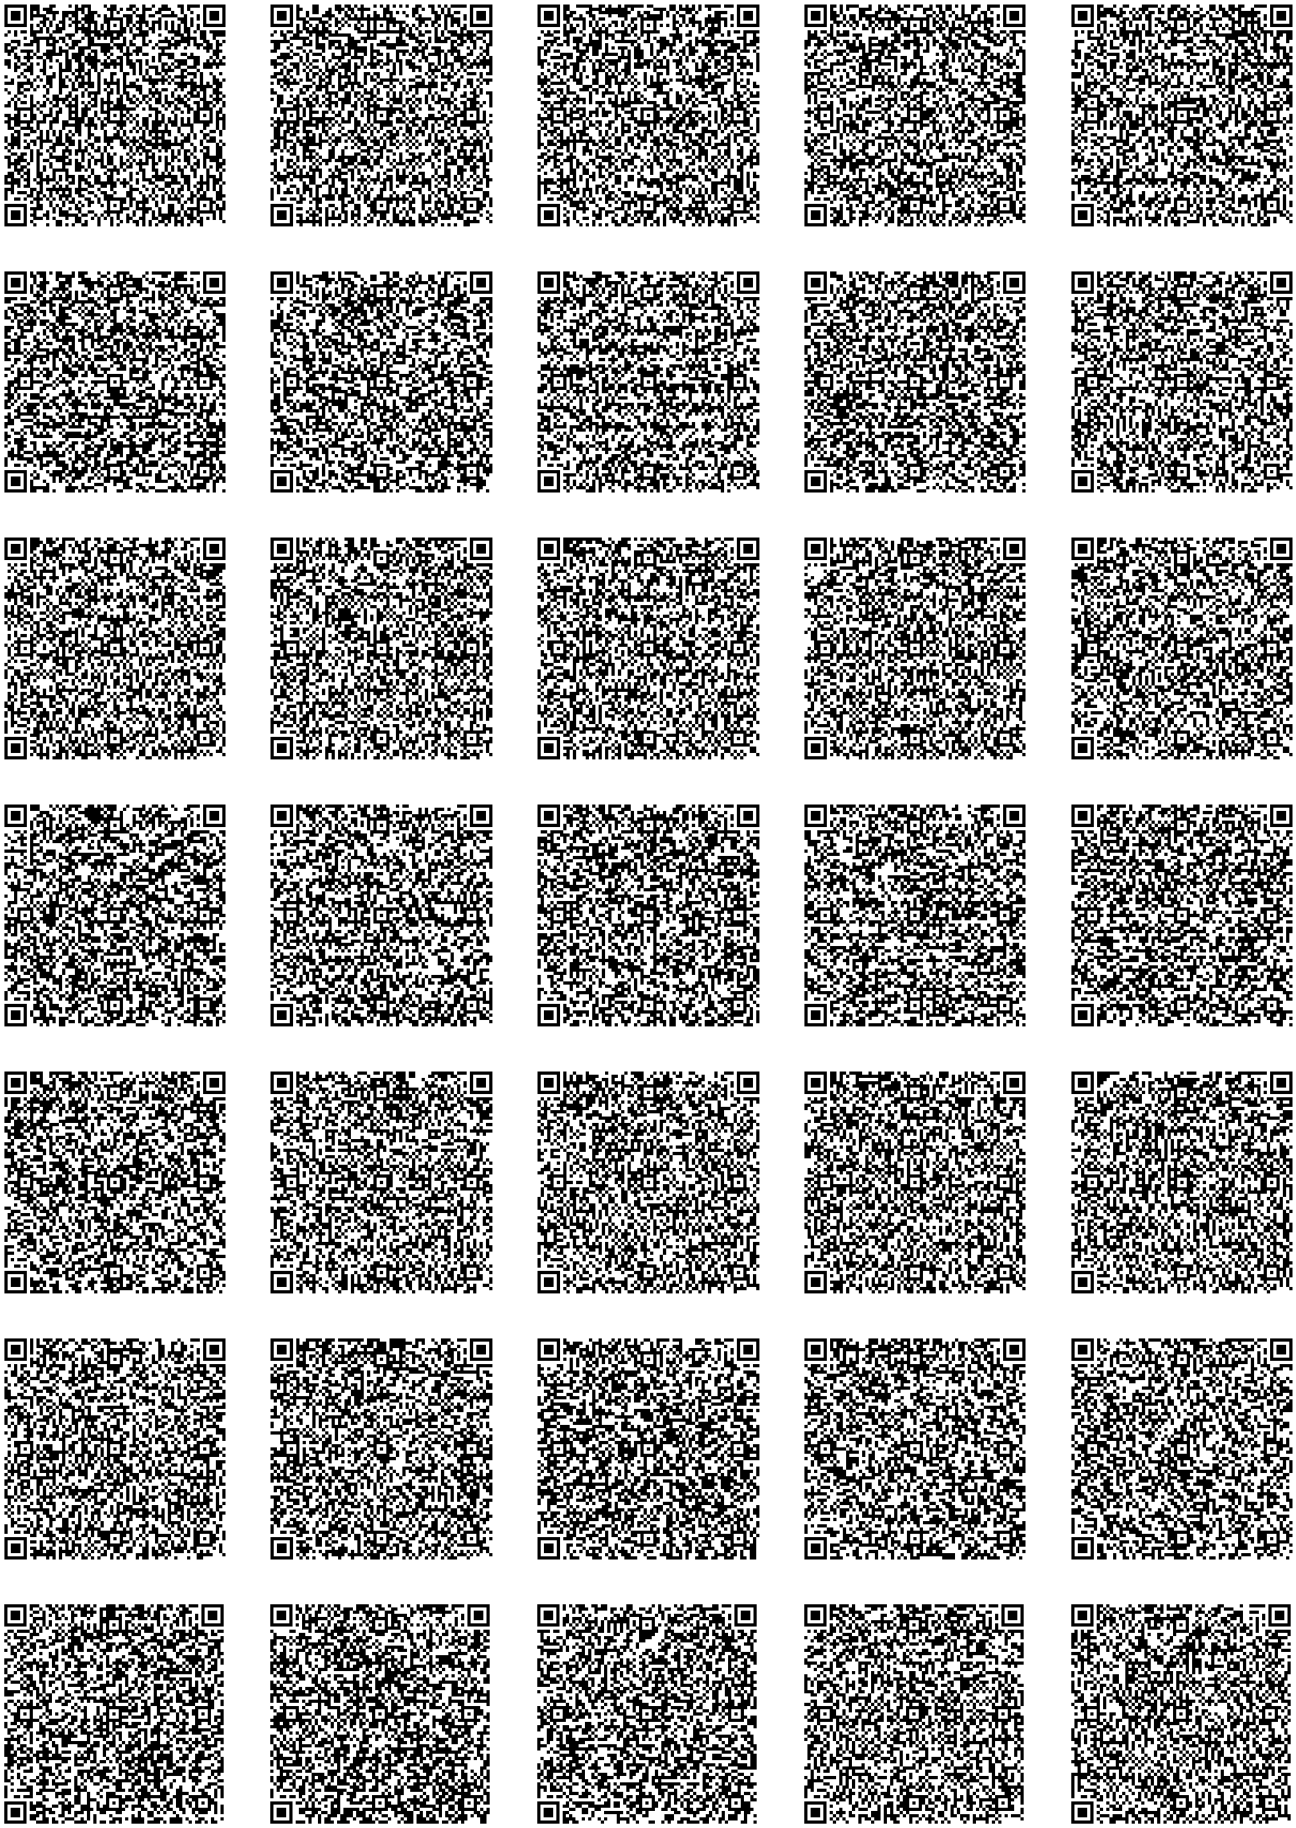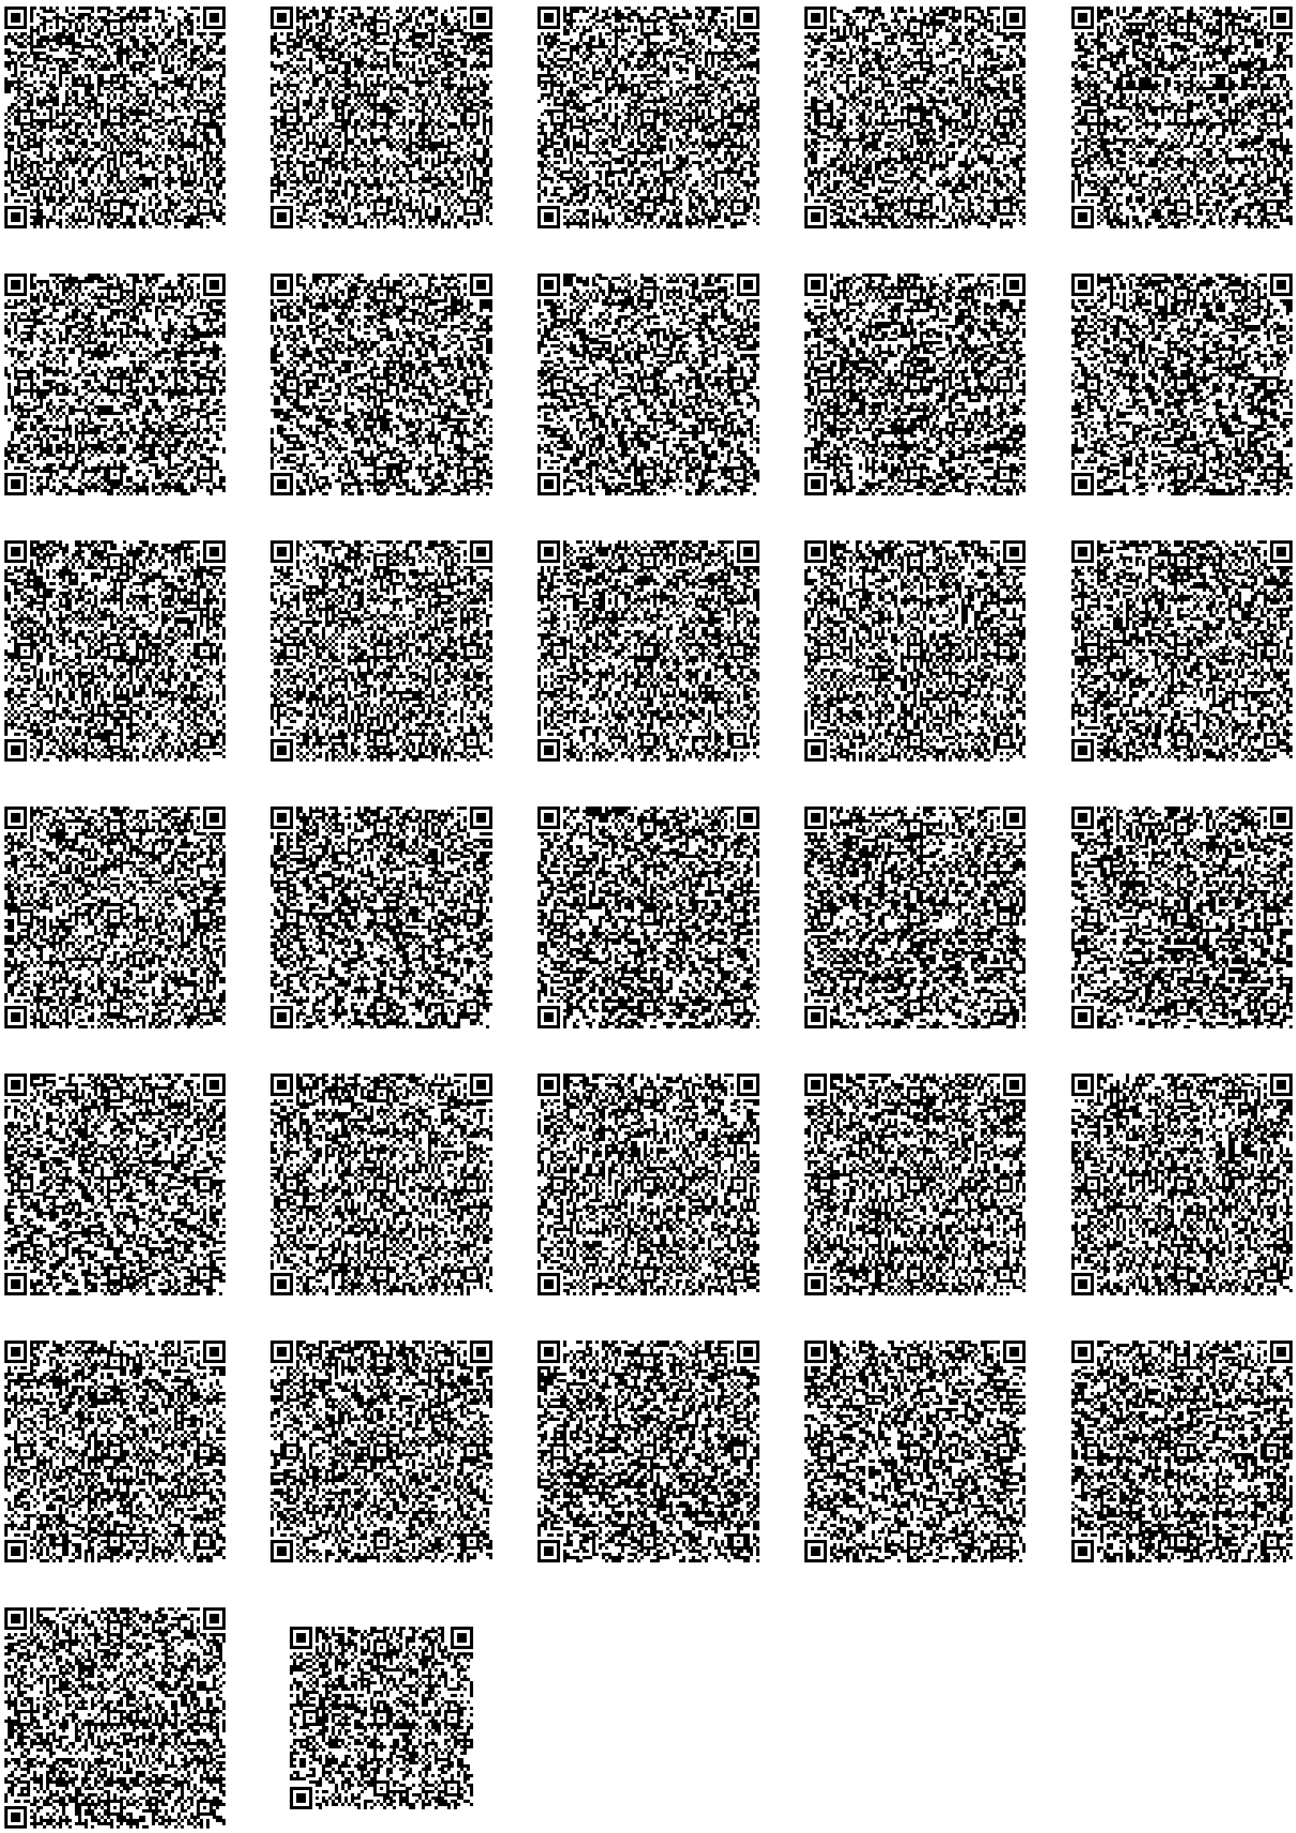
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	24.01.2025 09:30
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	24.01.2025 14:28
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	24.01.2025 09:54
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	25.01.2025 10:15
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	25.01.2025 14:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	25.01.2025 14:14
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	25.01.2025 14:42 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	25.01.2025 18:09
