ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060440002060-20250129-59567122	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000009
2.	**Дата выписки** 29.01.2025	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 28.01.2025		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 **9.2.** номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

10.1. количество

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** **Доля участия**

Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction

18. Адрес места нахождения

г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

20.1. количество

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	090340012961
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5	26.3	Адрес доставки	г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг

27.3 номер 117

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.4 дата 29.06.2023

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 номер

30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер

32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			451 585 115,18	451 585 115,18		0	451 585 115,18	12%	54 190 213,82	505 775 329			1		
				Всего по счету						**451 585 115,18**			**451 585 115,18**		**54 190 213,82**	**505 775 329**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	Wo5imdAXTr+LFNmj3a0sEa/uSOrGVnqTli6Ex5btJmgHhk/LD4fml640Ge4EviSEQfGzSKhXJMS2wrQGbZaSNJIE9NT6srKWQywIx/ElFQBzSNl8Sz BomSlqCWhm++NRkrPpvCYdQ6cenJUpa16LUNakem4lKS3FJl30UIdkUq0I=
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c66e6723-9b17-4cf1-aef8-2f86f21e0287)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за январь месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024: №7 от 30.12.2024.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	3 520 450 837	1 216 434 806	3 143 259 675,89				377 191 161,11	3 520 450 837
в том числе: за январь месяц 2025 года	505 775 329	505 775 329	451 585 115,18				54 190 213,82	505 775 329

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сы ға

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 1 "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в гор области

Реестр актов выполненных работ
за январь месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет
1	Акт №107	Технологическое оборудование. Методические пособия
2	Акт №108	Технологическое оборудование.
3	Акт №109	Вентиляция
4	Акт №110	Вентиляция
5	Акт №111	Архитектурные решения Блок Г,Ж
6	Акт №112	Архитектурные решения Блок Е
7	Акт №113	Архитектурные решения Блок Л
8	Акт №114	Архитектурные решения Блок А
9	Акт №115	Технологическое оборудование. Методические пособия
10	Акт №116	Вентиляция
11	Акт №117	Архитектурные решения Блок В
12	Акт №118	МАФы
		ИТОГО

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,**
Джилкибаев К. А. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,**
Адилбеков Ж.З. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН**
_____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c66e6723-9b17-4cf1-aef8-2f86f21e0287)

нак, строение 17/10

7 микрорайон, дом 46, ЖК

оде Актау Мангистауской

Сумма с НДС
229 050 179
16 076 220
1 071 102
16 869 928
68 312 765
15 718 430
73 230 206
6 436 470
29 701 464
2 175 305
22 086 298
25 046 962
505 775 329

региональному развитию АО

130440032226, Садвакасов К.Т.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c66e6723-9b17-4cf1-aef8-2f86f21e0287)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 28.01.2025 18:23
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 28.01.2025 23:50
Заказчик: ИИН 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР null	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	Подписано: 29.01.2025 10:04
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 29.01.2025 12:09

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c66e6723-9b17-4cf1-aef8-2f86f21e0287)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c66e6723-9b17-4cf1-aef8-2f86f21e0287)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#c66e6723-9b17-4cf1-aef8-2f86f21e0287)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Вентиляция				
			Подраздел: СИСТЕМА В1				
1	250	246-301-0503РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	кг	20	775	15 500
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В1				**15 500**
			Подраздел: СИСТЕМА В17				
2	408	6118-0101-0310ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	48.08	15 806	759 952
			Итого по подразделу: СИСТЕМА В17				**759 952**
			Итого по разделу: Вентиляция				**775 452**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**775 452**
			ИТОГО по акту:				**775 452**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	775452.313 x 6.20%	48 078
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	775452.313 + 48078.042	823 530
	Сметная прибыль, 5.00%	823530.355 x 5.00%	41 176
	Непредвиденные расходы, 5.000%	823530.355 x 5.000%	41 176
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		905 883
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	905883.391 x 1.0557	956 341
	НДС (12%)	956341.096 x 12%	114 760
	Итого с НДС	956341.096 + 114760.931	1 071 102

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.01.2025 11:29
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	26.01.2025 10:59
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.01.2025 13:51
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	27.01.2025 07:36
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	27.01.2025 07:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 10:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:28
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	27.01.2025 07:14

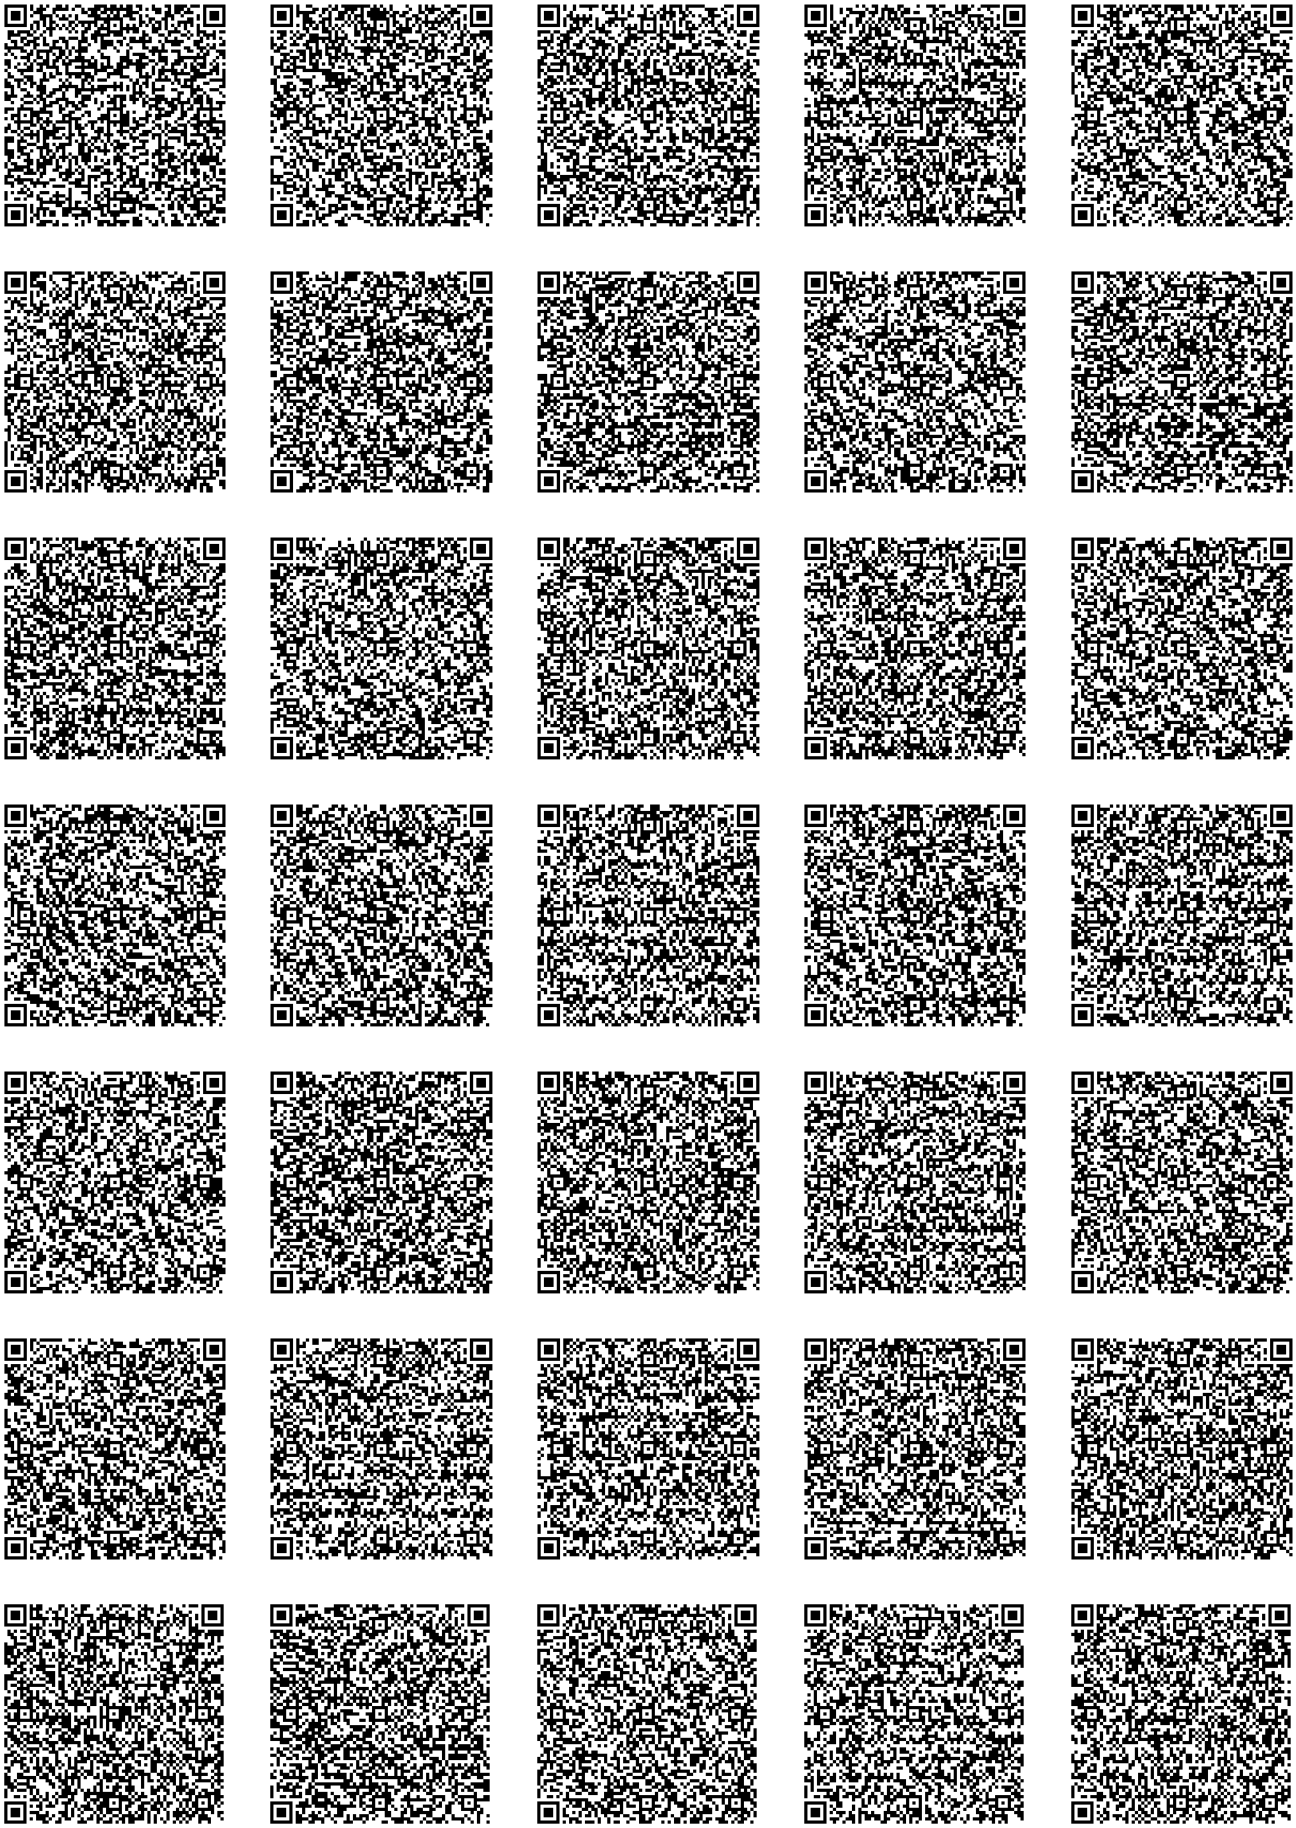

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Холодоснабжение				
1	88	246-303-0104РСНБ РК 2022	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый диаметром 710 мм	шт.	2	25 629	51 258
2	89	6118-0101-0308ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм диаметр до 800 мм	м2	49.455	13 385	661 955
3	90	261-102-0247РСНБ РК 2022	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	2	2 289	4 578
4	91	РСНБ РК 2022	Присоединительный комплект для ПВ5 и ККБ на 40 кВт,AHUKZ-02D.	шт	1	194 910	194 910
5	92	РСНБ РК 2022	Присоединительный комплект для П6 и ККБ на 45 кВт,AHUKZ-03D.	шт	1	296 184	296 184
6	93	РСНБ РК 2022	Присоединительный комплект для ПВ1 и ККБ на 78,5 кВт,AHUKZ-04D.	шт	1	387 130	387 130
7	94	246-702-0601СпрСЦ 02.2024	Разветвитель-рефнет RBM-BY55E+/FQZHD-03/	шт.	1	39 440	39 440
			Итого по разделу: Холодоснабжение				**1 635 455**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**1 635 455**
			ИТОГО по акту:				**1 635 455**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				757231.000 x 6.20%	46 948
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1635455.000 + 46948.321	1 682 403
		Сметная прибыль, 5.00%				804179.321 x 5.00%	40 208
		Непредвиденные расходы, 5.000%				1682403.321 x 5.000%	84 120
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 806 732
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750				1806732.453 x 1.0750	1 942 237
		НДС (12%)				1942237.387 x 12%	233 068

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС				1942237.387 + 233068.486	2 175 305

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	28.01.2025 04:18
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	28.01.2025 11:14
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	28.01.2025 04:20
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 11:34
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 11:36
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 11:35 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 11:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:58

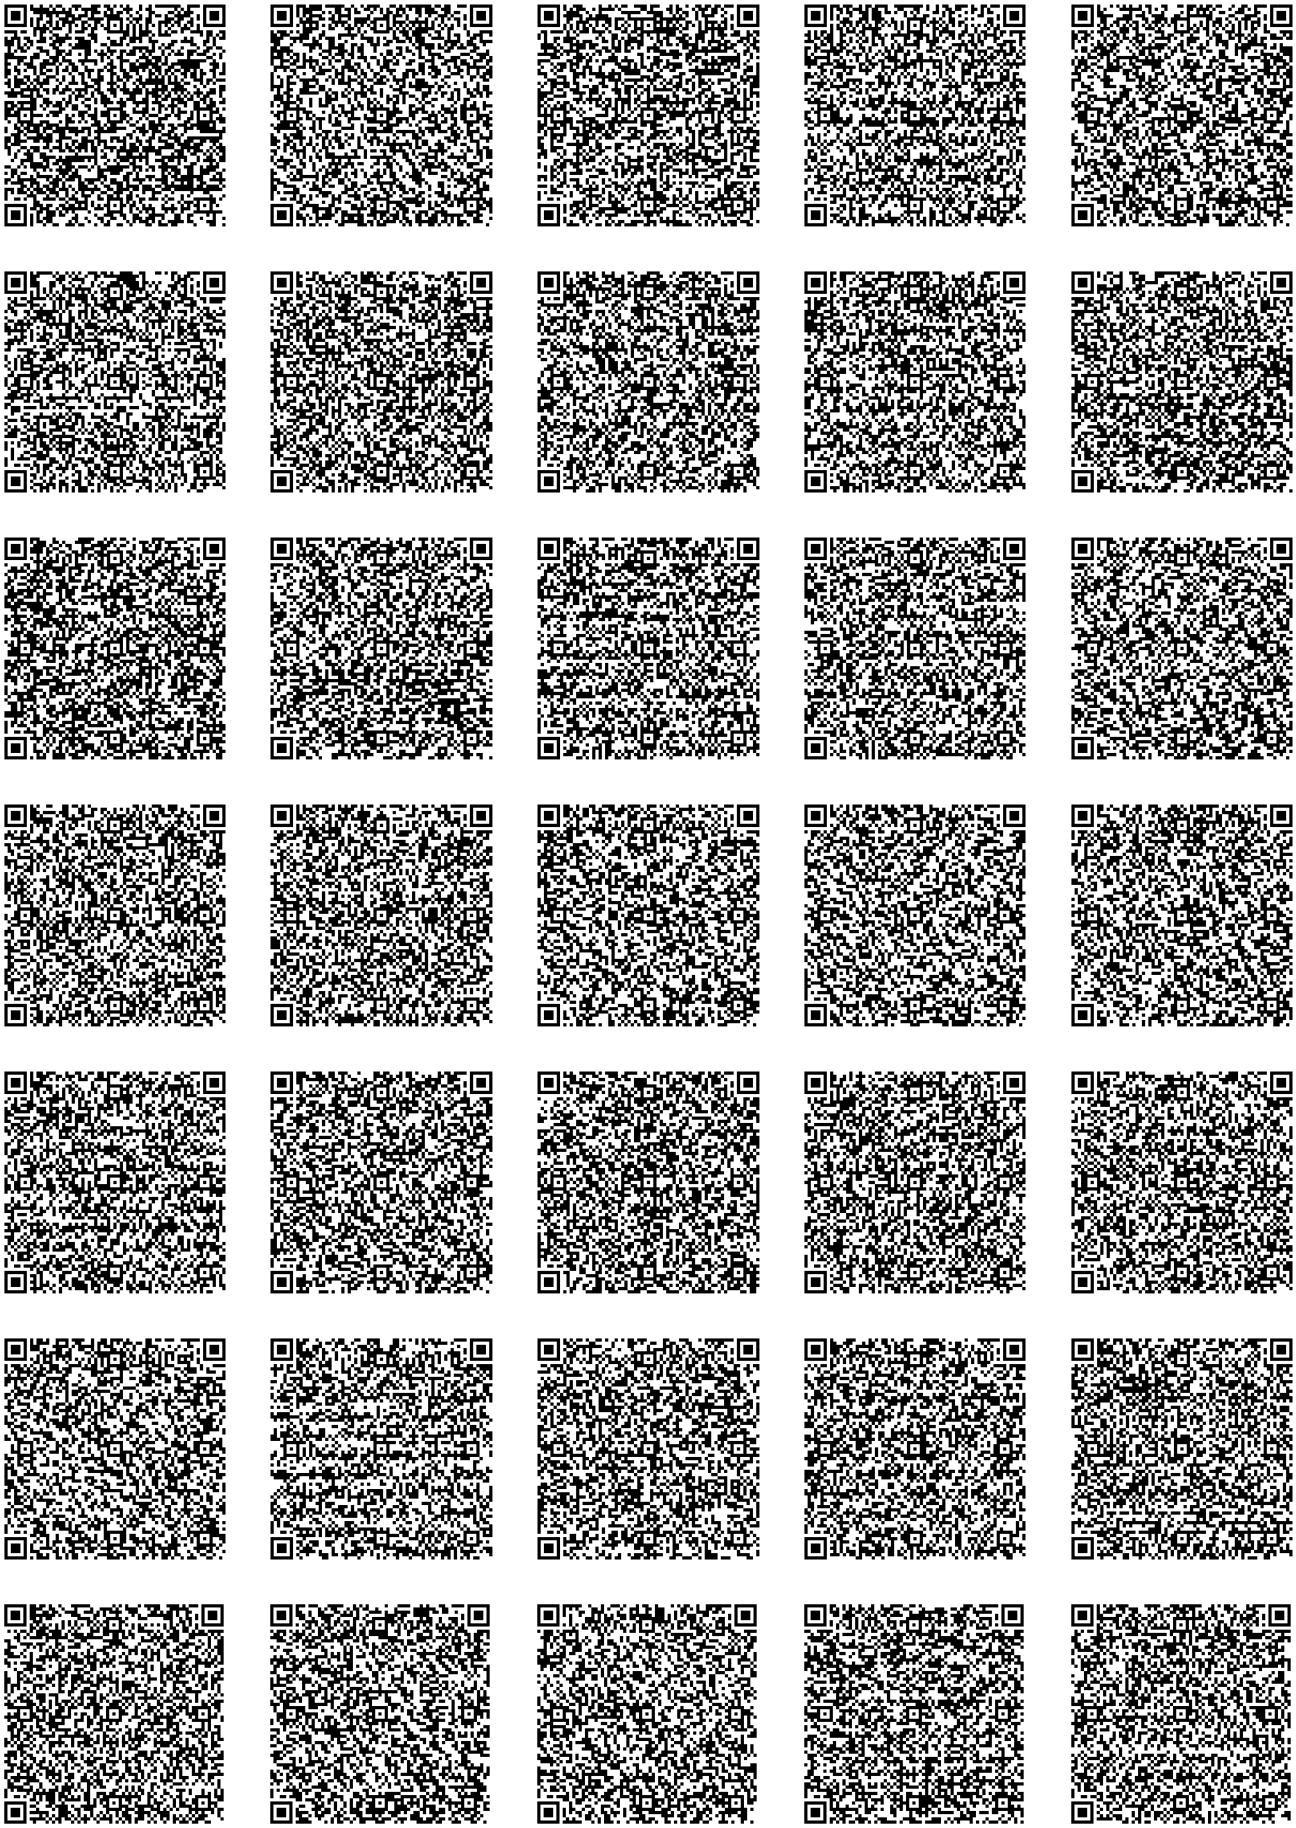

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок А				
			Раздел: Вентшахты /АР-31/				
1	391	6110-0203-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	52.69	5 699	300 280
2	392	261-105-0183РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0.300333	179 342	53 862
3	393	6105-0401-0104ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.27327	252 369	68 965
4	394	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.18274	429 921	78 564
5	395	214-208-0102РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.09053	467 480	42 321
6	396	214-402-0103РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	131.61	1 069	140 691
			Итого по разделу: Вентшахты /АР-31/				**684 683**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Козырек К-1 АР-33				
7	397	6112-0402-0201ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж планарного (безрамного) остекления при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	м2	9.75	10 110	98 572
8	398	217-401-0406РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 16 мм	м2	9.75	28 623	279 074
9	399	246-301-0501РСНБ РК 2022	Кронштейны из сортовой стали	кг	264.06	775	204 646
10	400	217-101-0303РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	4	104	416
			Итого по подразделу: Козырек К-1 АР-33				**582 708**
			Подраздел: Крыльцо Кр-1 АР-33				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	405	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9.2565	4 414	40 858
12	406	6109-0306-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	6.41	12 557	80 490
13	407	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	6.5382	18 095	118 309
14	408	6112-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	5.2	44 152	229 590
15	409	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	5.252	15 753	82 735
16	410	6109-0306-0502ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	11.03	26 288	289 957
17	411	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	11.30575	18 095	204 578
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1 АР-33				**1 046 517**
			Подраздел: Крыльцо Кр-2 АР-33				
18	417	6112-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	0.72	44 152	31 789
19	418	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	0.7272	15 753	11 456
20	419	6109-0306-0502ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	6.29	26 288	165 352
21	420	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	6.44725	18 095	116 662
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-2 АР-33				**325 260**
			Подраздел: Ограждение крылец				
22	421	6106-0304-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	8.12	38 001	308 568
			Итого по подразделу: Ограждение крылец				**308 568**
			Итого по разделу: Крыльца				**2 263 053**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Ограждение лестницы Л-1 АР-31				
23	422	6106-0304-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	37.295	38 001	1 417 247
			Итого по подразделу: Ограждение лестницы Л-1 АР-31				**1 417 247**
			Подраздел: Стремянка СМ-1				
24	423	1139-0501-0109РСНБ РК 2022	Стремянки. Устройство	т конструкций	0.1503	104 380	15 688
25	424	222-506-0701РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0.1503	1 075 341	161 624
26	425	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6.6132	448	2 963

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Стремянка СМ-1				**180 275**
			Подраздел: Переходной мостик ПМ-1				
27	426	1139-0501-0109РСНБ РК 2022	Стремянки. Устройство	т конструкций	0.09554	104 380	9 972
28	427	222-506-0701РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0.09554	1 075 341	102 738
29	428	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.20376	448	1 883
			Итого по подразделу: Переходной мостик ПМ-1				**114 593**
			Итого по разделу: Разные работы				**1 712 115**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок А				**4 659 851**
			ИТОГО по акту:				**4 659 851**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				4659851.000 x 6.20%	288 910
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4659851.000 + 288910.753	4 948 761
		Сметная прибыль, 5.00%				4948761.753 x 5.00%	247 438
		Непредвиденные расходы, 5.000%				4948761.753 x 5.000%	247 438
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 443 637
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				5443637.928 x 1.0557	5 746 848
		НДС (12%)				5746848.561 x 12%	689 621
		Итого с НДС				5746848.561 + 689621.827	6 436 470

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	27.01.2025 10:10
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	28.01.2025 04:18
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	27.01.2025 13:09
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 05:29
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 04:55
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 05:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 11:01 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:38

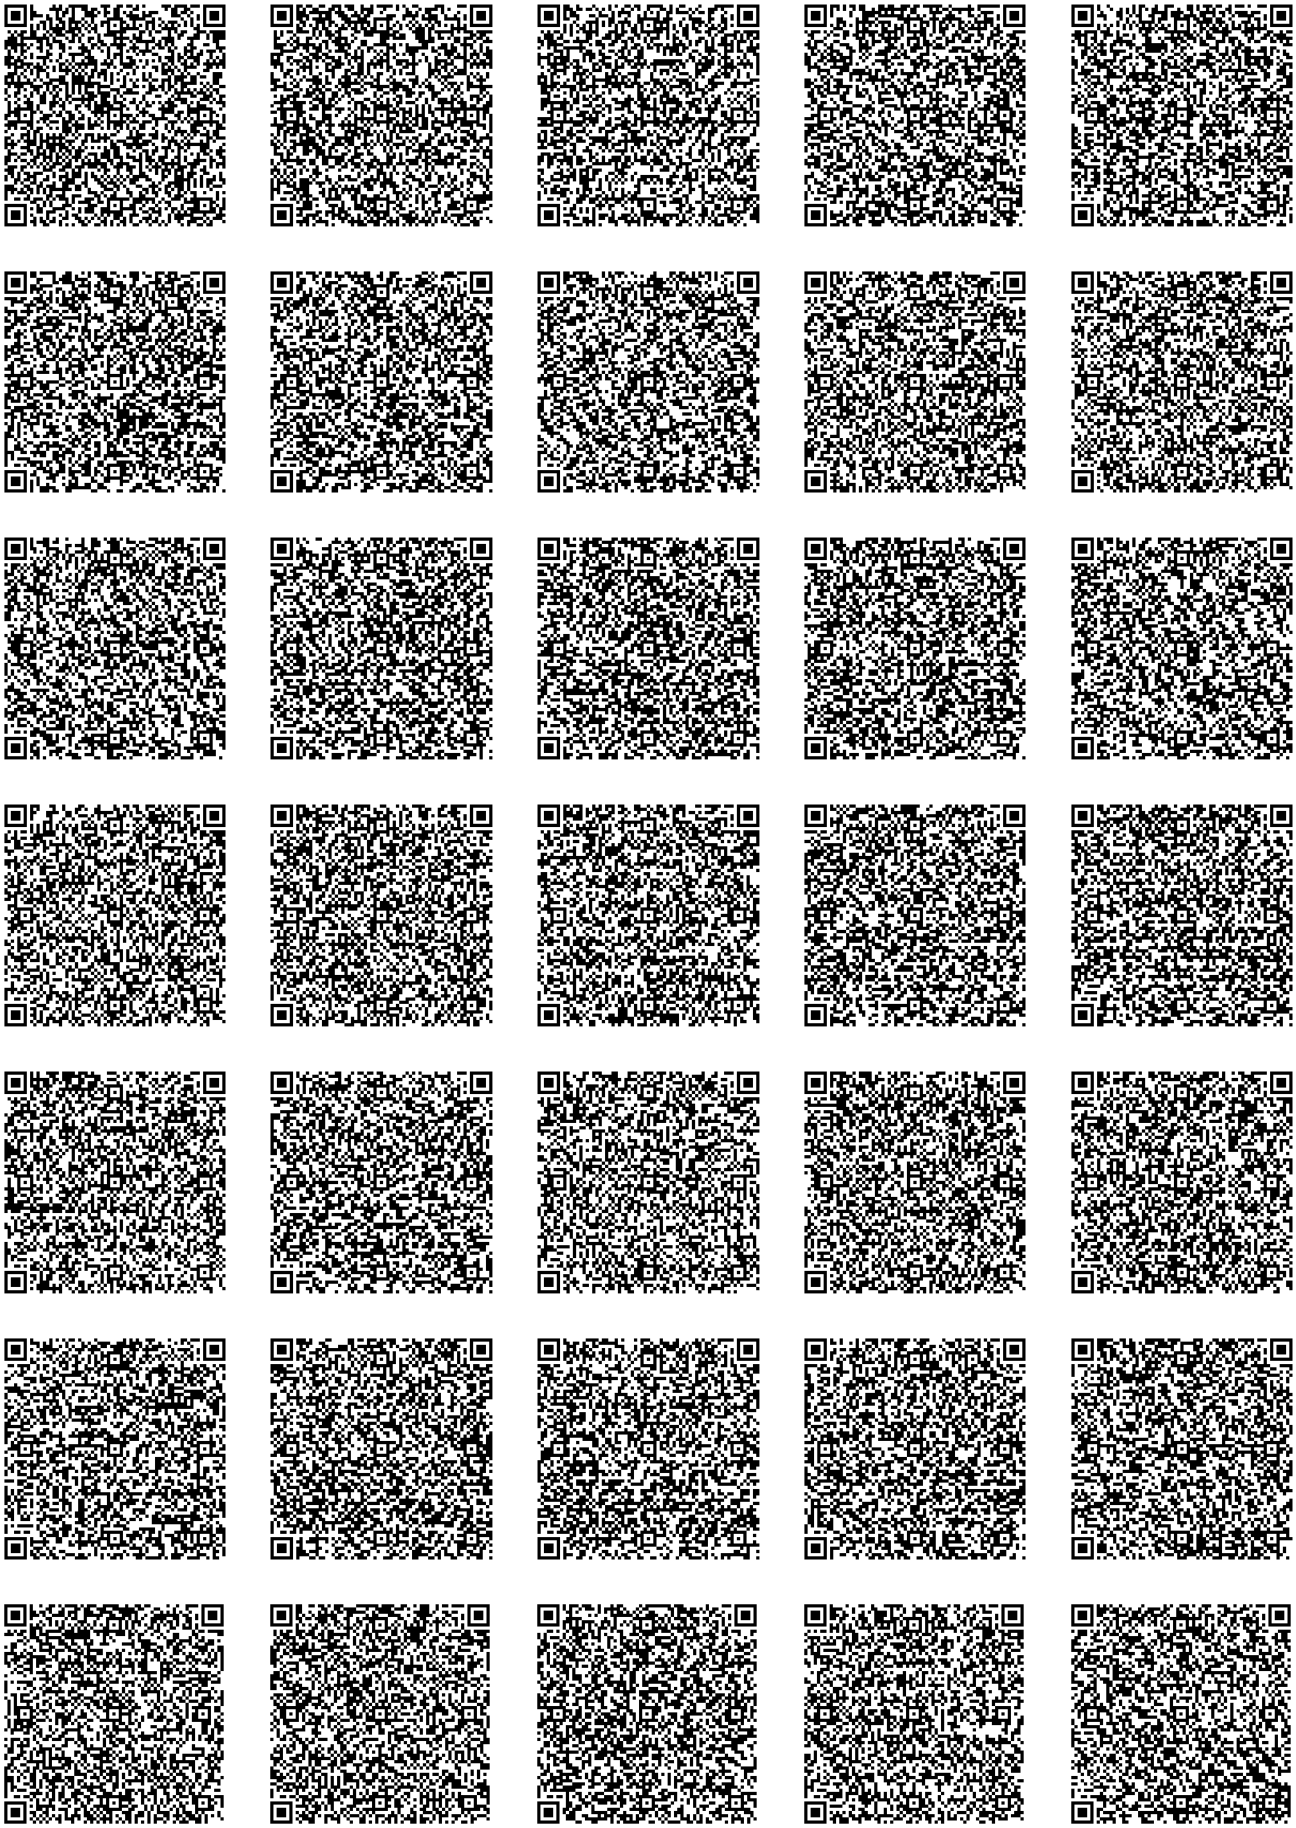

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Е				
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
			Подраздел: Крыльцо №1				
1	486	6109-0306-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	13.65	12 557	171 403
2	487	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	13.923	18 095	251 937
3	488	6112-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	32.37	44 152	1 429 200
4	489	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	32.6937	15 753	515 024
5	490	6109-0306-0502ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	93.59	26 288	2 460 294
6	491	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	95.92975	18 095	1 735 848
			Итого по подразделу: Крыльцо №1				**6 563 707**
			Подраздел: Крыльцо №2				
7	492	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.08	17 061	18 426
8	493	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2.15	43 400	93 310
9	494	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2374512	452 925	107 548
10	495	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0178	336 921	5 997
11	496	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3.6	4 414	15 890

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	497	6109-0306-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	2.61	12 557	32 774
13	498	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	2.6622	18 095	48 173
14	499	6112-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	2.65	44 152	117 003
15	500	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	2.6765	15 753	42 163
16	501	6109-0306-0502ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	4.96	26 288	130 388
17	502	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	5.084	18 095	91 995
			Итого по подразделу: Крыльцо №2				**703 667**
			Подраздел: Крыльцо №3				
18	503	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.1	17 061	18 767
19	504	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2.13	43 400	92 442
20	505	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2750136	452 925	124 561
21	506	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02016	336 921	6 792
22	507	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3.5	4 414	15 449
23	508	6109-0306-0602ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	2.66	12 557	33 402
24	509	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	2.7132	18 095	49 094
25	510	6112-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	1.54	44 152	67 994
26	511	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	1.5554	15 753	24 502
27	512	6109-0306-0502ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	5.6	26 288	147 213
28	513	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	5.74	18 095	103 865
			Итого по подразделу: Крыльцо №3				**684 082**
			Подраздел: Крыльцо №4				
29	514	6101-0108-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.8	17 061	13 649
30	515	6103-0101-0211ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.57	43 400	68 138
31	516	214-403-0103РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.153624	452 925	69 580

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	517	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01236	336 921	4 164
33	518	6111-0401-0107ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3.5	4 414	15 449
34	519	6112-0101-0102ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	1.26	44 152	55 632
35	520	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	1.2726	15 753	20 047
36	521	6109-0306-0502ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	6.48	26 288	170 346
37	522	231-201-0109РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	6.642	18 095	120 187
			Итого по подразделу: Крыльцо №4				**537 192**
			Подраздел: Ограждение крылец				
38	523	6106-0304-0301ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	71.25	8 188	583 395
39	524	222-503-0302РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	71.25	29 813	2 124 176
			Итого по подразделу: Ограждение крылец				**2 707 571**
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА				**11 196 219**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: СМ-1				
40	525	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.1503	289 374	43 493
41	526	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.116	429 921	49 871
42	527	214-210-0102РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.02886	339 944	9 811
43	528	214-101-0201РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00544	361 174	1 964
44	529	217-101-0401РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8	1 590	1 272
45	530	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.509	601	2 709
46	531	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.509	223	1 006
			Итого по подразделу: СМ-1				**110 128**
			Подраздел: переходный мостик				
47	532	6106-0304-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.09554	289 374	27 647
48	533	214-201-0102РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.07012	429 921	30 146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	534	214-201-0103РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0.01998	444 161	8 874
50	535	214-210-0102РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.00544	339 944	1 848
51	536	217-101-0401РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.6	1 590	2 544
52	537	6111-0501-0205ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2.8662	601	1 723
53	538	6111-0501-0505ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.8662	223	639
			Итого по подразделу: переходный мостик				**73 422**
			Итого по разделу: Разные работы				**183 550**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Е				**11 379 769**
			ИТОГО по акту:				**11 379 769**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				11379769.000 x 6.20%	705 545
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				11379769.000 + 705545.656	12 085 314
		Сметная прибыль, 5.00%				12085314.656 x 5.00%	604 265
		Непредвиденные расходы, 5.000%				12085314.656 x 5.000%	604 265
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					13 293 846
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				13293846.122 x 1.0557	14 034 313
		НДС (12%)				14034313.351 x 12%	1 684 117
		Итого с НДС				14034313.351 + 1684117.602	15 718 430

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	27.01.2025 10:10
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	28.01.2025 04:20
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	27.01.2025 13:06
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 06:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:31
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 06:41
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 06:57
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 10:57 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

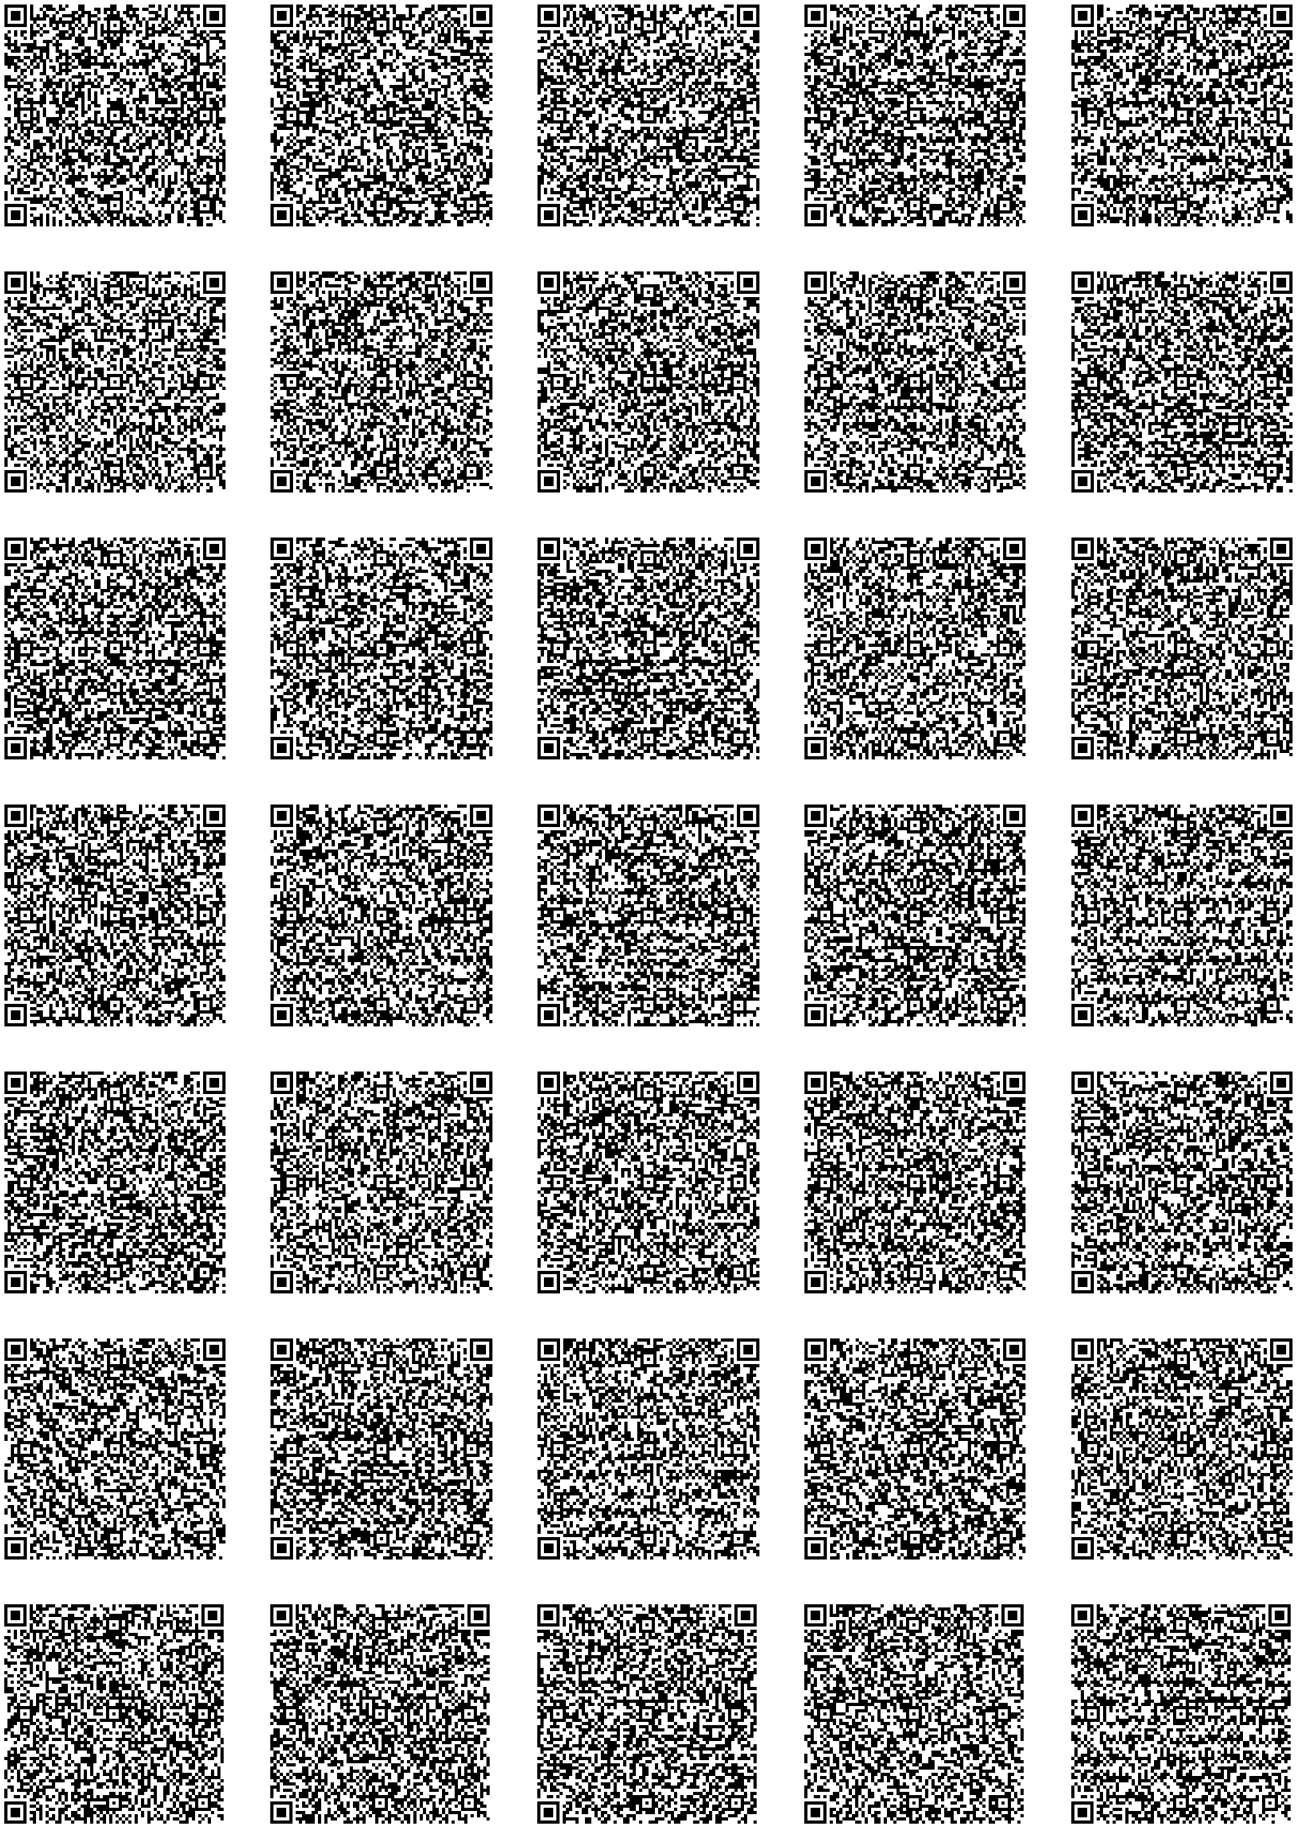

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование				
			Отдел: 1 этаж				
			Раздел: Блок А				
			Подраздел: Мастерская "Культура питания"				
1	39	521-301-3017007 СпрСЦ 02.2024	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
2	40	521-301-3010 СпрСЦ 02.2024	Чайник электрический	шт.	2	19 554	39 108
3	41	521-301-3015001 СпрСЦ 02.2024	Электрическая плита ДАРИНА 1В ЕМ 341 406 W, материал рабочей поверхности эмалированная сталь, тип управления механическое, 4 электрических конфорок, объем духовки 50 л, тип духовки электрическая	шт.	1	85 528	85 528
4	42	521-301-3016010 СпрСЦ 02.2024	Вытяжка над плитой MAUNFELD MPA 60, производительностью 420 м3/ч	шт.	1	38 384	38 384
5	44	521-301-3012 СпрСЦ 02.2024	Кухонный комбайн	шт.	1	130 330	130 330
6	45	522-103-0702 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260x287x137 мм, платформа 239x190 мм, до 5 кг)	шт.	1	61 620	61 620
			Итого по подразделу: Мастерская "Культура питания"				**444 089**
			Подраздел: Мастерская культура дома				
7	91	521-301-2902003 СпрСЦ 02.2024	Шкаф инструментальный в комплекте с электроинструментами (CraftLab), размер 1000мм x 550мм x 1800мм	шт.	1	2 572 242	2 572 242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	94	521-305-0136 СпрСЦ 02.2024	Станок модульный для создания 3D моделей UniShape	шт.	1	1 220 720	1 220 720
			Итого по подразделу: Мастерская культура дома				**3 792 962**
			Подраздел: Инструментальная				
9	98	1302-0102-0101 РСНБ РК 2022	Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса 5 т. Монтаж оборудования	шт.	1	435 905	435 905
10	101	521-301-2902003 СпрСЦ 02.2024	Шкаф инструментальный в комплекте с электроинструментами (CraftLab), размер 1000мм х 550мм х 1800мм	шт.	1	2 572 242	2 572 242
			Итого по подразделу: Инструментальная				**3 008 147**
			Итого по разделу: Блок А				**7 245 198**
			Раздел: Блок Б,Д				
			Подраздел: Инструкторская(начальная школа). Санузел.ПУИ				
11	127	СпрСЦ 02.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями LG XBOOM.	шт	1	97 185	97 185
			Итого по подразделу: Инструкторская(начальная школа). Санузел.ПУИ				**97 185**
			Подраздел: Спортивный зал 9х18 (2 шт.)				
12	135	522-101-1039001 СпрСЦ 02.2024	Мостик гимнастический пружинный с гнутой платформой	шт.	2	31 696	63 392
13	149	522-101-1017001 СпрСЦ 02.2024	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	30	5 357	160 710
14	150	522-101-1018001 СпрСЦ 02.2024	Футбольный мяч Select №5	шт.	30	6 696	200 880
15	153	522-101-1024007 СпрСЦ 02.2024	Шарики для настольного тенниса	шт.	40	89	3 560
			Итого по подразделу: Спортивный зал 9х18 (2 шт.)				**428 542**
			Итого по разделу: Блок Б,Д				**525 727**
			Раздел: Блок Г,Ж				
			Подраздел: Многофункциональный спортивный зал				
16	173	522-101-1017001 СпрСЦ 02.2024	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	30	5 357	160 710
17	174	522-101-1018001 СпрСЦ 02.2024	Футбольный мяч Select №5	шт.	30	6 696	200 880

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	176	522-101-1024007 СпрСЦ 02.2024	Шарики для настольного тенниса	шт.	40	89	3 560
			Итого по подразделу: Многофункциональный спортивный зал				**365 150**
			Подраздел: Инструкторская (5-11 кл.)				
19	191	СпрСЦ 02.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями LG XBOOM.	шт	1	97 185	97 185
			Итого по подразделу: Инструкторская (5-11 кл.)				**97 185**
			Итого по разделу: Блок Г,Ж				**462 335**
			Раздел: Блок В				
			Подраздел: Методический кабинет (младших классов)				
20	290	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методический кабинет (младших классов)				**15 993**
			Итого по разделу: Блок В				**15 993**
			Раздел: Блок Е				
			Подраздел: Кабинет врача. Санузел				
21	333	527-114-0402001 СпрСЦ 02.2024	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	1	40 773	40 773
			Итого по подразделу: Кабинет врача. Санузел				**40 773**
			Подраздел: Процедурная				
22	351	527-114-0403001 СпрСЦ 02.2024	Ширма трехсекционная на колесах ШР 0003	шт.	1	60 934	60 934
			Итого по подразделу: Процедурная				**60 934**
			Итого по разделу: Блок Е				**101 707**
			Раздел: Блок Л				
			Подраздел: Учебный кабинет предшкольный классов - 4 шт.				
23	521	СпрСЦ 02.2024	Музыкальный центр, мощность не менее 40 Вт. Воспроизведение аудио с цифровых носителей, наличие Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству. Defender Eclipse	шт	4	97 185	388 740
			Итого по подразделу: Учебный кабинет предшкольный классов - 4 шт.				**388 740**
			Подраздел: Игровая комната предшкольных классов				
24	524	СпрСЦ 02.2024	Шкаф для хранения игрушек и пособий.	шт	2	13 110	26 221
			Итого по подразделу: Игровая комната предшкольных классов				**26 221**
			Итого по разделу: Блок Л				**414 961**
			Итого по отделу: 1 этаж				**8 765 921**
			Отдел: 2 этаж				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Блок Д,И				
			Подраздел: Актовый зал на 260 мест (в т.ч. 4 места для МГН)				
25	620	СпрСЦ 02.2024	Музыкальный центр с беспроводными технологиями с беспроводными технологиями LG XBOOM.	ШТ	1	97 185	97 185
26	621	СпрСЦ 02.2024	Оборудование для освещения сцены.	к-т	1	1 312 130	1 312 130
			Итого по подразделу: Актовый зал на 260 мест (в т.ч. 4 места для МГН)				**1 409 315**
			Подраздел: Серверная				
27	633	СпрСЦ 02.2024	Медицинская аптечка.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Серверная				**15 993**
			Итого по разделу: Блок Д,И				**1 425 308**
			Раздел: Блок Г				
			Подраздел: Методический кабинет.				
28	669	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	к-т	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методический кабинет.				**15 993**
			Итого по разделу: Блок Г				**15 993**
			Раздел: Блок В				
			Подраздел: Кабинет иностранного языка на 13 уч.				
29	719	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет иностранного языка на 13 уч.				**15 993**
			Подраздел: Методический кабинет				
30	727	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	к-т	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методический кабинет				**15 993**
			Итого по разделу: Блок В				**31 986**
			Раздел: Блок Е				
			Подраздел: Библиотека с чит. залом на 19 мест, медиотекой на 16 мест. Книгохр.				
31	753	СпрСЦ 02.2024	Встроенная Web-камера, поддержка Full Hd (может быть встр. в монитор).	шт	1	38 518	38 518
32	755	522-101-0224 СпрСЦ 02.2024	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	17	24 116	409 972
33	756	СпрСЦ 02.2024	"Сканер для QR-кодов, линейных и двумерных штрих-кодов, кодов PDF417.	шт	1	35 456	35 456
			Итого по подразделу: Библиотека с чит. залом на 19 мест, медиотекой на 16 мест. Книгохр.				**483 946**
			Подраздел: Кабинет музыки				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	774	СпрСЦ 02.2024	Музыкальный центр, мощность не менее 40 Вт. Воспроизведение аудио с цифровых носителей., наличие Bluetooth, возможность подключения к мобильному устройству.	ШТ	1	97 185	97 185
			Итого по подразделу: Кабинет музыки				**97 185**
			Итого по разделу: Блок Е				**581 131**
			Итого по отделу: 2 этаж				**2 054 418**
			Отдел: 3 этаж				
			Раздел: Блок Г				
			Подраздел: Методический кабинет				
35	950	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методический кабинет				**15 993**
			Итого по разделу: Блок Г				**15 993**
			Раздел: Блок В				
			Подраздел: Кабинет начальных классов - 4 шт.				
36	973	СпрСЦ 02.2024	Телевизор с USB входом и доступом в интернет.	шт	4	182 539	730 159
37	974	СпрСЦ 02.2024	Музыкальный центр LG XBOOM.	шт	4	97 185	388 740
			Итого по подразделу: Кабинет начальных классов - 4 шт.				**1 118 899**
			Подраздел: Кабинет иностранного языка на 13 уч.				
38	989	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	набор	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет иностранного языка на 13 уч.				**15 993**
			Подраздел: Методический кабинет				
39	997	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методический кабинет				**15 993**
			Итого по разделу: Блок В				**1 150 885**
			Раздел: Блок Е				
			Подраздел: Кабинет робототехники.				
40	1026	521-305-0138001 СпрСЦ 02.2024	Стол для полей (2430мм х1200мм) с бортиками и 4 выкатными тумбочками (CraftLab)	шт.	1	680 229	680 229
			Итого по подразделу: Кабинет робототехники.				**680 229**
			Итого по разделу: Блок Е				**680 229**
			Итого по отделу: 3 этаж				**1 847 107**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование				**12 667 446**
			ИТОГО по акту:				**12 667 446**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				435905.000 x 6.20%	27 026
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				12667446.000 + 27026.109	12 694 472
		Сметная прибыль, 5.00%				462931.109 x 5.00%	23 146
		Непредвиденные расходы, 5.000%				12694472.109 x 5.000%	634 723
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					13 352 342
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750				13352342.270 x 1.0750	14 353 767
		НДС (12%)				14353767.940 x 12%	1 722 452
		Итого с НДС				14353767.940 + 1722452.153	16 076 220

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.01.2025 11:30
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	28.01.2025 11:18
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.01.2025 13:52
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 10:37 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 11:36
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:39
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 11:29
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 11:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

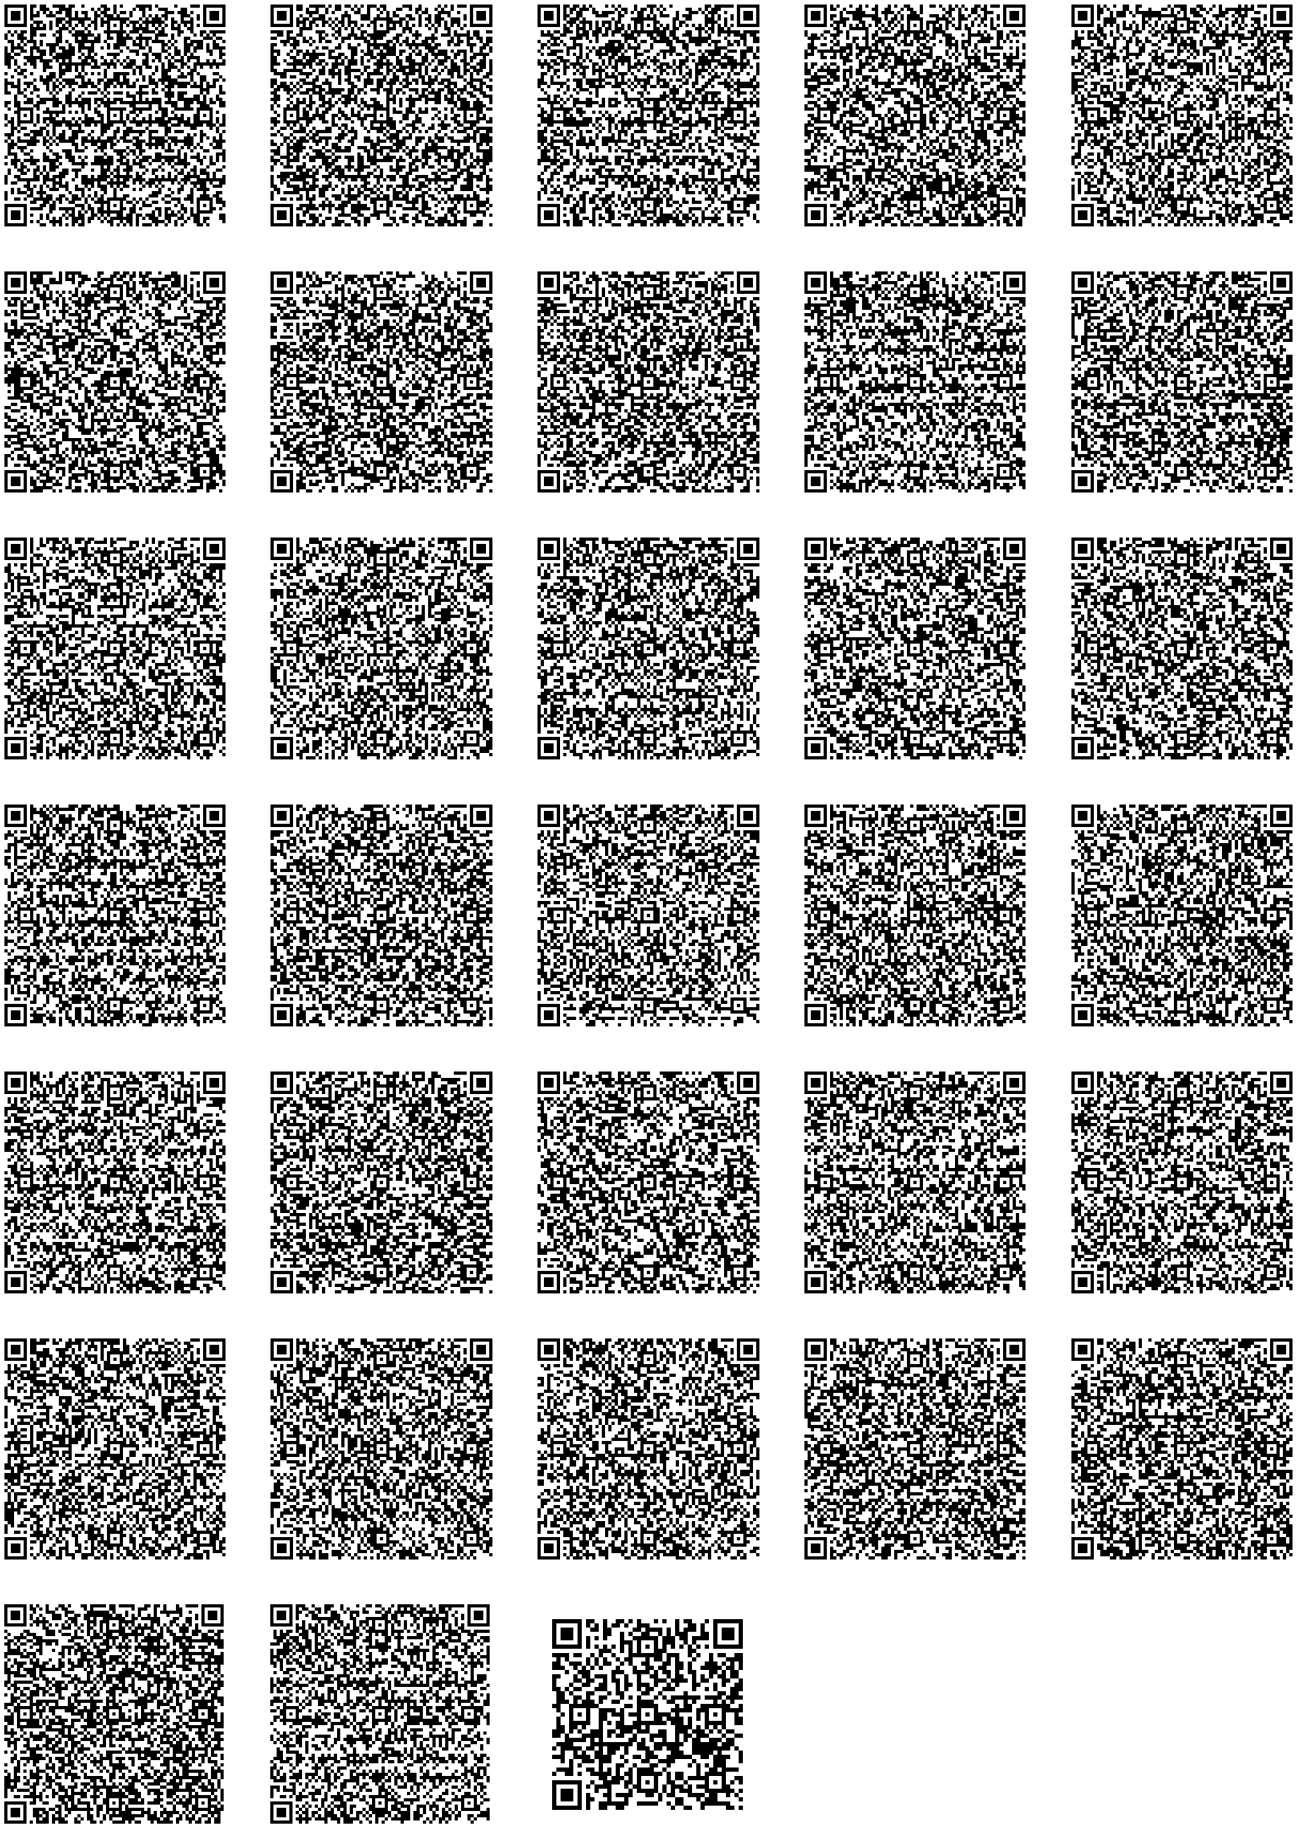

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Вентиляция				
			Раздел: Теплоснабжение установок систем П1-П5, ДП1, ДП2				
1	9	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	12	10 704	128 448
2	10	242-203-1406 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	20 446	245 352
3	11	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	8	19 320	154 560
4	12	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	8	41 196	329 568
5	13	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	83	10 599	879 717
6	14	242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	38	8 639	328 282
7	15	242-202-0703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	38	11 920	452 960
8	16	242-202-0704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	12 970	51 880
9	17	242-307-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4 013	8 026

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	18	242-307-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	5 608	5 608
11	19	6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	10 704	32 112
12	20	242-304-1102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	3	67 128	201 384
13	21	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	8	19 320	154 560
14	22	242-304-1103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	8	75 365	602 920
15	23	6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	2 867	5 734
16	24	242-303-1103 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	25 104	50 208
17	25	6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	4	3 269	13 076
18	26	242-303-1104 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	32 418	32 418
19	27	245-506-0126 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50	шт.	3	82 295	246 885
20	28	6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	19 320	38 640
21	29	245-506-0127 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65+/MSV-F2/	шт.	2	100 943	201 886
22	30	6116-0605-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	2	5 637	11 274
23	31	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	30 269	60 538
24	32	6116-0605-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	5 720	5 720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	33	242-404-0704 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	33 343	33 343
26	34	6116-0605-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	3	6 846	20 538
27	35	242-404-0406 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	38 802	116 406
28	36	6116-0605-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	2	8 450	16 900
29	37	242-404-0407 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	2	50 959	101 918
30	38	6116-0701-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов воздушных	шт.	32	946	30 272
31	39	245-405-1503 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	32	2 550	81 600
32	40	6116-0602-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухосборников наружный, диаметр до 159 мм	шт.	4	20 611	82 444
33	41	6116-0602-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка воздухосборников наружный, диаметр до 219 мм	шт.	2	25 165	50 330
34	42	6116-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	16	1 650	26 400
35	43	245-701-0704 СпрСЦ 02.2024	Манометр общетехнический диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160	шт.	16	11 448	183 168
36	44	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	1 797	28 752
37	45	261-401-0438 РСНБ РК 2022	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	16	267	4 272
38	46	6116-0701-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	16	2 239	35 824
39	47	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	16	5 565	89 040

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	48	1312-0901-0103 РСНБ РК 2022	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	22 454	269 448
41	49	261-401-0438 РСНБ РК 2022	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	4	267	1 068
42	50	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	125	2 590	323 750
43	51	241-101-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	10	483	4 830
44	52	241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	85	649	55 165
45	53	241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	30	1 172	35 160
46	54	6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	180	4 638	834 840
47	55	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	180	1 511	271 980
48	56	6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	250	5 351	1 337 750
49	57	241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	250	2 043	510 750
50	58	6114-0102-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	10	5 925	59 250
51	59	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	10	2 706	27 060
52	60	6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	18	5 925	106 650
53	61	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	18	3 789	68 202
54	62	6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	305	442	134 810

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	63	6114-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	278	449	124 822
56	64	6111-0101-1101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	7.5	108 788	815 910
57	65	234-201-0305 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	8.1	51 061	413 594
58	66	6111-0501-0517 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	220	540	118 800
59	67	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	220	300	66 000
60	68	6111-0301-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	250	2 307	576 750
61	69	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0.2875	552 642	158 885
62	70	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	100	708	70 800
63	71	6125-1003-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях ротаметра показывающего, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм	шт.	5	5 363	26 815
64	72	245-706-0103 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1В, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20	шт.	2	160 215	320 430
65	73	245-703-0101 РСНБ РК 2022	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	2	21 245	42 490
66	74	245-710-0204 РСНБ РК 2022	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	1	75 180	75 180
			Итого по разделу: Теплоснабжение установок систем П1-П5, ДП1, ДП2				**11 994 152**
			Итого по локальной смете: Вентиляция				**11 994 152**
			ИТОГО по акту:				**11 994 152**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				11994152.000 x 6.20%	743 637
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				11994152.000 + 743637.401	12 737 789
		Сметная прибыль, 5.00%				12737789.401 x 5.00%	636 889
		Непредвиденные расходы, 5.000%				12737789.401 x 5.000%	636 889

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					14 011 568
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750				14011568.341 x 1.0750	15 062 435
		НДС (12%)				15062435.967 x 12%	1 807 492
		Итого с НДС				15062435.967 + 1807492.316	16 869 928

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.01.2025 11:29
Представители технического надзора		
590115301718 - ҚҰЛЖАҒАРОВ САНАҚҚАЛИ ТҰЯҚБАЙҰЛЫ	тех надзор	26.01.2025 10:58
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.01.2025 13:51
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 10:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:28
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	27.01.2025 07:11
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	27.01.2025 07:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	27.01.2025 11:29

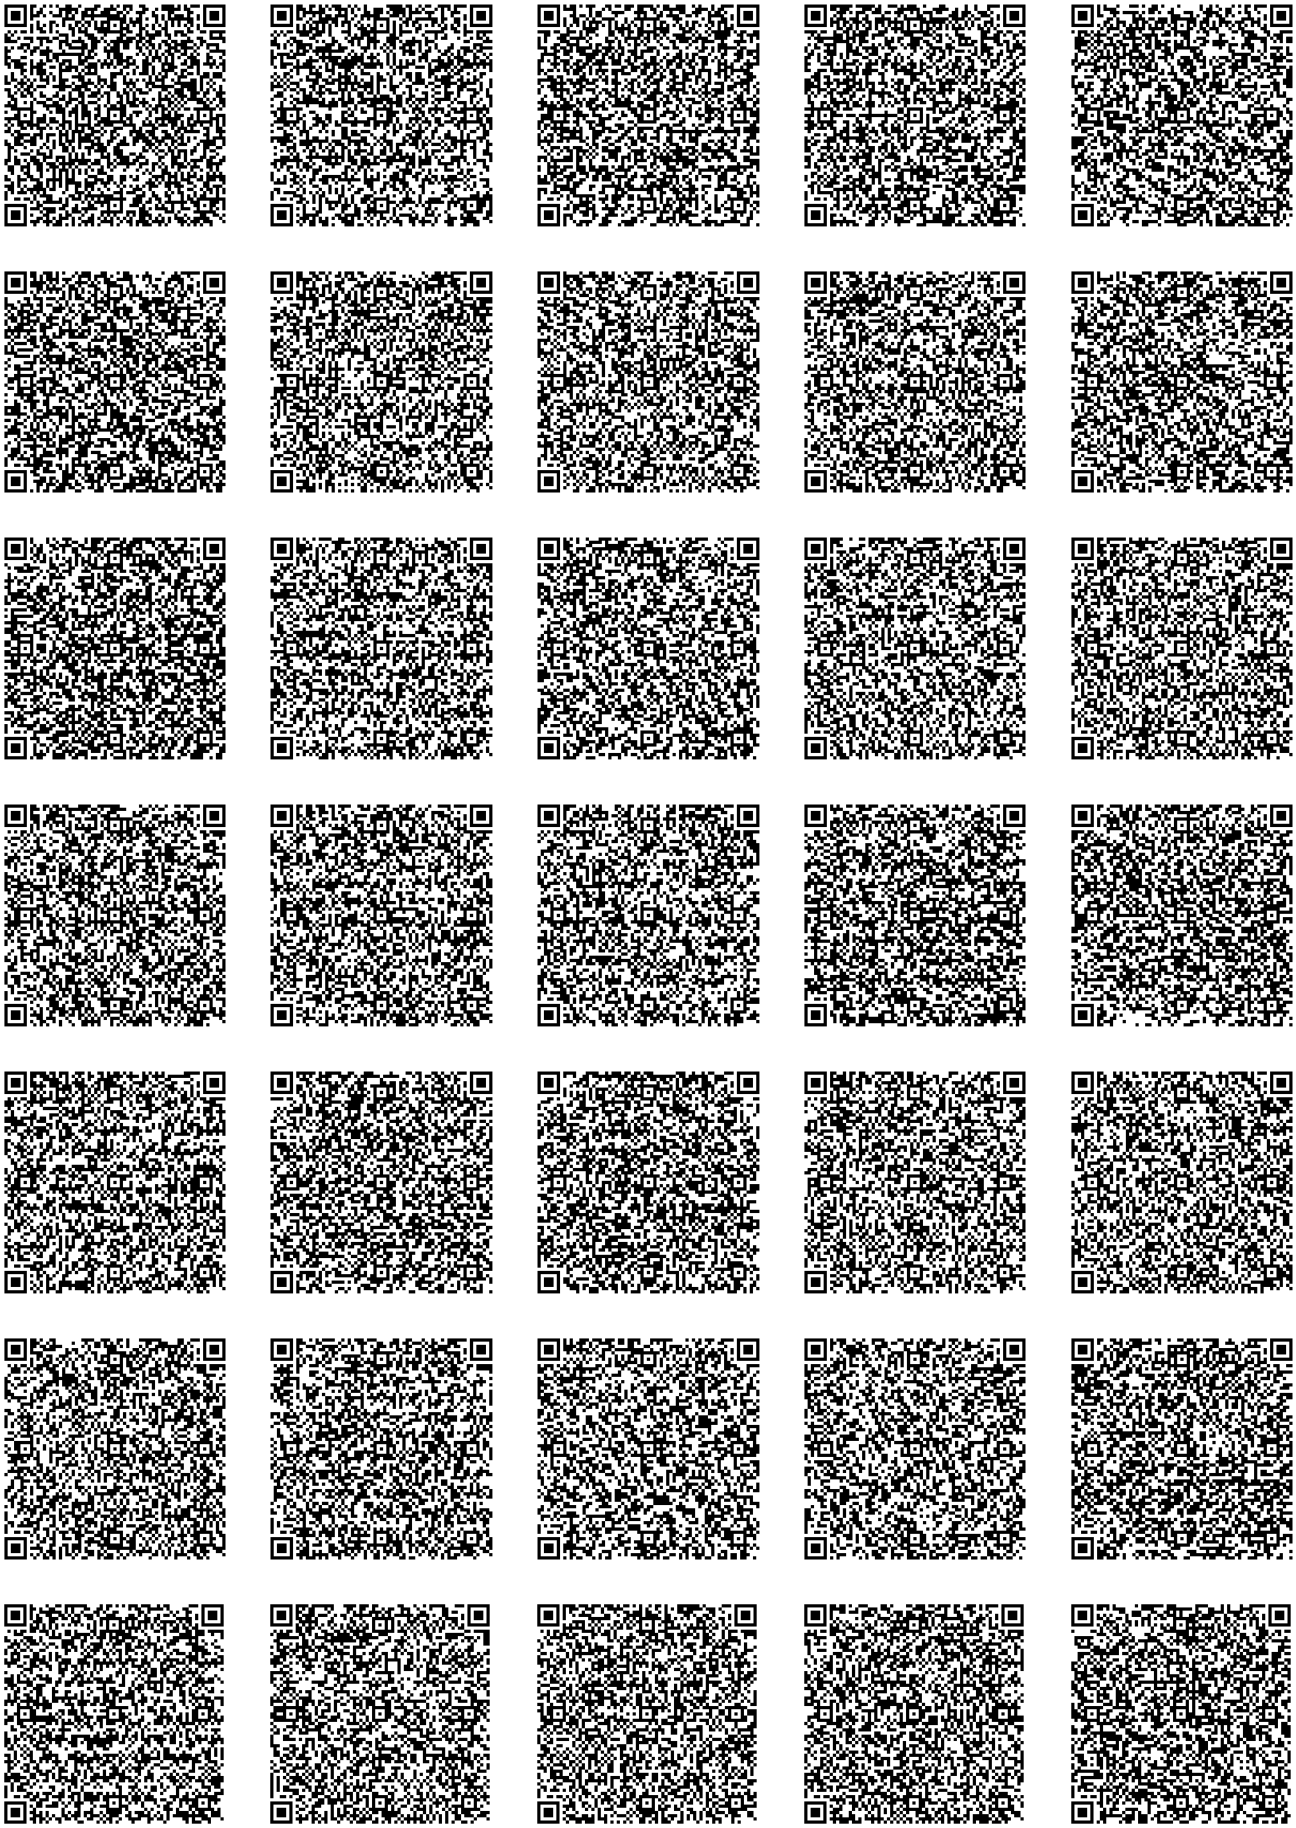

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок В				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Двери АР-20				
1	423	6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	1.75	14 734	25 784
2	424	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1.75	58 830	102 952
3	425	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.8	17 514	31 524
4	426	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/Д5/	м2	1.8	52 373	94 271
5	427	6108-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	3.15	8 426	26 541
6	428	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ,ДГ 21-15/Д19/	м2	3.15	19 229	60 571
7	429	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	79.8	7 285	581 343
8	430	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д52,22/	м2	12.6	19 229	242 285

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	431	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	20.16	20 902	421 384
10	432	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-14/Д21	м2	47.04	19 229	904 532
11	433	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	186.5	907	169 156
12	434	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	114	601	68 514
13	435	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	35	3 380	118 300
14	436	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	35	3 410	119 350
15	437	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	3.15	7 708	24 280
16	438	223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.15	83 965	264 490
17	439	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.8	17 514	31 524
18	440	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/Д54/	м2	1.8	64 046	115 283
19	441	6108-0204-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	2.16	19 053	41 154
20	442	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	2.16	67 178	145 103
			Итого по подразделу: Двери АР-20				**3 588 345**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-2 АР-23				
21	443	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2.24	4 268	9 560
22	444	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1.06	3 874	4 106

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	445	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7.76	130 304	1 011 159
24	446	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	1.06	146 170	154 940
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-2 АР-23				**1 179 765**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1				
25	447	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19.88	24 673	490 499
26	448	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	7.07	3 874	27 389
27	449	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	19.88	130 304	2 590 444
28	450	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7.07	146 170	1 033 421
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1				**4 141 754**
			Подраздел: Сантехнические кабины АР26.1				
29	451	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	37.2372	13 538	504 117
			Итого по подразделу: Сантехнические кабины АР26.1				**504 117**
			Подраздел: Перемычки АР-28				
30	452	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.31468	117 997	37 131
31	453	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.23943	429 921	102 936
32	454	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.07525	325 873	24 522
33	455	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.79242	300	3 838
34	456	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	12.79242	223	2 853
			Итого по подразделу: Перемычки АР-28				**171 280**
			Итого по разделу: Проемы				**9 585 261**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентшахты /АР-31/				
35	457	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	38.66	5 699	220 323
36	458	261-105-0183 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0.220362	179 342	39 520
37	459	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.20732	252 369	52 321
38	460	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.13544	429 921	58 228
39	461	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.07188	467 480	33 602
40	462	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	104.16	1 069	111 347
41	463	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	11.636012	300	3 491
			Подраздел: Ограждение лестницы Л-1 АР-32				
42	464	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	37.295	38 001	1 417 247
			Итого по подразделу: Ограждение лестницы Л-1 АР-32				**1 417 247**
			Итого по разделу: Вентшахты /АР-31/				**1 936 080**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Крыльцо Кр-1 АР-33				
43	470	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	1.68	12 557	21 096
44	471	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	1.7136	18 095	31 008
45	472	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	3.78	44 152	166 895
46	473	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	3.8178	15 753	60 142
47	474	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	7.81	26 288	205 309

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	475	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	8.00525	18 095	144 855
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1 АР-33				**629 305**
			Подраздел: Крыльцо Кр-2 АР-33				
49	481	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	1.8	12 557	22 603
50	482	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	1.836	18 095	33 222
51	483	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	2.11	44 152	93 161
52	484	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	2.1311	15 753	33 571
53	485	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	5.94	26 288	156 151
54	486	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	6.0885	18 095	110 170
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-2 АР-33				**448 879**
			Подраздел: Ограждение крылец				
55	487	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	4.93	38 001	187 345
56	488	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	4.93	8 188	40 367
57	489	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	55.95	29 813	1 668 037
			Итого по подразделу: Ограждение крылец				**1 895 749**
			Подраздел: Защитные экраны отопительных приборов ар.36				
58	490	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	100.48	4 298	431 862
59	491	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	100.48	764	76 767
60	492	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	698	462	322 476

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	493	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	52	2 208	114 816
62	494	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетка ПВХ 500х950мм.	шт	6	5 767	34 604
63	495	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетка ПВХ 500х850мм.	шт	6	5 323	31 943
64	496	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетка ПВХ 500х700мм.	шт	40	4 880	195 206
			Итого по подразделу: Защитные экраны отопительных приборов ар.36				**1 207 677**
			Итого по разделу: Крыльца				**4 181 610**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: СМ-4200-750				
65	497	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.1503	289 374	43 493
66	498	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.116	429 921	49 871
67	499	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.02886	339 944	9 811
68	500	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00544	361 174	1 964
69	501	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8	1 590	1 272
70	502	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.509	601	2 709
71	503	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.509	223	1 006
			Итого по подразделу: СМ-4200-750				**110 128**
			Подраздел: СМ-3600-750				
72	504	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.14106	289 374	40 819
73	505	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.10898	429 921	46 853

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	506	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.02664	339 944	9 056
75	507	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00544	361 174	1 964
76	508	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8	1 590	1 272
77	509	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.2318	601	2 543
78	510	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.2318	223	944
			Итого по подразделу: СМ-3600-750				**103 452**
			Подраздел: переходный мостик				
79	511	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.09554	289 374	27 647
80	512	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.07012	429 921	30 146
81	513	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0.01998	444 161	8 874
82	514	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.00544	339 944	1 848
83	515	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.6	1 590	2 544
84	516	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2.8662	601	1 723
85	517	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.8662	223	639
			Итого по подразделу: переходный мостик				**73 422**
			Итого по разделу: Разные работы				**287 002**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок В				**15 989 953**
			ИТОГО по акту:				**15 989 953**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				15989953.046 x 6.20%	991 377
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				15989953.046 +	16 981 330

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
						991377.058	
		Сметная прибыль, 5.00%				16981330.104 x 5.00%	849 066
		Непредвиденные расходы, 5.000%				16981330.104 x 5.000%	849 066
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					18 679 463
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				18679463.115 x 1.0557	19 719 909
		НДС (12%)				19719909.210 x 12%	2 366 389
		Итого с НДС				19719909.210 + 2366389.105	22 086 298

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	28.01.2025 05:07
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	28.01.2025 09:04
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	28.01.2025 08:58
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 10:14
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 10:14 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 10:28
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 11:51 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:59

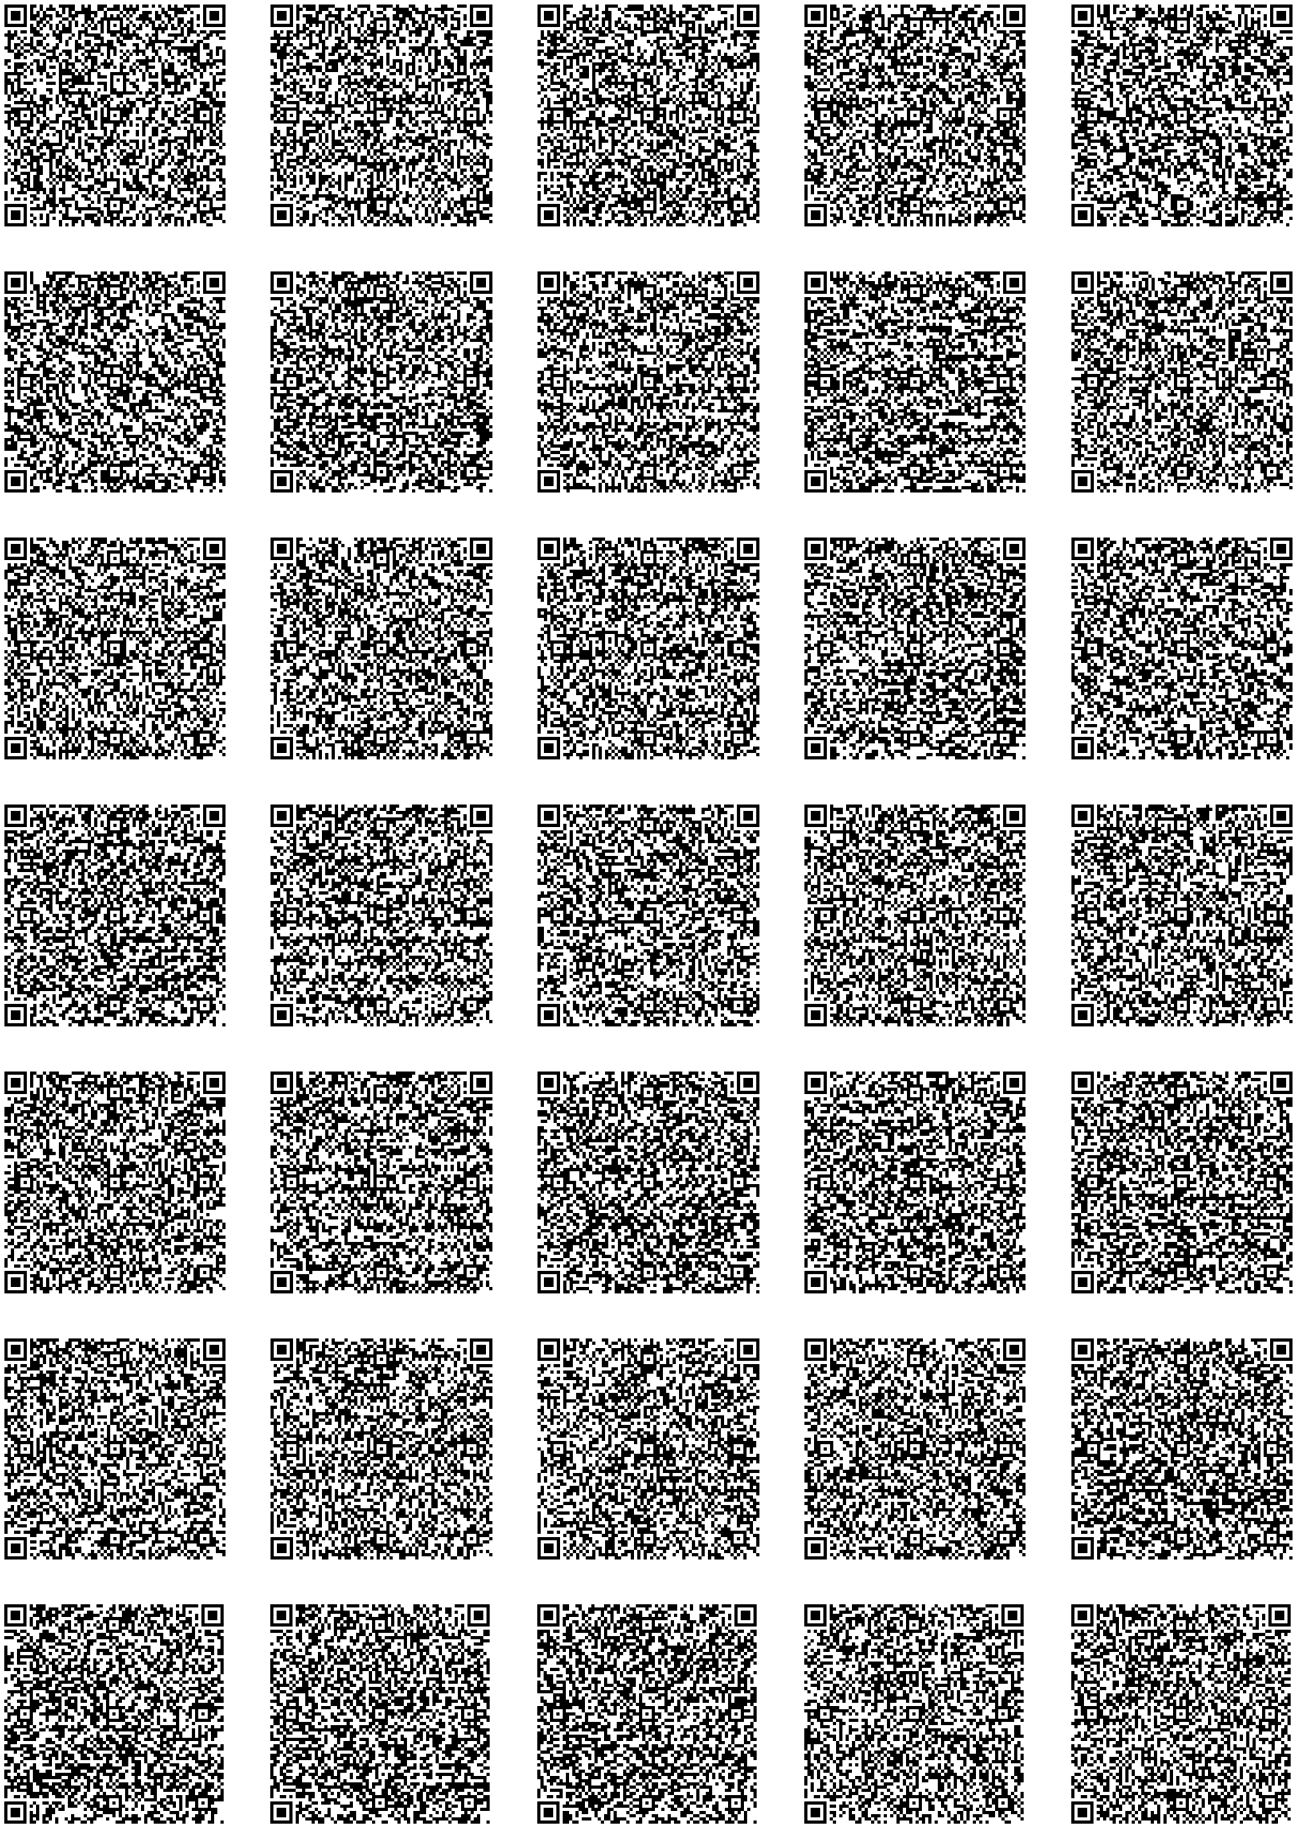

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: МАФы				
1	1	8601-0302-0301УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	26	65 752	1 709 552
2	2.2	8601-0303-0205УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	13	18 051	234 663
3	2.1	8601-0303-0205УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х 0,2 м х 0,44 м)	шт.	13	4	52
4	3	8601-0113-0103УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	2	1 119 660	2 239 320
5	4	8601-0201-0105УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей старших классов)	комплект	1	481 879	481 879
6	5	8601-0203-0102УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход (1,960 м х 1,075 м х 2,200 м)	комплект	2	600 858	1 201 716
7	6	8601-0201-0110УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х 1,52 м х 2,2 м)	комплект	3	662 345	1 987 035
8	7	8601-0201-0120УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,462 м х 1,196 м х 2,100 м)	комплект	2	371 752	743 504
9	8	8601-0103-0304УСН РК 8.02-03-2023	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"	комплект	4	113 765	455 060
10	9	8601-0201-0104УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	3	504 300	1 512 900
11	10	8601-0106-0303УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	6	325 369	1 952 214
12	11	8601-0104-0412УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом	комплект	5	321 472	1 607 360
13	12	8601-0207-0301УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с 1 подъемом	комплект	3	94 030	282 090
14	13	8601-0209-0102УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	172 985	345 970

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	14	8601-0210-0102УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой для детей	комплект	1	187 370	187 370
16	15	8601-0805-0104УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые (5,0х2,0)	комплект	1	572 477	572 477
17	16	8601-0213-0101УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 1	комплект	4	158 008	632 032
18	17	8601-0207-0304УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"баланс"	комплект	2	180 641	361 282
19	18	8601-0207-0303УСН РК 8.02-03-2023	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно-"зигзаг"	комплект	2	117 100	234 200
20	19	8601-0307-0104УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	492 160	492 160
21	20.1	8601-0307-0403УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	3	122	366
22	20.2	8601-0307-0403УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	3	221 916	665 748
			Итого по локальной смете: МАФы				**17 898 950**
			ИТОГО по акту:				**17 898 950**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	16998539.000 x 6.20%	1 053 909
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	17898950.000 + 1053909.386	18 952 859
	Сметная прибыль, 5.00%	18052448.386 x 5.00%	902 622
	Непредвиденные расходы, 5.000%	18952859.386 x 5.000%	947 642
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		20 803 124
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750	20803124.774 x 1.0750	22 363 359
	НДС (12%)	22363359.132 x 12%	2 683 603
	Итого с НДС	22363359.132 + 2683603.096	25 046 962

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	28.01.2025 05:08
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	28.01.2025 09:04
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	28.01.2025 08:57
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 10:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 11:56 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 12:00
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 10:05
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 10:28

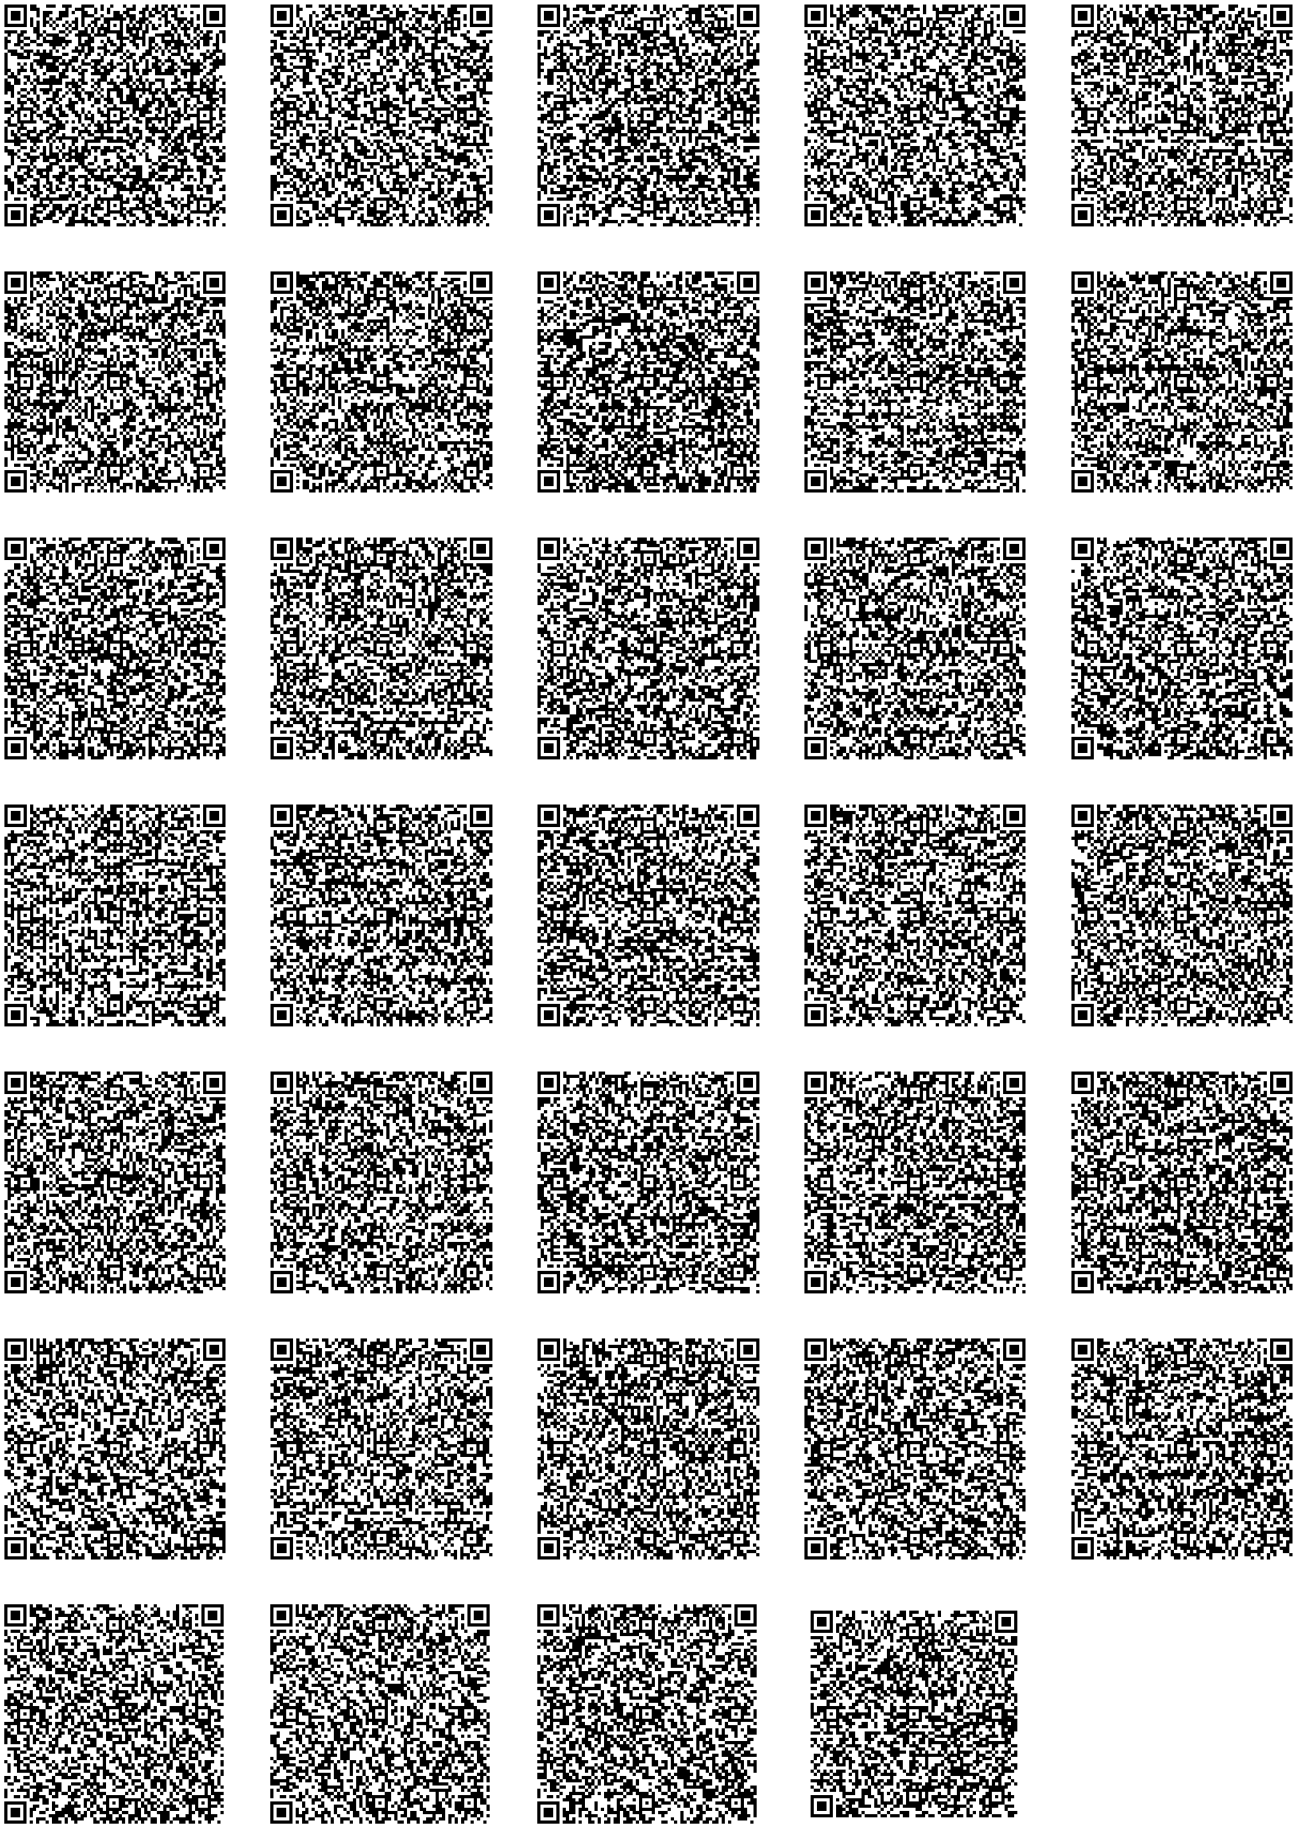

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование. Методические пособия				
			Раздел: Методические пособия по приказу №265				
			Подраздел: Предшкольные классы п.737, 740-742, 745-748, 756, 758, 759 - на 4 класса				
1	11	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	4	15 993	63 973
			Итого по подразделу: Предшкольные классы п.737, 740-742, 745-748, 756, 758, 759 - на 4 класса				**63 973**
			Подраздел: Игровая комната предшкольных классов п. 768-774, 777, 781, 783, 785, 788				
2	23	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Игровая комната предшкольных классов п. 768-774, 777, 781, 783, 785, 788				**15 993**
			Подраздел: Методические пособия для начальных классов п. 611-612, 614-622, 628-629, 631, 632, 639, 641-666, 668-690 - на 16 классов				
3	38	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	16	15 993	255 894
			Итого по подразделу: Методические пособия для начальных классов п. 611-612, 614-622, 628-629, 631, 632, 639, 641-666, 668-690 - на 16 классов				**255 894**
			Подраздел: Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				
4	77	СпрСЦ 02.2024	Набор демонстрационный для изучения механики в начальной школе.	набор	16	136 072	2 177 164
5	78	СпрСЦ 02.2024	Набор демонстрационный для интегрированных научных экспериментов по всем темам начальной школы.	набор	16	194 389	3 110 234
6	79	СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения весов и равновесия в начальной школе (на 13 учебных групп).	набор	16	184 670	2 954 722
7	80	СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения звуковых явлений в начальной школе	набор	16	174 950	2 799 210
8	81	СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения электричества в начальной школе (на 13 учебных групп).	набор	16	291 584	4 665 350
			Итого по подразделу: Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				**15 706 680**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета математики п. 1033-1044, 1048 - на 4 класса				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	101	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	4	15 993	63 973
10	110	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	4	15 993	63 973
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета математики п. 1033-1044, 1048 - на 4 класса				**127 946**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета географии п. 1326-1333, 1335-1376, 1378, 1379 - на 1 класс				
11	160	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета географии п. 1326-1333, 1335-1376, 1378, 1379 - на 1 класс				**15 993**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета истории п. 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272-1276, 1278-1281, 1284-1298, 1305, 1306, - на 3 класса				
12	192	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	3	15 993	47 980
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета истории п. 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272-1276, 1278-1281, 1284-1298, 1305, 1306, - на 3 класса				**47 980**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета английского языка п. 1006, 1012, 1015 - на 5 классов				
13	195	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	5	15 993	79 967
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета английского языка п. 1006, 1012, 1015 - на 5 классов				**79 967**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета русского языка и литературы п. 1097, 1107 - на 5 классов				
14	197	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	5	15 993	79 967
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета русского языка и литературы п. 1097, 1107 - на 5 классов				**79 967**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета казахского языка и литературы п. 966-969, 974-986 - на 4 класса				
15	199	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	4	15 993	63 973
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета казахского языка и литературы п. 966-969, 974-986 - на 4 класса				**63 973**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета робототехники п. 1454, 1456, 2692, 1457, 1459-1466, 2701, 2702 - на 1 класс				
16	212	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета робототехники п. 1454, 1456, 2692, 1457, 1459-1466, 2701, 2702 - на 1 класс				**15 993**
			Подраздел: Stem лаборатория п. 1407-1420, 1422-1429 - на 1 класс				
17	221	521-301-1607001СпрСЦ 02.2024	Набор для исследований по естественным наукам типа NaturePro Research Kit	набор	8	254 338	2 034 704
			Итого по подразделу: Stem лаборатория п. 1407-1420, 1422-1429 - на 1 класс				**2 034 704**
			Подраздел: Методические пособия для спортзала младших классов п. 2083, 2106, 2109 на 2 спортзала				
18	233	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
19	238	522-101-1059001СпрСЦ 02.2024	Секундомер цифровой TSE-930	шт.	20	26 203	524 060
20	239	522-101-1029001СпрСЦ 02.2024	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	2	28 022	56 044

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	245	522-101-1011001СпрСЦ 02.2024	Палка гимнастическая. Материал пластик. Диаметр 25мм, длина 1000мм	шт.	30	900	27 000
22	247	522-101-1012011СпрСЦ 02.2024	Скакалка детская PCrstalCONSTARPP-1215. Длина синтетического шнура 2,4 метра	шт.	30	596	17 880
23	260	522-101-1017001СпрСЦ 02.2024	Волейбольный мяч Mikasa MVA V320W	шт.	30	5 357	160 710
24	261	522-101-1018001СпрСЦ 02.2024	Футбольный мяч Select №5	шт.	30	6 696	200 880
25	263	522-101-1019031СпрСЦ 02.2024	Мяч для художественной гимнастики TFGMB0228 - 21 см. Изготовлен из Каучука	шт.	30	7 964	238 920
26	264	522-101-1019032СпрСЦ 02.2024	Мяч для художественной гимнастики TF19400	шт.	30	7 144	214 320
27	273	СпрСЦ 02.2024	Набор для игры в бадминтон.Ракетки для бадминтона	шт	15	5 831	87 475
			Итого по подразделу: Методические пособия для спортзала младших классов п. 2083, 2106, 2109 на 2 спортзала				**1 543 282**
			Подраздел: Инструкторская п. 2083-2088, 2090-2092 - на 2 кабинета				
28	275	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
29	279	522-101-1059001СпрСЦ 02.2024	Секундомер цифровой TSE-930	шт.	20	26 203	524 060
30	281	522-101-1029001СпрСЦ 02.2024	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	2	28 022	56 044
			Итого по подразделу: Инструкторская п. 2083-2088, 2090-2092 - на 2 кабинета				**596 097**
			Подраздел: Методические пособия для спортзала старшей школы п. 3113, 2098, 2100, 2106, 2107, 2109, 2112, 2118-2126, 2128-2134, 2138-2145, 2147, 2148, 2155-2158 на 1 спортзал				
31	287	522-101-1039002СпрСЦ 02.2024	Мостик гимнастический приставной	шт.	2	16 964	33 928
32	288	522-101-1027001СпрСЦ 02.2024	Обруч алюминевый	шт.	30	2 857	85 710
33	289	522-101-1011001СпрСЦ 02.2024	Палка гимнастическая. Материал пластик. Диаметр 25мм, длина 1000мм	шт.	30	900	27 000
34	292	522-101-1013002СпрСЦ 02.2024	Флажок разноцветный	шт.	10	1 385	13 850
35	295	522-101-1069001СпрСЦ 02.2024	Гранаты для метания 500 гр	шт.	6	5 943	35 658
36	296	522-101-1069002СпрСЦ 02.2024	Гранаты для метания 700 гр	шт.	6	6 793	40 758
37	310	522-101-1019014СпрСЦ 02.2024	Медицинбол 2кг. (медбол) RA-002. Изготовлен из высококачественной плотной износостойкой резины, натуральной кожи или ПВХ	шт.	10	9 609	96 090
38	319	522-101-1048002СпрСЦ 02.2024	Фишка разметочная ТМС-2179	шт.	40	300	12 000
39	321	522-101-1024007СпрСЦ 02.2024	Шарики для настольного тенниса	шт.	40	89	3 560
			Итого по подразделу: Методические пособия для спортзала старшей школы п. 3113, 2098, 2100, 2106, 2107, 2109, 2112, 2118-2126, 2128-2134, 2138-2145, 2147, 2148, 2155-2158 на 1 спортзал				**348 554**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Кабинет НВП п. 3225, 3230-3240, 3242-3247, 3249, 3252 - на 1 класс				
40	344	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет НВП п. 3225, 3230-3240, 3242-3247, 3249, 3252 - на 1 класс				**15 993**
			Подраздел: Кабинет инклюзивной поддержки п. 566-586, 590, 593, 594				
41	346	СпрСЦ 02.2024	Резак пластиковый.	шт	1	9 719	9 719
42	348	522-101-1037003СпрСЦ 02.2024	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507	шт.	1	6 657	6 657
43	349	522-101-1019020СпрСЦ 02.2024	Мяч гимнастический (Фитбол) TF-85 гладкий. Диаметр: 85 см	шт.	4	14 439	57 756
44	352	СпрСЦ 02.2024	Гамак.	шт	2	17 495	34 990
45	354	СпрСЦ 02.2024	Одеяло утяжеленное.	шт.	2	38 878	77 756
46	361	СпрСЦ 02.2024	Игрушки в виде домашних и диких животных.	набор.	4	4 859	19 439
47	362	СпрСЦ 02.2024	Набор муляжей овощей и фруктов.	набор.	4	15 841	63 367
			Итого по подразделу: Кабинет инклюзивной поддержки п. 566-586, 590, 593, 594				**269 684**
			Подраздел: Библиотека п. 403-405, 414, 416, 417				
48	368	СпрСЦ 02.2024	Сканер для QR - кодов Сканер штрих кодов Honeywell 1470G2D (1470G2DR-2USB-R) без подставки.	шт.	1	35 456	35 456
49	371	СпрСЦ 02.2024	Web-камера Встроенная видеокамера, Поддержка Full Hd, не менее 2 мегапикселей.	шт.	1	38 518	38 518
50	372	522-101-0224СпрСЦ 02.2024	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	17	24 116	409 972
			Итого по подразделу: Библиотека п. 403-405, 414, 416, 417				**483 946**
			Подраздел: Дизайн и технология п. 1981-2013, 2015, 2021, 2024, 2027				
51	374	521-301-3113016СпрСЦ 02.2024	Машина швейная электрическая (UniCraft SK-95), размер 580мм х 250мм х 540мм	шт.	1	299 556	299 556
52	375	521-301-3103009СпрСЦ 02.2024	Оверлок (UniCraft RK-95), размер 470мм х 330мм х 490мм	шт.	1	338 967	338 967
53	376	522-101-1304СпрСЦ 02.2024	Утюг	шт.	2	18 571	37 142
54	379	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Дизайн и технология п. 1981-2013, 2015, 2021, 2024, 2027				**691 658**
			Подраздел: Кабинет физики п. 1131-1139, 1142-1211, 1213, 1215, 1217, 1220, 2406, 2437 - на 1 класс				
55	466	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет физики п. 1131-1139, 1142-1211, 1213, 1215, 1217, 1220, 2406, 2437 - на 1 класс				**15 993**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Кабинет музыки п. 2195, 2197, 2198, 2200, 2201, 2209 - на 1 класс				
56	472	СпрСЦ 02.2024	Комплект карточек с нотными знаками демонстрационный	к-т	1	11 716	11 716
57	474	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет музыки п. 2195, 2197, 2198, 2200, 2201, 2209 - на 1 класс				**27 709**
			Подраздел: Кабинет логопеда п. 537, 542-548, 550-554				
58	475	СпрСЦ 02.2024	Ковер/Татами пазлы детские.	шт	1	13 017	13 017
59	485	СпрСЦ 02.2024	Набор развивающих принадлежностей и игрушек для развития лексики.	шт	1	12 538	12 538
			Итого по подразделу: Кабинет логопеда п. 537, 542-548, 550-554				**25 555**
			Подраздел: Кабинет психолога п. 490, 494, 502, 503, 506-508				
60	489	СпрСЦ 02.2024	Комплект для психолого-педагогического обследования детей с нарушением интеллекта MIKKO.	к-т	1	145 792	145 792
			Итого по подразделу: Кабинет психолога п. 490, 494, 502, 503, 506-508				**145 792**
			Подраздел: Культура питания п. 1914-1951, 1958, 1961				
61	494	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Культура питания п. 1914-1951, 1958, 1961				**15 993**
			Подраздел: Культура дома п. 1807-1814, 1820, 1821, 1827-1831, 1834-1840, 1842-1859, 1861-1867, 1869-1885, 1892-1899				
62	526	СпрСЦ 02.2024	Кусачки боковые.	шт	12	2 235	26 826
63	529	СпрСЦ 02.2024	Линейка металлическая 100 сантиметр.	шт	2	3 013	6 026
64	560	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
65	562	СпрСЦ 02.2024	Комплект средств для индивидуальной защиты.	шт	1	272 145	272 145
			Итого по подразделу: Культура дома п. 1807-1814, 1820, 1821, 1827-1831, 1834-1840, 1842-1859, 1861-1867, 1869-1885, 1892-1899				**320 990**
			Подраздел: Кабинет биологии/нанотехнологии п. 1494, 1607-1616, 1618-1626, 1628, 1630-1638, 1640-1646, 1648, 1651, 1658 - на 1 класс				
66	603	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет биологии/нанотехнологии п. 1494, 1607-1616, 1618-1626, 1628, 1630-1638, 1640-1646, 1648, 1651, 1658 - на 1 класс				**15 993**
			Подраздел: Кабинет химии п. 1681-1687, 1690, 1691, 1693-1716, 1718, 1721, 1728 - на 1 класс				
67	616	521-301-2018001СпрСЦ 02.2024	Набор для экспериментов по электрохимии типа Cornelsen Experimenta 51901	набор	1	250 426	250 426
68	636	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Кабинет химии п. 1681-1687, 1690, 1691, 1693-1716, 1718, 1721, 1728 - на 1 класс				**266 419**
			Подраздел: Инструкторская п. 822, 823-825, 828-830, 838, 839 - на 2 кабинета				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	639	СпрСЦ 02.2024	Аптечка медицинская.	шт	2	15 993	31 987
70	645	522-101-1029001СпрСЦ 02.2024	Электромегафон с регулируемой громкостью TV-2159	шт.	2	28 022	56 044
			Итого по подразделу: Инструкторская п. 822, 823-825, 828-830, 838, 839 - на 2 кабинета				**88 031**
			Подраздел: Визуальное искусство п. 1746, 1753, 1754, 1759, 1761, 1765, 1769, 1770, 1778, 1779, 2977, 2979, 2985, 2988, 2990, 2991, 2993, 2995, 2997-3003, 3004				
71	657	СпрСЦ 02.2024	Аптечка с принадлежностями.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Визуальное искусство п. 1746, 1753, 1754, 1759, 1761, 1765, 1769, 1770, 1778, 1779, 2977, 2979, 2985, 2988, 2990, 2991, 2993, 2995, 2997-3003, 3004				**15 993**
			Подраздел: Серверная п.456-460, 463				
72	682	СпрСЦ 02.2024	Медицинская аптечка.	шт	1	15 993	15 993
			Итого по подразделу: Серверная п.456-460, 463				**15 993**
			Подраздел: Сенсорная комната п.474-480, 484, 485				
73	689	СпрСЦ 02.2024	Зеркальный шар с источником света	к-т	1	32 074	32 074
			Итого по подразделу: Сенсорная комната п.474-480, 484, 485				**32 074**
			Подраздел: Кабинет социального педагога п.517, 520, 522, 525, 528, 529, 530				
74	695	СпрСЦ 02.2024	Колонка портативная.	шт	1	49 465	49 465
			Итого по подразделу: Кабинет социального педагога п.517, 520, 522, 525, 528, 529, 530				**49 465**
			Итого по разделу: Методические пособия по приказу №265				**23 494 277**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование. Методические пособия				**23 494 277**
			ИТОГО по акту:				**23 494 277**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	0.000 x 6.20%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	23494277.000 + 0.000	23 494 277
	Сметная прибыль, 5.00%	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные расходы, 5.000%	23494277.000 x 5.000%	1 174 713
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		24 668 990
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750	24668990.850 x 1.0750	26 519 165
	НДС (12%)	26519165.164 x 12%	3 182 299
	Итого с НДС	26519165.164 + 3182299.820	29 701 464

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	27.01.2025 11:07
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	27.01.2025 13:42
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	27.01.2025 13:18
Представители заказчика		
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:35
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 04:46
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 11:25 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 05:17 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 05:30

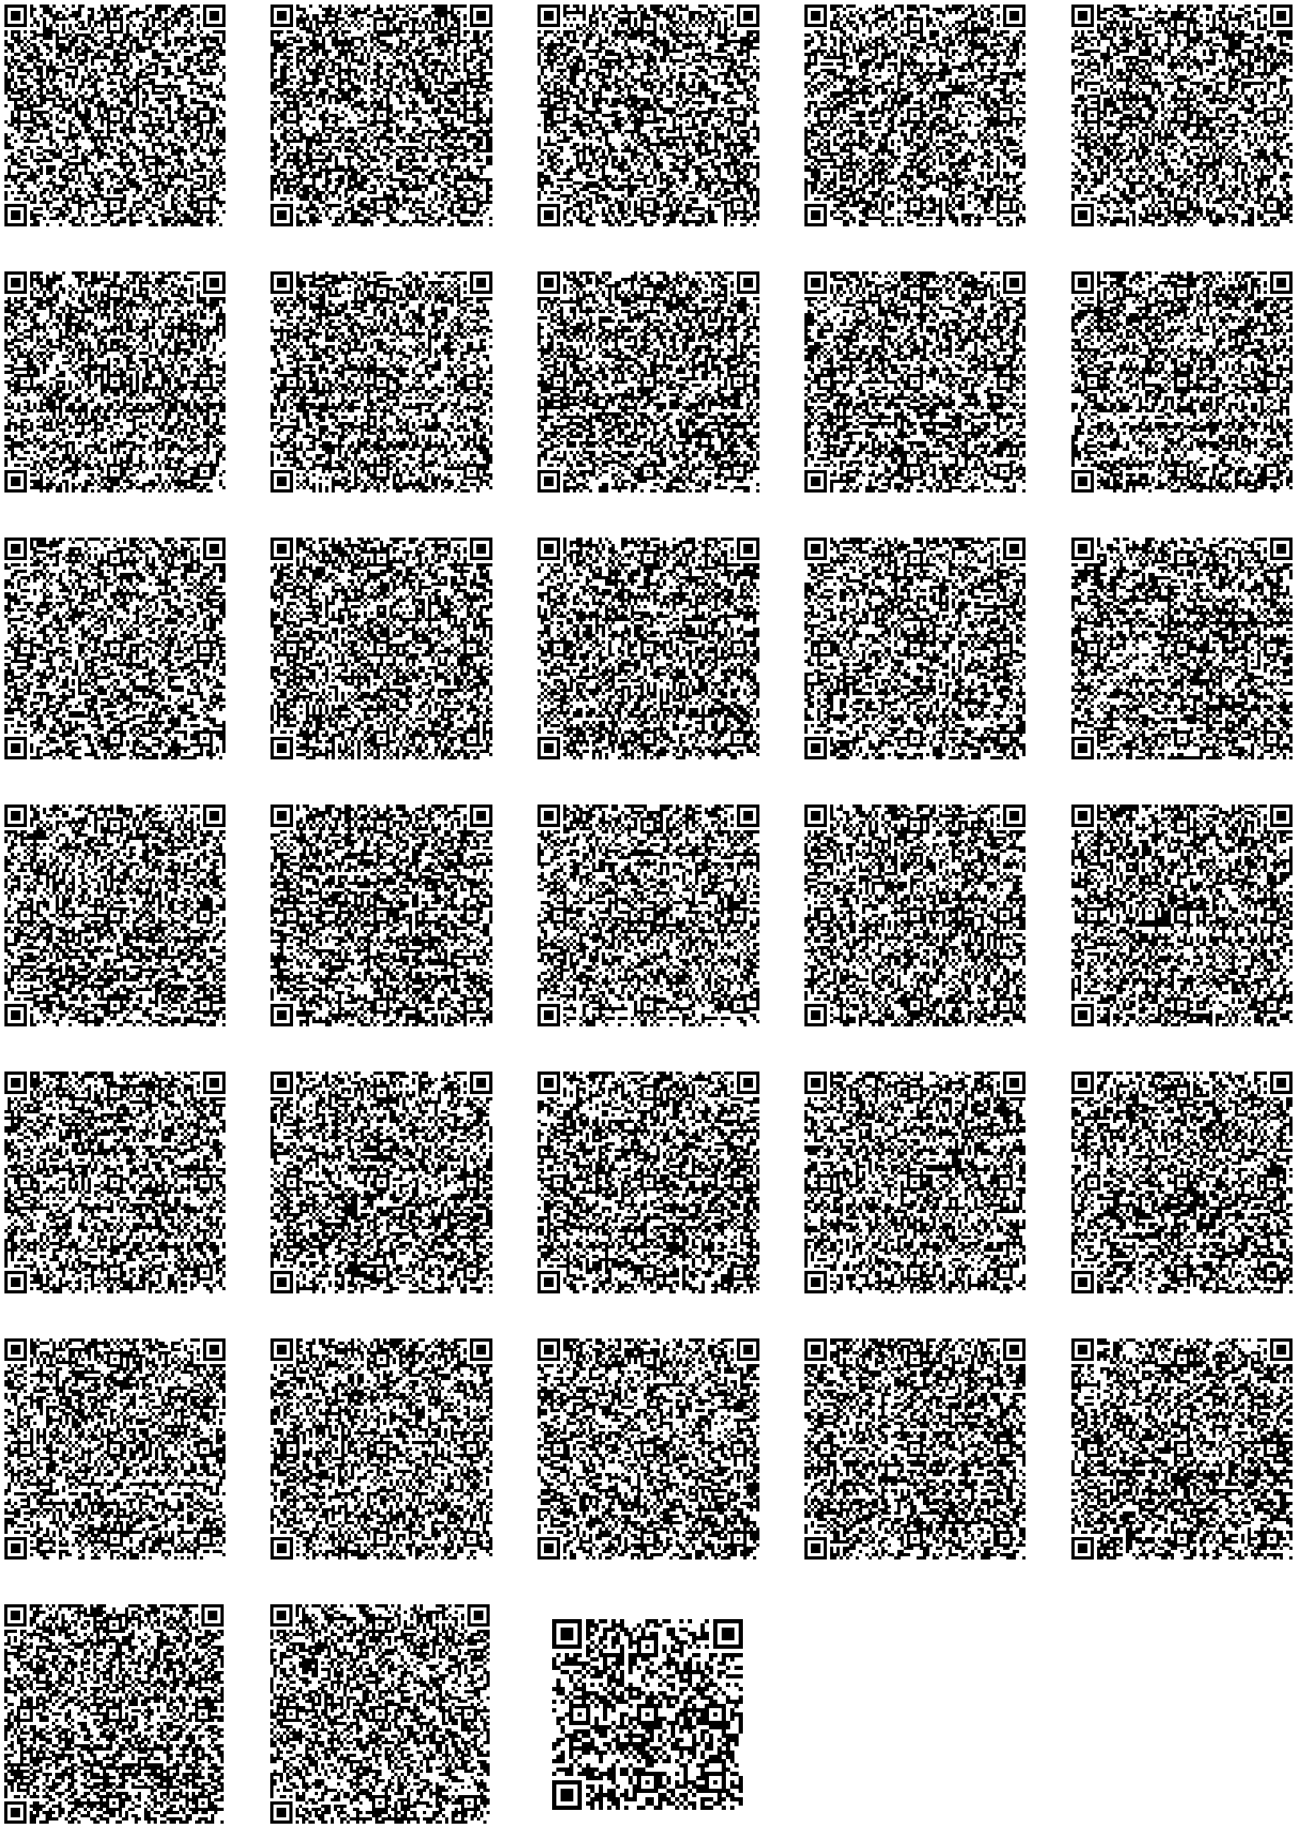

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Окна АС-19				
1	546	6108-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	7.46352	13 826	103 190
2	547	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	0.97524	41 150	40 131
3	548	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	4.97664	43 663	217 295
4	549	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1.51164	43 802	66 213
5	550	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	31.34736	10 112	316 984
6	551	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	31.34736	41 701	1 307 216
7	552	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29.53368	10 112	298 644
8	553	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	29.53368	47 013	1 388 466

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	554	6108-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой	м2	23.6016	9 313	219 801
10	555	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	23.6016	36 908	871 087
11	556	6108-0103-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 м2	м2	8.9856	7 830	70 357
12	557	223-103-0117 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	8.9856	84 099	755 680
			Итого по подразделу: Окна АС-19				**5 655 068**
			Подраздел: Подоконники				
13	558	6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	72.85	4 596	334 818
14	559	223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	1.35	2 648	3 575
15	560	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 250 мм	м	107.925	1 655	178 615
			Итого по подразделу: Подоконники				**517 009**
			Подраздел: Двери АР-20				
16	561	6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	5.74	14 734	84 573
17	562	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5.74	58 830	337 684
18	563	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.8	17 514	31 524
19	564	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/Д5/	м2	1.8	52 373	94 271
20	565	6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м2	3.15	13 530	42 620
21	566	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3.15	68 169	214 732

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	567	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	111.77	7 285	814 244
23	568	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	43.89	19 229	843 961
24	569	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	35.28	20 902	737 423
25	570	223-201-0204 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П+/21-15/	м2	40.1	21 694	869 929
26	571	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	303	907	274 821
27	572	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	158	601	94 958
28	573	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	48	3 380	162 240
29	574	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	48	3 410	163 680
30	575	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	3.3	7 708	25 436
31	576	223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15+Д32	м2	5.67	83 965	476 082
32	577	6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	1.8	14 734	26 521
33	578	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1.8	58 830	105 894
34	579	6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м2	2.16	13 530	29 225
35	580	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2.16	42 023	90 770
			Итого по подразделу: Двери АР-20				**5 520 589**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	581	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37.67	4 268	160 776
37	582	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	13.33	3 874	51 640
38	583	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	37.67	110 393	4 158 504
39	584	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	13.33	123 298	1 643 562
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1				**6 014 482**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1 АР-23				
40	585	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14.97	4 268	63 892
41	586	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	14.97	130 304	1 950 651
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1 АР-23				**2 014 543**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1				
42	587	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	22.57	24 673	556 870
43	588	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	3.35	3 874	12 978
44	589	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	22.57	130 304	2 940 961
45	590	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3.35	146 170	489 670
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1				**4 000 479**
			Подраздел: Сантехнические кабины АР26.1				
46	591	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	37.2918	13 538	504 856
			Итого по подразделу: Сантехнические кабины АР26.1				**504 856**
			Подраздел: Перемычки АР-28				
47	592	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.4135	117 997	48 792

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	593	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.0021	467 480	982
49	594	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.2227	429 921	95 743
50	595	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.1887	325 873	61 492
51	596	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	15.59399	300	4 678
52	597	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	15.59399	223	3 477
			Итого по подразделу: Перемычки АР-28				**215 164**
			Итого по разделу: Проемы				**24 442 190**
			Раздел: Вентшахты /АР-30/				
53	598	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	40.99	5 699	233 602
54	599	261-105-0183 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0.233643	179 342	41 902
55	600	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.23712	252 369	59 842
56	601	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.14888	429 921	64 007
57	602	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.08824	467 480	41 250
58	603	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13.380296	300	4 014
59	604	214-402-0302 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 2 мм	м2	2.05	20 670	42 373
			Итого по разделу: Вентшахты /АР-30/				**486 990**
			Раздел: Воздухозаборная шахта /АР-31.2/				
			Подраздел: ПВ6				
60	605	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м3	3.6	40 333	145 199

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	606	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.864	21 513	18 587
62	607	213-101-0102 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1.368	84 430	115 499
63	608	1114-0301-0204 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0056	72 093	404
64	609	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0056	391 444	2 192
65	610	1107-0504-0101 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	1	15 703	15 703
66	611	222-203-0202 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м3	0.216	157 608	34 043
67	612	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/по уклону/Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	0.5625	36 967	20 794
68	613	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	2.25	1 546	3 479
69	614	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.034425	21 513	741
70	615	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	2.25	121	272
71	616	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.034425	21 513	741
72	617	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	2.25	1 099	2 473
73	618	235-103-0204 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	2.5875	776	2 008
74	619	235-103-0301 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка	м2	2.5875	1 010	2 613
75	620	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3.12	8 990	28 048

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	621	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.026846	252 369	6 775
77	622	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.01689	429 921	7 261
78	623	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.009956	467 480	4 654
79	624	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1.5144684	300	453
80	625	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0.05831	1 479 078	86 245
81	626	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3.79015	4 053	15 361
82	627	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	6.615	4 332	28 656
83	628	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0.0998865	22 470	2 244
84	629	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0.1832355	1 069	196
			Итого по подразделу: ПВ6				**544 644**
			Подраздел: Ограждение лестницы Л-1 АР-32				
85	630	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	37.295	8 188	305 371
86	631	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	37.295	29 813	1 111 876
			Итого по подразделу: Ограждение лестницы Л-1 АР-32				**1 417 247**
			Итого по разделу: Воздухозаборная шахта /АР-31.2/				**1 961 891**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Крыльцо Кр-1 АР-33				
87	637	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	11.43	12 557	143 527
88	638	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	11.6586	18 095	210 962

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	639	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	28.63	44 152	1 264 072
90	640	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	28.9163	15 753	455 518
91	641	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	89.67	26 288	2 357 245
92	642	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	91.91175	18 095	1 663 143
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1 АР-33				**6 094 467**
			Подраздел: Крыльцо Кр-2 АР-33				
93	648	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	7.77	12 557	97 568
94	649	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	7.9254	18 095	143 410
95	650	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	4.73	44 152	208 839
96	651	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	4.7773	15 753	75 257
97	652	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	30.84	26 288	810 722
98	653	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	31.611	18 095	572 001
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-2 АР-33				**1 907 797**
			Подраздел: Крыльцо Кр-3 АР-33				
99	654	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	4.23	17 061	72 168
100	655	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	8.46	43 400	367 164
101	656	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.8927952	452 925	404 369

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
102	657	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0691	336 921	23 281
103	658	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7.5	4 414	33 105
104	659	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	3.91	12 557	49 098
105	660	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	3.9882	18 095	72 166
106	661	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	4.13	44 152	182 348
107	662	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	4.1713	15 753	65 710
108	663	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	27.61	26 288	725 812
109	664	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	28.30025	18 095	512 092
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-3 АР-33				**2 507 314**
			Подраздел: Ограждение крылец				
110	665	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	103.55	8 188	847 867
111	666	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	103.55	29 813	3 087 136
			Итого по подразделу: Ограждение крылец				**3 935 003**
			Итого по разделу: Крыльца				**14 444 581**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: СМ-4200-750				
112	667	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.1503	289 374	43 493
113	668	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.116	429 921	49 871
114	669	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.02886	339 944	9 811

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	670	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00544	361 174	1 964
116	671	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8	1 590	1 272
117	672	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.509	601	2 709
118	673	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.509	223	1 006
			Итого по подразделу: СМ-4200-750				**110 128**
			Подраздел: СМ-3600-750				
119	674	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.14106	289 374	40 819
120	675	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.10898	429 921	46 853
121	676	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.02664	339 944	9 056
122	677	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00544	361 174	1 964
123	678	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0.8	1 590	1 272
124	679	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4.2318	601	2 543
125	680	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.2318	223	944
			Итого по подразделу: СМ-3600-750				**103 452**
			Подраздел: переходный мостик				
126	681	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0.09554	289 374	27 647
127	682	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.07012	429 921	30 146

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	683	214-201-0103 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0.01998	444 161	8 874
129	684	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.00544	339 944	1 848
130	685	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1.6	1 590	2 544
131	686	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2.8662	601	1 723
132	687	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2.8662	223	639
			Итого по подразделу: переходный мостик				**73 422**
			Подраздел: Спортивный зал				
133	688	6112-0401-0116 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка, HPL панели, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	181.735	8 417	1 529 663
134	689	231-102-0103 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	м2	181.735	5 430	986 821
135	690	231-301-0501 РСНБ РК 2022	Пластик бумажнослоистый декоративный толщина 6 мм	м2	181.735	19 264	3 500 943
136	691	522-101-1091002 СпрСЦ 02.2024	Сетка заградительная, размер ячейки 40х40мм RAC-040	м2	313.76	6 442	2 021 242
			Итого по подразделу: Спортивный зал				**8 038 669**
			Итого по разделу: Разные работы				**8 325 671**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				**49 661 323**
			ИТОГО по акту:				**49 661 323**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	47640081.975 x 6.20%	2 953 684
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	49661323.975 + 2953684.992	52 615 008
	Сметная прибыль, 5.00%	50593766.967 x 5.00%	2 529 688
	Непредвиденные расходы, 5.000%	52615008.967 x 5.000%	2 630 750
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		57 775 447
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	57775447.763 x 1.0557	60 993 540

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДС (12%)				60993540.204 x 12%	7 319 224
		Итого с НДС				60993540.204 + 7319224.824	68 312 765

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	27.01.2025 04:37
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	28.01.2025 04:21
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	27.01.2025 09:09
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 06:56
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 10:45 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 06:43
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 06:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:29

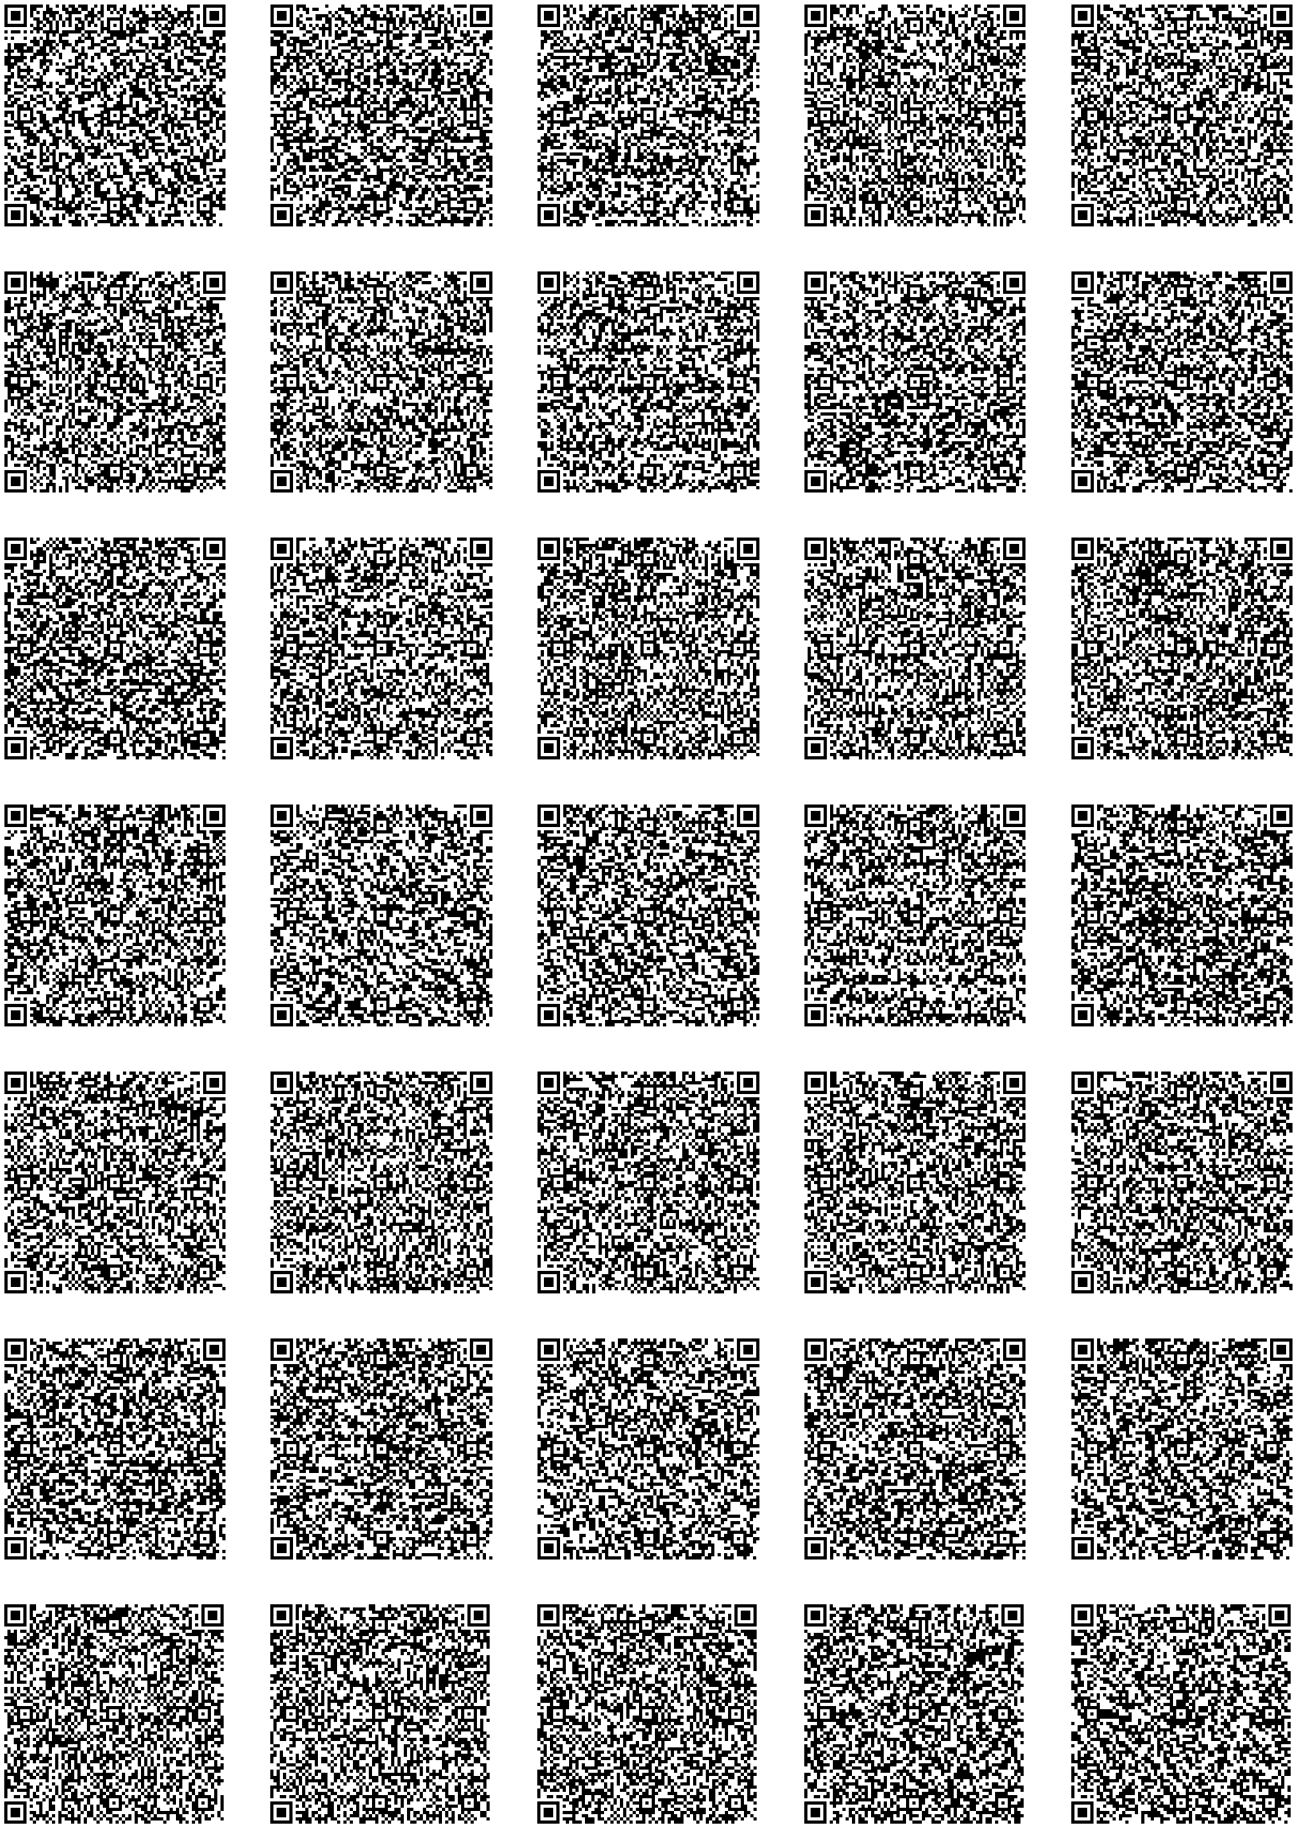

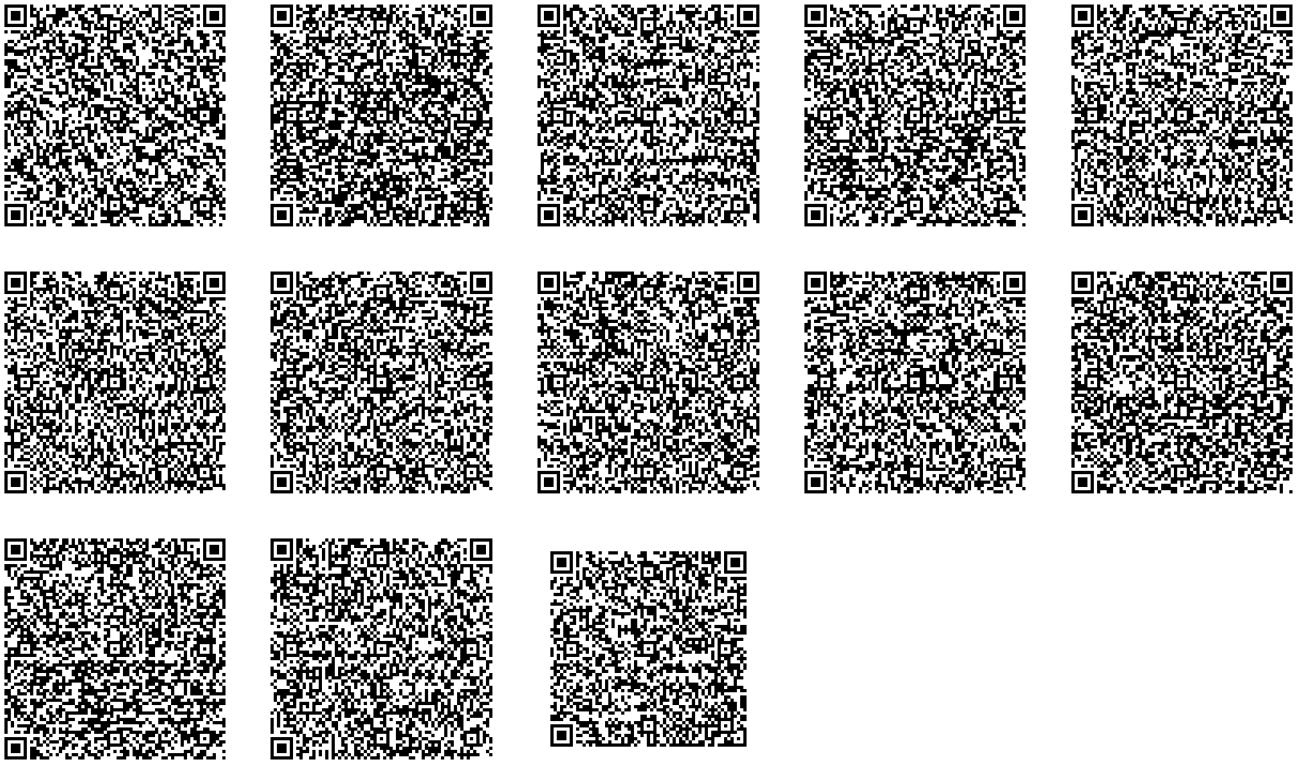

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Л				
			Раздел: Ведомость отделки стен АР-17				
			Подраздел: Затирка поверхности				
1	277	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	20.194	549	11 086
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**11 086**
			Подраздел: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				
2	278	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	1.884	5 623	10 593
			Итого по подразделу: Штукатурка цементно-песчанным раствором-20мм				**10 593**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
3	279	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	18.84	1 330	25 057
4	280	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	18.84	683	12 868
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**37 925**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
5	281	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	98.24	7 142	701 630
6	282	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	78.808128	167	13 161

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	283	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	206.814848	267	55 220
8	284	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	206.304	1 080	222 808
9	285	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	98.24	1 528	150 111
10	286	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	134.98176	76	10 259
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**1 153 189**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
11	287	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	483.61	1 566	757 333
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**757 333**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
12	288	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	89.681	1 823	163 488
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**163 488**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
13	289	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	537.01	1 957	1 050 929
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**1 050 929**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
14	291	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	516.66	1 330	687 158
15	292	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	516.66	683	352 879
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**1 040 037**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
16	293	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	89.372	5 623	502 538
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**502 538**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	294	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	15.04	1 260	18 950
18	295	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	3.76	497	1 869
19	296	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	15.04	641	9 641
20	297	236-202-0402 РСНБ РК 2022	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	2.256	497	1 121
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой фасадной краской (за 2 раза)				**31 581**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
21	298	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	13.7	7 142	97 845
22	299	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	10.99014	167	1 835
23	300	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	28.84124	267	7 701
24	301	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	28.77	1 080	31 072
25	302	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	13.7	1 528	20 934
26	303	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	18.8238	76	1 431
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**160 818**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
27	305	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	87.11	12 370	1 077 551
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**1 077 551**
			Подраздел: Выравнивающий шпатлёвочный слой,				
28	306	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	0.272	1 823	495
			Итого по подразделу: Выравнивающий шпатлёвочный слой,				**495**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	307	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	94.41	7 142	674 276
30	308	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	75.735702	167	12 648
31	309	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	198.751932	267	53 067
32	310	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	198.261	1 080	214 122
33	311	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	94.41	1 528	144 258
34	312	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	129.71934	76	9 859
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**1 108 230**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
35	313	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	522.24	1 566	817 828
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**817 828**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
36	314	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	85.433	1 823	155 744
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**155 744**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
37	315	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	440.34	1 957	861 745
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**861 745**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
38	316	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	41.859	549	22 980
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**22 980**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
39	317	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	430.6	1 330	572 698

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	318	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	430.6	683	294 100
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**866 798**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
41	319	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	18.25	7 142	130 342
42	320	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14.64015	167	2 445
43	321	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	38.4199	267	10 258
44	322	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	38.325	1 080	41 391
45	323	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	18.25	1 528	27 886
46	324	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	25.0755	76	1 906
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**214 228**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
47	326	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	103.54	12 370	1 280 790
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**1 280 790**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
48	327	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	93.65	5 623	526 594
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**526 594**
			Подраздел: затирка				
49	328	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	2.99	1 823	5 451
			Итого по подразделу: затирка				**5 451**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
50	329	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	895.46	1 823	1 632 424

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 632 424**
			Подраздел: Слой финишной шпатлёвки				
51	330	6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	443.06	1 957	867 068
			Итого по подразделу: Слой финишной шпатлёвки				**867 068**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
52	331	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	461.86	1 566	723 273
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**723 273**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				
53	332	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	36.314	549	19 936
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**19 936**
			Подраздел: Отделка по ГКЛО				
54	333	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	100.25	7 142	715 986
55	334	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	80.42055	167	13 430
56	335	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	211.0463	267	56 349
57	336	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	210.525	925	194 736
58	337	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	100.25	1 528	153 182
59	338	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	137.7435	76	10 469
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛО				**1 144 152**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
60	339	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	1633.85	1 330	2 173 020
61	340	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	1633.85	683	1 115 920

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**3 288 940**
			Подраздел: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				
62	341	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	34.022	5 623	191 305
			Итого по подразделу: Улучшенная п/п штукатурка -15/12 мм				**191 305**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				
63	342	6112-0202-0701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9.169	4 336	39 756
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -10мм				**39 756**
			Подраздел: Отделка по ГКЛВ				
64	343	6107-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 2 слоя, глухой	м2	7.89	7 142	56 350
65	344	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	6.329358	167	1 057
66	345	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	16.610028	267	4 435
67	346	232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	16.569	1 080	17 895
68	347	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	м2	7.89	1 528	12 056
69	348	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10.84086	76	823
			Итого по подразделу: Отделка по ГКЛВ				**92 617**
			Подраздел: Облицовка керамической плиткой				
70	350	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	86.17	12 370	1 065 923
			Итого по подразделу: Облицовка керамической плиткой				**1 065 923**
			Подраздел: Затирка поверхности				
71	351	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	3.86	549	2 119
			Итого по подразделу: Затирка поверхности				**2 119**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	352	6112-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, панельная стена и перегородка	м2	2.002	549	1 099
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка цементно-песчанным раствором-10мм				**1 099**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
73	353	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	2.002	1 823	3 649
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**3 649**
			Подраздел: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				
74	354	6112-0302-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, стена подготовленная под окраску	м2	20.02	1 330	26 627
75	355	6112-0302-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловыми водоэмульсионным составом за один раз, Добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м2	20.02	683	13 673
			Итого по подразделу: Окраска акриловой краской (за 2 раза)				**40 301**
			Подраздел: Фартук				
76	356	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	16.2	12 370	200 394
			Итого по подразделу: Фартук				**200 394**
			Итого по разделу: Ведомость отделки стен АР-17				**21 170 914**
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
77	357	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	341.2	3 897	1 329 656
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 329 656**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
78	358	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	367.06	2 920	1 071 815
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 071 815**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
79	359	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	341.2	1 753	598 124
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**598 124**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	360	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	177.84	6 504	1 156 671
81	361	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	186.732	4 122	769 709
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 926 380**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
82	362	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	4.65	7 975	37 084
83	363	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	0.4743	66 535	31 558
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**68 642**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
84	364	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	4.65	3 584	16 666
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**16 666**
			Подраздел: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				
85	367	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	/атмосферостойкая/Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	4.65	1 935	8 998
			Итого по подразделу: Окраска атмосферостойкой краской (за 2 раза)				**8 998**
			Подраздел: Реечный потолок				
86	368	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	26.27	7 125	187 174
87	369	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	27.5835	6 053	166 963
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**354 137**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
88	370	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	344.91	3 897	1 344 114
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 344 114**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
89	371	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	344.91	2 920	1 007 137

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 007 137**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
90	372	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	344.91	1 753	604 627
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**604 627**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
91	373	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	169.45	6 504	1 102 103
92	374	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	177.9225	4 122	733 397
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 835 500**
			Подраздел: Реечный потолок				
93	375	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	34.09	7 125	242 891
94	376	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	35.7945	6 053	216 664
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**459 555**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				
95	377	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	350.11	3 897	1 364 379
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями -3мм				**1 364 379**
			Подраздел: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				
96	378	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	350.11	2 920	1 022 321
			Итого по подразделу: Сплошное выравнивание сухими смесями 3-5 мм				**1 022 321**
			Подраздел: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				
97	379	6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	350.11	1 753	613 743
			Итого по подразделу: Окраска водоэмульсионной краской (за 2 раза)				**613 743**
			Подраздел: Подвесной потолок типа Armstrong				
98	380	6112-0501-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м2	160.08	6 504	1 041 160

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	381	232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	168.084	4 122	692 842
			Итого по подразделу: Подвесной потолок типа Armstrong				**1 734 002**
			Подраздел: Реечный потолок				
100	382	6112-0501-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подвесного потолка, реечного алюминиевого	м2	38.28	7 125	272 745
101	383	232-401-0301 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе	м2	40.194	6 053	243 294
			Итого по подразделу: Реечный потолок				**516 039**
			Подраздел: Утеплитель минераловатный				
102	384	6111-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2	22.69	7 975	180 953
103	385	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	2.31438	66 535	153 987
			Итого по подразделу: Утеплитель минераловатный				**334 940**
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
104	386	6112-0301-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	22.69	3 584	81 321
105	387	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	93.55087	76	7 110
106	388	217-202-0501 РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	22.69	145	3 290
107	389	6112-0302-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м2	22.69	1 565	35 510
108	390	6112-0302-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м2	22.69	841	19 082
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**146 313**
			Подраздел: Откосы				
109	391	6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 20 мм	м2	68.44	5 161	353 219
110	392	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	68.44	1 823	124 766

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	393	6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	68.44	1 566	107 177
			Итого по подразделу: Откосы				**585 162**
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**16 942 250**
			Раздел: Проемы				
			Подраздел: Двери АР-20				
112	404	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.75	-17 514	-30 650
113	405	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный/Д1/	м2	1.75	52 373	91 653
114	406	6108-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2	м2	3.15	8 426	26 541
115	407	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П ,ДГ 21-15/Д19/	м2	3.15	19 229	60 571
116	408	6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	85.68	7 285	624 179
117	409	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д52,22/	м2	10.5	19 229	201 904
118	410	223-201-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	25.2	20 902	526 730
119	411	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/ДГ 21-14/Д21	м2	49.98	19 229	961 065
120	412	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	206.1	907	186 933
121	413	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	114	601	68 514
122	414	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	39	3 380	131 820
123	415	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	39	3 410	132 990

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	416	6108-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м2	м2	3.15	7 708	24 280
125	417	223-205-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3.15	83 965	264 490
126	418	6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1.8	17 514	31 524
127	419	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный/Д54/	м2	1.8	64 046	115 283
			Итого по подразделу: Двери АР-20				**3 417 829**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-1 АР-21				
128	420	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	3.63	24 673	89 563
129	421	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	0.71	130 304	92 516
130	422	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2.92	146 170	426 816
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-1 АР-21				**608 895**
			Подраздел: Витражи наружные ВН-2 АР-21				
131	423	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19.06	4 268	81 348
132	424	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	3.11	3 874	12 048
133	425	223-301-0108 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	15.95	130 304	2 078 349
134	426	223-301-0208 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3.11	146 170	454 589
			Итого по подразделу: Витражи наружные ВН-2 АР-21				**2 626 334**
			Подраздел: Витражи внутренние ВВ-1				
135	427	6107-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7.45	4 268	31 797
136	428	6107-0302-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	2.98	3 874	11 545

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
137	429	223-301-0104 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	7.45	110 393	822 428
138	430	223-301-0204 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	м2	2.98	123 298	367 428
			Итого по подразделу: Витражи внутренние ВВ-1				**1 233 198**
			Подраздел: Сантехнические кабины АР26.1				
139	431	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	34.4708	13 538	466 666
			Итого по подразделу: Сантехнические кабины АР26.1				**466 666**
			Подраздел: Перемычки АР-28				
140	432	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0.33687	117 997	39 750
141	433	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.24942	429 921	107 231
142	434	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.08745	325 873	28 498
143	435	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	2	33	66
144	436	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	13.59798	300	4 079
145	437	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13.59798	223	3 032
			Итого по подразделу: Перемычки АР-28				**182 656**
			Итого по разделу: Проемы				**8 535 578**
			Раздел: Вентшахты /АР-30,1/				
146	438	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м2	110.22	7 415	817 281
147	439	212-402-0105 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3.41682	22 097	75 501
148	440	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	119.0376	1 069	127 250

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	441	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	44.03	5 699	250 926
150	442	261-105-0183 РСНБ РК 2022	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0.250971	179 342	45 010
151	443	6105-0401-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крепление сводов стальными затяжками	т	0.22988	252 369	58 015
152	444	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.15304	429 921	65 795
153	445	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0.07684	467 480	35 921
154	446	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12.868156	300	3 860
			Итого по разделу: Вентшахты /АР-30,1/				**1 479 561**
			Раздел: Крыльца				
			Подраздел: Крыльцо Кр-1 АР-33				
155	447	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.648	17 061	11 056
156	448	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1.81	43 400	78 554
157	449	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1772448	452 925	80 279
158	450	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01404	336 921	4 730
159	451	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	3.933	4 414	17 360
160	452	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	0.68	44 152	30 023
161	453	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	0.6868	15 753	10 819
162	454	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	5.64	26 288	148 264

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	455	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	5.781	18 095	104 607
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-1 АР-33				**485 692**
			Подраздел: Крыльцо Кр-2 АР-33				
164	456	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1.32	17 061	22 521
165	457	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5	43 400	217 000
166	458	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.5240088	452 925	237 337
167	459	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0383	336 921	12 904
168	460	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6	4 414	26 484
169	461	6112-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка стены плитами гранитными полированными толщиной 40 мм при числе плит, в 1 м2 свыше 4 до 6	м2	7.15	44 152	315 687
170	462	231-201-0107 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	7.2215	15 753	113 760
171	463	6109-0306-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	11.4	12 557	143 150
172	464	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	11.685	18 095	211 440
173	465	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	5.37	26 288	141 167
174	466	231-201-0109 РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 30 мм	м2	5.50425	18 095	99 599
			Итого по подразделу: Крыльцо Кр-2 АР-33				**1 541 049**
			Подраздел: Ограждение крылец				
175	467	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	6.14	8 188	50 274

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	468	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	6.14	29 813	183 052
			Итого по подразделу: Ограждение крылец				**233 326**
			Итого по разделу: Крыльца				**2 260 067**
			Раздел: Разные работы				
			Подраздел: Ограждение лестницы Л-1 АР-31				
177	469	6106-0304-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем	м	19.8	8 188	162 122
178	470	222-503-0302 РСНБ РК 2022	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	19.8	29 813	590 297
			Итого по подразделу: Ограждение лестницы Л-1 АР-31				**752 419**
			Подраздел: Стремянка СМ-1				
179	471	1139-0501-0109 РСНБ РК 2022	Стремянки. Устройство	т конструкций	0.1503	104 380	15 688
180	472	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0.1503	1 075 341	161 624
181	473	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6.6132	448	2 963
			Итого по подразделу: Стремянка СМ-1				**180 275**
			Подраздел: Переходной мостик ПМ-1				
182	474	1139-0501-0109 РСНБ РК 2022	Стремянки. Устройство	т конструкций	0.09554	104 380	9 972
183	475	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0.09554	1 075 341	102 738
184	476	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4.20376	448	1 883
			Итого по подразделу: Переходной мостик ПМ-1				**114 593**
			Подраздел: Защитные экраны отопительных приборов ар.26,4				
185	477	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	82.6	764	63 106
186	478	6107-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей,отнесенным от базовой стены, с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	м2	89.44	4 298	384 412

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	479	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	89.44	764	68 332
188	480	222-529-0501 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	698	462	322 476
189	481	6118-0202-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,2 м2	шт.	104	2 208	229 632
190	482	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетка ПВХ 400х800мм.	шт	66	4 880	322 092
191	483	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетка ПВХ 400х700мм.	шт	21	4 436	93 167
192	484	СТЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетка ПВХ 400х1000мм.	шт	17	5 767	98 046
			Итого по подразделу: Защитные экраны отопительных приборов ар.26,4				**1 581 265**
			Итого по разделу: Разные работы				**2 628 552**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Л				**53 016 922**
			ИТОГО по акту:				**53 016 922**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				53016922.130 x 6.20%	3 287 049
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				53016922.130 + 3287049.071	56 303 971
		Сметная прибыль, 5.00%				56303971.201 x 5.00%	2 815 198
		Непредвиденные расходы, 5.000%				56303971.201 x 5.000%	2 815 198
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					61 934 368
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				61934368.321 x 1.0557	65 384 112
		НДС (12%)				65384112.637 x 12%	7 846 093
		Итого с НДС				65384112.637 + 7846093.516	73 230 206

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	27.01.2025 10:21
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	27.01.2025 13:28
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	27.01.2025 13:17
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	28.01.2025 06:39
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	28.01.2025 06:57
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 11:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:36
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	28.01.2025 06:47 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

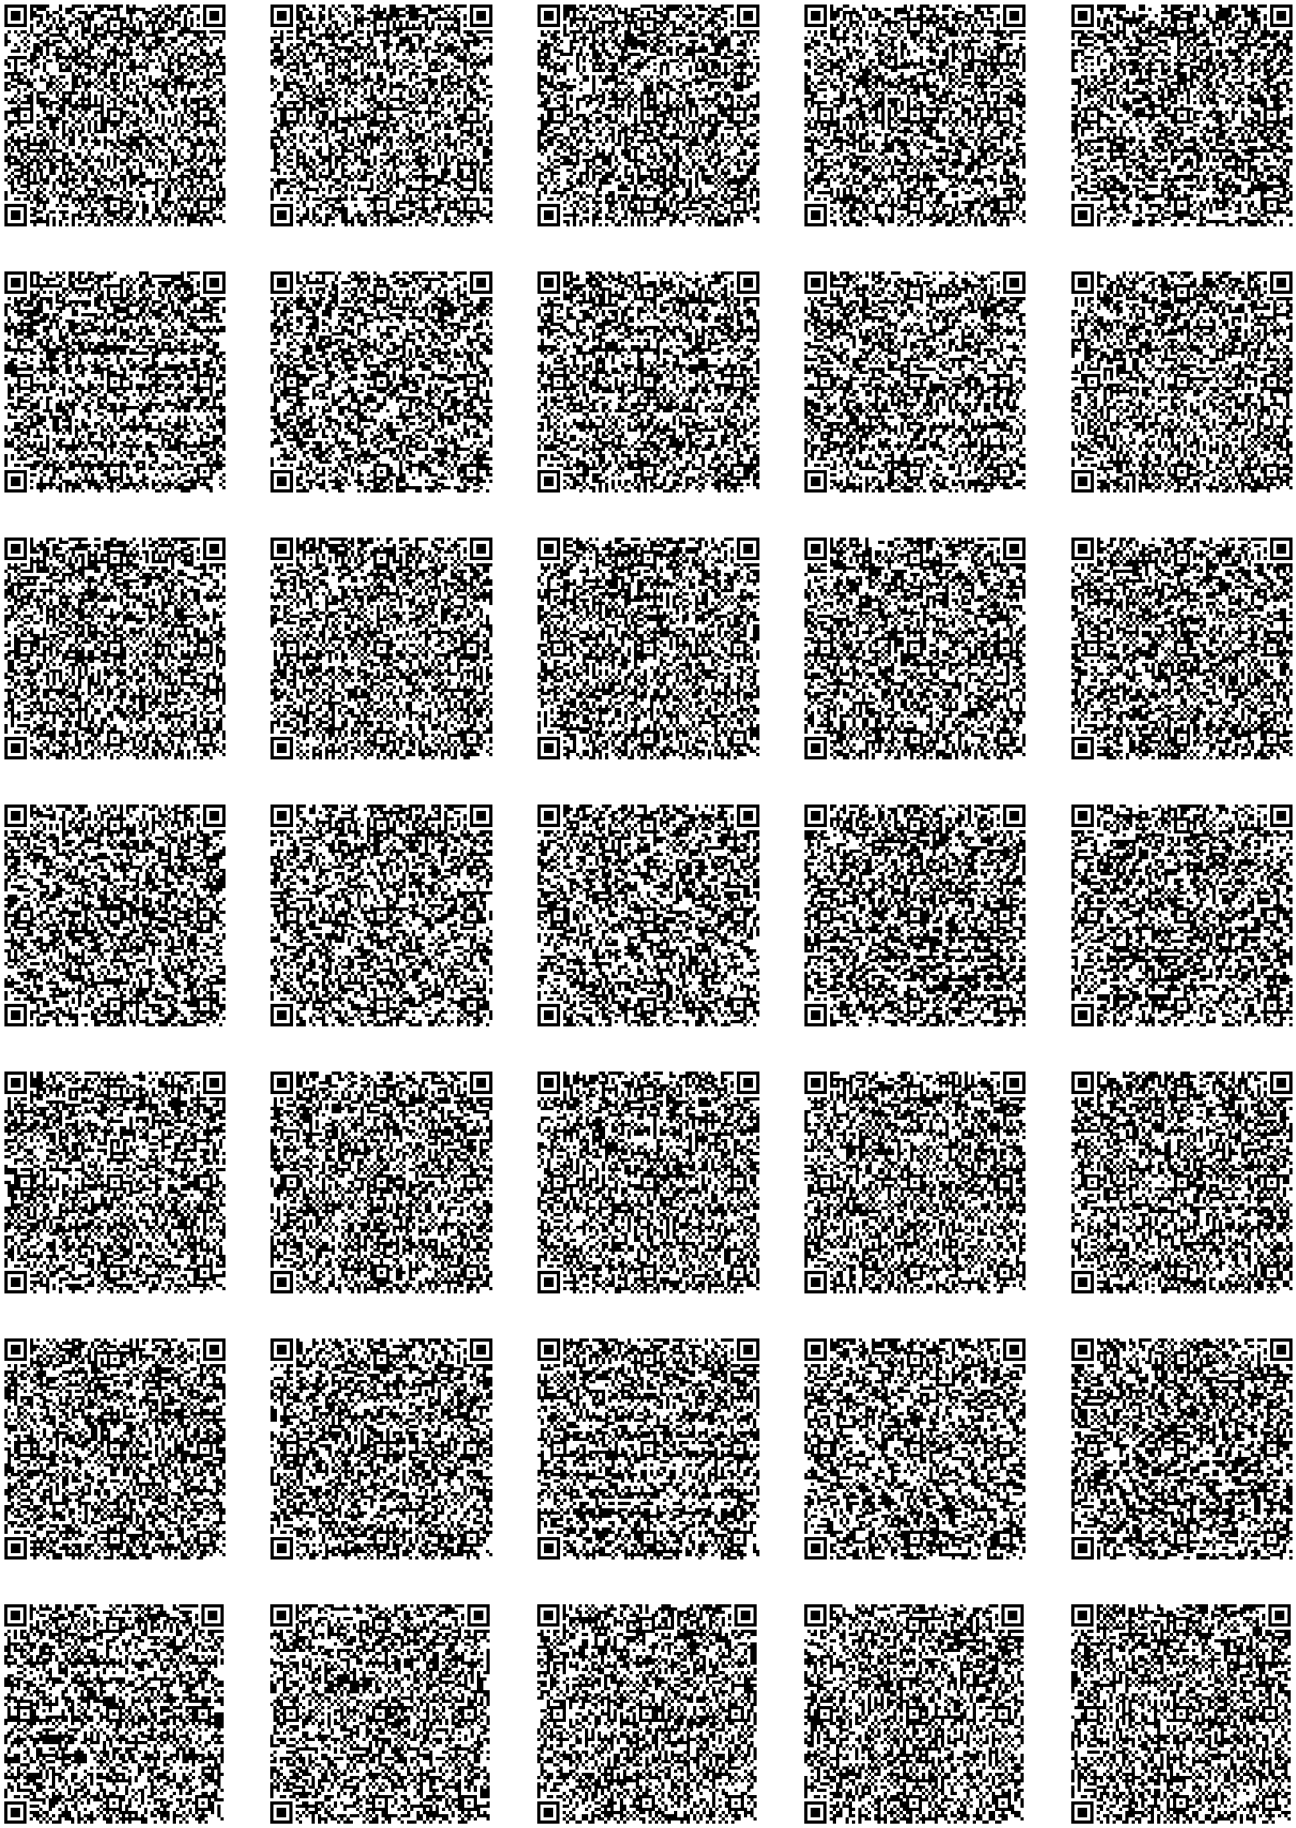

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Технологическое оборудование. Методические пособия				
			Раздел: Методические пособия по приказу №265				
			Подраздел: Предшкольные классы п.737, 740-742, 745-748, 756, 758, 759 - на 4 класса				
1	1		Демонстрационные часы с циферблатом.	шт	4	10 934	43 738
2	2		Муляжи овощей и фруктов, продуктов питания.	набор	4	29 158	116 634
3	3		Набор геометрических фигур демонстрационный.	набор	4	9 719	38 878
4	4	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	52	2 338	121 576
5	5	СпрСЦ 02.2024	Набор емкостей для демонстрации объема.	набор	4	27 640	110 561
6	6	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	набор	4	5 206	20 827
7	7	СпрСЦ 02.2024	Набор плоскостных геометрических фигур.	набор	4	7 289	29 158
8	8	СпрСЦ 02.2024	Оборудование и принадлежности для экспериментов по темам «Звук», «Вода и воздух», «Тепло», «Магнетизм».	к-т	62	83 309	5 165 193
9	9	СпрСЦ 02.2024	Счетный набор магнитный.	набор	16	2 652	42 439
10	10	СпрСЦ 02.2024	Фланелеграф.	шт	4	5 979	23 918
			Итого по подразделу: Предшкольные классы п.737, 740-742, 745-748, 756, 758, 759 - на 4 класса				**5 712 922**
			Подраздел: Игровая комната предшкольных классов п. 768-774, 777, 781, 783, 785, 788				
11	21	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм	шт.	5	25 207	126 035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	22	СпрСЦ 02.2024	Ширма.	шт	1	17 301	17 301
			Итого по подразделу: Игровая комната предшкольных классов п. 768-774, 777, 781, 783, 785, 788				**143 336**
			Подраздел: Методические пособия для начальных классов п. 611-612, 614-622, 628-629, 631, 632, 639, 641-666, 668-690 - на 16 классов				
13	24	СпрСЦ 02.2024	Набор сюжетных картин для развития речи.	набор	16	43 737	699 803
14	25	СпрСЦ 02.2024	Набор предметных картинок (животные, растения, транспорт, фрукты, овощи, мебель, одежда).	к-т	16	3 839	61 427
15	26	СпрСЦ 02.2024	Таблица демонстрационная «Коркем жазу алыпби» формат А-2.	шт	16	3 936	62 982
16	27	СпрСЦ 02.2024	Таблица демонстрационная «Чистописание. Алфавит» формат А-2.	шт	16	3 936	62 982
17	28	СпрСЦ 02.2024	Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"	шт	16	5 714	91 426
18	29	521-402-0102001 СпрСЦ 02.2024	Лента измерительная, 1000 мм	шт.	208	1 556	323 648
19	30	СпрСЦ 02.2024	Модель демонстрационная Единицы объема.	шт	16	9 441	151 064
20	31	СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный.	набор	16	16 231	259 705
21	32	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	16	2 338	37 408
22	33	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	набор	16	5 206	83 308
23	34	СпрСЦ 02.2024	Набор цифр и знаков магнитный демонстрационный.	набор	16	3 123	49 981
24	35	СпрСЦ 02.2024	Часы с циферблатом демонстрационный.	шт	16	10 934	174 951
25	36	СпрСЦ 02.2024	Часы с циферблатом для учащихся.	шт	208	3 915	814 321
26	37	СпрСЦ 02.2024	Плакат настенный "Правила техники безопасности в кабинете начальной школы"	шт	16	5 714	91 426
			Итого по подразделу: Методические пособия для начальных классов п. 611-612, 614-622, 628-629, 631, 632, 639, 641-666, 668-690 - на 16 классов				**2 964 432**
			Подраздел: Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				
27	39	521-301-1101002 СпрСЦ 02.2024	Анемометр типа Invicta 084059/42443	шт.	16	35 891	574 256
28	40	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	16	8 732	139 712
29	41	СпрСЦ 02.2024	Глобус Земли физический 320 миллиметр	шт	16	6 508	104 130

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	42	521-301-0547 СпрСЦ 02.2024	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	208	1 857	386 256
31	43	СпрСЦ 02.2024	Карта Мира политическая.	шт	16	3 887	62 205
32	44	СпрСЦ 02.2024	Карта физическая РК	шт	16	3 887	62 205
33	45	СпрСЦ 02.2024	Коллекция "Полезные ископаемые для начальной школы"	шт	16	11 323	181 171
34	46	522-101-0803 СпрСЦ 02.2024	Компас школьный	шт.	400	346	138 400
35	47	521-301-1550002 СпрСЦ 02.2024	Лупа ручная d.50 мм	шт.	400	346	138 400
36	48	СпрСЦ 02.2024	Торс человека.	шт	16	58 316	933 070
37	49	СпрСЦ 02.2024	Модель солнечной системы.	шт	16	22 354	357 677
38	50	521-301-2959 СпрСЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	16	18 098	289 568
39	51	СпрСЦ 02.2024	Набор веществ для растворения.	шт	16	24 298	388 779
40	52	521-301-0557001 СпрСЦ 02.2024	Набор грузов по механике (10х100гр)	набор	48	9 389	450 672
41	53	СпрСЦ 02.2024	Набор для исследования почвы (на 13 учебных групп).	шт	16	73 764	1 180 225
42	54	СпрСЦ 02.2024	Набор магнитов для опытов (на 13 рабочих групп).	шт	16	8 678	138 857
43	55	СпрСЦ 02.2024	Набор принадлежностей для ознакомления с силой трения и силой упругости	шт	208	16 523	3 436 807
44	56	СпрСЦ 02.2024	Набор тел разной электропроводимости.	шт	16	3 458	55 332
45	57	СпрСЦ 02.2024	Набор термометров уличный, комнатный водный.	шт	128	4 946	633 119
46	58	522-101-1033001 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	16	16 614	265 824
47	59	СпрСЦ 02.2024	Секундомер детский	шт	128	2 721	348 346
48	60	522-101-0802001 СпрСЦ 02.2024	Термометр демонстрационный	шт.	16	405	6 480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	61	СпрСЦ 02.2024	Часы песочные 1 минут.	шт	128	1 166	149 291
50	62	СпрСЦ 02.2024	Часы песочные 3 минут.	шт	128	1 457	186 614
51	63	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	16	25 744	411 904
52	65	СпрСЦ 02.2024	Комплект лабораторного оборудования Набор для юных биологов.	набор	80	428 969	34 317 540
53	66	СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Биология".	набор	16	680 363	10 885 818
54	68	521-202-0602002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Звук" типа Cornelsen 16104/44207 Experimenta	набор	16	83 175	1 330 800
55	69	521-202-0603002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Магнетизм" типа Cornelsen Experimenta 16115	набор	16	131 993	2 111 888
56	70	521-202-0604002 СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Механика" типа Cornelsen Experimenta 16100K	набор	16	186 236	2 979 776
57	71	СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Оптика" типа Cornelsen Experimenta 16110.	набор	16	83 247	1 331 958
58	73	СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория для начальной школы "Электричество" Cornelsen Experimenta 31772.	набор	16	111 754	1 788 073
59	74	СпрСЦ 02.2024	Динамометр демонстрационный 10 Ньютон (пара)	шт	16	8 747	139 961
60	75	521-301-1103001 СпрСЦ 02.2024	Дождемер типа Invicta 084059/42443	шт.	16	12 404	198 464
61	76	521-301-1711 СпрСЦ 02.2024	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	16	56 786	908 576
62	82	СпрСЦ 02.2024	Набор для исследования возобновляемой энергии	набор	16	189 529	3 032 478
63	83	СпрСЦ 02.2024	Набор лабораторной посуды и принадлежностей для преподавателя и учащихся.	шт	16	15 551	248 819
64	84	СпрСЦ 02.2024	Набор прозрачных и непрозрачных тел.	шт	208	10 848	2 256 568
65	85	СпрСЦ 02.2024	Флюгер для начальной школы.	шт	16	6 803	108 858
66	86	СпрСЦ 02.2024	Фонарь маленький ручной.	шт	208	1 166	242 598
			Итого по подразделу: Оборудование и принадлежности для естествознания и познания мира				**72 901 476**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета математики п. 1033-1044, 1048 - на 4 класса				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	88	СпрСЦ 02.2024	Калькулятор графический с перезаряжаемой батареей.	шт	24	136 072	3 265 745
68	89	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	шт	4	5 206	20 827
69	90	521-301-0303001 СпрСЦ 02.2024	Набор для демонстрации куба и сферы типа Invicta	набор	4	32 549	130 196
70	91	СпрСЦ 02.2024	Набор объемных геометрических фигур демонстрационный.	шт	4	16 231	64 926
71	92	СпрСЦ 02.2024	Развивающий набор "Объемные геометрические фигуры" Learning Resources	шт	4	16 231	64 926
72	93	СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	шт	4	16 231	64 926
73	94	СпрСЦ 02.2024	Набор прозрачных геометрических тел с сечением демонстрационный.	шт	4	16 231	64 926
74	95	СпрСЦ 02.2024	Набор для создания плоских фигур.	шт	12	4 859	58 317
75	96	521-301-0310001 СпрСЦ 02.2024	Набор Дробные части квадрата и круга типа Invicta	набор	12	66 000	792 000
76	97	521-301-0305001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследования законов вероятности типа Invicta 113159/42432	набор	4	69 620	278 480
77	98	521-301-0306001 СпрСЦ 02.2024	Набор геометрических фигур раздаточный	набор	52	2 338	121 576
78	99	СпрСЦ 02.2024	Набор стержневых геометрических фигур на 13 рабочих групп.	шт	4	34 712	138 849
79	100	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	4	69 008	276 033
80	102	СпрСЦ 02.2024	Головоломки разные в соответствии с возрастом для интеллектуального развития детей.	шт	100	17 773	1 777 304
81	103	СпрСЦ 02.2024	Игры настольные разные в соответствии с возрастом для интеллектуального развития детей.	шт	100	12 538	1 253 813
82	104	522-101-1049001 СпрСЦ 02.2024	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	52	10 018	520 936
83	105	522-101-1072005 СпрСЦ 02.2024	Шахматная доска складная виниловая размерами 510 мм х 510 мм с фигурами ТСН-200	комплект	4	7 264	29 056
84	106	521-302-0423001 СпрСЦ 02.2024	Часы шахматные механические ТСН-9905	шт.	52	19 173	996 996

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	107	522-101-1072002 СпрСЦ 02.2024	Шахматы 3в 1 (390мм х 390 мм)	шт.	52	10 089	524 628
86	108	522-101-1072004 СпрСЦ 02.2024	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214	шт.	52	5 858	304 616
87	109	СпрСЦ 02.2024	Шашки магнитные для демонстрационной доски	шт	4	6 998	27 992
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета математики п. 1033-1044, 1048 - на 4 класса				**10 777 068**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета географии п. 1326-1333, 1335-1376, 1378, 1379 - на 1 класс				
88	111	СпрСЦ 02.2024	Погодная станция.Набор для исследований климата и погоды	шт	1	68 036	68 036
89	117	СпрСЦ 02.2024	Карта Австралии и Океании политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
90	118	СпрСЦ 02.2024	Карта Австралии и Океании физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
91	119	СпрСЦ 02.2024	Карта Азии политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
92	120	СпрСЦ 02.2024	Карта Азии физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
93	121	СпрСЦ 02.2024	Карта Африки политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
94	122	СпрСЦ 02.2024	Карта Африки физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
95	123	СпрСЦ 02.2024	Карта Евразии физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
96	124	СпрСЦ 02.2024	Карта Европы политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
97	125	СпрСЦ 02.2024	Карта мира климатическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
98	126	СпрСЦ 02.2024	Карта мира политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
99	127	СпрСЦ 02.2024	Карта мира физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
100	128	СпрСЦ 02.2024	Карта народов и плотности населения мира 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
101	129	СпрСЦ 02.2024	Карта океанов 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
102	130	СпрСЦ 02.2024	Карта природных зон мира 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
103	131	СпрСЦ 02.2024	Карта Северной Америки политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
104	132	СпрСЦ 02.2024	Карта Северной Америки физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	133	СпрСЦ 02.2024	Карта экологических проблем мира 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
106	134	СпрСЦ 02.2024	Карта Южной Америки политическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
107	135	СпрСЦ 02.2024	Карта Южной Америки физическая 100х140 см.	шт	1	6 804	6 804
108	136	СпрСЦ 02.2024	Карта РК политико-административная 1/1 500 000 ламинированная.	шт	1	6 804	6 804
109	137	СпрСЦ 02.2024	Карта РК физическая	шт	1	3 888	3 888
110	138	СпрСЦ 02.2024	Глобус Звездного неба 320 миллиметр с подсветкой.	шт	1	16 069	16 069
111	139	СпрСЦ 02.2024	Глобус Земли политический 320 миллиметр.	шт	1	13 559	13 559
112	140	СпрСЦ 02.2024	Глобус Земли физический 150 миллиметр.	шт	13	5 130	66 702
113	141	СпрСЦ 02.2024	Глобус Луны 320 миллиметр.	шт	1	13 243	13 243
114	142	СпрСЦ 02.2024	Глобус Марса 320 миллиметр.	шт	1	13 243	13 243
115	143	СпрСЦ 02.2024	Модель по географии «Сдвиги и разломы земной коры».	шт	1	21 695	21 695
116	144	СпрСЦ 02.2024	Модель по географии «Строение земли».	шт	1	17 977	17 977
117	145	СпрСЦ 02.2024	Модель по географии «Строение рельефа морского дна».	шт	1	21 695	21 695
118	146	522-101-0805001 СпрСЦ 02.2024	Теллурий (модель Солнце - Земля - Луна)	шт.	1	32 644	32 644
119	147	СпрСЦ 02.2024	Модель циклона и антициклона.	шт	1	54 672	54 672
120	148	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Минералы и горные породы».	шт	1	18 980	18 980
121	149	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Полезные ископаемые».	шт	1	14 093	14 093
122	150	522-101-0801001 СпрСЦ 02.2024	Барометр-анероид. Диапазон: 720-780мм.рт.ст., 96000-104000Па, цена деления 1мм.рт.ст., 100Па	шт.	1	47 448	47 448
123	151	521-301-0506 СпрСЦ 02.2024	Гигрометр 0-25 градусов	шт.	1	11 607	11 607
124	152	521-301-1122 СпрСЦ 02.2024	Дальномер электронный	шт.	3	33 125	99 375

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
125	153	522-101-0803 СпрСЦ 02.2024	Компас школьный	шт.	25	346	8 650
126	154	521-301-1123001 СпрСЦ 02.2024	Курвиметр	шт.	13	2 518	32 734
127	155	522-101-1033001 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	3	16 614	49 842
128	156	522-101-0802002 СпрСЦ 02.2024	Термометр с фиксацией максимального и минимального значений типа ScienceCube, MDS-106. Диапазон: -20°C до +50°C	шт.	1	8 543	8 543
129	157	СпрСЦ 02.2024	Модель сейсмографа.	шт	1	58 317	58 317
130	158	521-301-1124001 СпрСЦ 02.2024	Флюгер типа Invicta 087559/42442	шт.	1	23 506	23 506
131	159	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	1	69 008	69 008
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета географии п. 1326-1333, 1335-1376, 1378, 1379 - на 1 класс				**921 606**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета истории п. 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272-1276, 1278-1281, 1284-1298, 1305, 1306, - на 3 класса				
132	161	СпрСЦ 02.2024	Карта Балканы и Малая Азия в XIII-XV веков. Завоевания турок - османов 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
133	162	СпрСЦ 02.2024	Карта Великая Отечественная война (22 июня 1941-декабрь 1943 годы) 100х140 сантиметр.	шт	3	6 803	20 411
134	163	СпрСЦ 02.2024	Карта Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
135	164	СпрСЦ 02.2024	Карта Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX-начале XXI в 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
136	165	СпрСЦ 02.2024	Карта Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 -май 1945 годы Разгром Японии) 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
137	166	СпрСЦ 02.2024	Карта Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр.	шт	3	6 803	20 411
138	167	СпрСЦ 02.2024	Карта Крестовые походы XI-XIII веков 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
139	168	СпрСЦ 02.2024	Карта Мир во второй половине XX века-начале XXI века 100х140 сантиметр.	шт	3	6 803	20 411
140	169	СпрСЦ 02.2024	Карта Монгольские завоевания XIII в 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
141	170	СпрСЦ 02.2024	Карта Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны 1918-1923 годы 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
142	171	СпрСЦ 02.2024	Карта Первая мировая война 1914-1918 годы. Военные действия в Европе и на Кавказе 100х140 санти-метр.	шт	3	6 803	20 411

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	172	СпрСЦ 02.2024	Карта Советский Союз в 1985-1991 годы. Распад СССР 100х140 сантиметр.	шт	3	6 803	20 411
144	173	СпрСЦ 02.2024	Карта Создание и распад державы Александра Македонского 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
145	174	СпрСЦ 02.2024	Карта Союз Советских Социалистических Республик в 1922-1939 годы 100х140 сантиметр.	шт	3	6 803	20 411
146	175	СпрСЦ 02.2024	Карта Столетняя война 1337-1453 годы 70х100 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
147	176	СпрСЦ 02.2024	Карта Мира политическая 1:25 000 000.	шт	3	3 887	11 663
148	177	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в годы ВОВ 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
149	178	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в годы гражданской войны 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
150	179	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в составе монгольской империи 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
151	180	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в средние века. Государственные образования на территории Казахстана 13-15 века 100х70 сантимет.	шт	3	3 887	11 663
152	181	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство в начале 18 века 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
153	182	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в средние века. Походы Эмира Тимура 1336-1405 годы 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
154	183	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство. Образование в 1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
155	184	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство. Образование в 1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
156	185	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан. Национально-освободительное движение под руководством Кенесары Касымулы 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
157	186	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан. Национально-освободительное движение Сырыма Датулы 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
158	187	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан. Развитие торговли в 19-начале 20 века 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
159	188	СпрСЦ 02.2024	Карта Казахстан. Участие казахов в Отечественной войне 1812 годы.100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
160	189	СпрСЦ 02.2024	Карта РК Политико-административная 1:1 500 000 ламинированная.	шт	3	3 887	11 663
161	190	СпрСЦ 02.2024	Карты Древний Казахстан в комплекте 10 штук 100х70 сантиметр.	шт	3	3 887	11 663
162	191	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	3	69 008	207 025
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета истории п. 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272-1276, 1278-1281, 1284-1298, 1305, 1306, - на 3 класса				**609 403**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета английского языка п. 1006, 1012, 1015 - на 5 классов				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	193	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	5	69 008	345 042
164	194	СпрСЦ 02.2024	Карта страны изучаемого языка.	шт	5	3 887	19 439
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета английского языка п. 1006, 1012, 1015 - на 5 классов				**364 481**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета русского языка и литературы п. 1097, 1107 - на 5 классов				
165	196	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	5	69 008	345 042
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета русского языка и литературы п. 1097, 1107 - на 5 классов				**345 042**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета казахского языка и литературы п. 966-969, 974-986 - на 4 класса				
166	198	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	4	69 008	276 033
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета казахского языка и литературы п. 966-969, 974-986 - на 4 класса				**276 033**
			Подраздел: Методические пособия для кабинета робототехники п. 1454, 1456, 2692, 1457, 1459-1466, 2701, 2702 - на 1 класс				
167	200	СпрСЦ 02.2024	Таблица «Робототехника» 120х240 см.	шт	1	12 635	12 635
168	201	521-305-0140001 СпрСЦ 02.2024	Комплект тренировочных полей для занятий робототехникой типа Инт парк	комплект	1	77 754	77 754
169	202	СпрСЦ 02.2024	Таблица Правила техники безопасности в кабинете информатики.	шт	1	12 635	12 635
170	203	521-305-0115001 СпрСЦ 02.2024	Набор робототехнический со средой программирования в виде программных блоков, содержащий микроконтроллер с экраном, моторы, датчики, конструкционные элементы, методические материалы типа FIRST Lego League Championship class pack for Challenge League	набор	6	895 287	5 371 722
171	204	521-305-0133 СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения Ардуино Arduino UScience Pro Kit	набор	12	41 205	494 460
172	205	521-305-0124001 СпрСЦ 02.2024	Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit	набор	3	330 556	991 668
173	206	521-305-0116001 СпрСЦ 02.2024	Набор для подготовки к соревнованиям по робототехнике типа лиги Game Elements FIRST Tech Challenge Championship	набор	1	1 130 475	1 130 475
174	207	521-305-0117 СпрСЦ 02.2024	Набор робототехники для изучения основ Искусственного интеллекта, компьютерного зрения и технологии беспилотных автомобилей на языке программирования Python. (FIRST Tech Challenge Championship with the Control Communication set and Electronics Modules and Sensors Set)	набор	6	2 461 037	14 766 222
175	208	521-305-0128001 СпрСЦ 02.2024	Набор образовательный с квадрокоптером типа CodyFly Edu Kit	набор	1	429 806	429 806
176	209	СпрСЦ 02.2024	Робот антропоморфный Робот гуманоид Robomate, с 16 приводами, с функцией беспроводного управления (Bluetooth), материал корпуса пластик, детали из алюминиевых сплавов. Инструкция сборки прилагается. Возможность управлять со смартфона, планшета или ПК.	шт	1	575 582	575 582
177	210	СпрСЦ 02.2024	Тренировочный набор для изучения программирования микроконтроллеров и датчиков, расположенных на общей физической плате с модулями интернет вещей, содержащий саму плату, необходимые инструменты для работы, методические материалы Набор Arduino Расширенный.	набор	1	40 822	40 822

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
178	211	СпрСЦ 02.2024	Программируемый дрон В состав набора входит: Аппаратура управления -1шт. Приемник - 1шт. Полетный контроллер - 1шт. датчик GPS - 1шт. Бесколлекторные двигатели -4шт. ESC регуляторы - 4шт. Аккумулятор -1шт. Пропеллеры -4шт.	набор	6	369 340	2 216 041
			Итого по подразделу: Методические пособия для кабинета робототехники п. 1454, 1456, 2692, 1457, 1459-1466, 2701, 2702 - на 1 класс				**26 119 822**
			Подраздел: Stem лаборатория п. 1407-1420, 1422-1429 - на 1 класс				
179	213	СпрСЦ 02.2024	Геоборд.	шт	8	7 810	62 485
180	214	СпрСЦ 02.2024	Конструктор плоских фигур.	шт	2	25 149	50 299
181	215	521-301-0301 СпрСЦ 02.2024	Пластиковая модель штангенциркуля	шт.	4	7 071	28 284
182	216	521-301-0305001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследования законов вероятности типа Invicta 113159/42432	набор	1	69 620	69 620
183	217	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	4	8 732	34 928
184	218	СпрСЦ 02.2024	Мини-лаборатория по гидропонике Состав комплекта: ячейки для растений -12шт., блок питания - 1шт., система улучшения фотосинтеза, система циркуляции воды, блок управления. Размеры мини лаборатории: 250ммх350ммх350мм.	шт	1	111 774	111 774
185	219	521-301-1711 СпрСЦ 02.2024	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	1	56 786	56 786
186	220	521-301-2959 СпрСЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	4	18 098	72 392
187	222	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	1	25 744	25 744
188	223	522-101-0808001 СпрСЦ 02.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	4	11 385	45 540
189	225	521-305-0132001 СпрСЦ 02.2024	Набор образовательный на базе Ардуино с научными датчиками типа Uscience Kit	набор	2	39 429	78 858
190	226	521-301-2967001 СпрСЦ 02.2024	Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ для дизайна и технологий типа TechGenius Pro 370891	шт.	1	824 286	824 286
191	227	521-305-0123 СпрСЦ 02.2024	Набор робототехнический для симуляции индустриальных процессов (SimuBot)	набор	1	1 435 744	1 435 744
192	228	521-305-0124001 СпрСЦ 02.2024	Набор образовательный для изучения RaspberryPi и Интернет вещей типа PiConnect Edu Kit	набор	2	330 556	661 112

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
193	229	521-305-0125001 СпрСЦ 02.2024	Набор для изучения нейротехнологий типа MindLab Kit	набор	1	251 444	251 444
194	230	521-305-0126001 СпрСЦ 02.2024	Набор для исследований альтернативной энергетики с методическими материалами типа GreenLab Research Kit	набор	1	677 796	677 796
			Итого по подразделу: Stem лаборатория п. 1407-1420, 1422-1429 - на 1 класс				**4 487 092**
			Подраздел: Методические пособия для спортзала младших классов п. 2083, 2106, 2109 на 2 спортзала				
195	234	522-101-1036001 СпрСЦ 02.2024	Корзина для мячей переносная. Размеры: 900x800x600мм	шт.	8	35 099	280 792
196	235	522-101-1037003 СпрСЦ 02.2024	Насос для накачивания мячей типа TPU-4507	шт.	2	6 657	13 314
197	236	СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 10 метров.	шт	2	2 624	5 249
198	237	522-101-1008004 СпрСЦ 02.2024	Свисток пластиковый TR-40	шт.	30	4 047	121 410
199	242	522-101-1002007 СпрСЦ 02.2024	Доска наклонная ребристая 1,5м TSF-4575 (дерево). Размеры 1500x240мм. Материал: березовая фанера 18 мм	шт.	2	31 910	63 820
200	243	522-101-1004001 СпрСЦ 02.2024	Канат для перетягивания 10м Ф40мм	шт.	2	75 207	150 414
201	246	522-101-1068002 СпрСЦ 02.2024	Перекладина гимнастическая пристенная	шт.	2	35 714	71 428
202	248	522-101-1003009 СпрСЦ 02.2024	Скамья гимнастическая с металлическими опорами TSF-9113. Длина скамейки 2000 мм, ширина 240мм, высота 340мм	шт.	16	51 220	819 520
203	249	522-101-1001008 СпрСЦ 02.2024	Стенка гимнастическая шведская деревянная TSF-9142. Размеры 2800x800мм	шт.	12	67 257	807 084
204	251	522-101-1040001 СпрСЦ 02.2024	Планка для прыжков в высоту TA-2158, длина 4 м, с пластиковыми наконечниками	шт.	2	37 084	74 168
205	252	522-101-1041002 СпрСЦ 02.2024	Стойка для прыжков в высоту, деревянная конструкция	шт.	2	50 364	100 728
206	253	522-101-1060 СпрСЦ 02.2024	Палочка эстафетная	шт.	10	714	7 140
207	254	СпрСЦ 02.2024	Маты для прыжков в высоту.Зона приземления RA-2205 2x2x0,5м.Состоит из 2 матов 2x1x0,5м. Изготовлена из ПВХ 2x2м. Материал наполнителя пенополиуретан.	шт	1	213 829	213 829

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
208	256	522-101-1020001 СпрСЦ 02.2024	Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150	шт.	20	1 420	28 400
209	257	522-101-1044001 СпрСЦ 02.2024	Ворота для минифутбола (2х3м)	шт.	2	37 500	75 000
210	258	522-101-1036001 СпрСЦ 02.2024	Корзина для мячей переносная. Размеры: 900х800х600мм	шт.	8	35 099	280 792
211	262	522-101-1045001 СпрСЦ 02.2024	Мяч гандбольный TF-9525	шт.	10	7 691	76 910
212	265	522-101-1046003 СпрСЦ 02.2024	Сетка волейбольная, размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951	шт.	2	41 431	82 862
213	266	522-101-1046003 СпрСЦ 02.2024	Сетка волейбольная, размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951	шт.	2	41 431	82 862
214	267	522-101-1053006 СпрСЦ 02.2024	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый), регулировка от 2240мм до 2430мм	пара	2	490 371	980 742
215	268	522-101-1052001 СпрСЦ 02.2024	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	410 714	821 428
216	270	522-101-1072003 СпрСЦ 02.2024	Шахматы размерами 480 х 500 х 30 мм TCH-182	шт.	52	10 127	526 604
217	271	521-302-0423001 СпрСЦ 02.2024	Часы шахматные механические TCH-9905	шт.	52	19 173	996 996
218	272	522-101-1072004 СпрСЦ 02.2024	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм TCH-214	шт.	52	5 858	304 616
			Итого по подразделу: Методические пособия для спортзала младших классов п. 2083, 2106, 2109 на 2 спортзала				**6 986 108**
			Подраздел: Инструкторская п. 2083-2088, 2090-2092 - на 2 кабинета				
219	277	522-101-1033001 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	2	16 614	33 228
220	278	522-101-1008004 СпрСЦ 02.2024	Свисток пластиковый TR-40	шт.	30	4 047	121 410
221	280	522-101-1030001 СпрСЦ 02.2024	Табло пластиковое перекидное TSC-2055	шт.	6	13 531	81 186
			Итого по подразделу: Инструкторская п. 2083-2088, 2090-2092 - на 2 кабинета				**235 824**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: Методические пособия для спортзала старшей школы п. 3113, 2098, 2100, 2106, 2107, 2109, 2112, 2118-2126, 2128-2134, 2138-2145, 2147, 2148, 2155-2158 на 1 спортзал				
222	283	522-101-1061002 СпрСЦ 02.2024	Бревно гимнастическое напольное 5м	шт.	1	33 036	33 036
223	284	522-101-1054001 СпрСЦ 02.2024	/Бревно напольное/Брусья гимнастические мужские профессиональные	шт.	1	178 661	178 661
224	285	522-101-1054001 СпрСЦ 02.2024	Брусья гимнастические мужские профессиональные	шт.	1	178 661	178 661
225	286	522-101-1054003 СпрСЦ 02.2024	Брусья гимнастические женские на растяжках	шт.	1	125 000	125 000
226	290	522-101-1068001 СпрСЦ 02.2024	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	2	37 500	75 000
227	291	522-101-1012001 СпрСЦ 02.2024	Скакалка с деревянными ручками	шт.	30	1 786	53 580
228	300	522-101-1020001 СпрСЦ 02.2024	Мяч для метания резиновый диаметром 60мм RAM-150	шт.	20	1 420	28 400
229	301	522-101-1040001 СпрСЦ 02.2024	Планка для прыжков в высоту TA-2158, длина 4 м, с пластиковыми наконечниками	шт.	2	37 084	74 168
230	302	522-101-1041001 СпрСЦ 02.2024	Стойка для прыжков в высоту TA-2141, из алюминиевой профильной трубы	комплект	2	147 626	295 252
231	303	522-101-1050003 СпрСЦ 02.2024	Ворота для гандбола, минифутбола RA-3200. Усиленная конструкция. Основные размеры в собранном состоянии: ширина - 3000 мм, высота - 2000 мм, глубина основания 1000 мм	шт.	2	231 144	462 288
232	304	522-101-1060 СпрСЦ 02.2024	Палочка эстафетная	шт.	10	714	7 140
233	305	522-101-1049001 СпрСЦ 02.2024	Тогызкумалак ТКТ-863	шт.	15	10 018	150 270
234	307	522-101-1070001 СпрСЦ 02.2024	Баскетбольное кольцо	шт.	8	4 911	39 288
235	308	521-302-0420001 СпрСЦ 02.2024	Жилетка игровая с номером TGV-010	шт.	40	2 486	99 440
236	313	522-101-1071001 СпрСЦ 02.2024	Сетка для баскетбола	шт.	10	536	5 360

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
237	314	522-101-1046003 СпрСЦ 02.2024	Сетка волейбольная, размер сетки 9500 х 1000 мм RAS-951	шт.	2	41 431	82 862
238	315	522-101-1086001 СпрСЦ 02.2024	Сетка для настольного тенниса sd-100, крепление винт. Изготовлена из нейлона Размеры сетки: Длина: 183 см +/- 1 см. Высота: 15,25 см	шт.	4	8 076	32 304
239	316	522-101-1047002 СпрСЦ 02.2024	Сетка мини-футбольная, размер ячейки 100 х 100 мм RAS-2100	шт.	2	58 256	116 512
240	317	522-101-1053006 СпрСЦ 02.2024	Стойка волейбольная зальная со стаканами с механизмом натяжения троса (профиль круглый), регулировка от 2240мм до 2430мм	пара	2	490 371	980 742
241	318	522-101-1046001 СпрСЦ 02.2024	Сетка волейбольная, нить D±2 мм, стальной трос D±3 мм	шт.	2	3 393	6 786
242	320	521-302-0423001 СпрСЦ 02.2024	Часы шахматные механические ТСН-9905	шт.	12	19 173	230 076
243	322	522-101-1072002 СпрСЦ 02.2024	Шахматы 3в 1 (390мм х 390 мм)	шт.	12	10 089	121 068
244	323	522-101-1072004 СпрСЦ 02.2024	Шашки размерами 480 х 500 х 30 мм ТСН-214	шт.	12	5 858	70 296
245	324	522-101-1052001 СпрСЦ 02.2024	Стойка баскетбольная профессиональная передвижная складная с защитой	шт.	2	410 714	821 428
			Итого по подразделу: Методические пособия для спортзала старшей школы п. 3113, 2098, 2100, 2106, 2107, 2109, 2112, 2118-2126, 2128-2134, 2138-2145, 2147, 2148, 2155-2158 на 1 спортзал				**4 267 618**
			Подраздел: Кабинет НВП п. 3225, 3230-3240, 3242-3247, 3249, 3252 - на 1 класс				
246	325	СпрСЦ 02.2024	Демонстрационный набор стендов и плакатов для кабинета НВП	шт	1	121 494	121 494
247	327	521-301-3412 СпрСЦ 02.2024	Комплект индивидуальных дозиметров	шт.	1	67 795	67 795
248	328	521-301-3420 СпрСЦ 02.2024	Индивидуальный перевязочный пакет	шт.	13	2 473	32 149
249	329	СпрСЦ 02.2024	Индивидуальный противохимический пакет ИПП 1.	шт	3	1 735	5 207
250	330	521-301-3418 СпрСЦ 02.2024	Компас армейский	шт.	13	6 366	82 758
251	332	521-301-3415 СпрСЦ 02.2024	Малая пехотная лопата	шт.	13	3 634	47 242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
252	335	СпрСЦ 02.2024	Носилки санитарные МЧС - Н 8 ручек ткань.	шт	3	21 383	64 149
253	338	521-301-3407 СпрСЦ 02.2024	Противогаз общевойсковой фильтрующий	шт.	3	28 839	86 517
254	339	521-301-3409 СпрСЦ 02.2024	Респиратор	шт.	13	1 598	20 774
255	340	521-301-3422 СпрСЦ 02.2024	Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте	шт.	3	34 518	103 554
256	341	СпрСЦ 02.2024	Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации.	шт	3	155 511	466 535
257	342	СпрСЦ 02.2024	Флажки сигнальные в комплекте.	к-т	2	5 641	11 283
258	343	СпрСЦ 02.2024	Шина транспортная эластичная.	шт	5	6 856	34 281
			Итого по подразделу: Кабинет НВП п. 3225, 3230-3240, 3242-3247, 3249, 3252 - на 1 класс				**1 143 738**
			Подраздел: Кабинет инклюзивной поддержки п. 566-586, 590, 593, 594				
259	345	521-103-0210001 СпрСЦ 02.2024	Ламинатор А4 "Lunar +" размерами 2х125 мкм. 30 см/мин. серый/синий (FELLOWES)	шт.	1	36 750	36 750
260	347	521-402-0124001 СпрСЦ 02.2024	Детский каркасный пружинный батут "Прыжок" Размер: 120х120х29 см	шт.	1	264 134	264 134
261	350	СпрСЦ 02.2024	Кресло-мешок.	шт	5	23 715	118 578
262	351	522-101-1063002 СпрСЦ 02.2024	Гимнастические маты 200см х 100см х 10см	шт.	4	22 411	89 644
263	353	СпрСЦ 02.2024	Мягкое напольное покрытие.	кв.м.	6	26 242	157 456
264	355	СпрСЦ 02.2024	Инстр. для изучения явлений природы (визуальный календарь).	шт.	4	6 998	27 992
265	356	СпрСЦ 02.2024	Счетчик событий на палец.	шт.	15	2 429	36 449
266	357	СпрСЦ 02.2024	Таймер.	шт.	15	10 934	164 016
267	358	521-201-0502027 СпрСЦ 02.2024	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	4	18 321	73 284
268	359	СпрСЦ 02.2024	Бубен.	шт.	4	1 846	7 387
269	360	СпрСЦ 02.2024	Бубенцы на палке.	шт.	4	937	3 748

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
270	363	СпрСЦ 02.2024	Доска для рисования маркером двусторонняя.	шт.	2	29 158	58 317
271	364	СпрСЦ 02.2024	Игрушка-сортер.	шт.	2	4 957	9 914
272	365	СпрСЦ 02.2024	Игра развивающая с прищепками.	шт.	2	6 415	12 830
273	366	СпрСЦ 02.2024	Мяч резиновый детский.	шт.	4	2 429	9 719
274	367	СпрСЦ 02.2024	Мяч мягкий из полиэстера.	шт.	4	5 151	20 605
			Итого по подразделу: Кабинет инклюзивной поддержки п. 566-586, 590, 593, 594				**1 090 823**
			Подраздел: Дизайн и технология п. 1981-2013, 2015, 2021, 2024, 2027				
275	373	521-301-3112001 СпрСЦ 02.2024	Машина вышивальная JANOME Memory Craft 550E, количество вышивальных дизайнов - 180, потребляемая мощность 55 Вт, максимальная скорость шитья 860 ст/мин	шт.	1	836 598	836 598
276	378	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	набор.	1	5 207	5 207
277	380	СпрСЦ 02.2024	Зеркало в багетной раме.	шт	1	30 373	30 373
278	383	СпрСЦ 02.2024	Таблица Правила техники безопасности при обработке текстильных материалов	шт	1	8 957	8 957
			Итого по подразделу: Дизайн и технология п. 1981-2013, 2015, 2021, 2024, 2027				**881 135**
			Подраздел: Кабинет физики п. 1131-1139, 1142-1211, 1213, 1215, 1217, 1220, 2406, 2437 - на 1 класс				
279	393	522-101-0801001 СпрСЦ 02.2024	Барометр-анероид. Диапазон: 720-780мм.рт.ст., 96000-104000Па, цена деления 1мм.рт.ст., 100Па	шт.	1	47 448	47 448
280	394	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	1	8 732	8 732
281	395	521-301-0545001 СпрСЦ 02.2024	Вольтметр лабораторный 0 до 15В	шт.	1	7 041	7 041
282	396	521-301-0516 СпрСЦ 02.2024	Генератор Вимшурста	шт.	1	36 862	36 862
283	397	521-301-0506 СпрСЦ 02.2024	Гигрометр 0-25 градусов	шт.	1	11 607	11 607
284	398	521-301-0508001 СпрСЦ 02.2024	Динамометр демонстрационный	шт.	1	49 731	49 731
285	399	521-301-0509 СпрСЦ 02.2024	Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект)	шт.	13	2 879	37 427

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
286	400	СпрСЦ 02.2024	Источник питания переменного и постоянного тока.	шт	13	113 323	1 473 203
287	401	521-301-0510 СпрСЦ 02.2024	Камертоны на резонансных ящиках (пара)	шт.	1	17 948	17 948
288	402	521-301-0575002 СпрСЦ 02.2024	Катушка Томсона	шт.	1	11 600	11 600
289	403	СпрСЦ 02.2024	Комплект блоков демонстрационных (при отсутствии в наборе Механика).	к-т	1	2 236	2 236
290	404	СпрСЦ 02.2024	Магазин сопротивлений демонстрационный.	шт	1	7 381	7 381
291	405	521-301-0513 СпрСЦ 02.2024	Магнит демонстрационный U-образный	шт.	1	9 875	9 875
292	406	521-301-0514 СпрСЦ 02.2024	Магнит демонстрационный полосовой	шт.	1	6 482	6 482
293	407	521-301-0515002 СпрСЦ 02.2024	Манометр жидкостной демонстрационный	шт.	1	3 625	3 625
294	408	СпрСЦ 02.2024	Электростатический маятник.	шт	1	5 904	5 904
295	409	521-301-0564001 СпрСЦ 02.2024	Микроамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	7 206	7 206
296	410	521-301-0565001 СпрСЦ 02.2024	Миллиамперметр для измерения переменного тока	шт.	1	6 846	6 846
297	411	СпрСЦ 02.2024	Модель кристаллической решетки.	шт	1	31 588	31 588
298	412	СпрСЦ 02.2024	Набор демонстрационный для изучения атмосферного давления	шт	1	142 876	142 876
299	413	СпрСЦ 02.2024	Набор демонстрационный для изучения механики	шт	1	238 127	238 127
300	414	СпрСЦ 02.2024	Набор демонстрационный для изучения оптики.	шт	1	145 792	145 792
301	415	521-301-0521002 СпрСЦ 02.2024	Набор из 5 шаров маятников со штативом	набор	1	10 370	10 370
302	416	СпрСЦ 02.2024	Набор инструментов для кабинета физики.	набор	1	18 860	18 860
303	417	СпрСЦ 02.2024	Набор капилляров.	набор	1	4 617	4 617

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
304	418	СпрСЦ 02.2024	Набор лабораторной посуды и принадлежностей для кабинета физики.	набор	1	85 435	85 435
305	420	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	набор	1	5 207	5 207
306	421	522-101-0812001 СпрСЦ 02.2024	Насос воздушный ручной	шт.	1	5 156	5 156
307	422	522-101-0814001 СпрСЦ 02.2024	Пистолет баллистический	шт.	1	23 193	23 193
308	423	521-301-2959 СпрСЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	1	18 098	18 098
309	424	СпрСЦ 02.2024	Плитка электрическая лабораторная.	шт	1	13 853	13 853
310	425	СпрСЦ 02.2024	Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала.	шт	1	7 381	7 381
311	426	521-301-0515001 СпрСЦ 02.2024	Прибор с манометром для исследования газовых законов типа Experia PHE-014	набор	1	26 805	26 805
312	427	521-301-0532001 СпрСЦ 02.2024	Реостат ползунковый	шт.	1	4 690	4 690
313	428	СпрСЦ 02.2024	Сосуды сообщающиеся.	набор	1	2 953	2 953
314	429	СпрСЦ 02.2024	Шар Паскаля.	шт	1	8 266	8 266
315	430	СпрСЦ 02.2024	Шар с кольцом.	набор	1	5 904	5 904
316	431	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	1	25 744	25 744
317	432	521-301-0544002 СпрСЦ 02.2024	Амперметр аналоговый лабораторный. Диапазон измерения: 0.6 А и 3 А	шт.	13	3 508	45 604
318	433	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	13	8 732	113 516
319	434	521-301-0545002 СпрСЦ 02.2024	Вольтметр аналоговый лабораторный. Диапазон измерения: 3 В и 15 В	шт.	13	3 508	45 604
320	435	521-301-0546001 СпрСЦ 02.2024	Выключатель однополюсный двунаправленный	шт.	13	585	7 605

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
321	436	521-301-0547 СпрСЦ 02.2024	Динамометр лабораторный 2,5 ньютон	шт.	13	1 857	24 141
322	437	СпрСЦ 02.2024	Железный порошок в капсулах.	шт	13	6 560	85 289
323	438	521-301-0571001 СпрСЦ 02.2024	Желоб Галилея	шт.	13	6 434	83 642
324	439	521-301-0573001 СпрСЦ 02.2024	Калориметр. Вместимость внутреннего сосуда не менее 250 мл	шт.	13	4 677	60 801
325	440	СпрСЦ 02.2024	Катушка первичной обмотки лабораторная.	шт	13	10 535	136 967
326	441	521-301-0550001 СпрСЦ 02.2024	Комплект блоков лабораторных	комплект	13	2 518	32 734
327	442	521-301-0551 СпрСЦ 02.2024	Комплект соединительных проводов	комплект	13	2 473	32 149
328	443	521-301-0552 СпрСЦ 02.2024	Держатель миниатюрный ламповый	шт.	13	630	8 190
329	444	521-301-0553 СпрСЦ 02.2024	Линза на подставке	шт.	13	1 079	14 027
330	445	521-301-0554 СпрСЦ 02.2024	Магнит дугообразный	шт.	13	1 799	23 387
331	446	521-301-0555 СпрСЦ 02.2024	Магнит полосовой	шт.	13	1 799	23 387
332	447	СпрСЦ 02.2024	Маятник математический	шт	13	13 412	174 367
333	448	521-301-0556001 СпрСЦ 02.2024	Модель электродвигателя (разборная) лабораторная	шт.	13	6 709	87 217
334	449	521-301-0557001 СпрСЦ 02.2024	Набор грузов по механике (10х100гр)	набор	13	9 389	122 057
335	450	СпрСЦ 02.2024	Набор дифракционных решеток.	шт	13	11 663	151 624
336	451	521-301-0558 СпрСЦ 02.2024	Набор калориметрических тел	набор	13	4 677	60 801
337	452	СпрСЦ 02.2024	Набор по электролизу лабораторный.	шт	13	19 438	252 706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
338	453	521-301-0501 СпрСЦ 02.2024	Набор пружин с различной жесткостью	набор	16	3 403	54 448
339	454	СпрСЦ 02.2024	Набор тел равного объема и равной массы	шт	13	7 645	99 389
340	455	СпрСЦ 02.2024	Плата для сборки электрических цепей.	шт	13	33 269	432 507
341	456	СпрСЦ 02.2024	Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток	шт	13	46 946	610 299
342	457	СпрСЦ 02.2024	Лабораторная электроплита.	шт	13	13 853	180 091
343	458	521-301-0532001 СпрСЦ 02.2024	Реостат ползунковый	шт.	1	4 690	4 690
344	459	521-301-0572 СпрСЦ 02.2024	Рычаг-линейка	шт.	13	1 799	23 387
345	460	522-101-0804 СпрСЦ 02.2024	Стрелки магнитные на штативах	комплект	13	720	9 360
346	461	521-301-0561001 СпрСЦ 02.2024	Трибометр лабораторный	шт.	13	4 677	60 801
347	462	522-101-0808001 СпрСЦ 02.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	13	11 385	148 005
348	463	521-301-0574 СпрСЦ 02.2024	Электромагнит разборный с деталями	шт.	13	5 134	66 742
349	464	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе.	к-т	1	69 008	69 008
350	465	СпрСЦ 02.2024	Карта звездного неба подвижная.	шт	13	3 887	50 541
351	468	СпрСЦ 02.2024	Набор по электролизу лабораторный.	шт	13	19 438	252 706
			Итого по подразделу: Кабинет физики п. 1131-1139, 1142-1211, 1213, 1215, 1217, 1220, 2406, 2437 - на 1 класс				**6 223 858**
			Подраздел: Кабинет музыки п. 2195, 2197, 2198, 2200, 2201, 2209 - на 1 класс				
352	469	521-201-0501 СпрСЦ 02.2024	Пианино	шт.	1	1 338 393	1 338 393
353	470	СпрСЦ 02.2024	Баян Тульский.	шт	1	677 934	677 934
354	471	521-105-0501 СпрСЦ 02.2024	Домбыра	шт.	25	40 179	1 004 475

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
355	473	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе	к-т	1	69 008	69 008
			Итого по подразделу: Кабинет музыки п. 2195, 2197, 2198, 2200, 2201, 2209 - на 1 класс				**3 089 810**
			Подраздел: Кабинет логопеда п. 537, 542-548, 550-554				
356	476	СпрСЦ 02.2024	Зеркало настенное для групповых логопедических занятий.	шт	1	14 579	14 579
357	477	522-201-0202001 СпрСЦ 02.2024	Зеркало для индивидуальных логопедических занятий. Складное, переносное, из оргстекла в футляре типа Инт парк 27513	шт.	4	58 768	235 072
358	478	521-402-0205001 СпрСЦ 02.2024	Зонды постановочные, комплект из 7 штук (по методике Ф.А.Рау)	комплект	2	32 042	64 084
359	479	521-402-0206001 СпрСЦ 02.2024	Зонды массажные, комплект из 12 штук	комплект	1	38 971	38 971
360	480	СпрСЦ 02.2024	Логопедический зонд вспомогательный.	к-т	2	6 561	13 122
361	482	522-201-0203004 СпрСЦ 02.2024	Тренажер для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи типа Инт парк 27514	шт.	1	264 891	264 891
362	483	СпрСЦ 02.2024	Тренажер для развития слухового восприятия и формирования коммуникативно-речевых навыков.	шт	1	536 098	536 098
363	484	522-201-0204002 СпрСЦ 02.2024	GoTalk 9+ настольное речевое устройство с 9 окнами для изображений, имеет 5 уровней записи	шт.	1	155 882	155 882
364	486	СпрСЦ 02.2024	Демонстрационный набор для логопеда.	шт	1	18 995	18 995
			Итого по подразделу: Кабинет логопеда п. 537, 542-548, 550-554				**1 341 694**
			Подраздел: Кабинет психолога п. 490, 494, 502, 503, 506-508				
365	487	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм	шт.	2	25 207	50 414
366	488	СпрСЦ 02.2024	Набор развивающих игрушек для детей с особенными образовательными потребностями	набор	1	63 177	63 177
367	490	СпрСЦ 02.2024	Светильник-релаксант разноцветный настольный.	шт	2	13 607	27 215
			Итого по подразделу: Кабинет психолога п. 490, 494, 502, 503, 506-508				**140 806**
			Подраздел: Культура питания п. 1914-1951, 1958, 1961				
368	495	СпрСЦ 02.2024	Таблица Правила техники безопасности в мастерской "Культура питания".	шт	1	8 817	8 817
			Итого по подразделу: Культура питания п. 1914-1951, 1958, 1961				**8 817**
			Подраздел: Культура дома п. 1807-1814, 1820, 1821, 1827-1831, 1834-1840, 1842-1859, 1861-1867, 1869-1885, 1892-1899				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
369	496	СпрСЦ 02.2024	Гравер электрический с набором мини-насадок.	шт	1	23 463	23 463
370	497	СпрСЦ 02.2024	Дрель электрическая.	шт	1	13 112	13 112
371	498	521-301-2911 СпрСЦ 02.2024	Дрель-шуруповерт аккумуляторная	шт.	1	39 259	39 259
372	499	521-301-2910 СпрСЦ 02.2024	Лобзик электрический	шт.	1	27 929	27 929
373	500	521-301-2969001 СпрСЦ 02.2024	Пила торцовочная электрическая типа Umachine 447591. Мощность 1,4 Квт, диаметр 30 мм, макс. глубина пропила под углом 90° 70мм	шт.	1	322 947	322 947
374	501	СпрСЦ 02.2024	Пила циркулярная мини.	шт	1	38 878	38 878
375	502	СпрСЦ 02.2024	Реноватор.	шт	1	39 240	39 240
376	503	СпрСЦ 02.2024	Рубанок электрический.	шт	1	52 291	52 291
377	504	521-301-2968001 СпрСЦ 02.2024	Станок гравировальный лазерный в комплекте с чиллером и стабилизатором типа LaserPro 958452	шт.	1	1 167 947	1 167 947
378	505	521-301-2907002 СпрСЦ 02.2024	Станок деревообрабатывающий комбинированный типа WoodMaster Combo 145182	шт.	1	579 815	579 815
379	506	521-301-2903 СпрСЦ 02.2024	Станок сверлильный по металлу	шт.	1	244 606	244 606
380	507	521-301-2905002 СпрСЦ 02.2024	Станок токарный по металлу типа MetalCraft Pro 591488	шт.	1	1 018 012	1 018 012
381	508	521-301-2912 СпрСЦ 02.2024	Машина угловая шлифовальная	шт.	1	35 679	35 679
382	509	521-301-2909 СпрСЦ 02.2024	Электроточило с подставкой	шт.	1	80 330	80 330
383	510	521-301-2966001 СпрСЦ 02.2024	Пылесос индустриальный UniVac Pro	шт.	1	153 106	153 106
384	511	СпрСЦ 02.2024	Краскопульт.	шт	1	14 579	14 579
385	512	521-301-2959 СпрСЦ 02.2024	Мультиметр цифровой	шт.	6	18 098	108 588

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
386	513	521-301-2914 СпрСЦ 02.2024	Прибор для выжигания	шт.	12	26 813	321 756
387	514	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	набор	1	5 207	5 207
388	515	СпрСЦ 02.2024	Аппарат для сварки пластиковых труб.	шт	1	13 043	13 043
389	516	СпрСЦ 02.2024	Долото-стамеска 8 миллиметр.	шт	6	1 903	11 419
390	517	СпрСЦ 02.2024	Долото-стамеска 16 миллиметр.	шт	6	2 536	15 221
391	518	СпрСЦ 02.2024	Зажим ручной.	шт	6	2 663	15 979
392	519	СпрСЦ 02.2024	Зубило.	шт	6	1 652	9 914
393	520	СпрСЦ 02.2024	Заклепочник.	шт	6	3 110	18 661
394	521	СпрСЦ 02.2024	Заклепки 3,2 х 8 миллиметр, 50 штук.	набор	12	3 110	37 323
395	522	СпрСЦ 02.2024	Кернер.	шт	6	874	5 249
396	523	СпрСЦ 02.2024	Киянка резиновая.	шт	6	2 536	15 221
397	524	СпрСЦ 02.2024	Клещи.	шт	6	4 859	29 158
398	525	СпрСЦ 02.2024	Ключ трубный рычажный.	шт	3	5 827	17 481
399	527	СпрСЦ 02.2024	Лента измерительная 1 метр.	шт	12	971	11 663
400	528	СпрСЦ 02.2024	Линейка металлическая 30 сантиметр.	шт	12	777	9 331
401	530	СпрСЦ 02.2024	Молоток слесарный 200 грамм.	шт	12	2 235	26 826
402	531	СпрСЦ 02.2024	Молоток слесарный 400 грамм.	шт	3	2 235	6 707
403	532	СпрСЦ 02.2024	Набор ключей рожковых 6-24 миллиметр 8 штук.	набор	1	8 121	8 121
404	533	СпрСЦ 02.2024	Набор метчиков и плашек М3-М10.	набор	3	18 467	55 401
405	534	СпрСЦ 02.2024	Набор надфилей алмазных 10 штук.	набор	6	3 887	23 327
406	535	СпрСЦ 02.2024	Пинцет.	шт	3	972	2 916

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
407	536	СпрСЦ 02.2024	Напильник квадратный.	шт	12	1 977	23 724
408	537	СпрСЦ 02.2024	Напильник круглый.	шт	12	1 755	21 064
409	538	СпрСЦ 02.2024	Напильник плоский.	шт	12	1 977	23 724
410	539	СпрСЦ 02.2024	Напильник трехгранный.	шт	12	1 977	23 724
411	540	СпрСЦ 02.2024	Ножницы по металлу 250 миллиметр.	шт	6	3 401	20 411
412	541	СпрСЦ 02.2024	Ножовка по дереву 400 миллиметр.	шт	12	2 235	26 826
413	542	СпрСЦ 02.2024	Ножовка по металлу 300 миллиметр.	шт	12	2 429	29 158
414	543	СпрСЦ 02.2024	Отвертка крестообразная.	шт	12	865	10 380
415	544	СпрСЦ 02.2024	Отвертка плоская.	шт	12	865	10 380
416	545	СпрСЦ 02.2024	Отвертки в наборе для точечных работ.	набор	2	3 888	7 776
417	546	СпрСЦ 02.2024	Плоскогубцы.	шт	12	1 943	23 327
418	547	СпрСЦ 02.2024	Рубанок одинарник металлический.	шт	6	4 859	29 158
419	548	СпрСЦ 02.2024	Рулетка 5 метров.	шт	1	1 409	1 409
420	549	СпрСЦ 02.2024	Стусло пластиковое с пилой.	шт	4	4 082	16 329
421	550	СпрСЦ 02.2024	Тиски слесарные поворотные 125 миллиметр.	шт	6	17 981	107 886
422	551	СпрСЦ 02.2024	Тиски трубные 10-89 миллиметр.	шт	1	6 814	6 814
423	552	СпрСЦ 02.2024	Тонкогубцы 160 миллиметр.	шт	12	2 766	33 194
424	553	СпрСЦ 02.2024	Трос для прочистки труб.	шт	1	3 720	3 720
425	554	СпрСЦ 02.2024	Трубогиб для труб из металлопластики и мягких металлов.	шт	1	2 420	2 420
426	555	СпрСЦ 02.2024	Труборез для металлопластиковых труб.	шт	1	2 420	2 420
427	556	СпрСЦ 02.2024	Угольник 300 миллиметр металлический.	шт	6	942	5 656

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
428	557	521-301-2954 СпрСЦ 02.2024	Штангенциркуль	шт.	6	5 140	30 840
429	559	СпрСЦ 02.2024	Ящик для хранения инструментов.	шт	12	5 734	68 814
430	563	СпрСЦ 02.2024	Таблица Правила техники безопасности при обработке древесины и металла.	шт	1	8 123	8 123
431	564	СпрСЦ 02.2024	Фен технический.	шт	1	14 579	14 579
			Итого по подразделу: Культура дома п. 1807-1814, 1820, 1821, 1827-1831, 1834-1840, 1842-1859, 1861-1867, 1869-1885, 1892-1899				**5 171 561**
			Подраздел: Кабинет биологии/нанотехнологии п. 1494, 1607-1616, 1618-1626, 1628, 1630-1638, 1640-1646, 1648, 1651, 1658 - на 1 класс				
432	575	СпрСЦ 02.2024	Набор микропрепаратов по анатомии.	набор	13	38 877	505 413
433	576	СпрСЦ 02.2024	Набор микропрепаратов по ботанике.	набор	13	34 018	442 236
434	577	СпрСЦ 02.2024	Набор микропрепаратов по зоологии.	набор	13	34 018	442 236
435	578	СпрСЦ 02.2024	Набор микропрепаратов по общей биологии.	набор	13	34 018	442 236
436	579	СпрСЦ 02.2024	Набор для приготовления микропрепаратов на класс	набор	1	194 390	194 390
437	580	521-301-1550001 СпрСЦ 02.2024	Лупа ручная d.60 мм	шт.	25	402	10 050
438	581	521-301-1552001 СпрСЦ 02.2024	Микроскоп ученический 640х	шт.	13	49 524	643 812
439	582	521-301-1711 СпрСЦ 02.2024	Микроскоп цифровой портативный USB	шт.	1	56 786	56 786
440	583	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	13	8 732	113 516
441	584	521-301-2111001 СпрСЦ 02.2024	Аппарат для дистилляции воды	шт.	13	76 000	988 000
442	585	СпрСЦ 02.2024	Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов и лабораторных работ.	набор	1	85 435	85 435
443	586	521-301-2123 СпрСЦ 02.2024	Плитка электрическая лабораторная	шт.	1	14 253	14 253
444	587	522-101-0808001 СпрСЦ 02.2024	Штатив лабораторный комбинированный	шт.	13	11 385	148 005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
445	588	СпрСЦ 02.2024	Торс человека 85 сантиметр.	шт	1	58 317	58 317
446	589	СпрСЦ 02.2024	Модель глаза увеличенная.	шт	1	11 282	11 282
447	590	СпрСЦ 02.2024	Модель сердца демонстрационная.	шт	1	9 331	9 331
448	591	СпрСЦ 02.2024	Модель почки в разрезе.	шт	1	5 511	5 511
449	592	СпрСЦ 02.2024	Модель лёгких с альвеолой.	шт	1	21 868	21 868
450	593	СпрСЦ 02.2024	Модель спинного мозга.	шт	1	16 237	16 237
451	594	СпрСЦ 02.2024	Модель уха.	шт	1	16 523	16 523
452	595	521-301-1549 СпрСЦ 02.2024	Скелет человека 170 см на роликовой подставке	шт.	1	160 089	160 089
453	596	СпрСЦ 02.2024	Модель продольного сечения корня.	шт	1	11 080	11 080
454	597	СпрСЦ 02.2024	Модель структуры ДНК	шт	1	16 495	16 495
455	598	СпрСЦ 02.2024	Модель строения листа.	шт	1	12 600	12 600
456	599	СпрСЦ 02.2024	Модель цветка универсальная.	шт	1	8 553	8 553
457	600	СпрСЦ 02.2024	Комплект гербариев по биологии	к-т	1	27 215	27 215
458	601	СпрСЦ 02.2024	Комплект коллекций по биологии	к-т	1	194 390	194 390
459	602	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе.	к-т	1	69 008	69 008
460	604	СпрСЦ 02.2024	Комплект средств для индивидуальной защиты.	шт	1	272 145	272 145
			Итого по подразделу: Кабинет биологии/нанотехнологии п. 1494, 1607-1616, 1618-1626, 1628, 1630-1638, 1640-1646, 1648, 1651, 1658 - на 1 класс				**4 997 012**
			Подраздел: Кабинет химии п. 1681-1687, 1690, 1691, 1693-1716, 1718, 1721, 1728 - на 1 класс				
461	611	522-101-0806 СпрСЦ 02.2024	Баня комбинированная	шт.	5	48 179	240 895
462	612	521-301-0503001 СпрСЦ 02.2024	Весы электронные до 200гр (0,1г)	шт.	13	8 732	113 516
463	613	521-301-2111002 СпрСЦ 02.2024	Дистиллятор воды типа ScienceCube, MDS-102. Производительность: 1 л/ч. Водосборник: пластик, объём 3,6 л. Ёмкость: нержавеющая сталь. Потребляемая мощность: 750 Вт	шт.	1	82 028	82 028

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
464	614	521-301-2104 СпрСЦ 02.2024	Колбонагреватель	шт.	5	92 089	460 445
465	615	521-301-2105 СпрСЦ 02.2024	Набор ареометров (19 шт)	комплект	1	60 179	60 179
466	617	521-301-2101001 СпрСЦ 02.2024	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ	набор	1	29 189	29 189
467	618	521-301-2107 СпрСЦ 02.2024	Прибор для сбора газов	шт.	13	4 346	56 498
468	619	522-101-0808002 СпрСЦ 02.2024	Штатив физический универсальный	шт.	1	25 744	25 744
469	620	521-301-2109 СпрСЦ 02.2024	Штатив лабораторный химический	шт.	13	11 732	152 516
470	621	СпрСЦ 02.2024	Набор моделей демонстрационных кристаллических решеток.	набор	1	51 513	51 513
471	622	521-301-1922 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей масштабных молекул	комплект	1	23 214	23 214
472	623	521-301-1923001 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащегося	набор	14	24 038	336 532
473	624	521-301-1925001 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей образования p и s связей	набор	1	66 907	66 907
474	625	521-301-1926001 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей p и d облаков и шаростержневых молекул	набор	1	45 576	45 576
475	626	521-301-1927001 СпрСЦ 02.2024	Набор моделей электронных облаков и химических связей	набор	1	60 315	60 315
476	627	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».	набор	3	7 775	23 327
477	628	521-301-2004001 СпрСЦ 02.2024	Набор "Металлы", малый	комплект	3	38 946	116 838
478	629	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Минералы и горные породы».	набор	1	18 980	18 980
479	630	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Нефть и продукты ее переработки».	набор	3	10 691	32 074
480	631	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Сырье для топливной промышленности».	набор	3	9 979	29 937

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
481	632	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Сырье для химической промышленности».	набор	3	9 855	29 566
482	633	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Топливо».	набор	3	9 855	29 566
483	634	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Чугун и сталь».	набор	3	9 979	29 937
484	635	СпрСЦ 02.2024	Коллекция «Шкала твердости».	набор	3	9 979	29 937
485	637	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе.	к-т	1	69 008	69 008
486	638	СпрСЦ 02.2024	Комплект средств для индивидуальной защиты.	шт	1	272 145	272 145
			Итого по подразделу: Кабинет химии п. 1681-1687, 1690, 1691, 1693-1716, 1718, 1721, 1728 - на 1 класс				**2 486 382**
			Подраздел: Инструкторская п. 822, 823-825, 828-830, 838, 839 - на 2 кабинета				
487	641	522-101-1033001 СпрСЦ 02.2024	Рулетка измерительная 50 м	шт.	2	16 614	33 228
488	642	522-101-1008001 СпрСЦ 02.2024	Свисток металический	шт.	30	536	16 080
489	643	522-101-1059001 СпрСЦ 02.2024	Секундомер цифровой TSE-930	шт.	20	26 203	524 060
490	644	522-101-1030001 СпрСЦ 02.2024	Табло пластиковое перекидное TSC-2055	шт.	6	13 531	81 186
491	646	522-101-1036001 СпрСЦ 02.2024	Корзина для мячей переносная. Размеры: 900x800x600мм	шт.	8	35 099	280 792
			Итого по подразделу: Инструкторская п. 822, 823-825, 828-830, 838, 839 - на 2 кабинета				**935 346**
			Подраздел: Визуальное искусство п. 1746, 1753, 1754, 1759, 1761, 1765, 1769, 1770, 1778, 1779, 2977, 2979, 2985, 2988, 2990, 2991, 2993, 2995, 2997-3003, 3004				
492	648	СпрСЦ 02.2024	Комплект настенных стендов на пластиковой основе.	к-т	1	69 008	69 008
493	649	522-101-0316001 СпрСЦ 02.2024	Мольберт низкий складной 600x1000	шт.	12	14 550	174 600
494	650	521-301-2704 СпрСЦ 02.2024	Мольберт в комплекте с доской и чехлом	шт.	25	4 938	123 450
495	651	СпрСЦ 02.2024	Стол для натюрмортов складной	шт	3	21 261	63 784
496	652	СпрСЦ 02.2024	Стойка для экспозиций.	шт	5	24 992	124 963

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
497	653	СпрСЦ 02.2024	Холст для рисования на подрамнике.	шт	15	1 263	18 953
498	654	СпрСЦ 02.2024	Гербарий.	шт	1	10 934	10 934
499	655	СпрСЦ 02.2024	Набор муляжей фруктов и овощей не менее 20 штук.	шт	1	15 815	15 815
500	656	СпрСЦ 02.2024	Ящик этюдный	шт	4	21 723	86 892
501	658	521-301-1802 СпрСЦ 02.2024	Тележка пластиковая с 4 лотками	шт.	4	145 982	583 928
502	659	522-101-1233004 СпрСЦ 02.2024	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм/800х450х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	2	79 671	159 342
503	661	СпрСЦ 02.2024	Ноутбук Acer TMP216-51 16WUXGA IPS / i5 1335U / 8Gb DDR4 3200/512Gb SSD, Microsoft office, Windows 11, Гарнитура,Проводная мышь, коврик.	шт	26	388 779	10 108 259
504	662	521-101-0410025 СпрСЦ 02.2024	Тележка Acer Charging Car для хранения и зарядки до 32 ноутбуков	шт.	1	875 914	875 914
505	663	СпрСЦ 02.2024	Готовальня большая.	шт	1	10 400	10 400
506	664	СпрСЦ 02.2024	Ящик для чертежных работ	шт	10	14 579	145 792
507	665	СпрСЦ 02.2024	Светодиодная осветительная панель со стойкой.	к-т	4	21 868	87 475
508	666	СпрСЦ 02.2024	Коробка для хранения наглядных пособий крышкой	шт	8	2 429	19 439
509	667	СпрСЦ 02.2024	Набор чертежных инструментов для классной доски из 5 предметов.	набор	1	5 207	5 207
510	668	СпрСЦ 02.2024	Демонстрационные наборы для развития пространственного мышления	набор	4	43 737	174 951
511	669	521-301-2954 СпрСЦ 02.2024	Штангенциркуль	шт.	25	5 140	128 500
			Итого по подразделу: Визуальное искусство п. 1746, 1753, 1754, 1759, 1761, 1765, 1769, 1770, 1778, 1779, 2977, 2979, 2985, 2988, 2990, 2991, 2993, 2995, 2997-3003, 3004				**12 987 606**
			Подраздел: Актовый зал п.446-455				
512	670	СпрСЦ 02.2024	Асатаяк.	шт	2	9 372	18 745
513	672	521-107-0201 СпрСЦ 02.2024	Аккордеон	шт.	1	697 500	697 500
514	673	521-105-0502 СпрСЦ 02.2024	Дауылпаз	шт.	2	71 429	142 858

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
515	674	521-105-0501 СпрСЦ 02.2024	Домбыра	шт.	25	40 179	1 004 475
516	675	СпрСЦ 02.2024	Кастаньеты деревянные.пара.		2	2 041	4 082
517	676	СпрСЦ 02.2024	Колокольчики в наборе 8 штук.пара.		2	12 635	25 271
518	677	СпрСЦ 02.2024	Ксилофон.	шт	2	20 702	41 405
519	678	521-201-0502027 СпрСЦ 02.2024	Пластмассовые маракасы LP389 LP Fiber Maracas	шт.	2	18 321	36 642
520	679	521-105-0505 СпрСЦ 02.2024	Сазсырнай	шт.	1	35 714	35 714
521	680	521-105-0515 СпрСЦ 02.2024	Тай-туяк деревянный	шт.	2	12 500	25 000
522	681	СпрСЦ 02.2024	Шанкобыз.	шт	2	18 467	36 934
			Итого по подразделу: Актовый зал п.446-455				**2 068 626**
			Подраздел: Сенсорная комната п.474-480, 484, 485				
523	683	СпрСЦ 02.2024	Тактильные панели.	шт	2	24 298	48 597
524	684	СпрСЦ 02.2024	Фиброоптический ковер.	шт	1	317 147	317 147
525	685	СпрСЦ 02.2024	Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка с пультом управления.	шт	1	291 584	291 584
526	686	СпрСЦ 02.2024	Мягкая платформа к интерактивной воздушно-пузырьковой трубке.	шт	1	89 419	89 419
527	687	СпрСЦ 02.2024	Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковой трубки.	к-т	1	191 474	191 474
528	688	СпрСЦ 02.2024	Фиброоптический туннель.	шт	1	291 584	291 584
529	692	522-101-1262003 СпрСЦ 02.2024	Пуф мягкий круглый, размеры: диаметр 450мм, высота 450мм	шт.	2	25 207	50 414
530	693	СпрСЦ 02.2024	Фиброоптические волокна с источником света.	к-т	1	146 687	146 687
			Итого по подразделу: Сенсорная комната п.474-480, 484, 485				**1 426 906**
			Подраздел: Кабинет социального педагога п.517, 520, 522, 525, 528, 529, 530				
531	694	СпрСЦ 02.2024	Флипчарт - магнитно-маркерная доска с креплением для листа или блока бумаги. Размер не менее 1000х700 мм. В комплекте: ватман/блокнот.	шт	1	29 158	29 158

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
532	696	СпрСЦ 02.2024	Информационный стенд.	шт	1	38 878	38 878
533	697	СпрСЦ 02.2024	Светильник с приглушенным светом.	шт	1	7 498	7 498
			Итого по подразделу: Кабинет социального педагога п.517, 520, 522, 525, 528, 529, 530				**75 534**
			Итого по разделу: Методические пособия по приказу №265				**181 181 917**
			Итого по локальной смете: Технологическое оборудование. Методические пособия				**181 181 917**
			ИТОГО по акту:				**181 181 917**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	0.000 x 6.20%	0
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	181181917.000 + 0.000	181 181 917
	Сметная прибыль, 5.00%	0.000 x 5.00%	0
	Непредвиденные расходы, 5.000%	181181917.000 x 5.000%	9 059 095
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		190 241 012
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 4 квартал, к = 1.0750	190241012.850 x 1.0750	204 509 088
	НДС (12%)	204509088.814 x 12%	24 541 090
	Итого с НДС	204509088.814 + 24541090.658	229 050 179

Лист согласования
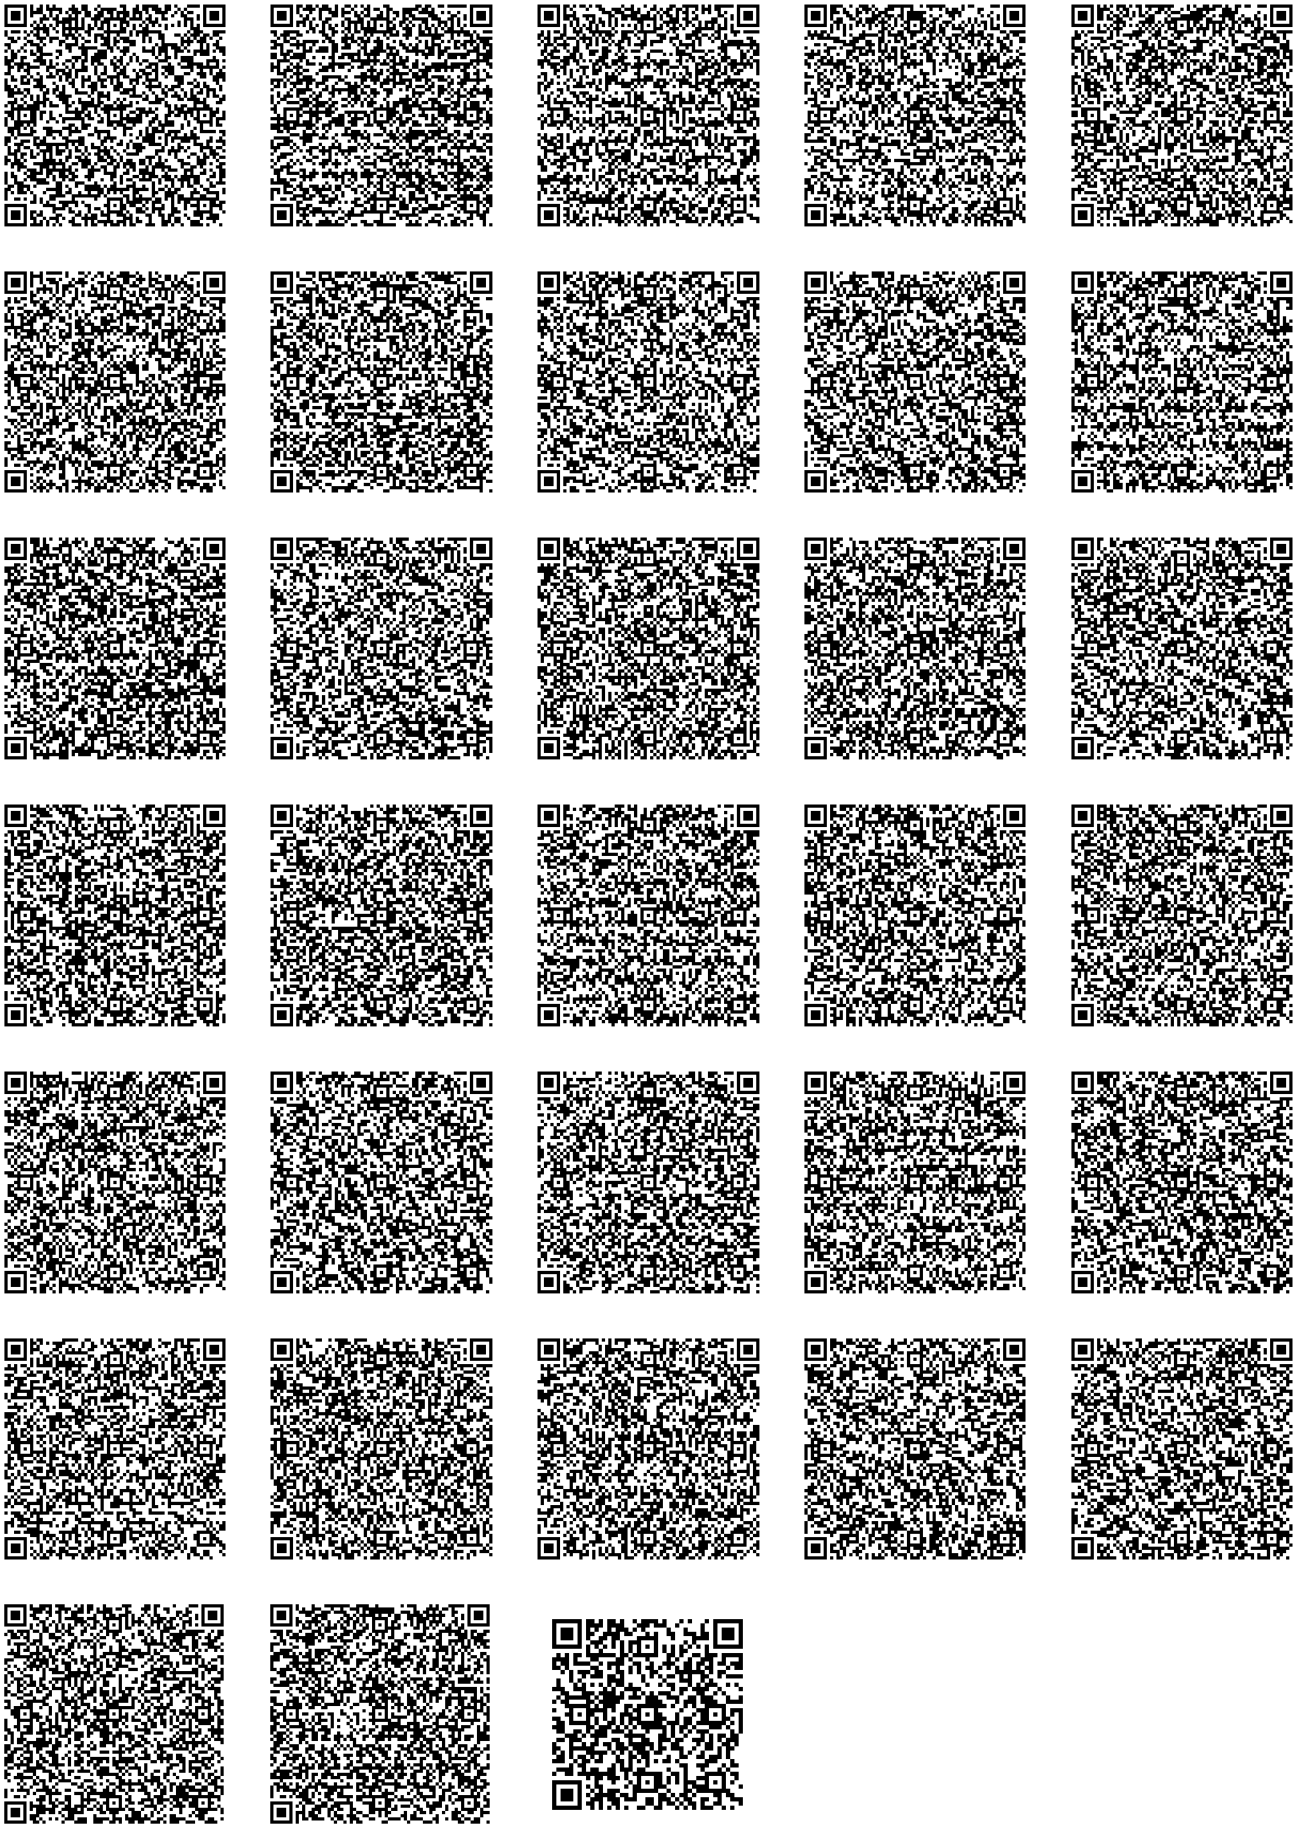
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	25.01.2025 09:05
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	27.01.2025 04:28
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	25.01.2025 13:52
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	27.01.2025 07:35
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Директор Регионального подразделения по Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям	28.01.2025 11:27
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	27.01.2025 07:29 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	27.01.2025 07:17
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	28.01.2025 09:27 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
