ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-060440002060-20250220-20383073	1.1.	**Номер учетной системы** 00000000020
2.	**Дата выписки** 20.02.2025 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота** 20.02.2025
4.	Исправленный [v] 4.1 Дата выписки 20.02.2025	5.	Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы 00000000019 4.3 Регистрационный номер ESF-060440002060-20250220-20256523	5.2	Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001 **9.2.** номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП	10.1. количество	
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК IRTYKZKA
13. ИИК KZ459650000072168167
15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 090340012961 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**
Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction

18. Адрес места нахождения
г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель	20.1. количество	
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	090340012961
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	Акционерное Общество Samruk-Kazyna Construction
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Мангистауский обл, Мунайлинский район, с.Мангистау, Промышленная зона 1, д 80/5	26.3	Адрес доставки	г.Астана, ул.Сыганак, строение 17/10
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер 117

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 29.06.2023

27.5 Учетный номер

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер
32.2 дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Количественная единица измерения	Количество товара в количественной единице измерения	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Код товара (GTIN)	Дополнительные данные
											Ставка	Сумма		Ставка	Сумма						
1	2	3	3/1	4	5	6	6/1	6/2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17/1	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области на 1200 мест"			работа	1			415 751 046,43	415 751 046,43		0	415 751 046,43	12%	49 890 125,57	465 641 172			1		
				Всего по счету						**415 751 046,43**			**415 751 046,43**		**49 890 125,57**	**465 641 172**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
2YVeBsWnRSbOJFIwn0sLJaf/BzKKv8F7kkIsV6iAFit/Qj+Z1EGR/HGgx0wZZZq1Y+gQpN4+KLGtZB1Mzvw5xh0ELjNVkxHhIboV748Y5KBgKtAdjAasi
D97fbjIlmpqT6897JK/oWc+symE8byEdDDZr8SoBq/TMJwJVWhifak=

45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**

46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10
Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за февраль месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
090340012961	060440002060			**дог № 117**	**29.06.2023**		
				доп.соглашения: №1 от19.12.2023г; №2 от 05.02.2024; №3 от 28.02.2024г; №4 от 16.04.2024;№5 от 25.07.2024; №6 от 29.08.2024: №7 от 30.12.2024.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	5 783 263 154	3 479 247 123	5 163 627 816,07				619 635 337,93	5 783 263 154
в том числе: за февраль месяц 2025 года	510 921 775	510 921 775	456 180 156,25				54 741 618,75	510 921 775

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, Джилкибаев К. А.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060, Адилбеков Ж.З.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2ac75259-c638-43a8-b4a1-60a512bedd16)

Заказчик: АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961, г.Астана, улица Сығанақ, строение 17/10

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс", БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, 17 микрорайон, дом 46, ЖК "Мерет", офис 5
Наименование строительства и его адрес: Строительство школы в 19 микрорайоне в городе Актау Мангистауской области

Реестр актов выполненных работ
за февраль месяц 2025 года

№ п/п	Номер акта выполненных работ	Наименование смет	Сумма с НДС
1	Акт №176	Архитектурные решения, блок Л	45 280 603,00
2	Акт №177	Архитектурные решения, блок Е	19 894 093,00
3	Акт №178	Архитектурные решения, блок Г,Ж	81 531 086,00
4	Акт №179	Архитектурные решения, блок И,К	27 695 975,00
5	Акт №180	Архитектурные решения, блок Б,Д	71 428 054,00
6	Акт №181	Архитектурные решения, блок В	58 763 739,00
7	Акт №182	Архитектурные решения, блок А	44 948 571,00
8	Акт №183	Архитектурные решения, блок Л	664 186,00
9	Акт №184	Архитектурные решения, блок Л	6 641 347,00
10	Акт №185	Архитектурные решения, блок Б,Д	4 564 806,00
11	Акт №186	Архитектурные решения, блок В	5 666 931,00
12	Акт №187	Архитектурные решения, блок А	6 812 648,00
13	Акт №188	Архитектурные решения, блок Г,Ж	4 824 587,00
14	Акт №189	Архитектурные решения, блок И,К	2 123 313,00
15	Акт №190	Электроосвещение	72 762 519,00
16	Акт №191	Электроосвещение	24 620 319,00
17	Акт №192	Электроосвещение	10 576 305,00
18	Акт №193	Силовое электрооборудование	22 122 693,00
		ИТОГО	**510 921 775,00**

Заказчик: **Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию АО "Samruk-Kazyna Construction", БИН 090340012961,**
Джилкибаев К. А. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подрядчик: **Директор ТОО "АС Құрылыс". БИН 060440002060,**
Адилбеков Ж.З. _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Технический надзор: **Заместитель директора ТОО "САМРУК-КАЗЫНА ДЕВЕЛОПМЕНТ". БИН 130440032226, Садвакасов К.Т.** _____

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2ac75259-c638-43a8-b4a1-60a512bedd16)

Лист согласования

ФИО	Должность	Данные ЭЦП
Технический надзор: ИИН 660227350087 - САДВАКАСОВ КАЙРАТ null	Заместитель директора	Подписано: 20.02.2025 16:08
Генеральный подрядчик: ИИН 650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ null	Директор	Подписано: 20.02.2025 15:22
Заказчик: ИИН 581103301307 - ДЖИЛКИБАЕВ КУАТ null	Заместитель Председателя Правления по национальному проекту и региональному развитию	Подписано: 20.02.2025 17:26
Заказчик: ИИН 810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР null	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	Подписано: 20.02.2025 17:10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2ac75259-c638-43a8-b4a1-60a512bedd16)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2ac75259-c638-43a8-b4a1-60a512bedd16)

Подписано через EQURYLYS.KZ (#2ac75259-c638-43a8-b4a1-60a512bedd16)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок И, К				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
1	97	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	6.86	26 288	180 336
2	98	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	7.0315	15 753	110 767
3	99	6111-0501-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ПФ-115	м2	97.5	341	33 248
4	100	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	139.48	2 356	328 615
5	101	222-529-0501РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	146.454	462	67 662
6	102	261-107-0605РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	146.454	954	139 717
7	103	261-107-0608РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	146.454	665	97 392
8	104	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	8.32	2 490	20 717
9	105	231-305-0101СпрСЦ 02.2024	/ламели/Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	8.32	12 216	101 637
10	106	1115-0402-0302РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	39.58	973	38 511
11	107	1115-0213-0102РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	19.74	16 943	334 455

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	108	1115-0212-0201РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	19.74	4 264	84 171
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**1 537 228**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок И, К				**1 537 228**
			ИТОГО по акту:				**1 537 228**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				1537228.000 x 6.20%	95 308
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				1537228.000 + 95308.133	1 632 536
		Сметная прибыль, 5.00%				1632536.133 x 5.00%	81 626
		Непредвиденные расходы, 5.000%				1632536.133 x 5.000%	81 626
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					1 795 789
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				1795789.746 x 1.0557	1 895 815
		НДС (12%)				1895815.235 x 12%	227 497
		Итого с НДС				1895815.235 + 227497.828	2 123 313

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	16.02.2025 10:54
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	17.02.2025 05:36
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	17.02.2025 05:54
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:29
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	17.02.2025 07:09
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:40
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

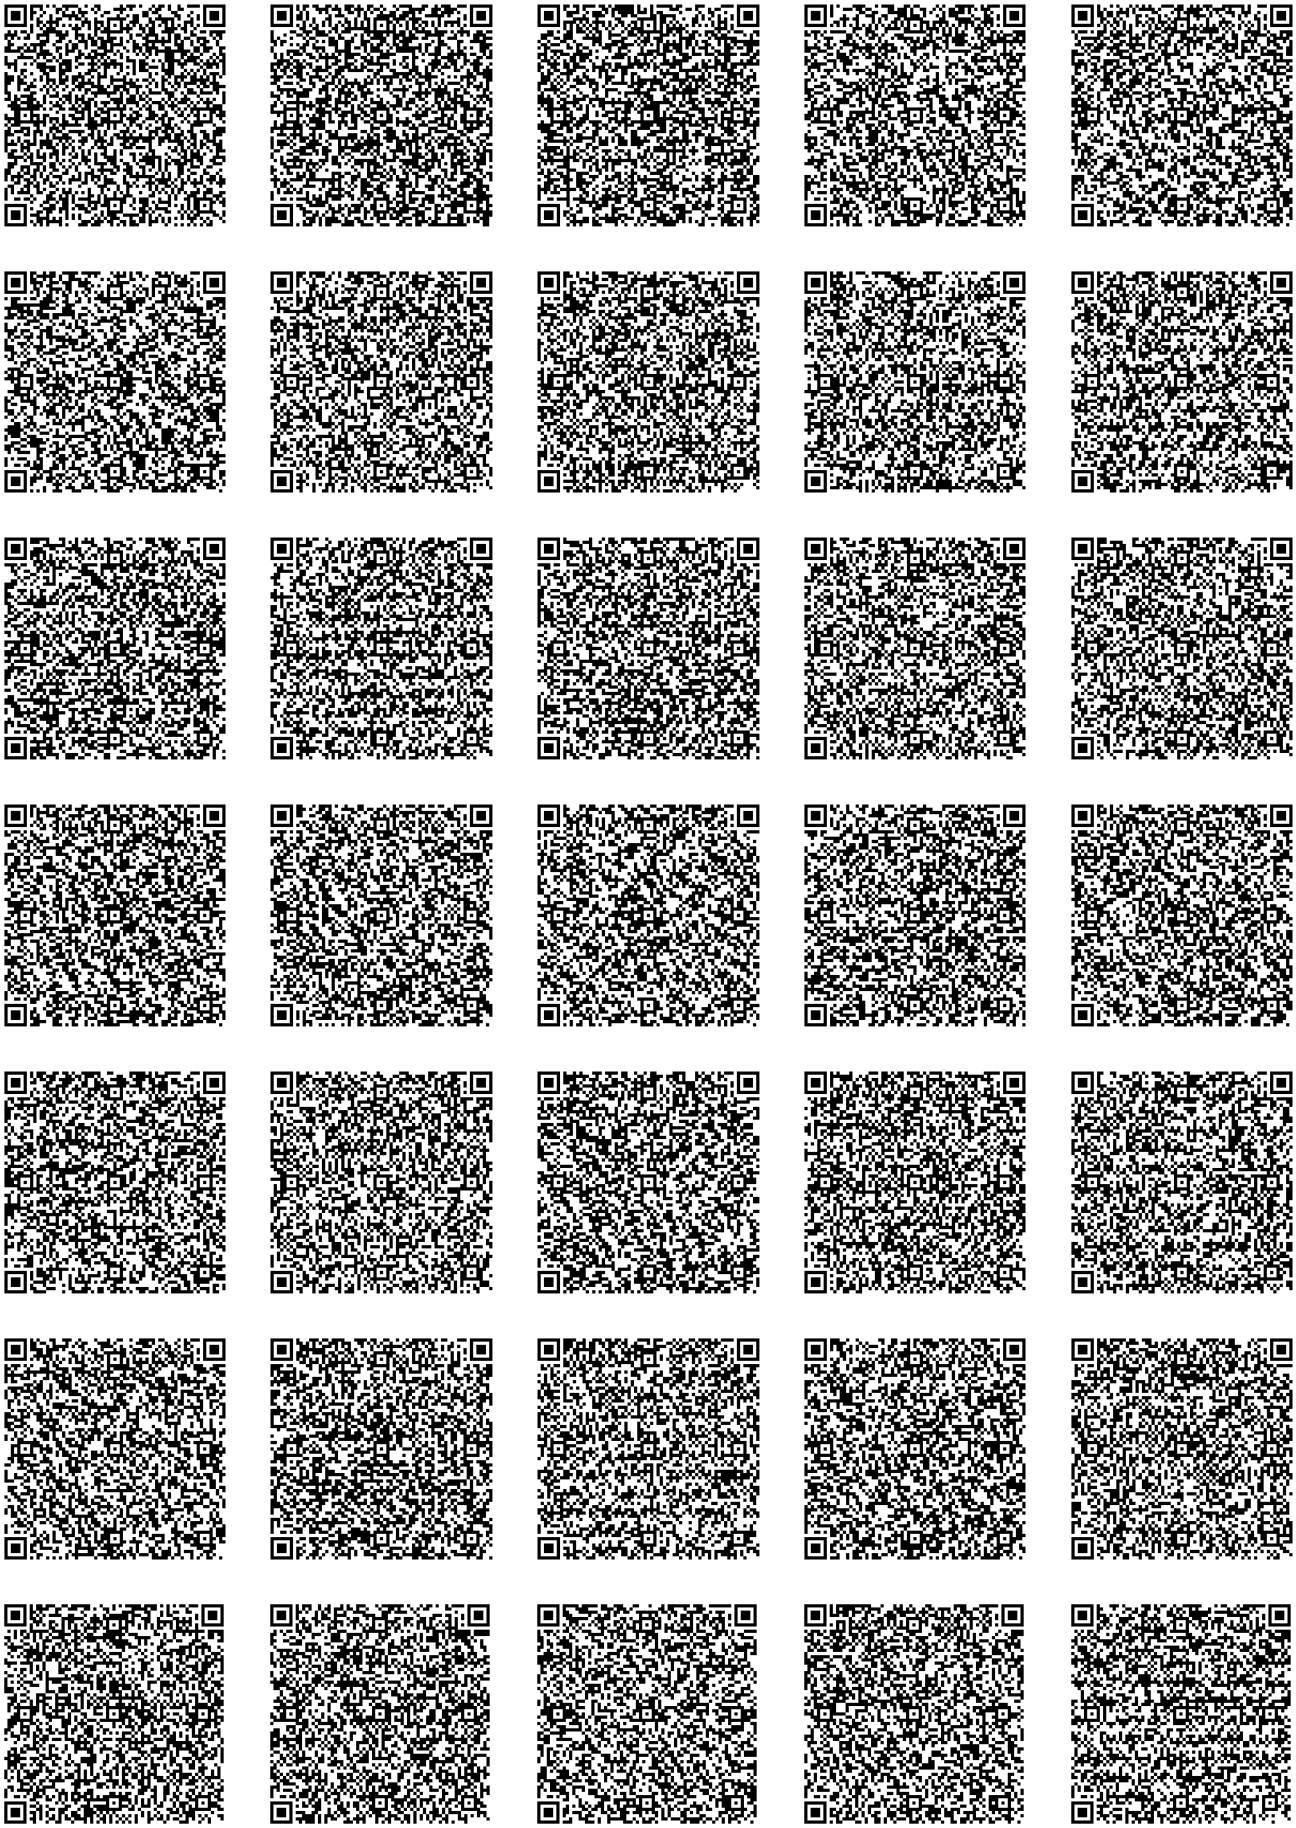

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Б, Д				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
1	104	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	3.59	26 288	94 374
2	105	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	3.67975	15 753	57 967
3	106	6111-0501-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ПФ-115	м2	61.87	341	21 098
4	107	1115-0402-0302РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	18.69	973	18 185
5	108	1115-0213-0102РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	91.13	16 943	1 544 016
6	109	1115-0212-0201РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	91.13	4 264	388 578
7	110	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	206.64	2 356	486 843
8	111	222-529-0501РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	216.972	462	100 241
9	112	261-107-0605РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	216.972	954	206 991
10	113	261-107-0608РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	216.972	665	144 286
11	114	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	7.27	2 490	18 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	115	231-305-0401СпрСЦ 01.2024	/орнамент/Панель рельефная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 560x560x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	7.27	12 199	88 687
13	116	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	9.21	2 490	22 933
14	117	231-305-0101СпрСЦ 02.2024	/ламели/Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	9.21	12 216	112 509
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**3 304 811**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Б, Д				**3 304 811**
			ИТОГО по акту:				**3 304 811**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				3304811.000 x 6.20%	204 898
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3304811.000 + 204898.276	3 509 709
		Сметная прибыль, 5.00%				3509709.276 x 5.00%	175 485
		Непредвиденные расходы, 5.000%				3509709.276 x 5.000%	175 485
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					3 860 680
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				3860680.203 x 1.0557	4 075 720
		НДС (12%)				4075720.091 x 12%	489 086
		Итого с НДС				4075720.091 + 489086.411	4 564 806

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	16.02.2025 10:50
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	17.02.2025 05:38
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	17.02.2025 05:51
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 12:30
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:11 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:41
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:28

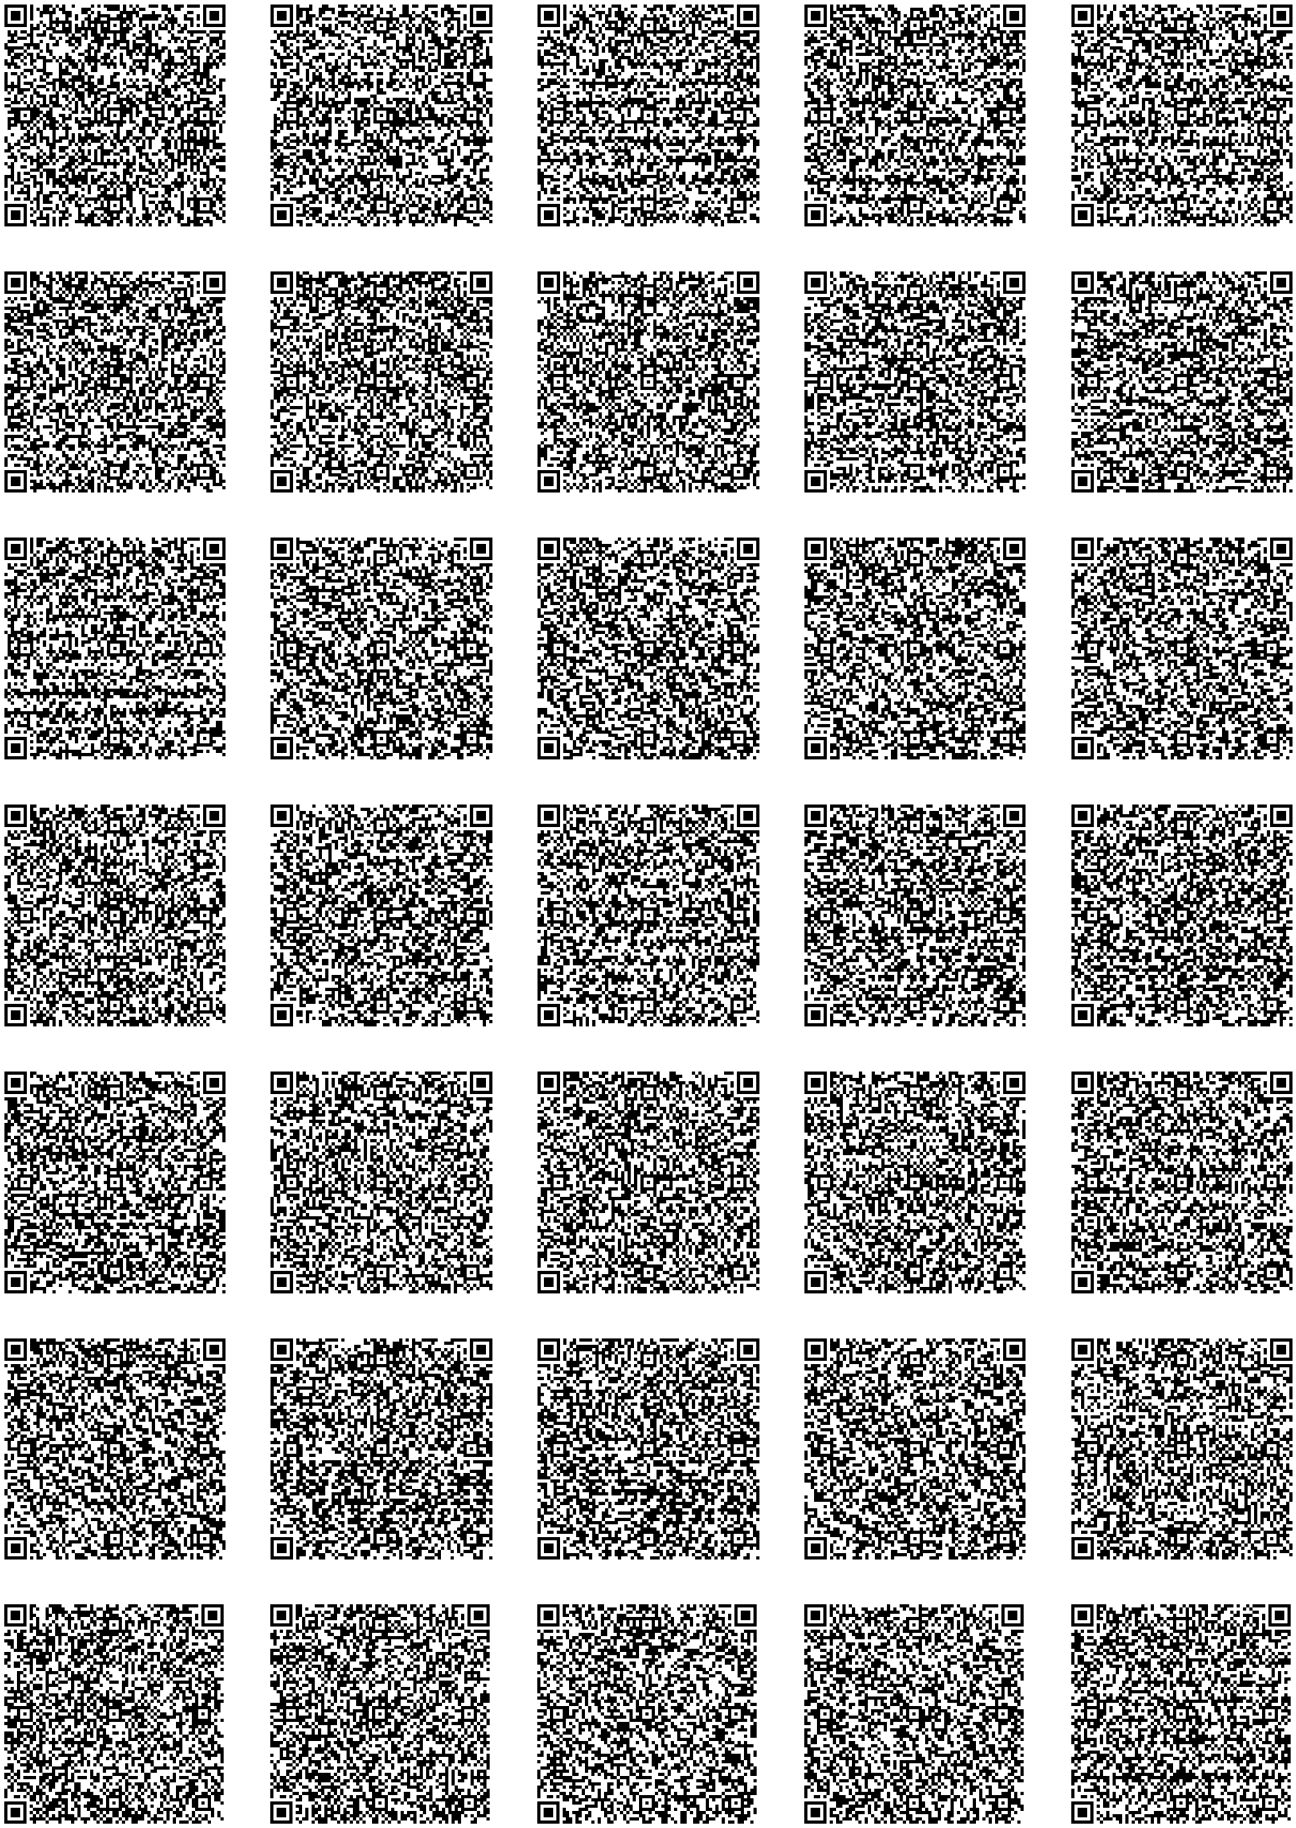

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
1	99	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	7.93	26 288	208 464
2	100	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	8.12825	15 753	128 044
3	101	6111-0501-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ПФ-115	м2	63.45	341	21 636
4	102	1115-0402-0302РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	50.71	973	49 341
5	103	1115-0213-0102РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	8.577	16 943	145 320
6	104	1115-0212-0201РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	85.77	4 264	365 723
7	105	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	495.56	2 356	1 167 539
8	106	222-529-0501РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	520.338	462	240 396
9	107	261-107-0605РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	520.338	954	496 402
10	108	261-107-0608РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	520.338	665	346 025
11	109	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	7.27	2 490	18 102

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	110	231-305-0401СпрСЦ 01.2024	/орнамент/Панель рельефная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 560x560x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	7.27	12 199	88 687
13	111	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	14.77	2 490	36 777
14	112	231-305-0101СпрСЦ 02.2024	/ламели/Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	14.77	12 216	180 430
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**3 492 886**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				**3 492 886**
			ИТОГО по акту:				**3 492 886**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				3492886.100 x 6.20%	216 558
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				3492886.100 + 216558.932	3 709 445
		Сметная прибыль, 5.00%				3709445.032 x 5.00%	185 472
		Непредвиденные расходы, 5.000%				3709445.032 x 5.000%	185 472
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 080 389
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				4080389.535 x 1.0557	4 307 667
		НДС (12%)				4307667.232 x 12%	516 920
		Итого с НДС				4307667.232 + 516920.068	4 824 587

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	16.02.2025 10:57
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	17.02.2025 05:36
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	17.02.2025 05:54
Представители заказчика		
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:29
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	17.02.2025 07:15
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:40
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

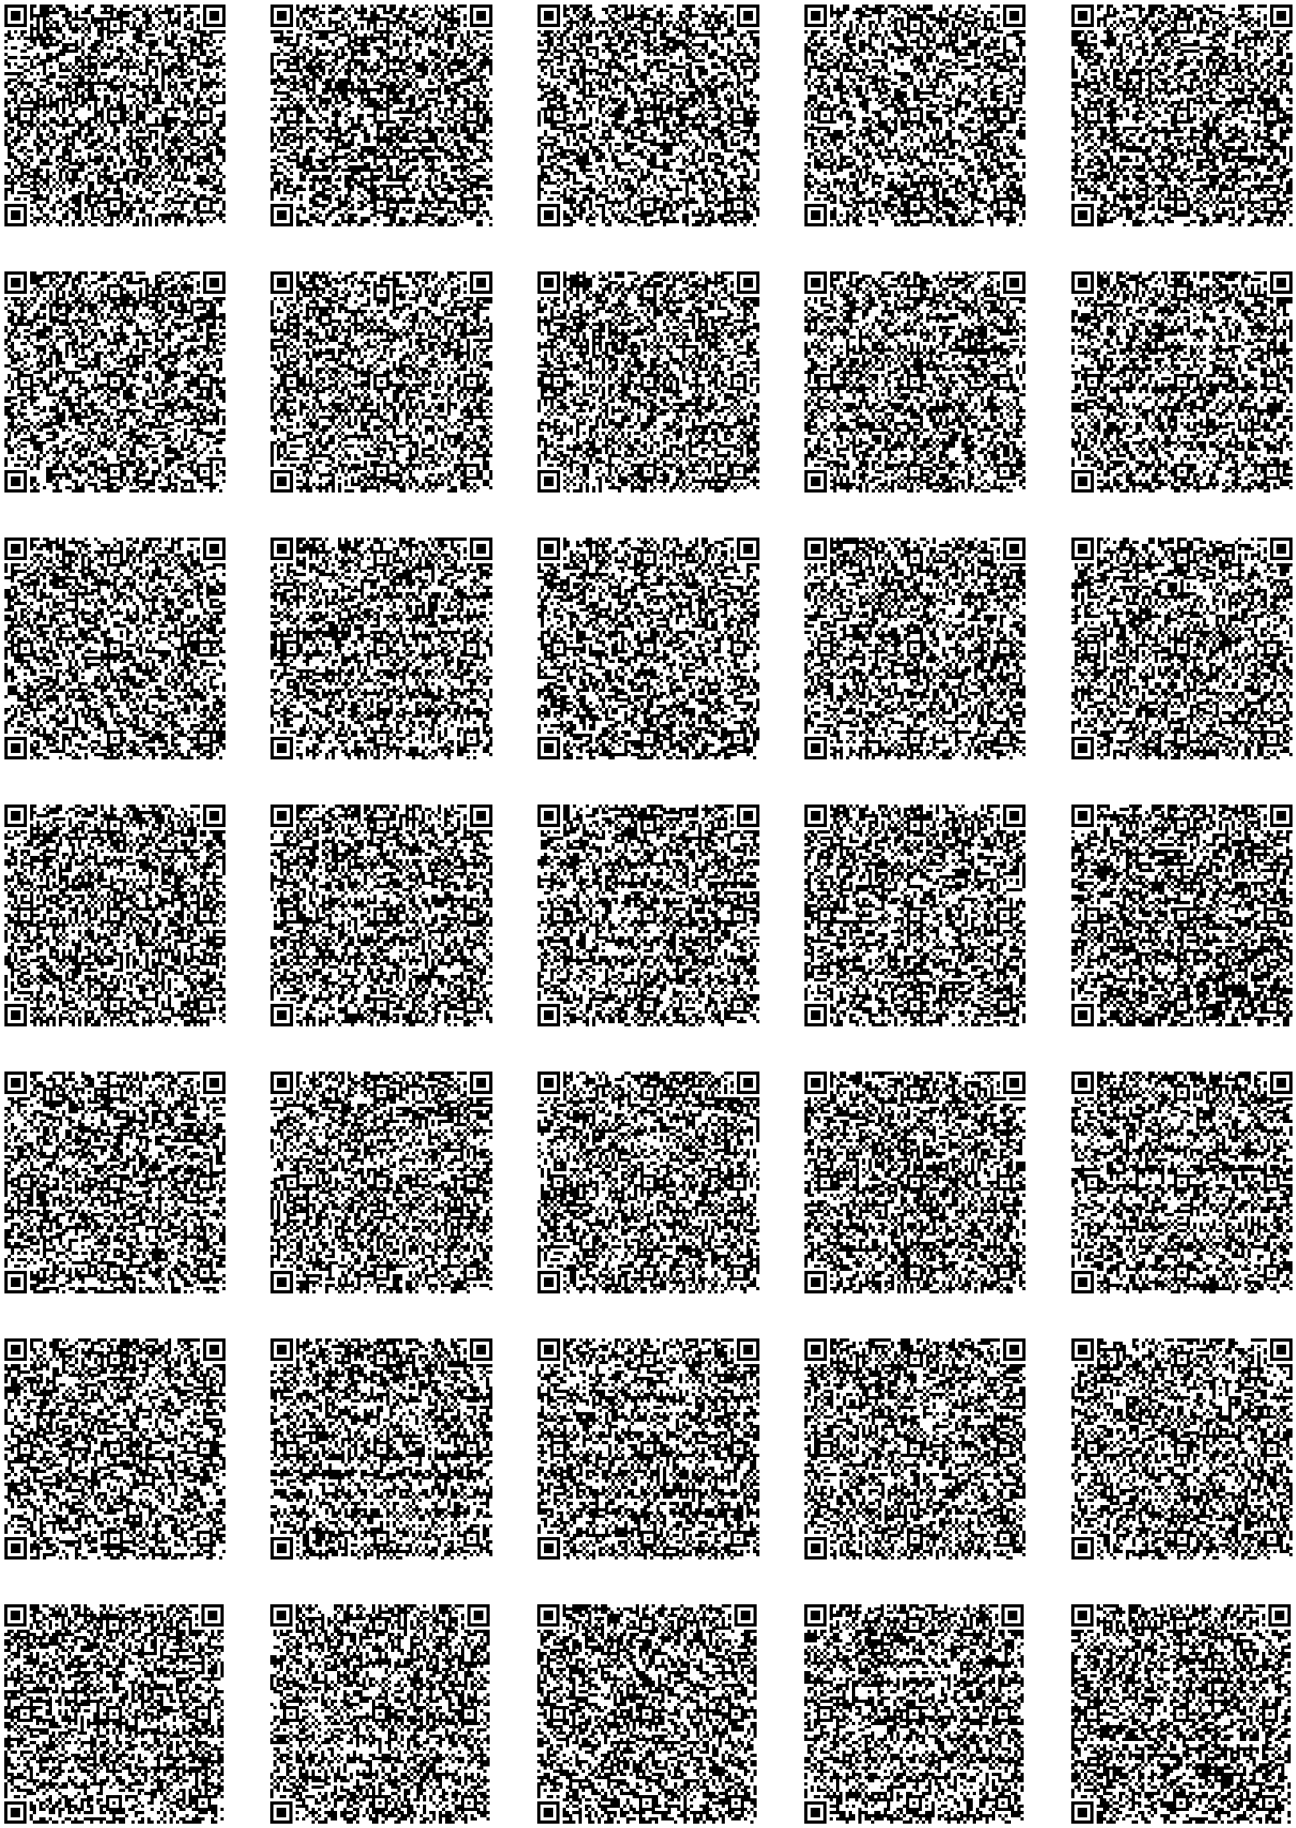

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок В				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
1	81	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	3.45	26 288	90 694
2	82	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	3.53625	15 753	55 707
3	83	6111-0501-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ПФ-115	м2	34.09	341	11 625
4	84	1115-0402-0302РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	21.1	973	20 530
5	85	1115-0213-0102РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	78.95	16 943	1 337 650
6	86	1115-0212-0201РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	78.95	4 264	336 643
7	87	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	341.4	2 356	804 338
8	88	222-529-0501РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	358.47	462	165 613
9	89	261-107-0605РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	358.47	954	341 980
10	90	261-107-0608РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	358.47	665	238 382
11	91	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	8.87	2 490	22 086

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	92	231-305-0401СпрСЦ 01.2024	/орнамент/Панель рельефная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 560x560x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	8.87	12 199	108 205
13	93	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	38.71	2 490	96 388
14	94	231-305-0101СпрСЦ 02.2024	/ламели/Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	38.71	12 216	472 880
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**4 102 723**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок В				**4 102 723**
			ИТОГО по акту:				**4 102 723**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				4102723.000 x 6.20%	254 368
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4102723.000 + 254368.818	4 357 091
		Сметная прибыль, 5.00%				4357091.818 x 5.00%	217 854
		Непредвиденные расходы, 5.000%				4357091.818 x 5.000%	217 854
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					4 792 800
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				4792801.000 x 1.0557	5 059 760
		НДС (12%)				5059760.016 x 12%	607 171
		Итого с НДС				5059760.016 + 607171.202	5 666 931

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	16.02.2025 11:01
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	17.02.2025 05:34
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	17.02.2025 05:55
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	17.02.2025 06:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	17.02.2025 06:22
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:31
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:44 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	17.02.2025 06:42

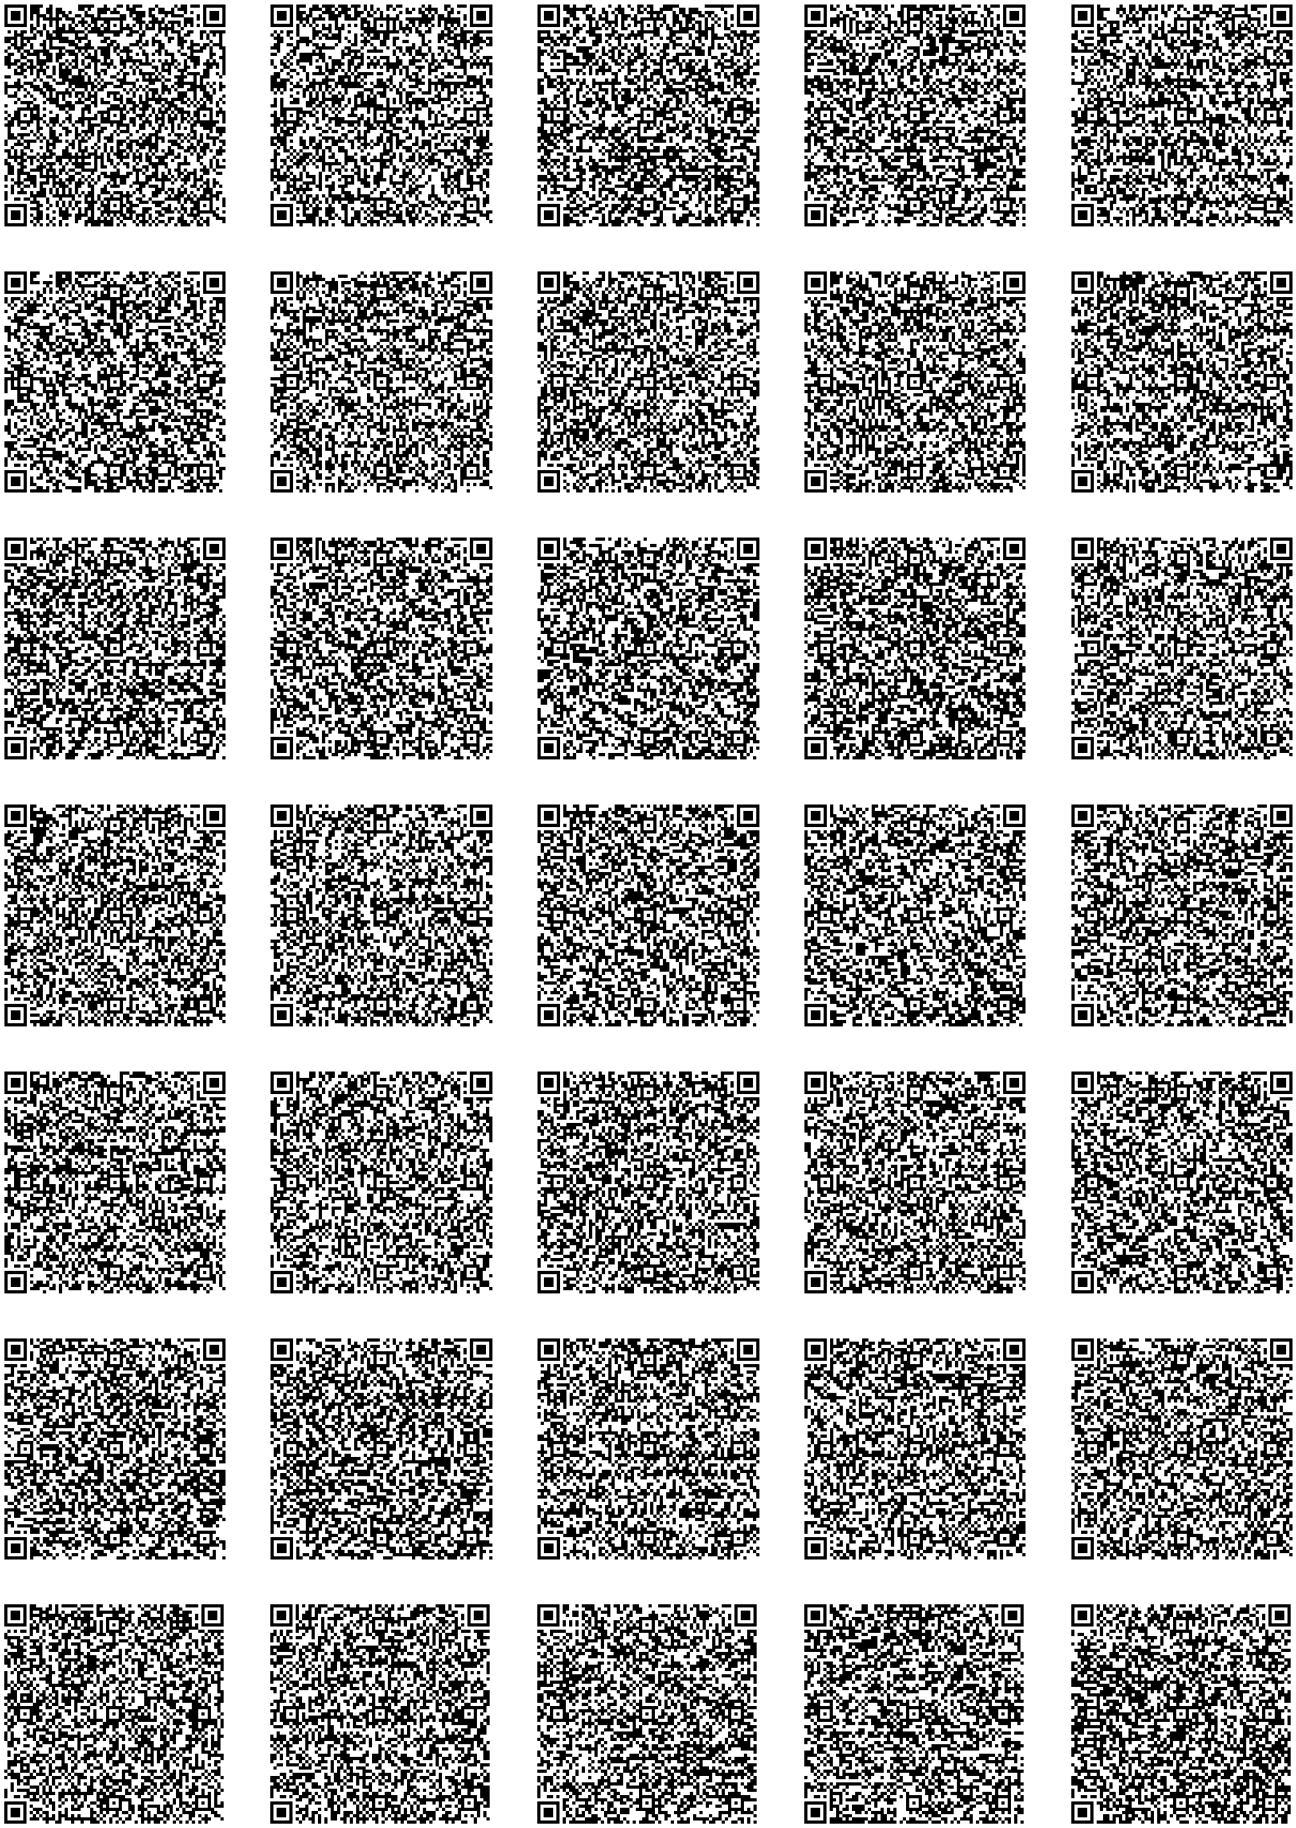

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Л				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
1	83	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	3.36	26 288	88 328
2	84	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	3.444	15 753	54 253
3	85	6111-0501-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ПФ-115	м2	29.55	341	10 077
4	86	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	403.48	2 356	950 599
5	87	222-529-0501РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	423.654	462	195 728
6	88	261-107-0605РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	423.654	954	404 166
7	89	261-107-0608РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	423.654	665	281 730
8	90	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	56.72	2 490	141 233
9	91	231-305-0101СпрСЦ 02.2024	/ламели/Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	56.72	12 216	692 892
10	92	1115-0402-0302РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	17.39	973	16 920
11	93	1115-0213-0102РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	93	16 943	1 575 699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	94	1115-0212-0201РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	93	4 264	396 552
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**4 808 177**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Л				**4 808 177**
			ИТОГО по акту:				**4 808 177**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				4808177.000 x 6.20%	298 106
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				4808177.000 + 298106.965	5 106 283
		Сметная прибыль, 5.00%				5106283.965 x 5.00%	255 314
		Непредвиденные расходы, 5.000%				5106283.965 x 5.000%	255 314
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					5 616 912
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				5616912.361 x 1.0557	5 929 774
		НДС (12%)				5929774.380 x 12%	711 572
		Итого с НДС				5929774.380 + 711572.926	6 641 347

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	16.02.2025 10:51
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	17.02.2025 05:37
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	17.02.2025 05:53
Представители заказчика		
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:28
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	17.02.2025 07:16
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:40
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:17 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:10 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

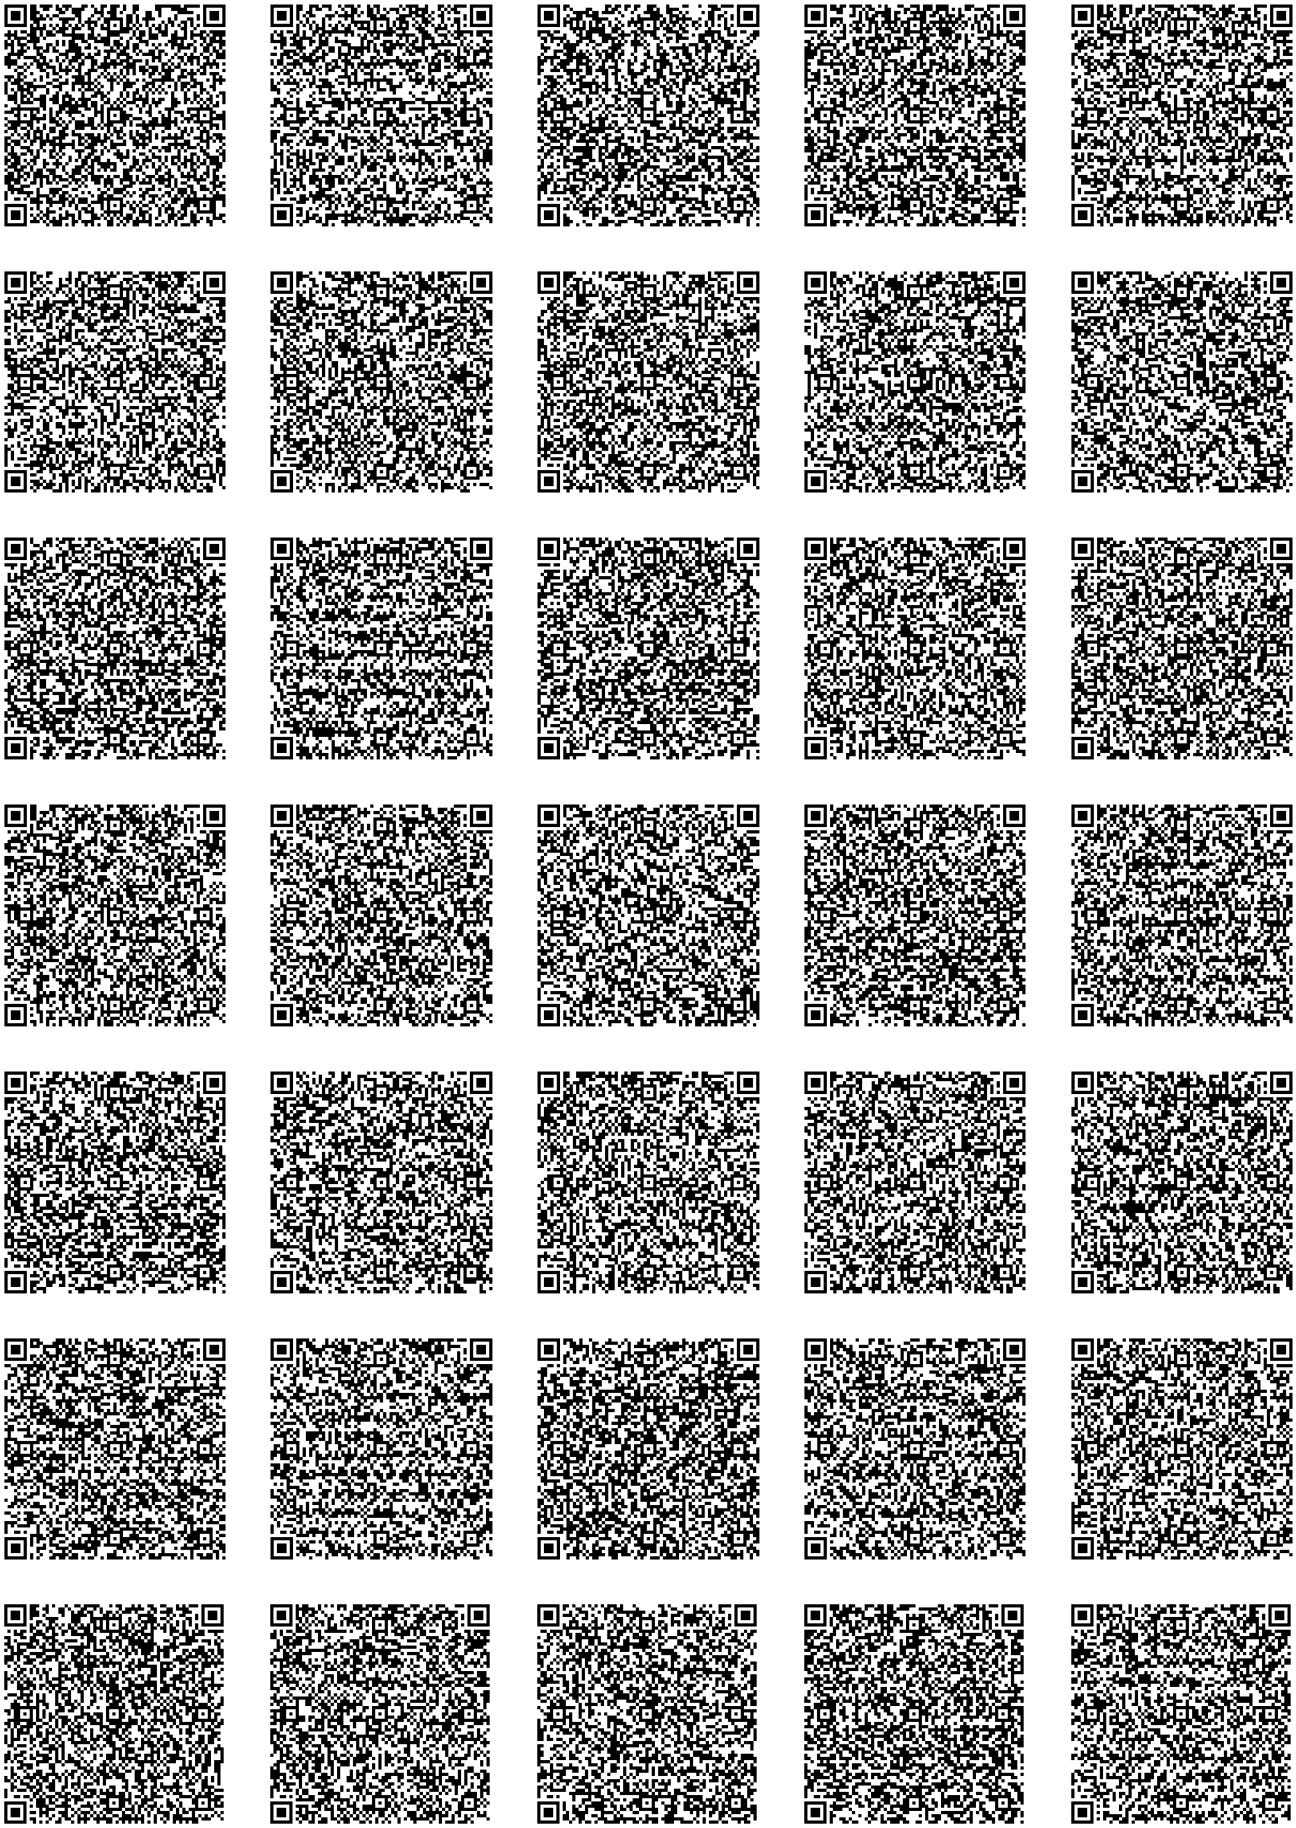

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок А				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
1	79	6109-0306-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из гранитных плит на клеевом растворе из сухих смесей, количество плит на 1 м2 до 4 штук	м2	2.58	26 288	67 823
2	80	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	2.6445	15 753	41 659
3	81	1115-0402-0302РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада	16.62	973	16 171
4	82	1115-0213-0102РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	м2	97.44	16 943	1 650 926
5	83	1115-0212-0201РСНБ РК 2022	Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна микроминерала до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	97.44	4 264	415 484
6	84	6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	390.24	2 356	919 405
7	85	222-529-0501РСНБ РК 2022	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	409.752	462	189 305
8	86	261-107-0605РСНБ РК 2022	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	409.752	954	390 903
9	87	261-107-0608РСНБ РК 2022	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	409.752	665	272 485
10	88	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	3.64	2 490	9 064
11	89	231-305-0401СпрСЦ 01.2024	/орнамент/Панель рельефная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 560х560х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	3.64	12 199	44 404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	90	6112-0401-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада декоративными элементами	м2	62.19	2 490	154 853
13	91	231-305-0101СпрСЦ 02.2024	/ламели/Панель алюминиевая композитная толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм	м2	62.19	12 216	759 713
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**4 932 195**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок А				**4 932 195**
			ИТОГО по акту:				**4 932 195**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	4932195.000 x 6.20%	305 796
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	4932195.000 + 305796.081	5 237 991
	Сметная прибыль, 5.00%	5237991.081 x 5.00%	261 899
	Непредвиденные расходы, 5.000%	5237991.081 x 5.000%	261 899
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		5 761 790
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	5761790.189 x 1.0557	6 082 721
	НДС (12%)	6082721.902 x 12%	729 926
	Итого с НДС	6082721.902 + 729926.628	6 812 648

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	16.02.2025 11:00
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	17.02.2025 05:35
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	17.02.2025 05:55
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	17.02.2025 07:02
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:40
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:41 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:30

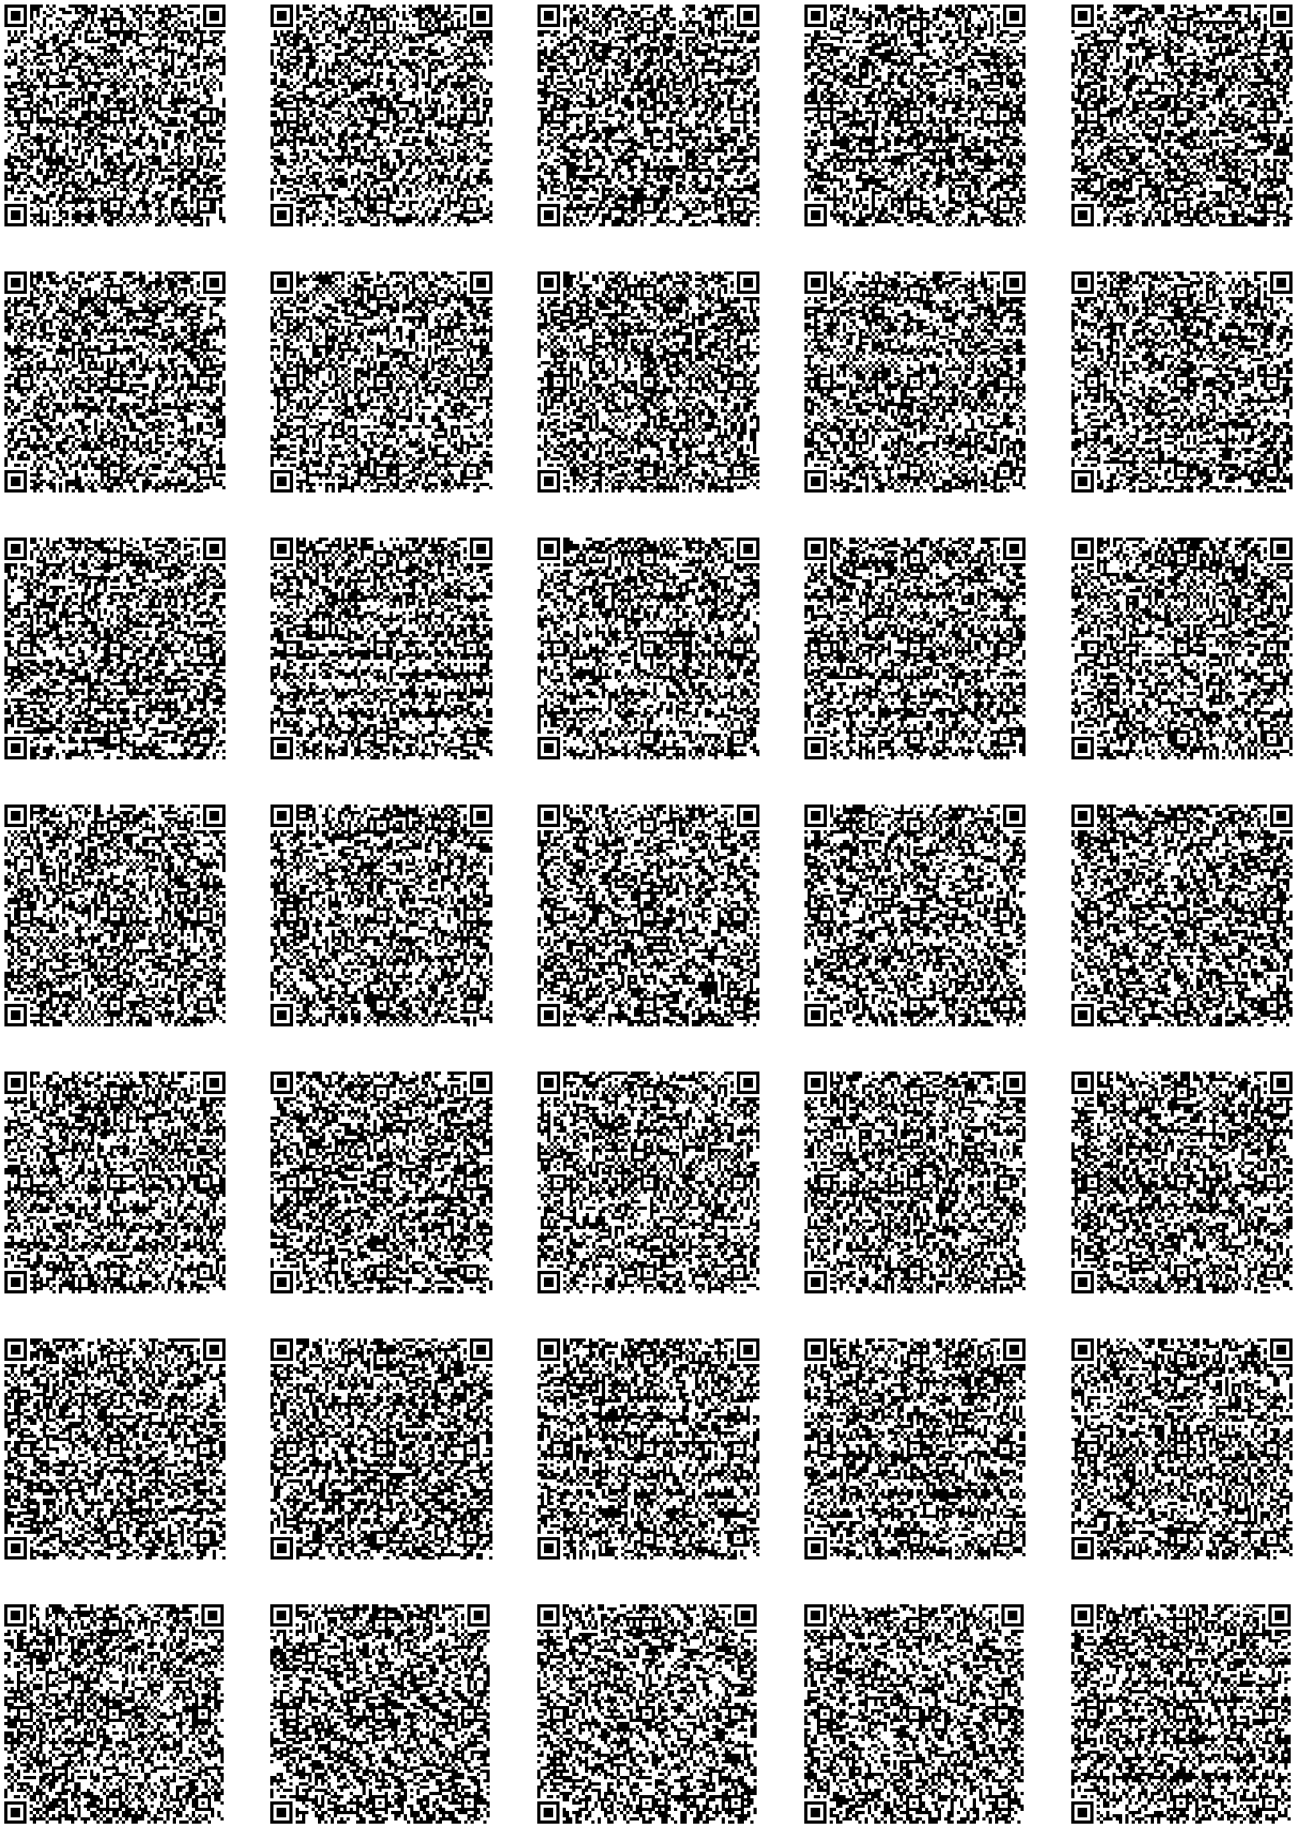

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроосвещение				
			Отдел: Блок "В"				
			Подраздел: ЩО-1.3				
1	111	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
2	112	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
3	113	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	20	7 467	149 340
4	114	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
5	115	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	575	6 900
6	116	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
7	117	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2 543	5 086
			Итого по подразделу: ЩО-1.3				**211 990**
			Подраздел: ЩО-2.3				
8	118	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
9	119	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
10	120	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	20	7 467	149 340
11	121	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	122	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	11	575	6 325
13	123	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4 041	24 246
14	124	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2 543	5 086
			Итого по подразделу: ЩО-2.3				**215 456**
			Подраздел: ЩО-3.3				
15	125	6119-0602-0108ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
16	126	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
17	127	6124-0303-0601ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	21	7 467	156 807
18	128	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
19	129	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	12	575	6 900
20	130	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4 041	24 246
21	131	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2 543	5 086
			Итого по подразделу: ЩО-3.3				**223 498**
			Подраздел: ЯТП-0.25				
22	132	6119-0601-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 861	8 861
23	133	247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19 972
			Итого по подразделу: ЯТП-0.25				**28 833**
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
24	134	6119-0401-0208ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	204	6 780	1 383 120
25	135	6119-0401-0101ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	67	2 673	179 091
26	136	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	204	18 984	3 872 736
27	137	247-102-3025СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	шт.	28	34 392	962 976
28	138	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	8	5 211	41 688
29	139	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	7 596	22 788

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	140	247-104-2815СпрСЦ 02.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	50 503	50 503
31	141	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	27	7 891	213 057
32	142	6119-0401-0105ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	4	3 769	15 076
33	143	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300х90мм.	шт.	4	33 508	134 032
34	144	247-104-2502СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
35	145	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	12	7 864	94 368
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**6 977 216**
			Итого по отделу: Блок "В"				**7 656 993**
			Итого по локальной смете: Электроосвещение				**7 656 993**
			ИТОГО по акту:				**7 656 993**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	7656993.000 x 6.20%	474 733
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	7656993.000 + 474733.551	8 131 726
	Сметная прибыль, 5.00%	8131726.551 x 5.00%	406 586
	Непредвиденные расходы, 5.000%	8131726.551 x 5.000%	406 586
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		8 944 899
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	8944899.207 x 1.0557	9 443 130
	НДС (12%)	9443130.092 x 12%	1 133 175
	Итого с НДС	9443130.092 + 1133175.611	10 576 305

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	19.02.2025 04:47
Представители технического надзора		
880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА	технадзор по электрике	19.02.2025 06:18
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	19.02.2025 09:08
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	19.02.2025 13:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	19.02.2025 13:23
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 06:42 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:33
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	19.02.2025 12:56

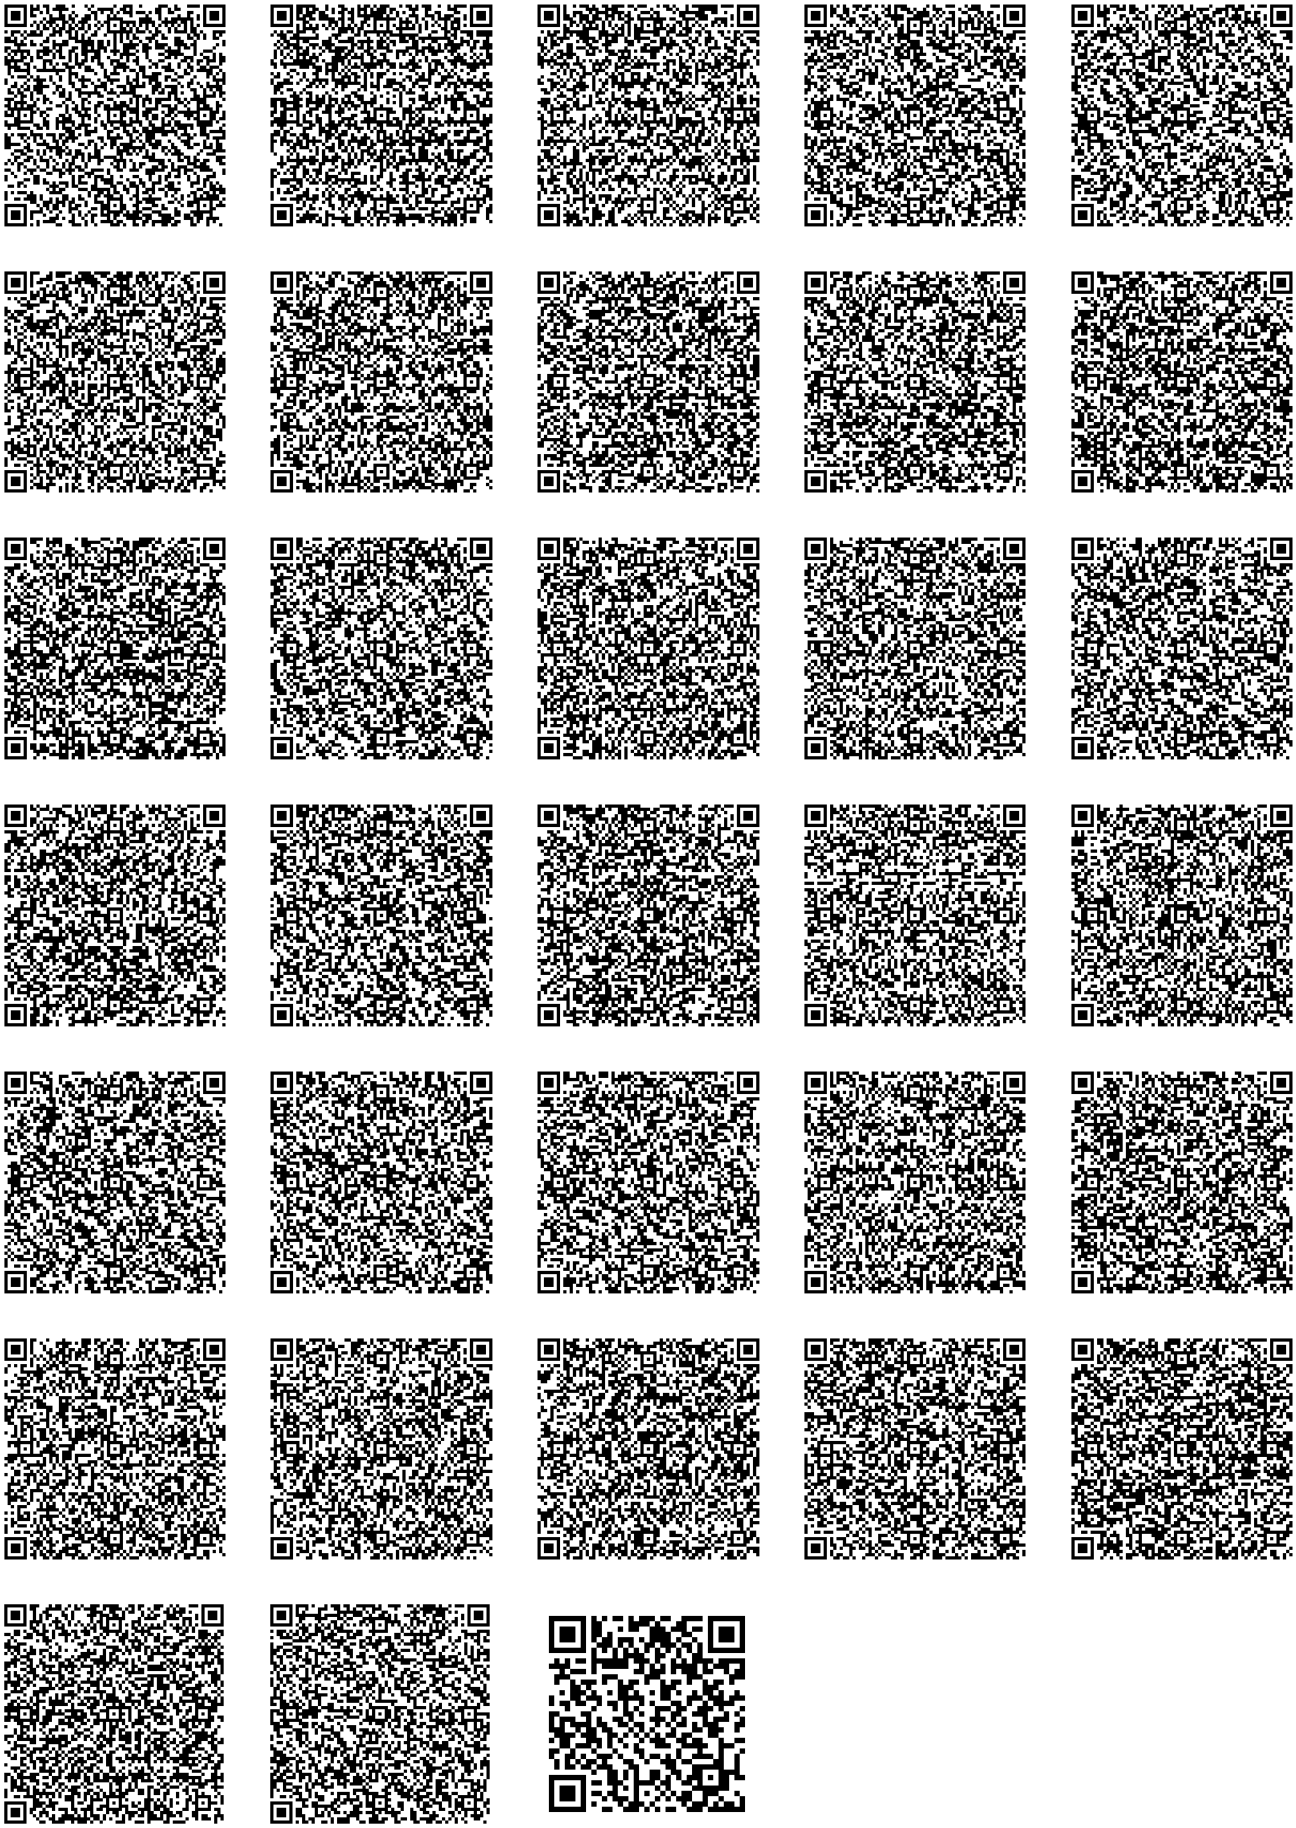

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Е				
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-16/				
1	79	6112-0401-0115ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	483.701	11 166	5 401 005
2	81	217-109-0102РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1900.6604	27	51 318
3	82	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	4780.104	54	258 125
4	83	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	586.1318	120	70 336
5	84	231-305-0501СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	625.966	12 212	7 644 297
6	85	6112-0401-0112ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада гранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	21.52	22 280	479 466
7	86	217-109-0108РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	180.768	67	12 111
8	87	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	109.752	54	5 927
9	88	231-102-0401СпрСЦ 02.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	21.52	6 249	134 478
10	89	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	21.9504	15 753	345 785
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-16/				**14 402 849**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Е				**14 402 849**
			ИТОГО по акту:				**14 402 849**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				14402849.400 x 6.20%	892 976
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				14402849.400 + 892976.635	15 295 826

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль, 5.00%				15295826.035 x 5.00%	764 791
		Непредвиденные расходы, 5.000%				15295826.035 x 5.000%	764 791
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					16 825 408
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				16825408.639 x 1.0557	17 762 583
		НДС (12%)				17762583.900 x 12%	2 131 510
		Итого с НДС				17762583.900 + 2131510.068	19 894 093

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	02.02.2025 08:45
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	03.02.2025 05:57
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.02.2025 04:29
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:17 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 13:06
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	19.02.2025 15:39 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 03:36
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:42

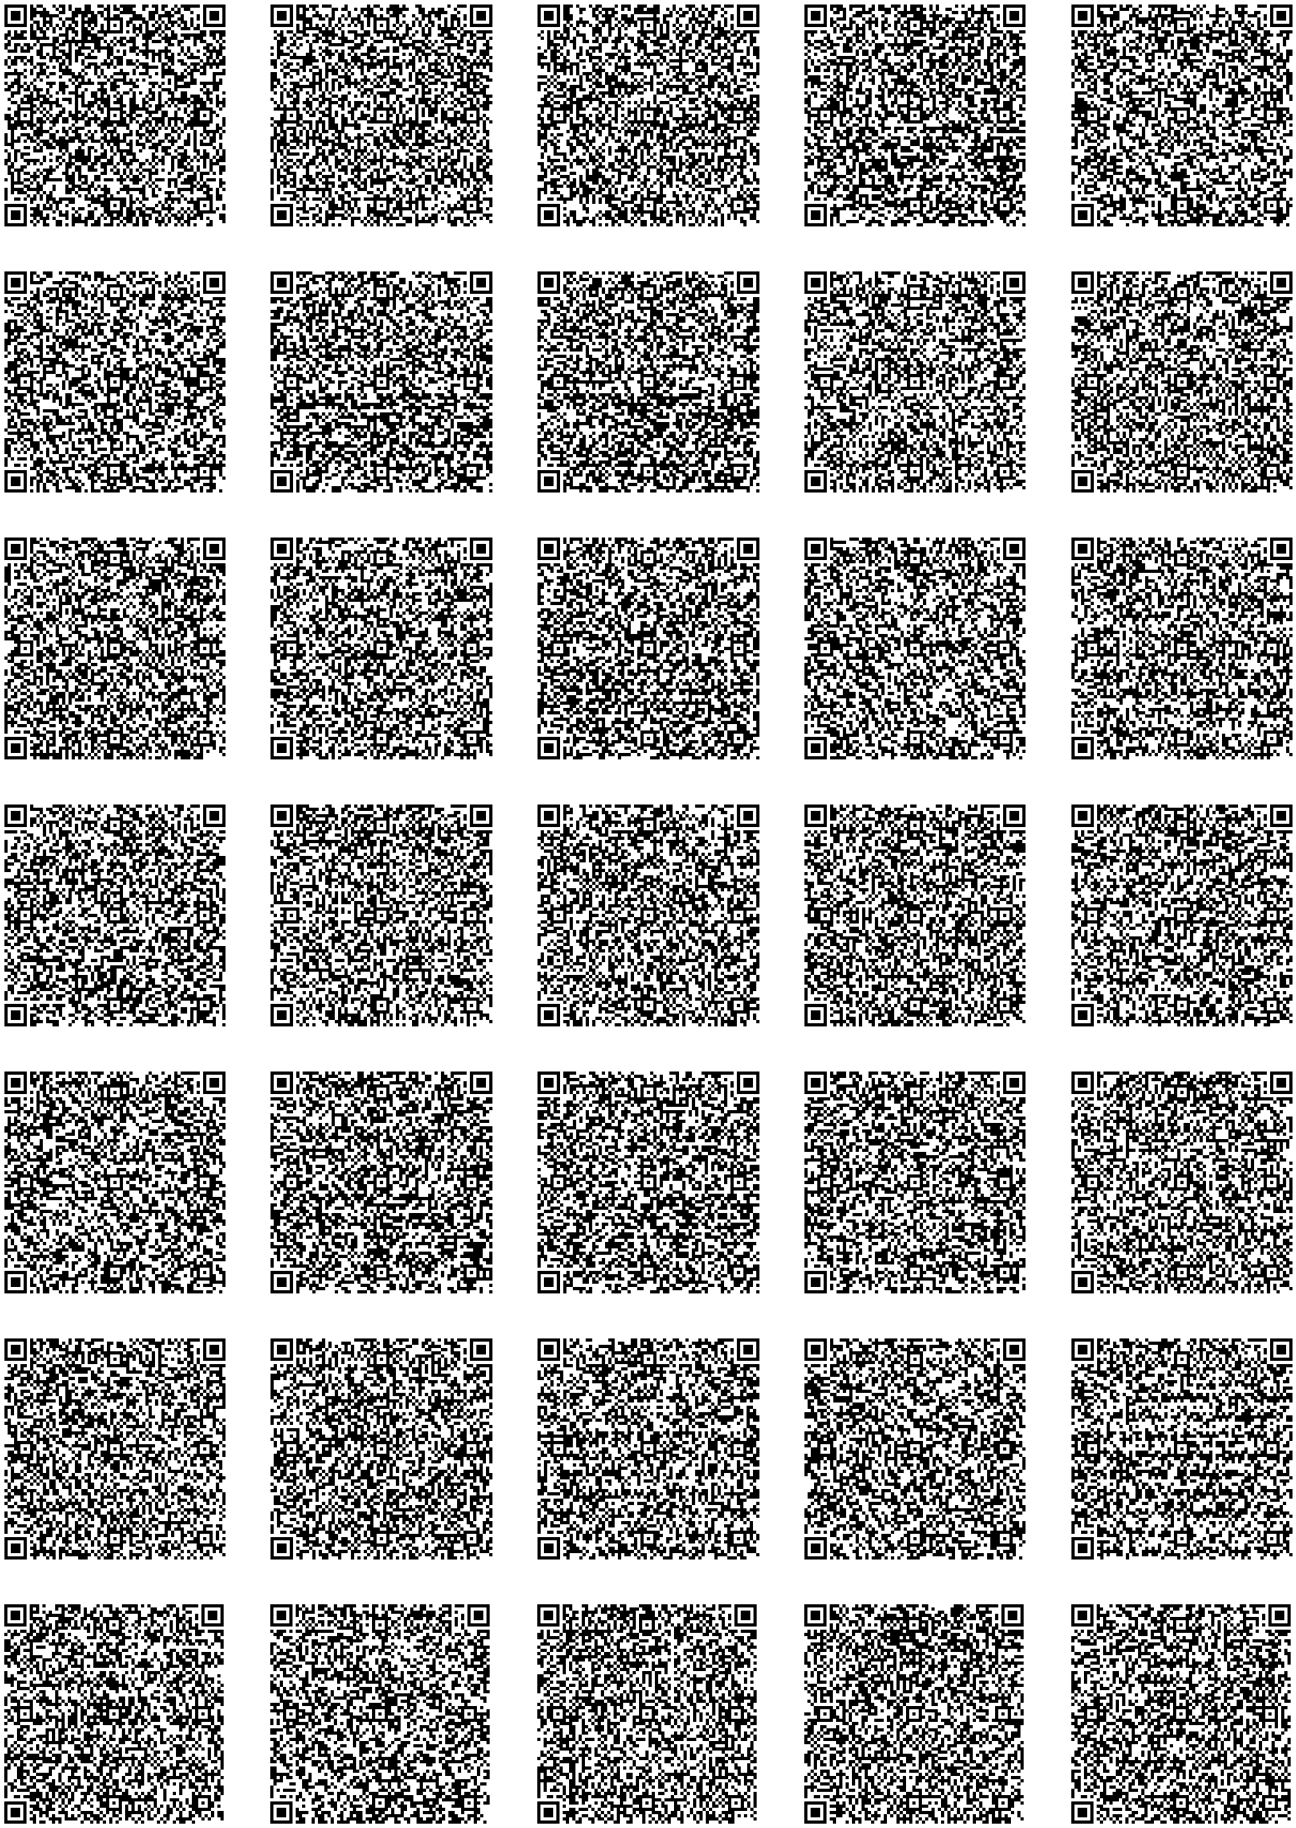

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Силовое электрооборудование				
			Отдел: Блок "А"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ПР-К1.1				
1	1	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
2	2	247-201-0221РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 347	9 347
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
4	4	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
5	5	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4 041	24 246
			Итого по подразделу: ПР-К1.1				**103 476**
			Подраздел: ПР-К2.1				
6	6	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
7	7	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
8	8	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	11	7 467	82 137
9	9	247-204-2526РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
11	11	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	9	4 041	36 369
			Итого по подразделу: ПР-К2.1				**151 762**
			Подраздел: ПР-К3.1				
12	12	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
13	13	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
14	14	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	11	7 467	82 137
15	15	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
16	16	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4 041	40 410
			Итого по подразделу: ПР-К3.1				**153 006**
			Подраздел: ПР-1.1				
17	17	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
18	18	247-201-0224РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 055	16 055
19	19	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	20	7 467	149 340
20	20	247-204-2527РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
21	21	247-204-0763РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 576	2 576
22	22	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4 182
23	23	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
24	24	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	15	4 041	60 615
			Итого по подразделу: ПР-1.1				**252 963**
			Подраздел: ПР-2.1				
25	25	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
27	27	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 467	89 604
28	28	247-204-2525РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
29	29	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4 182
30	30	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	9	4 041	36 369
			Итого по подразделу: ПР-2.1				**160 614**
			Подраздел: ПР-3.1				
31	31	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
32	32	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
33	33	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 467	74 670
34	34	247-204-2525РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
35	35	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
36	36	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4 041	32 328
			Итого по подразделу: ПР-3.1				**136 562**
			Подраздел: ЩС-1.1				
37	37	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
38	38	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
39	39	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
40	40	247-204-0762РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615	2 615
41	41	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
42	42	247-204-0186РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С40 30 мА	шт.	1	4 459	4 459

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	16 164
			Итого по подразделу: ЩС-1.1				**106 115**
			Подраздел: ЩС-1.2,1.3				
44	44	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	15 355	30 710
45	45	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9 924	19 848
46	46	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 467	104 538
47	47	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
48	48	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
49	49	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4 041	40 410
			Итого по подразделу: ЩС-1.2,1.3				**210 092**
			Подраздел: ЩС-2.1,3.1				
50	50	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	15 355	30 710
51	51	247-201-0104РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 468	20 936
52	52	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	20	7 467	149 340
53	53	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
54	54	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
55	55	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	16	4 041	64 656
			Итого по подразделу: ЩС-2.1,3.1				**280 228**
			Подраздел: ЩС-К2.1				
56	56	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
57	57	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
59	59	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
60	60	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
61	61	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
			Итого по подразделу: ЩС-К2.1				**105 046**
			Подраздел: ПР-В1				
62	62	6124-0303-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	1	29 089	29 089
63	63	247-201-0803РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25 513
64	64	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 467	67 203
65	65	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
66	66	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
67	67	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4 032
68	68	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	2 875
69	69	6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного	шт.	7	6 995	48 965
70	70	247-208-0105РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2 852	5 704
71	71	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	5	2 543	12 715
			Итого по подразделу: ПР-В1				**203 576**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**1 863 440**
			Итого по отделу: Блок "А"				**1 863 440**
			Отдел: Блок "Б,Д"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ВУ-1 (АВР-400А НА 2ввода)				
72	124	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	63 078	63 078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	125	247-201-0821РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	120 418	120 418
74	126	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	3	7 467	22 401
75	127	247-204-3430РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	49 339	98 678
76	128	247-204-0753РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 280	2 280
77	129	6124-0302-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 400 А	шт.	3	43 025	129 075
78	130	247-208-0413РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ 64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3	шт.	1	297 165	297 165
79	131	247-208-3201 СпрСЦ 02.2024	Приставка для контактора типа VIKO VTCA-AU/11 1NO+1NC YARD. KONT.USTE MONTE	шт.	2	3 704	7 408
80	132	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	3	2 834	8 502
81	133	247-211-0801РСНБ РК 2022	Реле контроля фаз РК-101 тип 01 380В	шт.	1	8 906	8 906
82	134	247-211-0305РСНБ РК 2022	Реле промежуточные типа РЭК78 3(MY3), 5 А, 220 В, АС	шт.	1	978	978
83	135	247-211-0501РСНБ РК 2022	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	1	440	440
84	136	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В	шт.	2	588	1 176
85	137	1308-0103-1702 РСНБ РК 2022	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	8	4 561	36 488
86	138	247-215-0219РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	2	48 989	97 978
			Итого по подразделу: ВУ-1 (АВР-400А НА 2ввода)				**894 971**
			Подраздел: ВУ-2 (АВР-400А НА 2ввода)				
87	139	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	63 078	63 078
88	140	247-201-0821РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	120 418	120 418
89	141	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	3	7 467	22 401
90	142	247-204-3430РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	2	49 339	98 678

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	143	247-204-0753РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 280	2 280
92	144	6124-0302-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 400 А	шт.	3	43 025	129 075
93	145	247-208-0413РСНБ РК 2022	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ 64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3	шт.	1	297 165	297 165
94	146	247-208-3201 СпрСЦ 02.2024	Приставка для контактора типа VIKO VTCA-AU/11 1NO+1NC YARD. KONT.USTE MONTE	шт.	2	3 704	7 408
95	147	6125-0405-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле	шт.	3	2 834	8 502
96	148	247-211-0801РСНБ РК 2022	Реле контроля фаз РК-101 тип 01 380В	шт.	1	8 906	8 906
97	149	247-211-0305РСНБ РК 2022	Реле промежуточные типа РЭК78 3(MY3), 5 А, 220 В, АС	шт.	1	978	978
98	150	247-211-0501РСНБ РК 2022	Разъем РРМ78 для РЭК78 3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)	шт.	1	440	440
99	151	247-216-0801РСНБ РК 2022	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В	шт.	2	588	1 176
100	152	1308-0103-1702 РСНБ РК 2022	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	8	4 561	36 488
101	153	247-215-0219РСНБ РК 2022	Шина медная марки М1 размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	2	48 989	97 978
			Итого по подразделу: ВУ-2 (АВР-400А НА 2ввода)				**894 971**
			Подраздел: РУ-1				
102	154	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	63 078	63 078
103	155	247-201-0821РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	120 418	120 418
104	156	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 467	7 467
105	157	247-204-3430РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	1	49 339	49 339
106	158	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 579	6 579
107	159	247-301-0227РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	99 395	99 395

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	160	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	16 920	50 760
109	161	247-302-0516РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	3	3 438	10 314
110	162	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 467	104 538
111	163	247-204-3419РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	16 517	16 517
112	164	247-204-3410РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	2	12 624	25 248
113	165	247-204-3408РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 80А 25кА	шт.	2	12 531	25 062
114	166	247-204-3405РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 40А 25кА	шт.	1	12 510	12 510
115	167	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4 182
116	168	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	1 964	7 856
117	169	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
118	170	247-204-0715РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	624	624
			Итого по подразделу: РУ-1				**605 903**
			Подраздел: РУ-2				
119	171	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	63 078	63 078
120	172	247-201-0821РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	120 418	120 418
121	173	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 467	7 467
122	174	247-204-3430РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА	шт.	1	49 339	49 339
123	175	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 579	6 579
124	176	247-301-0227РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	99 395	99 395
125	177	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	3	16 920	50 760

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	178	247-302-0516РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 400/5А	шт.	3	3 438	10 314
127	179	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 467	89 604
128	180	247-204-3410РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 125А 25кА	шт.	2	12 624	25 248
129	181	247-204-3409РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 100А 25кА	шт.	2	12 580	25 160
130	182	247-204-3407РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	2	12 477	24 954
131	183	247-204-3406РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 50А 25кА	шт.	1	12 515	12 515
132	184	247-204-0761РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162
133	185	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1 964	5 892
134	186	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
			Итого по подразделу: РУ-2				**594 901**
			Подраздел: ВУ-Ст				
135	187	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	63 078	63 078
136	188	515-301-0301РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	1 718 377	1 718 377
137	189	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	6 579	13 158
138	190	247-301-0227РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	2	99 395	198 790
139	191	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	16 920	101 520
140	192	247-302-0507РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	3	2 987	8 961
141	193	247-302-0510РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 200/5А	шт.	3	2 987	8 961
			Итого по подразделу: ВУ-Ст				**2 112 845**
			Подраздел: РУ-Ст				
142	194	6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	63 078	63 078

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
143	195	515-301-0315РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А	шт.	1	811 734	811 734
			Итого по подразделу: РУ-Ст				**874 812**
			Подраздел: ПР-СС2				
144	196	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
145	197	247-201-0220РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 958	7 958
146	198	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
147	199	247-204-2502РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А	шт.	1	754	754
148	200	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	2 875
			Итого по подразделу: ПР-СС2				**71 744**
			Подраздел: ПР-Ср1				
149	201	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
150	202	247-201-0903РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 18 модулей IP41	шт.	1	5 966	5 966
151	203	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	7 467	59 736
152	204	247-204-2527РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
153	205	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 151	4 302
154	206	247-204-0719РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	843	843
155	207	247-204-0716РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	683	683
156	208	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
			Итого по подразделу: ПР-Ср1				**91 434**
			Подраздел: ПР-Ср3				
157	209	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
158	210	247-201-0902РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	4 269	4 269

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	211	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
160	212	247-204-2527РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
161	213	247-204-0719РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	843	843
162	214	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2 300
			Итого по подразделу: ПР-Ср3				**70 393**
			Подраздел: ПР-Ср3				
163	215	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
164	216	247-201-0902РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	4 269	4 269
165	217	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
166	218	247-204-2527РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
167	219	247-204-0717РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	697	697
168	220	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2 300
			Итого по подразделу: ПР-Ср3				**70 247**
			Подраздел: ПР-В3				
169	221	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
170	222	247-201-0809РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18 271	18 271
171	223	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
172	224	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
173	225	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
174	226	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4 032
175	227	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
176	228	6124-0302-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	1	34 582	34 582
177	229	247-208-0105РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 852	2 852
			Итого по подразделу: ПР-В3				**136 566**
			Подраздел: ПР-К1.2				
178	230	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
179	231	247-201-0221РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 347	9 347
180	232	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 467	37 335
181	233	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
182	234	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	16 164
			Итого по подразделу: ПР-К1.2				**80 460**
			Подраздел: ПР-К2.2				
183	235	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
184	236	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
185	237	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 467	67 203
186	238	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
187	239	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
188	240	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4 041	28 287
			Итого по подразделу: ПР-К2.2				**125 054**
			Подраздел: ПР-К3.2				
189	241	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
190	242	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	243	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
192	244	247-204-2525РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
193	245	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4 182
194	246	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12 123
			Итого по подразделу: ПР-К3.2				**88 580**
			Подраздел: ПР-0				
195	247	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
196	248	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
197	249	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
198	250	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
199	251	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	6	4 041	24 246
			Итого по подразделу: ПР-0				**104 053**
			Подраздел: ПР-1.2				
200	252	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
201	253	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
202	254	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	17	7 467	126 939
203	255	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
204	256	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
205	257	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	15	4 041	60 615
			Итого по подразделу: ПР-1.2				**220 029**
			Подраздел: ПР-2.2				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	258	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
207	259	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
208	260	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 467	67 203
209	261	247-204-2526РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
210	262	247-204-0761РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162
211	263	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4 041	28 287
			Итого по подразделу: ПР-2.2				**125 831**
			Подраздел: ПР-3.2				
212	264	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
213	265	247-201-0221РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 347	9 347
214	266	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 467	37 335
215	267	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
216	268	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	16 164
			Итого по подразделу: ПР-3.2				**80 460**
			Подраздел: ЩОВ				
217	269	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
218	270	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
219	271	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 467	89 604
220	272	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
221	273	247-204-2446РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 40А 30 мА	шт.	1	6 055	6 055
222	274	247-208-0145РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	6 062	6 062

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
223	275	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	575	3 450
224	276	247-204-0709РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	649	649
225	277	245-712-0102РСНБ РК 2022	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	19 452	19 452
226	278	245-712-0301РСНБ РК 2022	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1 800	1 800
227	279	6124-0303-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	4	34 697	138 788
228	280	515-301-0211РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	369 976	369 976
229	281	515-301-0208РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	338 808	338 808
230	282	515-301-0209РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А	шт.	2	368 882	737 764
231	283	6124-0103-1501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	2	18 101	36 202
232	284	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конденсаторная установка, 75 квар УКМ-58-0,4-75-25 У3 75 квар	шт.	1	388 564	388 564
233	285	ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конденсаторная установка, 60 квар УКМ-58-0,4-60-25 У3 60 квар.	шт.	1	384 148	384 148
			Итого по подразделу: ЩОВ				**2 548 627**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**9 791 881**
			Раздел: Электроустановочные изделия				
			Подраздел: ШЗ				
234	340	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
235	341	247-201-0809РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18 271	18 271
236	342	СТПрайсРСНБ РК 2022	Изолятор шинный SM-40.	шт	10	367	3 672
237	343	6124-0103-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	0.7	4 018	2 813
238	344	СТПрайс ЕСЦ РСНБ РК 2023	Медная полоса, сечением 15х3 мм	шт	5	2 658	13 292
			Итого по подразделу: ШЗ				**53 403**
			Итого по разделу: Электроустановочные изделия				**53 403**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по отделу: Блок "Б,Д"				**9 845 284**
			Отдел: Блок "В"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ПР-К1.3				
239	358	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
240	359	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
241	360	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 467	67 203
242	361	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
243	362	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	8	4 041	32 328
			Итого по подразделу: ПР-К1.3				**127 004**
			Подраздел: ПР-К2.3				
244	363	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
245	364	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
246	365	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 467	104 538
247	366	247-204-2526РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2 965
248	367	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
249	368	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	12	4 041	48 492
			Итого по подразделу: ПР-К2.3				**186 286**
			Подраздел: ПР-К3.3				
250	369	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
251	370	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
252	371	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 467	104 538

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
253	372	247-204-2525РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А	шт.	1	2 259	2 259
254	373	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	13	4 041	52 533
			Итого по подразделу: ПР-К3.3				**187 530**
			Подраздел: ПР-1.3				
255	374	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
256	375	247-201-0223РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 845	12 845
257	376	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	16	7 467	119 472
258	377	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
259	378	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
260	379	247-204-0716РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	683	683
261	380	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С20 30 мА	шт.	13	4 041	52 533
			Итого по подразделу: ПР-1.3				**205 163**
			Подраздел: ПР-2.3				
262	381	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
263	382	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
264	383	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 467	74 670
265	384	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
266	385	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	9	4 041	36 369
			Итого по подразделу: ПР-2.3				**138 512**
			Подраздел: ПР-3.3				
267	386	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
268	387	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
269	388	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	7 467	59 736
270	389	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
271	390	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4 041	28 287
			Итого по подразделу: ПР-3.3				**115 496**
			Подраздел: ПР-СС3				
272	391	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
273	392	247-201-0220РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 958	7 958
274	393	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
275	394	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
276	395	247-204-0714РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	679	679
277	396	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	2 875
			Итого по подразделу: ПР-СС3				**81 395**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**1 041 386**
			Итого по отделу: Блок "В"				**1 041 386**
			Отдел: Блок "Г,Ж"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ЩС-К2.2,ЩС-К3.1				
278	436	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	2	15 355	30 710
279	437	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9 924	19 848
280	438	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 467	104 538
281	439	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
282	440	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5 329	10 658
283	441	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4 041	40 410

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ЩС-К2.2,ЩС-К3.1				**210 092**
			Подраздел: ЩС-2.2				
284	442	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
285	443	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
286	444	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
287	445	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
288	446	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
289	447	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
			Итого по подразделу: ЩС-2.2				**105 046**
			Подраздел: ПР-В2				
290	448	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
291	449	247-201-0105РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	13 642	13 642
292	450	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 467	74 670
293	451	247-204-0763РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 576	2 576
294	452	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
295	453	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
296	454	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 151	6 453
297	455	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6 048
298	456	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
			Итого по подразделу: ПР-В2				**126 739**
			Подраздел: ПР-СС1				
299	457	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
300	458	247-201-0902РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	4 269	4 269
301	459	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	7 467	59 736
302	460	247-204-2522РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 259	2 259
303	461	247-204-0714РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	679	2 037
304	462	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2 300
305	463	6119-0602-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 30 кг	шт.	2	24 606	49 212
306	464	515-301-0211РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	1	369 976	369 976
307	465	515-301-0208РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А	шт.	1	338 808	338 808
			Итого по подразделу: ПР-СС1				**843 952**
			Подраздел: ШУВ				
308	466	6119-0602-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	18 457	18 457
309	467	247-201-0803РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 513	25 513
310	468	6119-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка переключателя	шт.	8	4 453	35 624
311	469	247-206-0210РСНБ РК 2022	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22 I-O PPBB 22 мм, неон	шт.	8	2 080	16 640
			Итого по подразделу: ШУВ				**96 234**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**1 382 063**
			Итого по отделу: Блок "Г,Ж"				**1 382 063**
			Отдел: Блок "Е"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ЩС-К3.2				
312	526	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
313	527	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
314	528	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
315	529	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
316	530	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
317	531	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
			Итого по подразделу: ЩС-К3.2				**105 046**
			Подраздел: ПР-В4				
318	532	6119-0602-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	18 457	18 457
319	533	247-201-0804РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	37 697	37 697
320	534	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
321	535	247-204-0762РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 615	2 615
322	536	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
323	537	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 151	6 453
324	538	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4 032
325	539	6119-0602-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 40 кг	шт.	2	37 645	75 290
326	540	515-301-0211РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А	шт.	2	369 976	739 952
			Итого по подразделу: ПР-В4				**942 094**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**1 047 140**
			Итого по отделу: Блок "Е"				**1 047 140**
			Отдел: Блок "И,К"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ПР-Н				
327	586	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
328	587	247-201-0119РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	16 762	16 762

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
329	588	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 467	74 670
330	589	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
331	590	247-204-0758РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 151	2 151
332	591	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6 048
333	592	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2 300
334	593	247-204-0170РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3 982
			Итого по подразделу: ПР-Н				**123 527**
			Подраздел: ПР-Вст				
335	594	6119-0602-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 20 кг	шт.	1	18 457	18 457
336	595	247-201-0804РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	37 697	37 697
337	596	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	12	7 467	89 604
338	597	247-204-1835РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255	9 255
339	598	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
340	599	247-204-0763РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 576	2 576
341	600	247-204-0761РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2 162
342	601	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3 928
343	602	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6 048
344	603	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
345	604	6124-0302-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А	шт.	6	34 582	207 492
346	605	247-208-0105РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	3	2 852	8 556
347	606	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	3	2 543	7 629

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: ПР-Вст				**400 458**
			Подраздел: ПР-Ст.1				
348	607	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
349	608	247-201-0905РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	12 433	12 433
350	609	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 467	74 670
351	610	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
352	611	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 016	8 064
353	612	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
			Итого по подразделу: ПР-Ст.1				**132 986**
			Подраздел: ПР-СТ2				
354	613	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
355	614	247-201-0904РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 725	7 725
356	615	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
357	616	247-204-2529РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2 824
358	617	247-204-0235РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С40 100 мА	шт.	4	7 269	29 076
359	618	247-204-0226РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	5 677	5 677
			Итого по подразделу: ПР-СТ2				**105 459**
			Подраздел: ПР-СТ3				
360	619	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
361	620	247-201-0904РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	1	7 725	7 725
362	621	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	622	247-204-2529РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2 824	2 824
364	623	247-204-0235РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С40 100 мА	шт.	2	7 269	14 538
365	624	247-204-0230РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	2	6 078	12 156
366	625	247-204-0226РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	5 677	5 677
			Итого по подразделу: ПР-СТ3				**103 077**
			Подраздел: ПР-Ст4				
367	626	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
368	627	247-201-0905РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	12 433	12 433
369	628	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	9	7 467	67 203
370	629	247-204-2527РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
371	630	247-204-0230РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	1	6 078	6 078
372	631	247-204-0218РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	3	5 772	17 316
373	632	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	16 164
			Итого по подразделу: ПР-Ст4				**137 373**
			Подраздел: ПР-Ст5				
374	633	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
375	634	247-201-0905РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	12 433	12 433
376	635	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	14	7 467	104 538
377	636	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
378	637	247-204-0218РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	2	5 772	11 544
379	638	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4 041	44 451
			Итого по подразделу: ПР-Ст5				**190 580**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: ЩС-2.3				
380	639	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
381	640	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
382	641	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
383	642	247-204-2524РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2 259	2 259
384	643	247-204-0760РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2 091
385	644	247-204-0757РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2 016
386	645	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12 123
			Итого по подразделу: ЩС-2.3				**88 570**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**1 282 030**
			Итого по отделу: Блок "И,К"				**1 282 030**
			Отдел: Блок "Л"				
			Раздел: Электрооборудование				
			Подраздел: ЩС-К2.3				
387	703	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
388	704	247-201-0103РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9 924
389	705	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7 467	52 269
390	706	247-204-0759РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1 964
391	707	247-204-3001РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5 329
392	708	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
			Итого по подразделу: ЩС-К2.3				**105 046**
			Подраздел: ЩОП				
393	709	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
394	710	247-201-0220РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 958	7 958
395	711	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 467	37 335
396	712	247-204-0715РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	624	624
397	713	247-204-2410РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 32А 30 мА	шт.	1	4 755	4 755
398	714	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
399	715	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	3 239	3 239
400	716	245-712-0201РСНБ РК 2022	Терморегулятор с датчиком модели ТР 111	шт.	1	6 054	6 054
			Итого по подразделу: ЩОП				**77 045**
			Итого по разделу: Электрооборудование				**182 091**
			Итого по отделу: Блок "Л"				**182 091**
			Итого по локальной смете: Силовое электрооборудование				**16 643 434**
			ИТОГО по акту:				**16 643 434**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	10445327.680 x 6.20%	647 610
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	16643434.680 + 647610.296	17 291 044
	Сметная прибыль, 5.00%	11092937.976 x 5.00%	554 646
	Непредвиденные расходы, 5.000%	17291044.976 x 5.000%	864 552
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		18 710 244
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	18710244.124 x 1.0557	19 752 404
	НДС (12%)	19752404.722 x 12%	2 370 288
	Итого с НДС	19752404.722 + 2370288.567	22 122 693

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	19.02.2025 12:56
Представители технического надзора		
880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА	технадзор по электрике	20.02.2025 04:59
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	19.02.2025 16:40
Представители заказчика		
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 09:51
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	20.02.2025 05:49
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	20.02.2025 07:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	20.02.2025 07:39
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 09:24 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

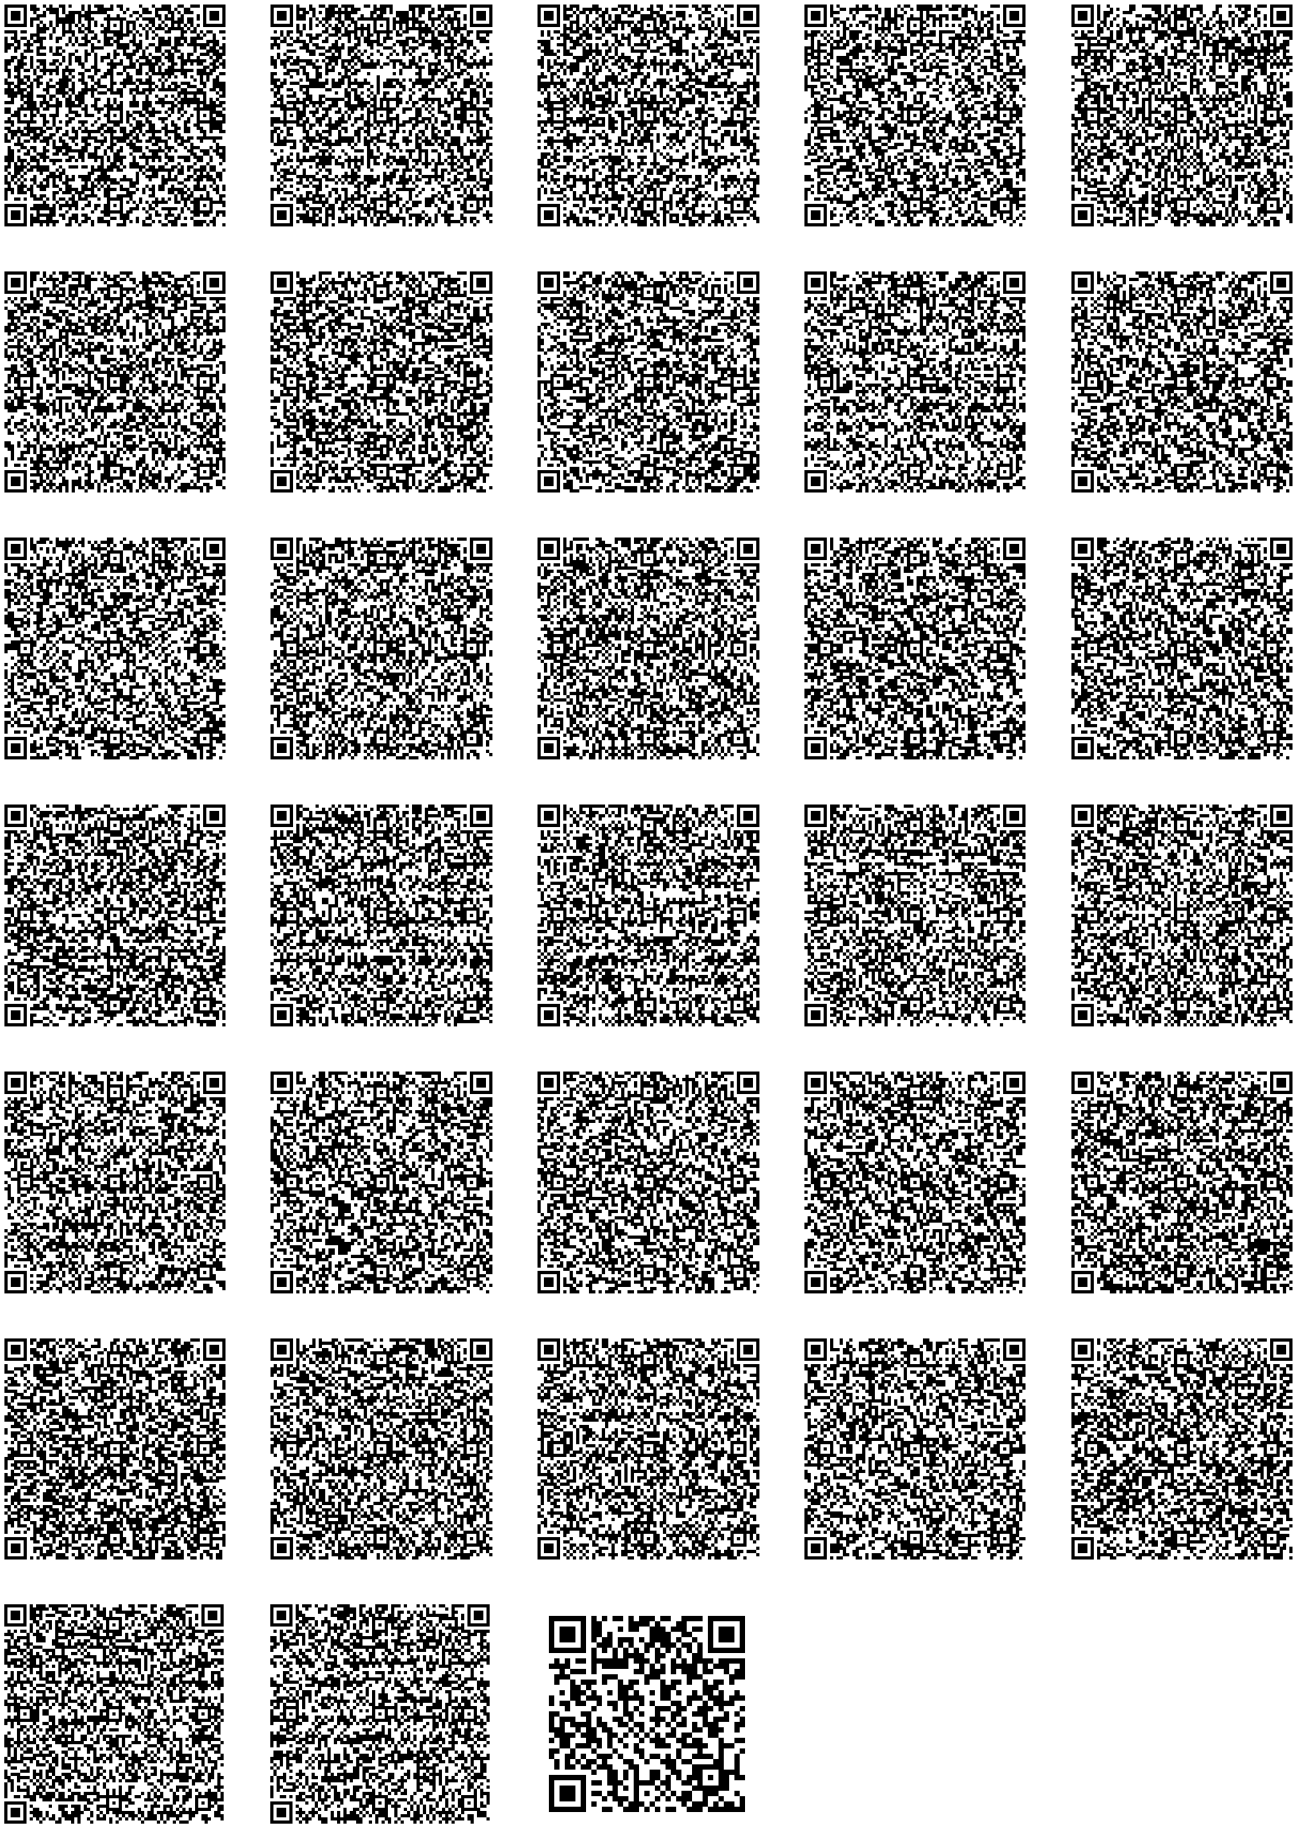

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроосвещение				
			Отдел: Блок "А"				
			Подраздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	42	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	3720	950	3 534 000
2	43	243-107-2702РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м	51	609	31 059
3	45	243-107-2502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	3080.4	470	1 447 788
4	46	243-107-2302РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	м	545.7	337	183 901
5	47	243-202-0103РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	117.3	432	50 674
			Итого по подразделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**5 247 422**
			Подраздел: ТРУБЫ 4780				
6	48	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	50	54	2 700
7	49	241-207-0301РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3670	45	165 150
			Итого по подразделу: ТРУБЫ 4780				**167 850**
			Подраздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов				
8	50	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60	995	59 700
9	51	243-142-0107РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	61.8	147	9 085

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Дополнительная система уравнивания потенциалов				**68 785**
			Итого по отделу: Блок "А"				**5 484 057**
			Отдел: Блок Б.Д				
			Подраздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
10	100	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	1835	950	1 743 250
11	101	243-107-2702РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	км	51	609	31 059
12	103	243-107-2502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	км	1387.2	470	651 984
13	104	243-107-2302РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	км	204	337	68 748
14	105	243-202-0103РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	м	229.5	432	99 144
			Итого по подразделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**2 594 185**
			Подраздел: ТРУБЫ				
15	106	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	52.25	54	2 821
16	107	241-207-0301РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1802.85	45	81 128
			Итого по подразделу: ТРУБЫ				**83 949**
			Подраздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов				
17	108	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80	995	79 600
18	109	243-142-0107РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	82.4	147	12 113
19	110	247-202-1201РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	21 804	65 412
			Итого по подразделу: Дополнительная система уравнивания потенциалов				**157 125**
			Итого по отделу: Блок Б.Д				**2 835 259**
			Отдел: Блок "В"				
			Подраздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
20	155	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	5950	950	5 652 500
21	156	243-107-2702РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	м	163.2	609	99 389
22	158	243-107-2502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	м	4314.6	470	2 027 862

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	159	243-107-2302РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	765	337	257 805
24	160	243-202-0103РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5	м	826.2	432	356 918
			Итого по подразделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**8 394 474**
			Подраздел: ТРУБЫ				
25	161	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	179.1	54	9 671
26	162	241-207-0301РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5847.9	45	263 156
			Итого по подразделу: ТРУБЫ				**272 827**
			Подраздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов				
27	163	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	45	995	44 775
28	164	243-142-0107РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	46.35	147	6 813
29	165	247-202-1201РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	21 804	65 412
			Итого по подразделу: Дополнительная система уравнивания потенциалов				**117 000**
			Итого по отделу: Блок "В"				**8 784 301**
			Отдел: Блок И.К				
			Подраздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
30	256	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	465	950	441 750
31	257	243-107-2702РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	м	45.9	609	27 953
32	259	243-107-2502РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	м	326.4	470	153 408
33	260	243-107-2302РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	м	76.5	337	25 780
			Итого по подразделу: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**648 891**
			Подраздел: ТРУБЫ				
34	261	241-207-0302РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	45.6	54	2 462
35	262	241-207-0301РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	424.2	45	19 089
			Итого по подразделу: ТРУБЫ				**21 551**
			Подраздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	263	6119-0102-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	25	995	24 875
37	264	243-142-0107РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	м	25.75	147	3 784
38	265	247-202-1201РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	21 804	21 804
			Итого по подразделу: Дополнительная система уравнивания потенциалов				**50 464**
			Итого по отделу: Блок И.К				**720 906**
			Итого по локальной смете: Электроосвещение				**17 824 524**
			ИТОГО по акту:				**17 824 524**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	17824524.077 x 6.20%	1 105 120
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	17824524.077 + 1105120.459	18 929 644
	Сметная прибыль, 5.00%	18929644.536 x 5.00%	946 482
	Непредвиденные расходы, 5.000%	18929644.536 x 5.000%	946 482
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		20 822 608
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	20822608.989 x 1.0557	21 982 428
	НДС (12%)	21982428.310 x 12%	2 637 891
	Итого с НДС	21982428.310 + 2637891.397	24 620 319

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	18.02.2025 14:00
Представители технического надзора		
880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА	технадзор по электрике	19.02.2025 06:17
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	19.02.2025 09:07
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	19.02.2025 13:23
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 06:38 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:33
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	19.02.2025 12:58
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	19.02.2025 13:20 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

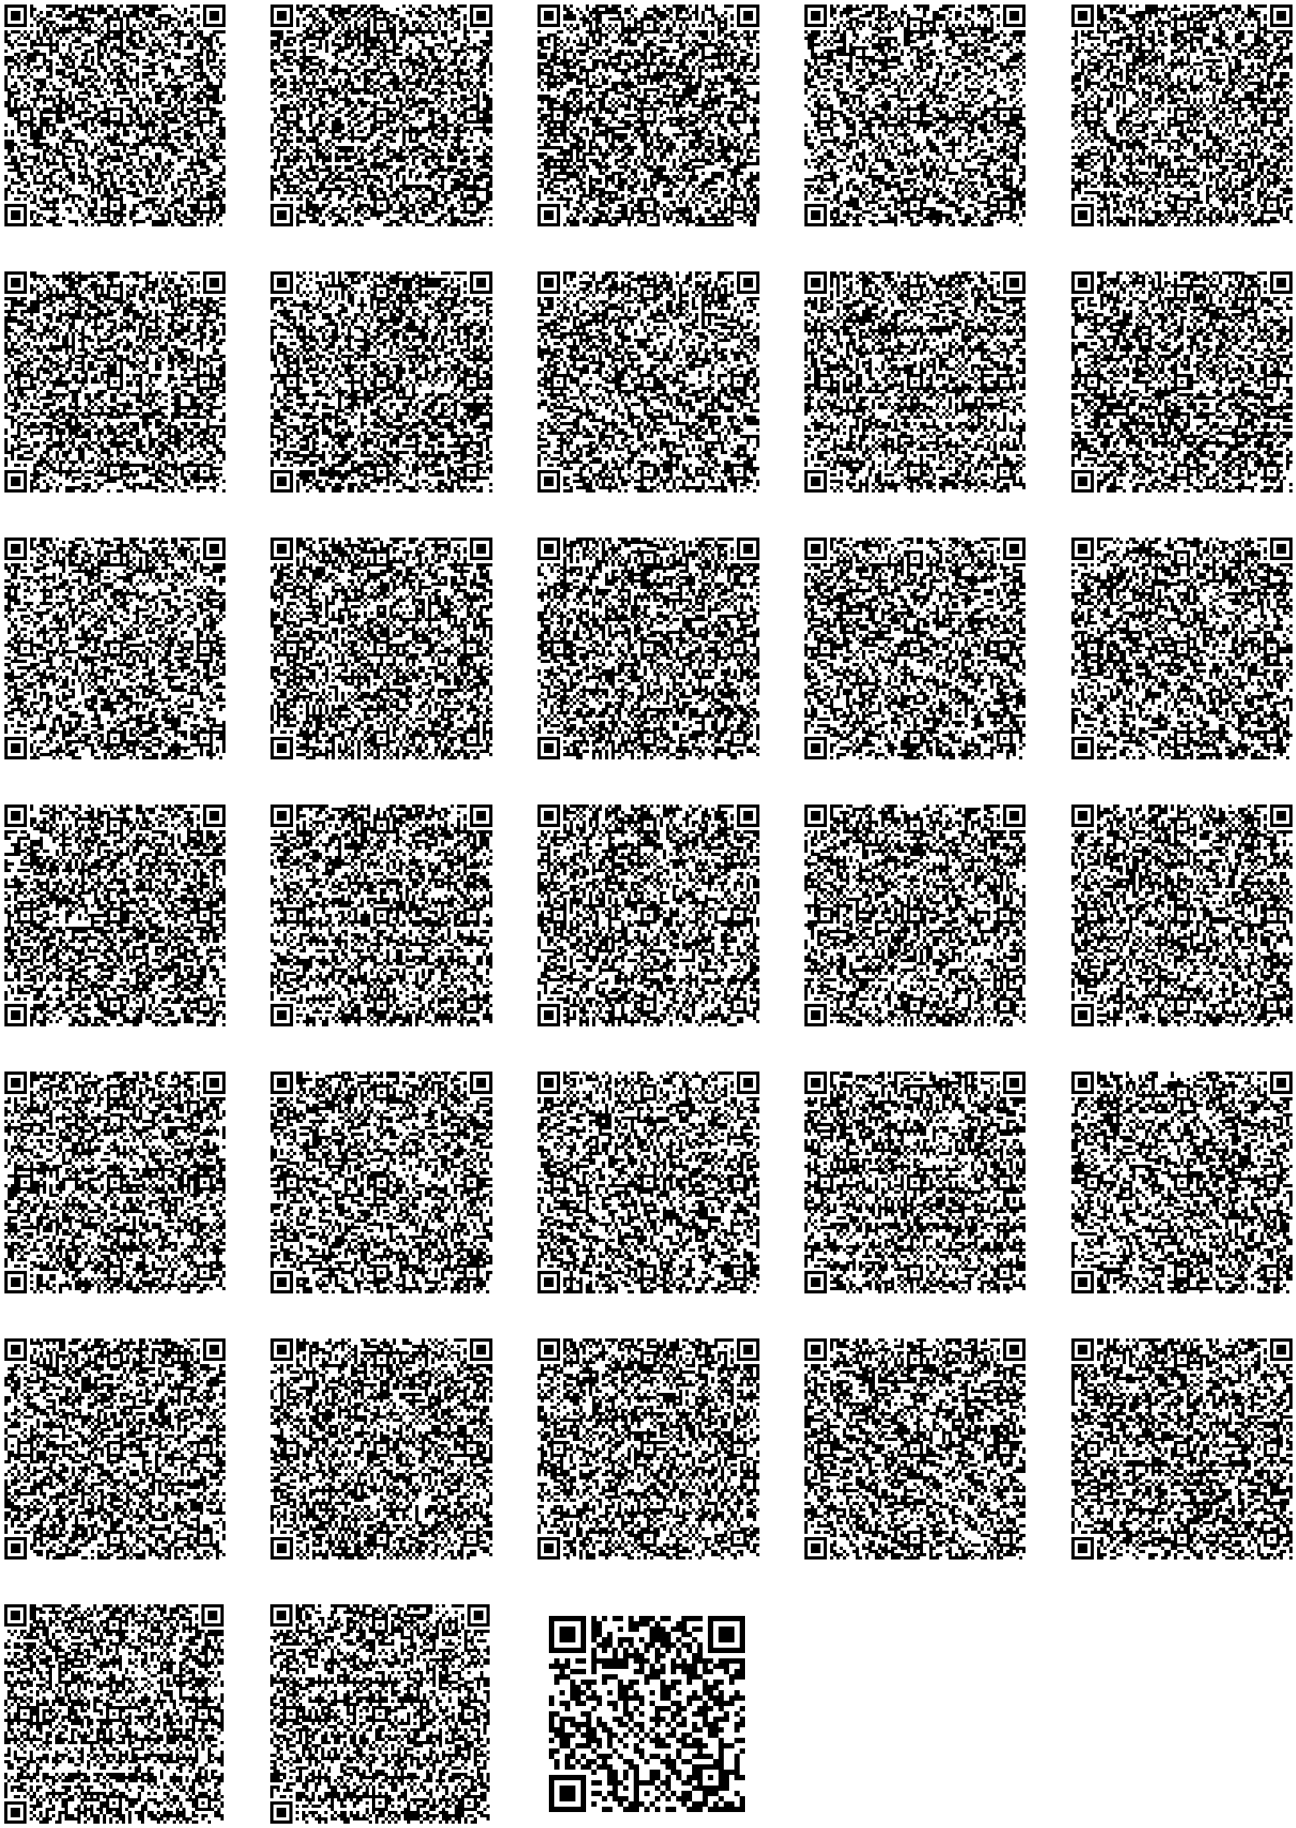

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок И, К				
			Раздел: Стены, перегородки /АР-13/				
			Подраздел: Утеплители наружные				
1	76	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	949	4 131	3 920 319
2	77	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	6.3444	66 535	422 125
3	78	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	84.1092	31 847	2 678 626
			Итого по подразделу: Утеплители наружные				**7 021 070**
			Итого по разделу: Стены, перегородки /АР-13/				**7 021 070**
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
4	85	6112-0401-0115ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	338.1215	11 166	3 775 464
5	87	217-109-0102РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1328.6186	27	35 873
6	88	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3341.436	54	180 438
7	89	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	409.7237	120	49 167
8	90	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	0.78132	31 847	24 883
9	91	231-305-0501СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	437.569	12 212	5 343 593
10	92	6112-0401-0112ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада гранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	79.69	22 280	1 775 493
11	93	217-109-0108РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	669.396	67	44 850

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	94	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	406.419	54	21 947
13	95	231-102-0401СпрСЦ 02.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	79.69	6 249	497 983
14	96	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	81.2838	15 753	1 280 464
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**13 030 155**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок И, К				**20 051 225**
			ИТОГО по акту:				**20 051 225**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				20051225.550 x 6.20%	1 243 175
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				20051225.550 + 1243175.946	21 294 401
		Сметная прибыль, 5.00%				21294401.496 x 5.00%	1 064 720
		Непредвиденные расходы, 5.000%				21294401.496 x 5.000%	1 064 720
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					23 423 841
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				23423841.645 x 1.0557	24 728 549
		НДС (12%)				24728549.625 x 12%	2 967 425
		Итого с НДС				24728549.625 + 2967425.955	27 695 975

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	02.02.2025 08:46
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	03.02.2025 05:56
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.02.2025 04:31
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	19.02.2025 15:46 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 03:37
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:42
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 13:03
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

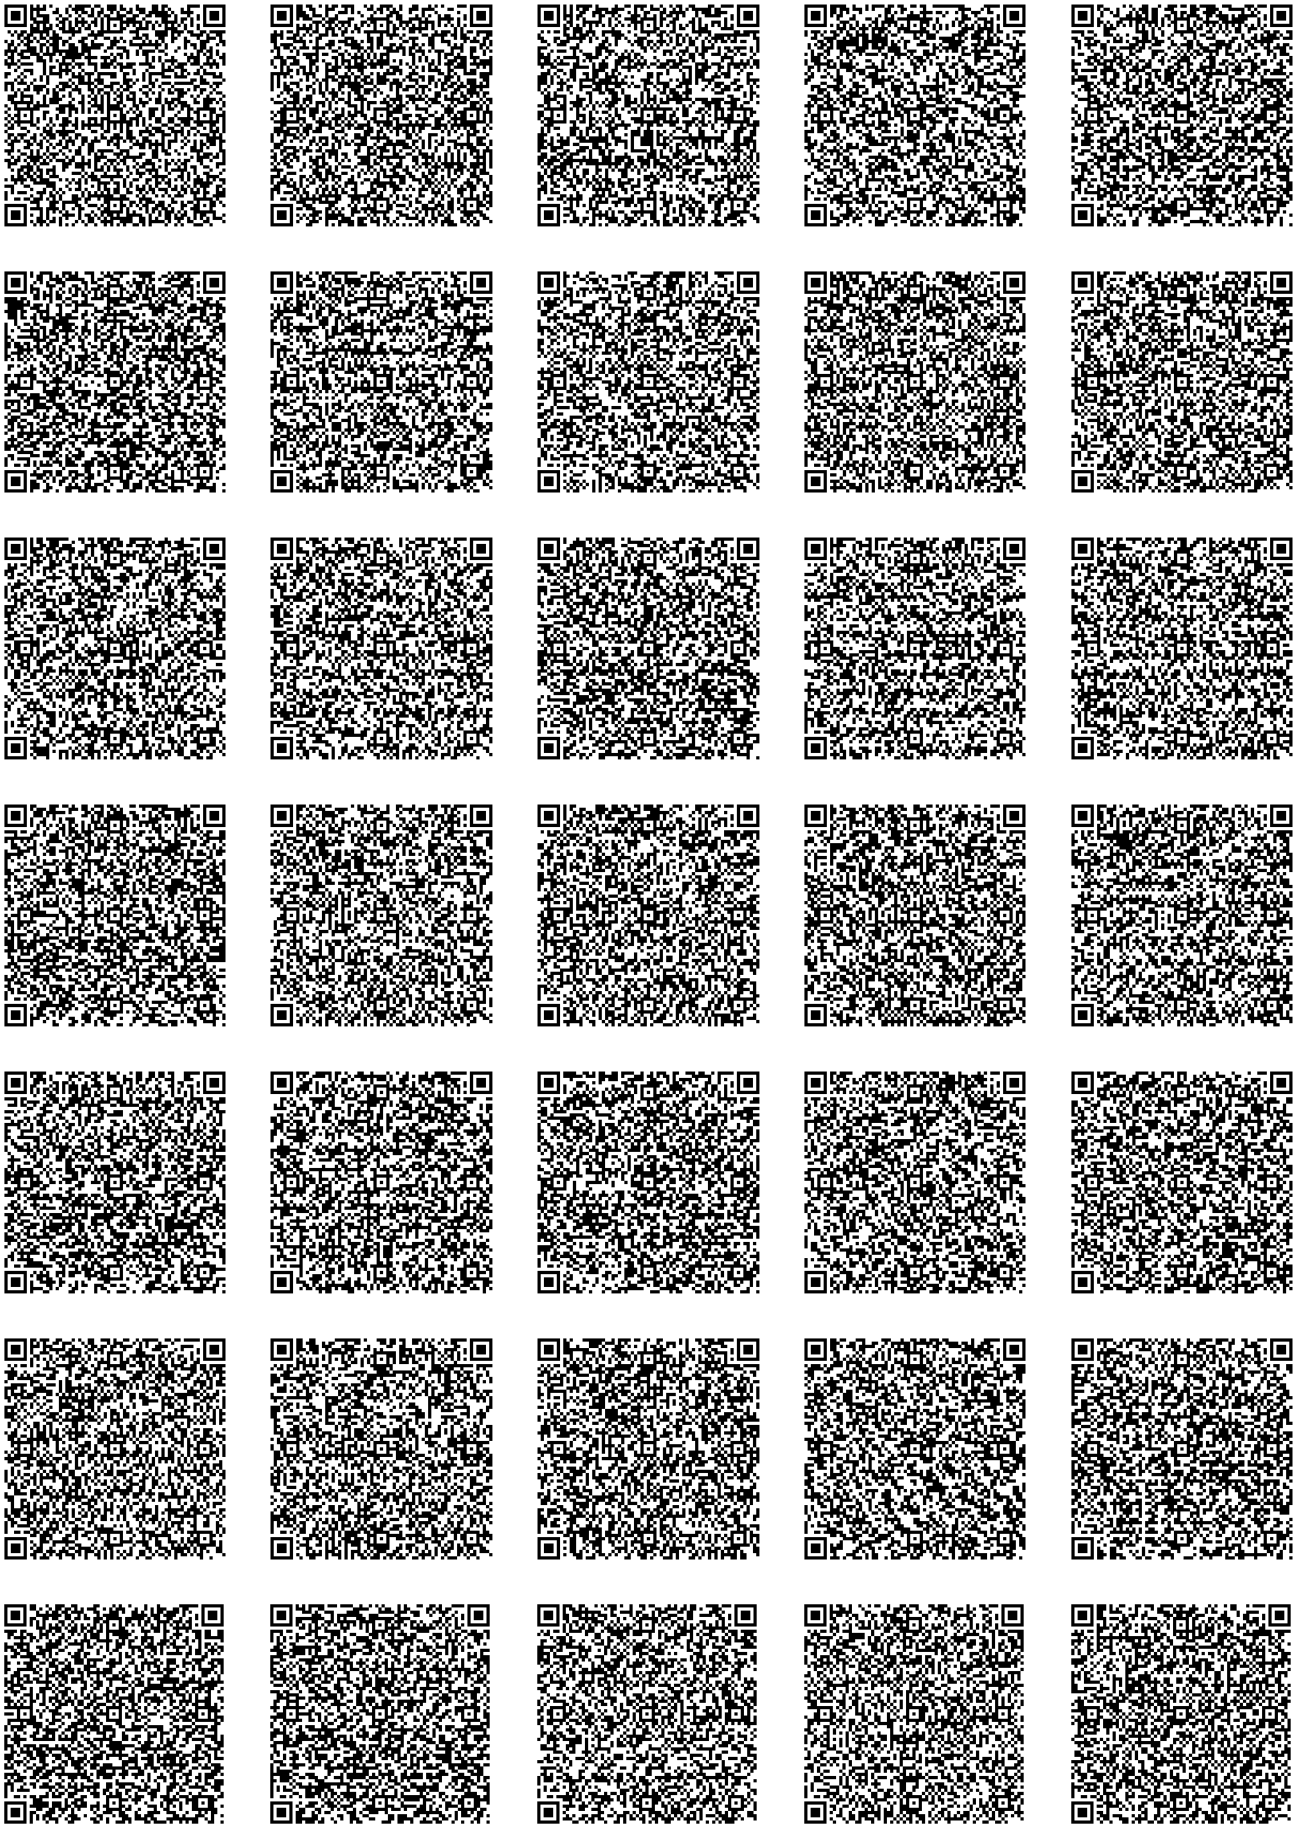

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок А				
			Раздел: Кровля /АР-6/				
			Подраздел: Кровля Тип1				
1	14	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	409.14	365	149 336
2	15	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	409.14	1 546	632 530
3	16	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.259842	21 513	134 668
4	17	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	409.14	283	115 787
5	18	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	14.606298	21 513	314 225
6	19	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.40914	75 517	30 897
7	20	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.40914	391 444	160 155
8	21	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	409.14	1 099	449 645
9	22	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	409.14	865	353 906
10	23	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	1411.533	1 636	2 309 268

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	24	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	470.511	1 791	842 685
			Итого по подразделу: Кровля Тип1				**5 493 102**
			Подраздел: Кровля Тип2				
12	30	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	409.14	365	149 336
13	31	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	75.21	1 546	116 275
14	32	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.150713	21 513	24 755
15	33	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	75.21	283	21 284
16	34	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2.684997	21 513	57 762
17	35	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.07521	75 517	5 680
18	36	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.07521	391 444	29 440
19	37	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	75.21	1 099	82 656
20	38	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	75.21	865	65 057
21	39	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	259.4745	1 636	424 500
22	40	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	86.4915	1 791	154 906
			Итого по подразделу: Кровля Тип2				**1 131 652**
			Подраздел: примечание п.11				
23	42	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.00208	75 517	157
24	43	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00208	391 444	814
25	44	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство аэраторов	шт.	5	3 663	18 315
26	45	246-301-0601РСНБ РК 2022	/аэратор/Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	5	9 113	45 565

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: примечание п.11				**64 851**
			Подраздел: Примыкания				
27	46	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	285.24	4 541	1 295 275
28	47	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	185.406	1 636	303 324
29	48	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	242.454	1 791	434 235
			Итого по подразделу: Примыкания				**2 032 834**
			Подраздел: Накрывочные элементы парапета				
30	49	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	73.13	8 990	657 439
31	50	6110-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов настенных	м	15	15 675	235 125
			Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета				**892 564**
			Итого по разделу: Кровля /АР-6/				**9 615 003**
			Раздел: Стены, перегородки /АР-13/				
			Подраздел: Утеплители наружные				
32	59	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	306.24	4 131	1 265 077
33	60	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	3.59091	66 535	238 921
34	61	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	24.05466	31 847	766 068
			Итого по подразделу: Утеплители наружные				**2 270 067**
			Итого по разделу: Стены, перегородки /АР-13/				**2 270 067**
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
35	68	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	618.8	11 166	6 909 520
36	70	217-109-0102РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	2431.52	27	65 651
37	71	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6115.2	54	330 221
38	72	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	749.84	120	89 981
39	73	231-305-0501СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	800.8	12 212	9 779 370

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	74	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада гранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	59.57	22 280	1 327 220
41	75	217-109-0108РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	500.388	67	33 526
42	76	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	303.807	54	16 406
43	77	231-102-0401СпрСЦ 02.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	59.57	6 249	372 253
44	78	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	60.7614	15 753	957 174
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**19 881 322**
			Раздел: Полы АР-15				
			Подраздел: Тип 7				
45	114	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	0.924	1 828	1 689
46	115	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0188496	21 513	405
47	116	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	0.924	111	102
48	117	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.0141372	21 513	304
49	118	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.002541	75 517	191
50	119	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.002541	391 444	994
			Итого по подразделу: Тип 7				**3 687**
			Подраздел: Тип 8				
51	128	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	11.202	1 828	20 477
52	129	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2285208	21 513	4 916
53	130	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	11.202	111	1 243
54	131	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.1713906	21 513	3 687
55	132	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.011202	75 517	845

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	133	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.011202	391 444	4 385
			Итого по подразделу: Тип 8				**35 554**
			Подраздел: Тип 10				
57	140	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	16.252	1 828	29 708
58	141	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.3315408	21 513	7 132
59	142	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	16.252	147	2 388
60	143	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.3315408	21 513	7 132
61	144	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.016252	75 517	1 227
62	145	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.016252	391 444	6 361
			Итого по подразделу: Тип 10				**53 951**
			Подраздел: Тип 12				
63	154	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	18.258	1 828	33 375
64	155	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.3724632	21 513	8 012
65	156	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	18.258	147	2 683
66	157	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.3724632	21 513	8 012
67	158	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 100х100	т	0.0502095	75 517	3 791
68	159	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.0502095	391 444	19 654
			Итого по подразделу: Тип 12				**75 531**
			Подраздел: Тип 8				
69	169	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	11.037	1 828	20 175
70	170	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2251548	21 513	4 843

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	171	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	11.037	111	1 225
72	172	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.1688661	21 513	3 632
73	173	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.011037	75 517	833
74	174	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.011037	391 444	4 320
			Итого по подразделу: Тип 8				**35 031**
			Подраздел: Тип 10				
75	181	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	27.612	1 828	50 474
76	182	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.5632848	21 513	12 117
77	183	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	27.612	147	4 059
78	184	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.5632848	21 513	12 117
79	185	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.027612	75 517	2 085
80	186	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.027612	391 444	10 808
			Итого по подразделу: Тип 10				**91 663**
			Подраздел: Тип 11				
81	195	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	7.579	1 828	13 854
82	196	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.1546116	21 513	3 326
83	197	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	7.579	147	1 114
84	198	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.1546116	21 513	3 326
85	199	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.007579	75 517	572
86	200	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.007579	391 444	2 966

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 11				**25 159**
			Подраздел: Тип 8				
87	209	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	10.911	1 828	19 945
88	210	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.2225844	21 513	4 788
89	211	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	10.911	111	1 211
90	212	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.1669383	21 513	3 591
91	213	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.010911	75 517	824
92	214	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.010911	391 444	4 271
			Итого по подразделу: Тип 8				**34 631**
			Подраздел: Тип 10				
93	221	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	35.156	1 828	64 265
94	222	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.7171824	21 513	15 428
95	223	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	35.156	147	5 167
96	224	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.7171824	21 513	15 428
97	225	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 3вр 100х100	т	0.035156	75 517	2 654
98	226	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.035156	391 444	13 761
			Итого по подразделу: Тип 10				**116 706**
			Подраздел: Тип 23				
99	235	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	4.6125	36 459	168 167
100	236	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки 5вр 50х50	т	0.2895625	75 517	21 867
101	237	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.2895625	391 444	113 348

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: Тип 23				**303 382**
			Итого по разделу: Полы АР-15				**775 300**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок А				**32 541 693**
			ИТОГО по акту:				**32 541 693**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				32541693.400 x 6.20%	2 017 584
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				32541693.400 + 2017584.929	34 559 278
		Сметная прибыль, 5.00%				34559278.329 x 5.00%	1 727 963
		Непредвиденные расходы, 5.000%				34559278.329 x 5.000%	1 727 963
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					38 015 206
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				38015206.162 x 1.0557	40 132 653
		НДС (12%)				40132653.145 x 12%	4 815 918
		Итого с НДС				40132653.145 + 4815918.377	44 948 571

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	02.02.2025 08:48
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	03.02.2025 05:51
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.02.2025 04:38
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:41
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 03:39
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 12:38
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	19.02.2025 16:05 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

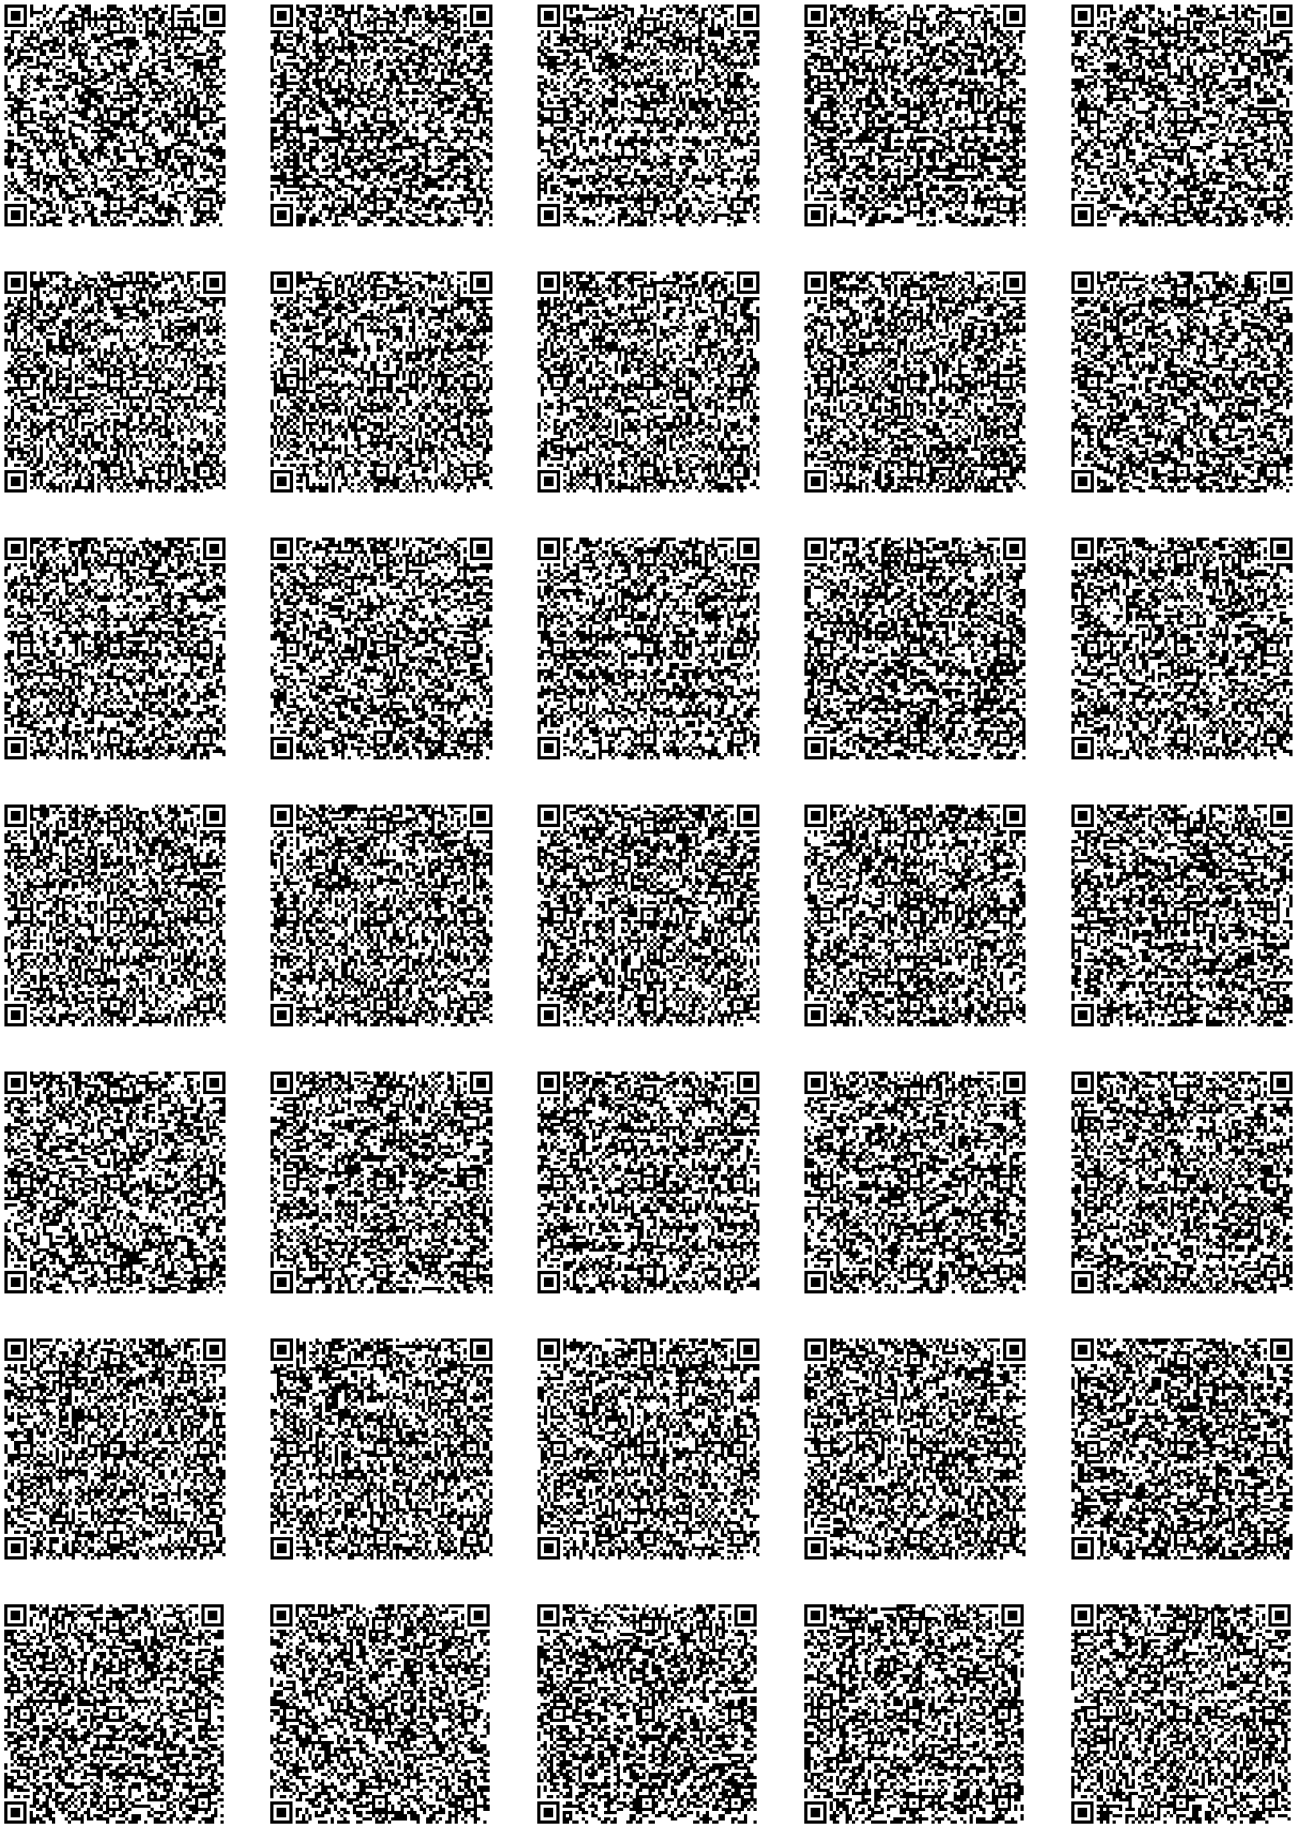

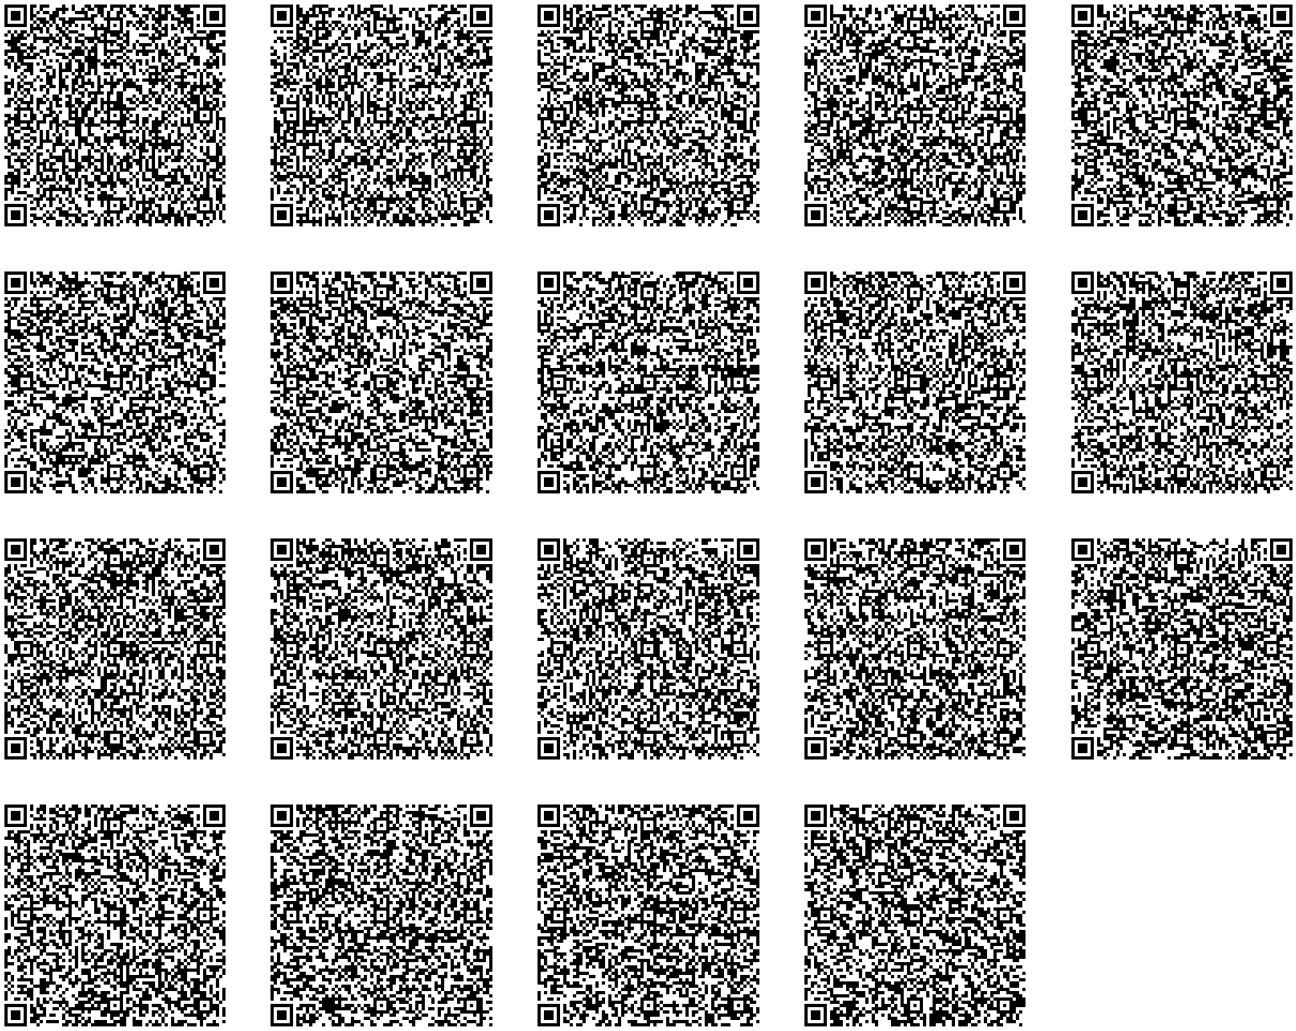

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок В				
			Раздел: Кровля /АР-6/				
			Подраздел: Кровля Тип1				
1	20	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	461.35	365	168 393
2	21	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	461.35	1 546	713 247
3	22	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	7.058655	21 513	151 853
4	23	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	461.35	283	130 562
5	24	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16.470195	21 513	354 323
6	25	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.46135	75 517	34 840
7	26	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.46135	391 444	180 593
8	27	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	461.35	1 099	507 023
9	28	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	461.35	865	399 068
10	29	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	1591.6575	1 636	2 603 952

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	30	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	530.5525	1 791	950 220
			Итого по подразделу: Кровля Тип1				**6 194 075**
			Подраздел: Кровля Тип2				
12	36	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	47.48	365	17 330
13	37	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	47.48	1 546	73 404
14	38	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0.726444	21 513	15 628
15	39	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	47.48	283	13 437
16	40	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.695036	21 513	36 465
17	41	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.04748	75 517	3 586
18	42	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.04748	391 444	18 586
19	43	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	47.48	1 099	52 181
20	44	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	47.48	865	41 070
21	45	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	163.806	1 636	267 987
22	46	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	54.602	1 791	97 792
			Итого по подразделу: Кровля Тип2				**637 466**
			Подраздел: Примыкания				
23	48	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	190.32	4 541	864 243
24	49	235-103-0113РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	123.708	1 139	140 903
25	50	235-103-0116РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	161.772	867	140 256
			Итого по подразделу: Примыкания				**1 145 402**
			Подраздел: Накрывочные элементы парапета				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	51	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	70.5475	8 990	634 222
27	52	6110-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов настенных	м	15	15 675	235 125
			Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета				**869 347**
			Итого по разделу: Кровля /АР-6/				**8 846 290**
			Раздел: Стены, перегородки /АР-13/				
			Подраздел: Утеплители наружные				
28	61	1126-0201-0108РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	962.4	4 131	3 975 674
29	62	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	8.5017	66 535	565 661
30	63	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	81.1614	31 847	2 584 747
			Итого по подразделу: Утеплители наружные				**7 126 082**
			Итого по разделу: Стены, перегородки /АР-13/				**7 126 082**
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
31	70	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	658.9285	11 166	7 357 595
32	72	217-109-0102РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	2589.2014	27	69 908
33	73	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6511.764	54	351 635
34	74	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	798.4663	120	95 816
35	75	231-305-0501СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	852.731	12 212	10 413 551
36	76	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада гранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	43.74	22 280	974 526
37	77	217-109-0108РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	367.416	67	24 617
38	78	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	223.074	54	12 046
39	79	231-102-0401СпрСЦ 02.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	43.74	6 249	273 331
40	80	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	44.6148	15 753	702 817
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**20 275 843**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы АР-17				
			Подраздел: Тип 8				
41	190	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	117.54	7 414	871 442
42	191	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	119.8908	3 632	435 443
43	192	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	84.83	1 592	135 049
44	193	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	51.40698	1 416	72 792
			Итого по подразделу: Тип 8				**1 514 726**
			Подраздел: Тип 15 с/у				
45	217	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	37.8	7 414	280 249
46	218	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	38.556	3 632	140 035
47	219	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	62.08	1 592	98 831
48	220	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.62048	1 416	53 270
			Итого по подразделу: Тип 15 с/у				**572 386**
			Подраздел: Тип 8				
49	229	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	116.71	7 414	865 288
50	230	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	119.0442	3 632	432 369
51	231	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	84.27	1 592	134 158
52	232	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	51.06762	1 416	72 312
			Итого по подразделу: Тип 8				**1 504 127**
			Подраздел: Тип 15 с/у				
53	256	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	37.8	7 414	280 249
54	257	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	38.556	3 632	140 035

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	258	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	62.08	1 592	98 831
56	259	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	37.62048	1 416	53 270
			Итого по подразделу: Тип 15 с/у				**572 386**
			Подраздел: Тип 19				
57	277	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	38.08	7 414	282 325
58	278	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	38.8416	3 632	141 073
59	279	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	51.42	1 592	81 861
60	280	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	31.16052	1 416	44 123
			Итого по подразделу: Тип 19				**549 382**
			Подраздел: Тип 20				
61	285	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	20.72	7 414	153 618
62	286	231-302-0103РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м2	21.1344	3 632	76 760
63	287	6109-0401-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	39.82	1 592	63 393
64	288	233-202-0101РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24.13092	1 416	34 169
			Итого по подразделу: Тип 20				**327 940**
			Подраздел: Примечание п.7				
65	291	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	138	991	136 758
66	292	233-204-0201РСНБ РК 2022	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	138	957	132 066
			Итого по подразделу: Примечание п.7				**268 824**
			Подраздел: Примечание п.8				
67	293	6109-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	55	991	54 505

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	294	СТПРАЙС-ЛИСТ ЕСЦ РСНБ РК 2023	Закладной профиль Dewmark Standart SV 21/50/80.	м	19	16 301	309 729
69	295	СТПРАЙС-ЛИСТ ЕСЦ РСНБ РК 2023	Угловой закладной профиль Dewmark Standart SV-E 21/50/80.	м	36	17 259	621 324
			Итого по подразделу: Примечание п.8				**985 558**
			Итого по разделу: Полы АР-17				**6 295 329**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок В				**42 543 545**
			ИТОГО по акту:				**42 543 545**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	42543545.590 x 6.20%	2 637 699
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	42543545.590 + 2637699.745	45 181 245
	Сметная прибыль, 5.00%	45181245.335 x 5.00%	2 259 062
	Непредвиденные расходы, 5.000%	45181245.335 x 5.000%	2 259 062
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		49 699 369
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	49699369.869 x 1.0557	52 467 624
	НДС (12%)	52467624.771 x 12%	6 296 114
	Итого с НДС	52467624.771 + 6296114.972	58 763 739

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	02.02.2025 08:47
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	03.02.2025 05:52
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.02.2025 04:34
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 12:43
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:41
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	19.02.2025 15:58 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 03:38

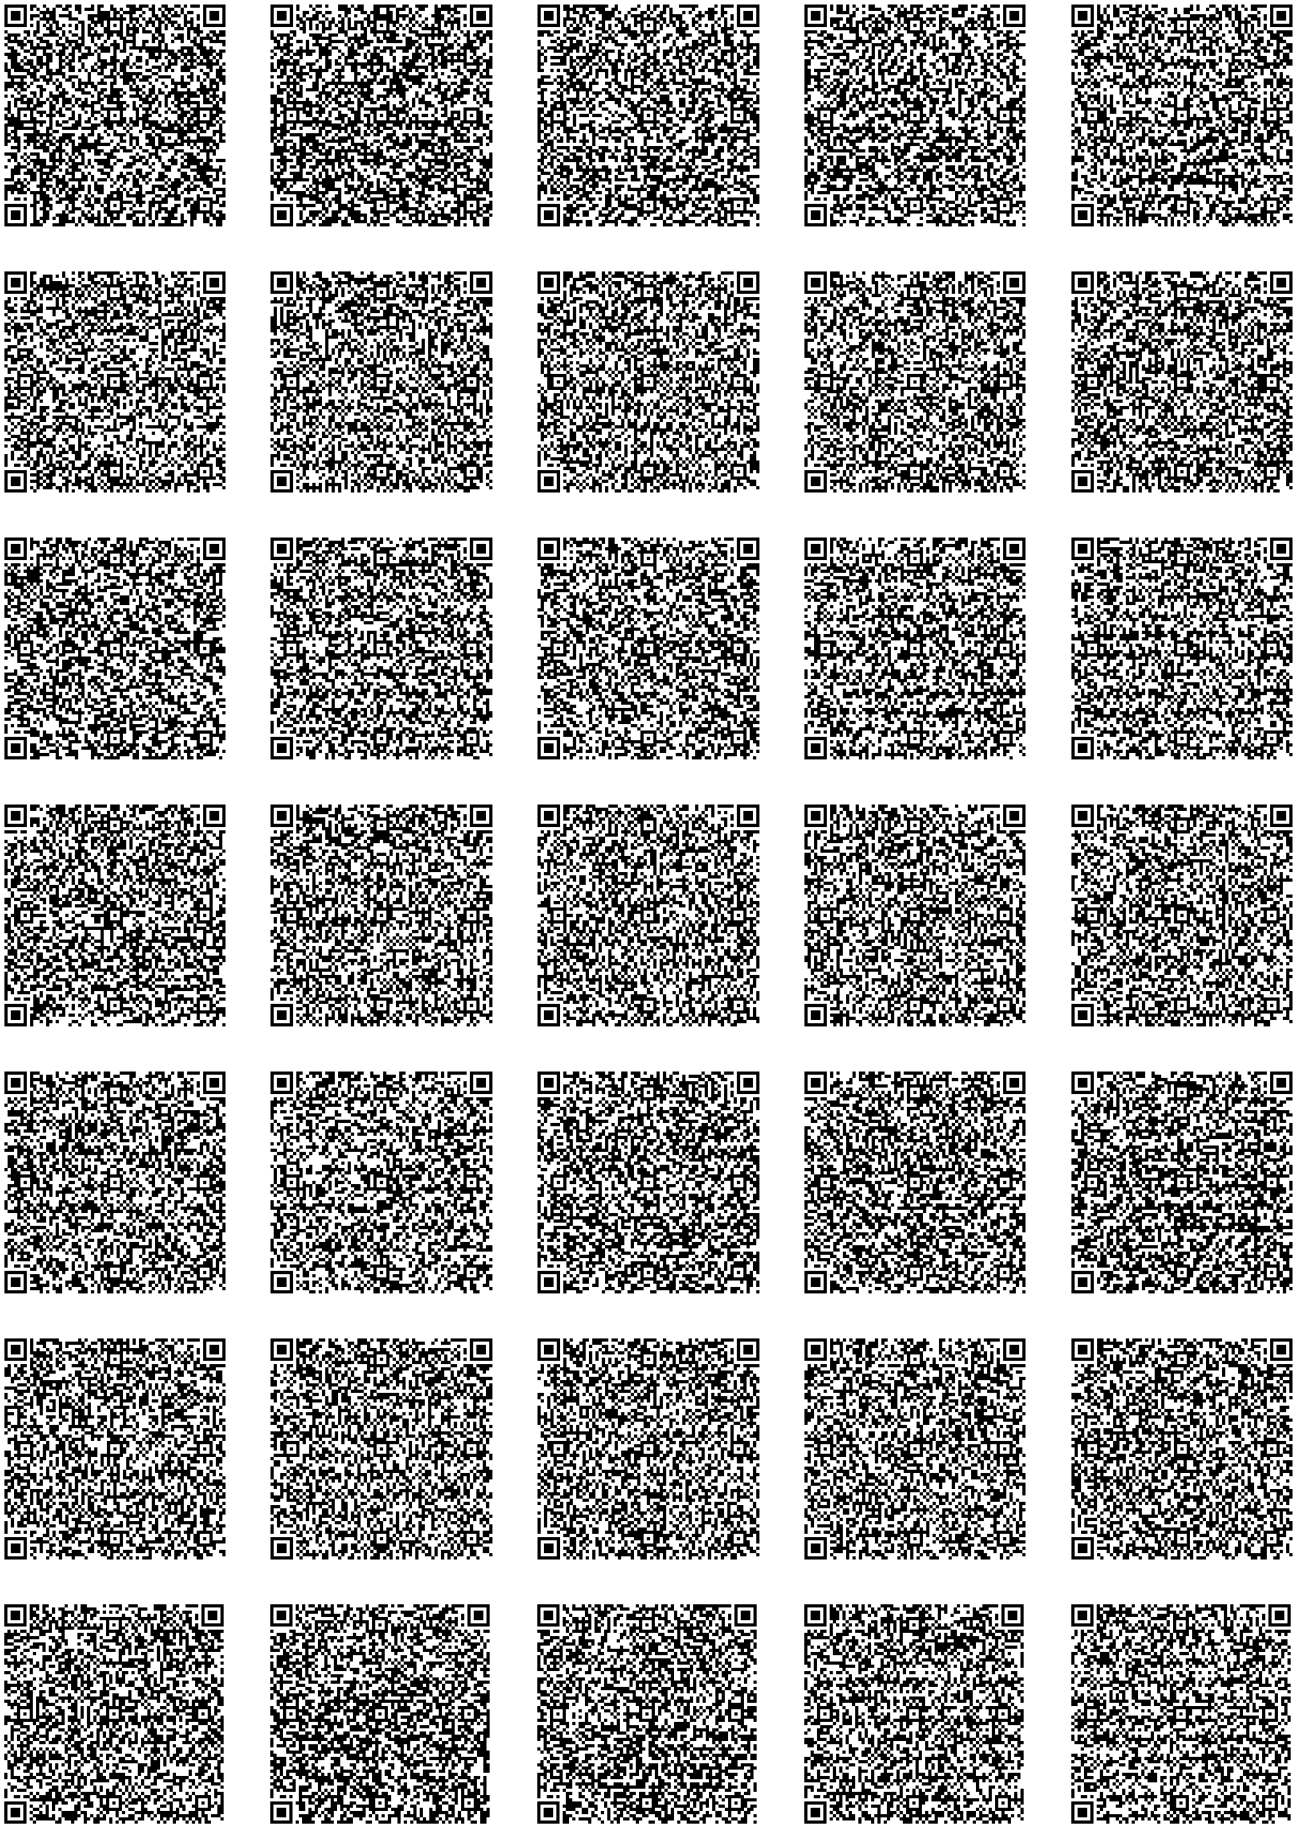

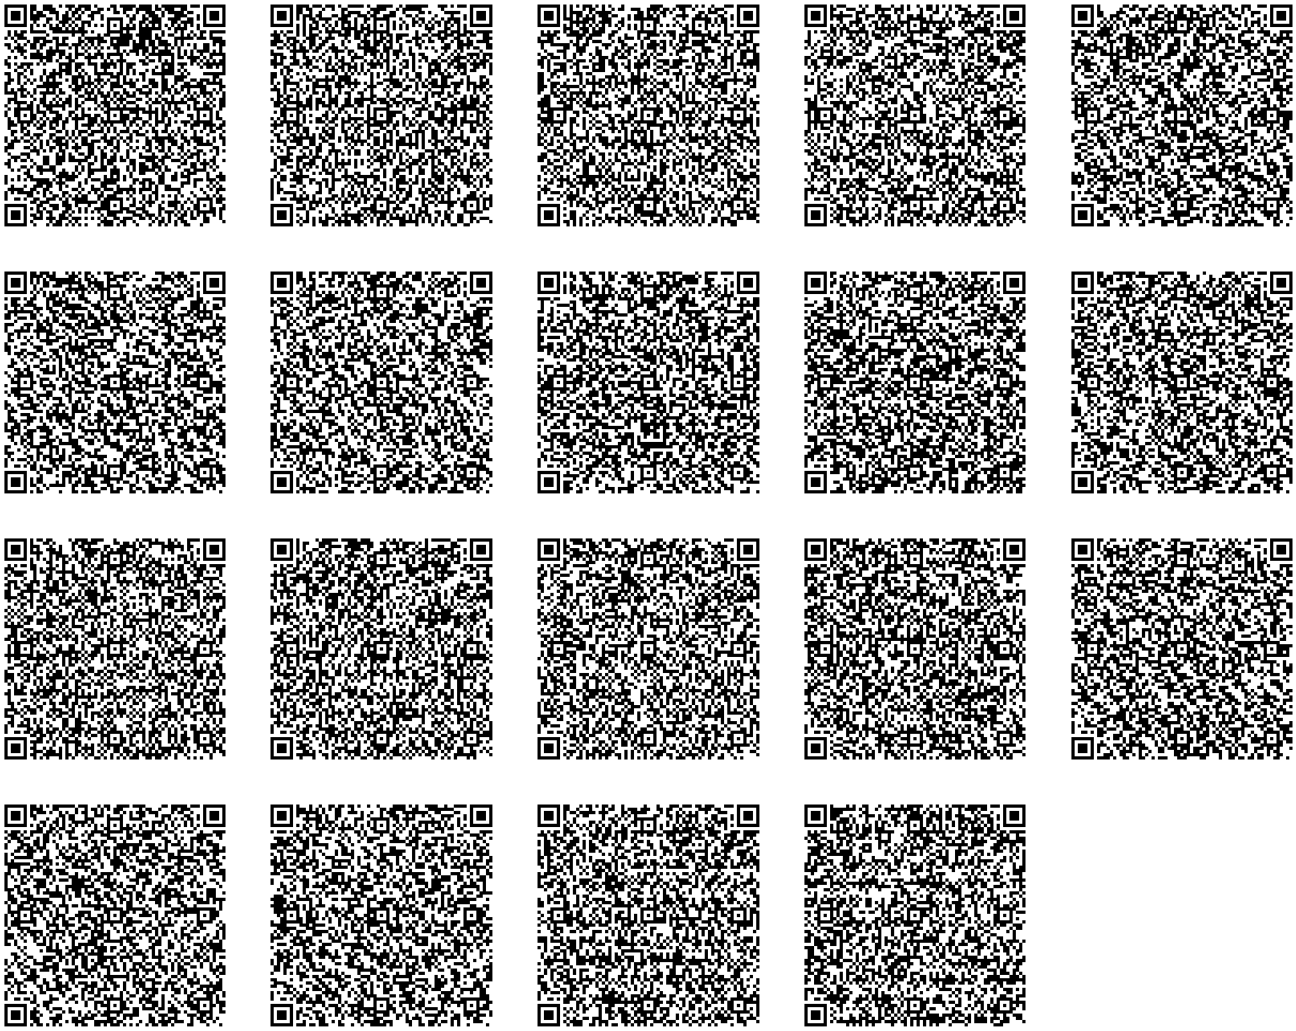

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Б, Д				
			Раздел: Кровля /АР-6/				
			Подраздел: Кровля Тип1				
1	27	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	449.59	365	164 100
2	28	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	449.59	1 546	695 066
3	29	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6.878727	21 513	147 982
4	30	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	449.59	283	127 234
5	31	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	16.050363	21 513	345 291
6	32	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.44959	75 517	33 952
7	33	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.44959	391 444	175 989
8	34	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	449.59	1 099	494 099
9	35	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	449.59	865	388 895
10	36	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	1551.0855	1 636	2 537 576

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	37	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	517.0285	1 791	925 998
			Итого по подразделу: Кровля Тип1				**6 036 182**
			Подраздел: Кровля Тип2				
12	43	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	96.33	365	35 160
13	44	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	96.33	1 546	148 926
14	45	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.473849	21 513	31 707
15	46	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	96.33	283	27 261
16	47	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	3.438981	21 513	73 983
17	48	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.09633	75 517	7 275
18	49	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.09633	391 444	37 708
19	50	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	96.33	1 099	105 867
20	51	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	96.33	865	83 325
21	52	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	332.3385	1 636	543 706
22	53	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	110.7795	1 791	198 406
			Итого по подразделу: Кровля Тип2				**1 293 324**
			Подраздел: Кровля Тип3				
23	54	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	349.75	365	127 658
24	55	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	349.75	2 087	729 928
25	56	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	36.02425	31 847	1 147 264
26	57	234-101-0207РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	36.02425	63 122	2 273 923

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	58	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	349.75	563	196 909
28	59	235-103-0603РСНБ РК 2022	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок	м2	384.725	529	203 519
29	60	6110-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	м2	349.75	1 356	474 261
30	61	235-104-0209СпрСЦ 02.2024	Мембрана кровельная гибкая из термопластичного полиолефина, гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,1 мм, армированная сеткой из полиэстера типа UltraPly TPO Elevate	м2	384.725	5 987	2 303 349
			Итого по подразделу: Кровля Тип3				**7 456 813**
			Подраздел: примечание п.6				
31	62	6111-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	1.3	61 373	79 785
			Итого по подразделу: примечание п.6				**79 785**
			Подраздел: пимечание п.12				
32	63	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.00176	75 517	133
33	64	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00176	391 444	689
34	65	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство аэраторов	шт.	6	3 663	21 978
35	66	246-301-0601РСНБ РК 2022	/аэратор/Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	6	9 113	54 678
36	67	6110-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов настенных	м	15	15 675	235 125
			Итого по подразделу: пимечание п.12				**312 603**
			Подраздел: Примыкания				
37	68	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	282.32	4 541	1 282 015
38	69	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	183.508	1 636	300 219
39	70	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	239.972	1 791	429 790
			Итого по подразделу: Примыкания				**2 012 024**
			Подраздел: Накрывочные элементы парапета				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	71	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	153.7395	8 990	1 382 118
			Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета				**1 382 118**
			Подраздел: Накрывочные элементы парапета				
41	72	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	154.0195	8 990	1 384 635
			Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета				**1 384 635**
			Подраздел: Деформационной шов				
42	73	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	35.07	8 354	292 975
43	74	235-103-0113РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	52.2543	1 139	59 518
44	75	235-103-0116РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	68.7372	867	59 595
			Итого по подразделу: Деформационной шов				**412 088**
			Итого по разделу: Кровля /АР-6/				**20 369 572**
			Раздел: Стены, перегородки /АР-13/				
			Подраздел: Утеплители наружные				
45	84	1126-0201-0108 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	1009.2	4 131	4 169 005
46	85	234-101-0206РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м3	7.4358	66 535	494 741
47	86	234-101-0204РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	88.0668	31 847	2 804 663
			Итого по подразделу: Утеплители наружные				**7 468 409**
			Итого по разделу: Стены, перегородки /АР-13/				**7 468 409**
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
48	93	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	800.2325	11 166	8 935 396
49	95	217-109-0102РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3144.443	27	84 900
50	96	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	7908.18	54	427 042
51	97	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	969.6935	120	116 363
52	98	231-305-0501СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	1035.595	12 212	12 646 686

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	99	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада гранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	36.62	22 280	815 894
54	100	217-109-0108РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	307.608	67	20 610
55	101	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	186.762	54	10 085
56	102	231-102-0401СпрСЦ 02.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	36.62	6 249	228 838
57	103	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	37.3524	15 753	588 412
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**23 874 226**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Б, Д				**51 712 207**
			ИТОГО по акту:				**51 712 207**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	51712207.350 x 6.20%	3 206 156
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	51712207.350 + 3206156.757	54 918 364
	Сметная прибыль, 5.00%	54918364.107 x 5.00%	2 745 918
	Непредвиденные расходы, 5.000%	54918364.107 x 5.000%	2 745 918
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		60 410 200
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	60410200.518 x 1.0557	63 775 048
	НДС (12%)	63775048.687 x 12%	7 653 005
	Итого с НДС	63775048.687 + 7653005.842	71 428 054

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	02.02.2025 08:47
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	03.02.2025 05:55
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.02.2025 04:32
Представители заказчика		
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 12:59
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:41
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	19.02.2025 15:52 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 03:38
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:15 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

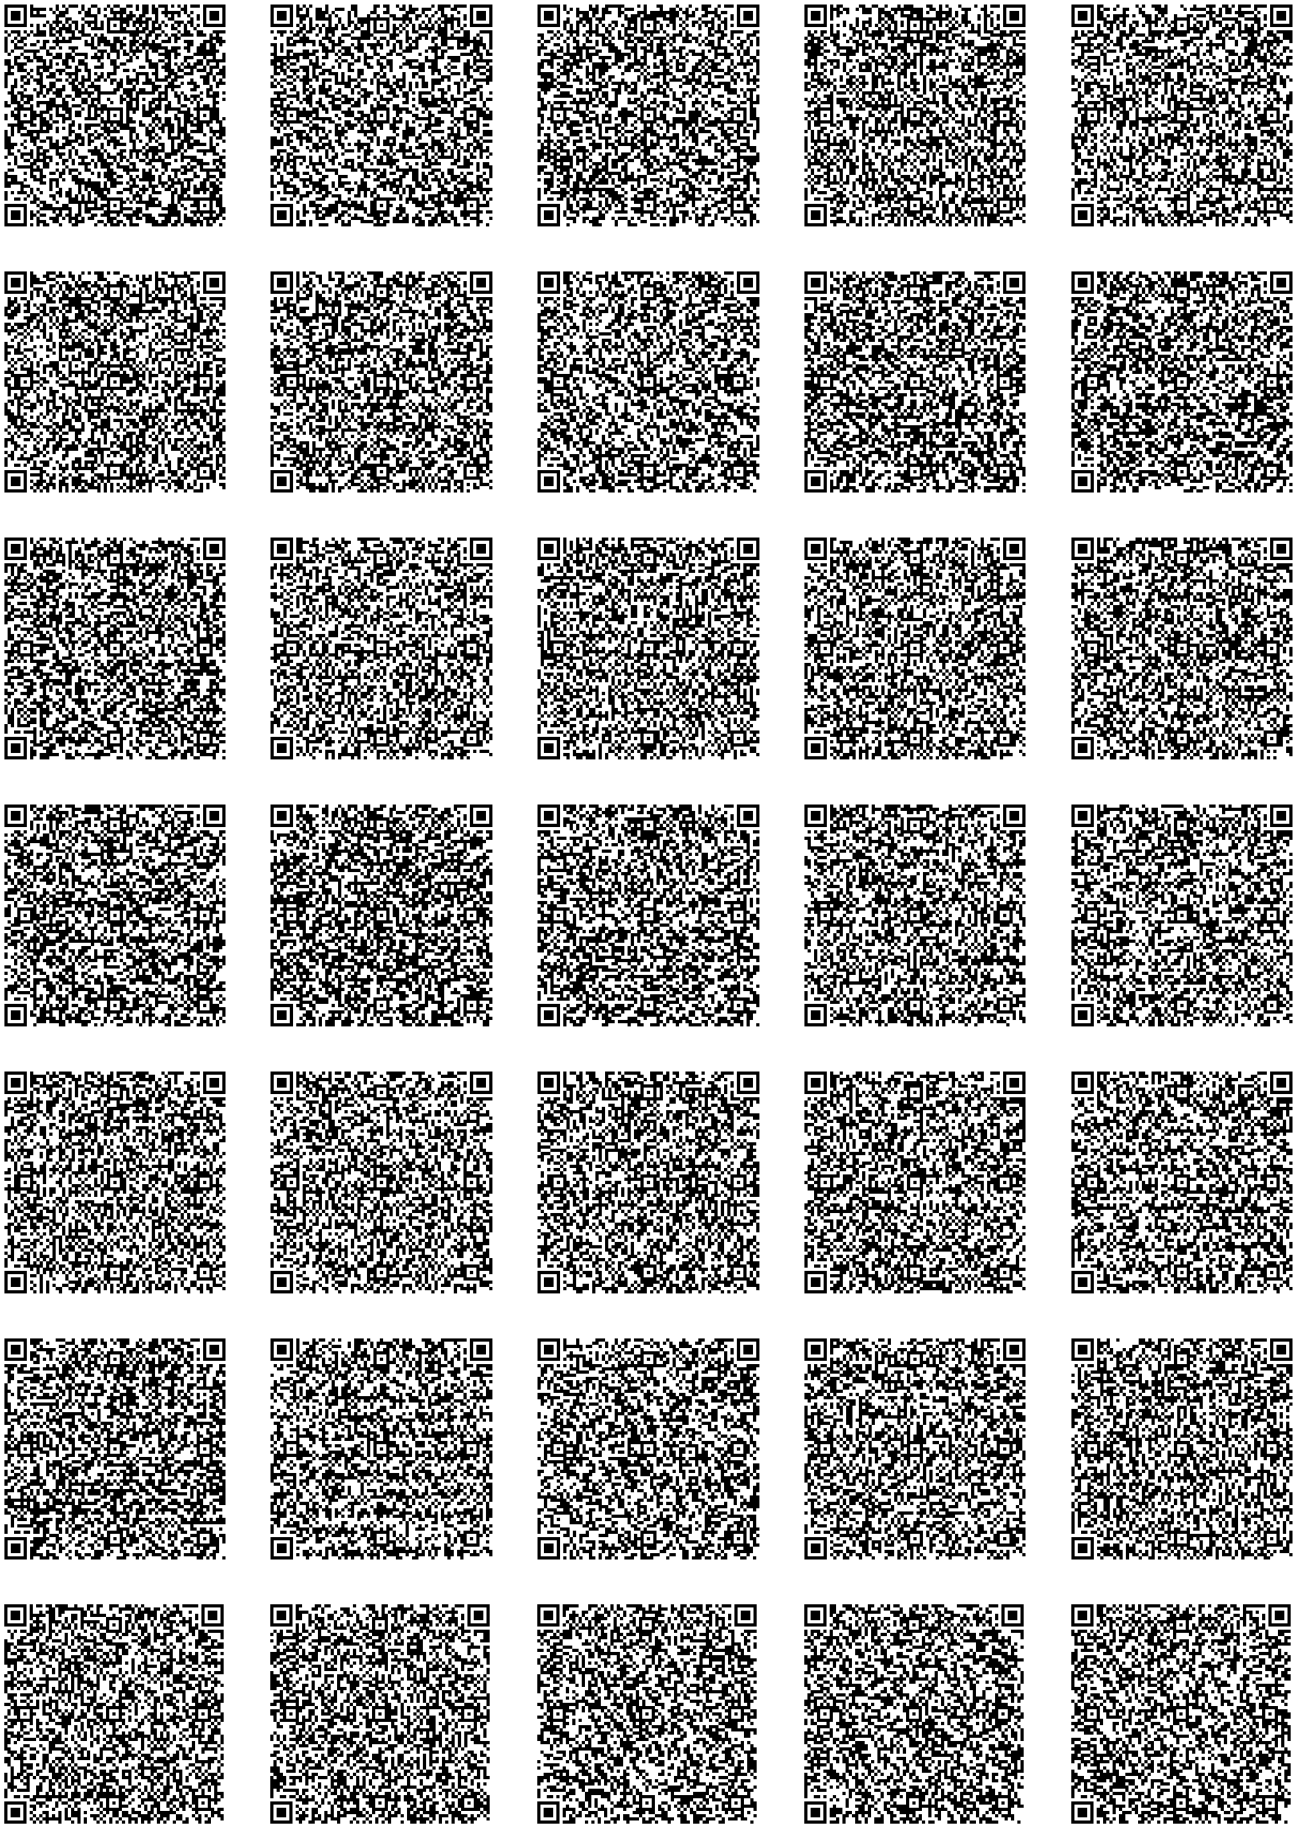

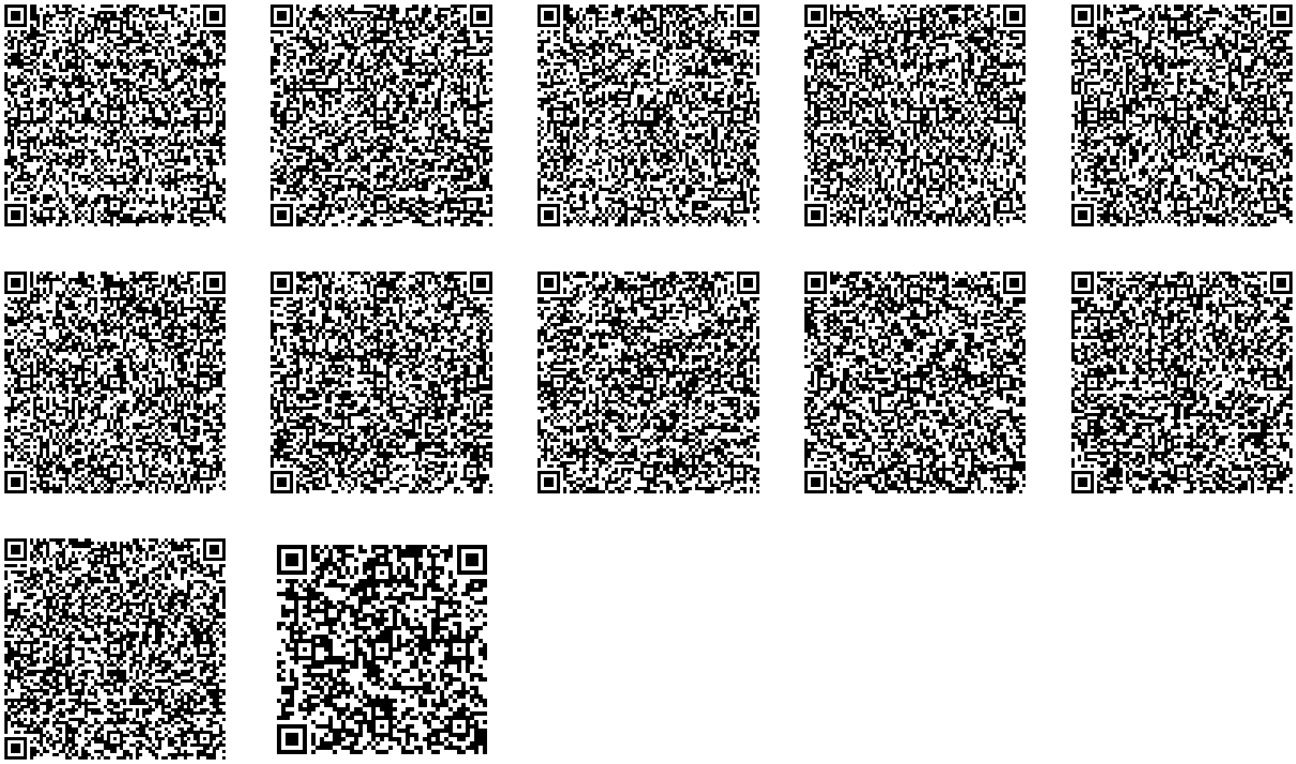

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Электроосвещение				
			Отдел: Блок "А"				
			Подраздел: ЩО-1.1				
1	1	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
2	2	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
3	3	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	16	7 467	119 472
4	4	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
5	5	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	575	5 750
6	6	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041	12 123
7	7	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	2	2 543	5 086
			Итого по подразделу: ЩО-1.1				**169 904**
			Подраздел: ЩО-2.1				
8	8	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
9	9	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
10	10	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	15	7 467	112 005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
12	12	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	575	4 600
13	13	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	5	4 041	20 205
14	14	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 543	2 543
			Итого по подразделу: ЩО-2.1				**166 826**
			Подраздел: ЩО-3.1				
15	15	6119-0602-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	15 355	15 355
16	16	247-201-0222РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-3 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 859	9 859
17	17	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	13	7 467	97 071
18	18	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
19	19	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	575	4 025
20	20	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4 041	16 164
21	21	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 543	2 543
			Итого по подразделу: ЩО-3.1				**147 276**
			Подраздел: ЯТП-0.25				
22	22	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	8 861	8 861
23	23	247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	19 972	19 972
			Итого по подразделу: ЯТП-0.25				**28 833**
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
24	24	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	211	6 780	1 430 580
25	25	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	51	2 673	136 323
26	26	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	211	18 984	4 005 624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	27	247-102-3025СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	шт.	28	34 392	962 976
28	28	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	8	5 211	41 688
29	29	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	7 596	22 788
30	30	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	12	7 891	94 692
31	31	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	5	3 769	18 845
32	32	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300x90мм.	шт.	5	33 508	167 540
33	33	247-104-2502СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
34	34	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	12	7 864	94 368
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**6 983 205**
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
35	35	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	109	1 389	151 401
36	36	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	62	478	29 636
37	37	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	47	613	28 811
38	38	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	4	1 192	4 768
39	39	247-212-0205РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4	1 229	4 916
40	40	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	109	35	3 815
41	41	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	130	928	120 640
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**343 987**
			Итого по отделу: Блок "А"				**7 840 031**
			Отдел: Блок Б.Д				
			Подраздел: ЩО-1.2				
42	52	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 350	13 350
43	53	247-201-0210РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	54	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	10	7 467	74 670
45	55	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
46	56	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	575	4 025
47	57	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041	4 041
48	58	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 543	2 543
			Итого по подразделу: ЩО-1.2				**107 175**
			Подраздел: ЩО-2.2				
49	59	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 350	13 350
50	60	247-201-0210РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
51	61	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	8	7 467	59 736
52	62	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
53	63	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	2 875
54	64	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041	4 041
55	65	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 543	2 543
			Итого по подразделу: ЩО-2.2				**91 091**
			Подраздел: ЩО-3.2				
56	66	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 350	13 350
57	67	247-201-0210РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
58	68	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 467	44 802
59	69	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
60	70	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
61	71	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041	4 041

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
62	72	247-208-0104РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	1	2 543	2 543
			Итого по подразделу: ЩО-3.2				**75 007**
			Подраздел: ЯТП-0.25				
63	73	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	3	8 861	26 583
64	74	247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	19 972	59 916
			Итого по подразделу: ЯТП-0.25				**86 499**
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
65	75	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	102	6 780	691 560
66	76	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	120	2 673	320 760
67	77	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	102	18 984	1 936 368
68	78	247-102-3025СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	шт.	2	34 392	68 784
69	79	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	26	5 211	135 486
70	80	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	5	7 596	37 980
71	81	247-104-2815СпрСЦ 02.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	15	50 503	757 545
72	82	247-104-2816СпрСЦ 02.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	65 455	589 095
73	83	247-102-3003СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	14	139 786	1 957 004
74	84	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	49	7 891	386 659
75	85	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	5	3 769	18 845
76	86	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300x90мм.	шт.	5	33 508	167 540
77	87	247-104-2502СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	3	7 781	23 343
78	88	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	36	7 864	283 104
79	89	247-102-2902СпрСЦ 02.2024	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	192 127	384 254

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**7 758 327**
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
80	90	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	63	1 389	87 507
81	91	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	13	1 192	15 496
82	92	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	48	478	22 944
83	93	247-212-0104РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	536	2 144
84	94	247-212-0205РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	10	1 229	12 290
85	95	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	583	583
86	96	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	613	6 743
87	97	247-214-0103РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	512	1 024
88	98	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	63	35	2 205
89	99	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	195	928	180 960
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**331 896**
			Итого по отделу: Блок Б.Д				**8 449 995**
			Отдел: Блок "В"				
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
90	146	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	118	1 389	163 902
91	147	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1 192	1 192
92	148	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	65	478	31 070
93	149	247-212-0104РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	536	3 216
94	150	247-212-0205РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 229	1 229
95	151	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	583	1 166
96	152	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	613	27 585

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
97	153	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	116	35	4 060
98	154	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	160	928	148 480
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**381 900**
			Итого по отделу: Блок "В"				**381 900**
			Отдел: Блок "Г,Ж"				
			Подраздел: ЯТП-0.25				
99	166	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8 861	17 722
100	167	247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	19 972	39 944
			Итого по подразделу: ЯТП-0.25				**57 666**
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
101	168	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	226	6 780	1 532 280
102	169	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	116	2 673	310 068
103	170	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	226	18 984	4 290 384
104	171	247-102-3025СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	шт.	16	34 392	550 272
105	172	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	15	5 211	78 165
106	173	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	7 596	45 576
107	174	247-104-2815СпрСЦ 02.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	50 503	202 012
108	175	247-102-3003СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20	шт.	28	139 786	3 914 008
109	176	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	47	7 891	370 877
110	177	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	6	3 769	22 614
111	178	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300x90мм.	шт.	6	33 508	201 048
112	179	247-104-2502СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781	15 562
113	180	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	28	7 864	220 192

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	181	247-102-2902СпрСЦ 02.2024	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	4	192 127	768 508
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**12 521 566**
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
115	182	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	139	1 389	193 071
116	183	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1 192	3 576
117	184	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	75	478	35 850
118	185	247-212-0104РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	536	4 824
119	186	247-212-0205РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1 229	3 687
120	187	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	583	1 749
121	188	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	52	613	31 876
122	189	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	136	35	4 760
123	190	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	180	928	167 040
124	191	6119-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка поста с кнопкой	шт.	26	4 453	115 778
125	192	247-201-1301РСНБ РК 2022	Корпус для установки типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431+/ВКР10-2-К01/	шт.	13	3 948	51 324
126	193	247-209-0103РСНБ РК 2022	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом+/ВВТ10-ABLF-K04/	шт.	13	856	11 128
127	194	247-209-0103РСНБ РК 2022	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом+/ВВТ10-ABLF-K06/	шт.	13	856	11 128
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**635 791**
			Подраздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов				
128	195	6125-0405-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: колодка клеммнная на 20 клемм	шт.	3	5 206	15 618
129	196	247-202-1201РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	3	21 804	65 412
			Итого по подразделу: Дополнительная система уравнивания потенциалов				**81 030**
			Итого по отделу: Блок "Г,Ж"				**13 296 053**
			Отдел: Блок "Е"				
			Подраздел: ЯТП-0.25				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
130	197	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	8 861	17 722
131	198	247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	19 972	39 944
			Итого по подразделу: ЯТП-0.25				**57 666**
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
132	199	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	205	6 780	1 389 900
133	200	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	74	2 673	197 802
134	201	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	205	18 984	3 891 720
135	202	247-102-3025СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	шт.	14	34 392	481 488
136	203	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	8	5 211	41 688
137	204	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный ЖКХ, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения+/Damin LED 40 MS/	шт.	6	7 596	45 576
138	205	247-104-2815СпрСЦ 02.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	2	50 503	101 006
139	206	247-102-1801РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	22	73 266	1 611 852
140	207	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	22	7 891	173 602
141	208	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	6	3 769	22 614
142	209	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300x90мм.	шт.	6	33 508	201 048
143	210	247-104-2502СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	2	7 781	15 562
144	211	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	24	7 864	188 736
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**8 362 594**
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
145	212	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	98	1 389	136 122
146	213	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	6	1 192	7 152

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
147	214	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	54	478	25 812
148	215	247-212-0104РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	536	1 072
149	216	247-212-0205РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1 229	7 374
150	217	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	583	1 166
151	218	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	38	613	23 294
152	219	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	583	1 166
153	220	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	94	35	3 290
154	221	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	160	928	148 480
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**354 928**
			Подраздел: Дополнительная система уравнивания потенциалов				
155	222	6125-0405-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка дополнительная на пультах и панелях: колодка клеммнная на 20 клемм	шт.	1	5 206	5 206
156	223	247-202-1201РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	21 804	21 804
			Итого по подразделу: Дополнительная система уравнивания потенциалов				**27 010**
			Итого по отделу: Блок "Е"				**8 802 198**
			Отдел: Блок И.К				
			Подраздел: ЩО-Ст				
157	224	6119-0602-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	13 350	13 350
158	225	247-201-0210РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6 287
159	226	6124-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка прибора или аппарата	шт.	5	7 467	37 335
160	227	247-204-2523РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 259	2 259
161	228	247-204-0713РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1 725
162	229	247-204-0178РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4 041	4 041
			Итого по подразделу: ЩО-Ст				**64 997**
			Подраздел: ЯТП-0.25				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
163	230	6119-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	4	8 861	35 444
164	231	247-203-0107РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	19 972	79 888
			Итого по подразделу: ЯТП-0.25				**115 332**
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
165	232	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	50	6 780	339 000
166	233	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	91	2 673	243 243
167	234	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	50	18 984	949 200
168	235	247-102-2418СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/R ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20	шт.	11	64 724	711 964
169	236	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	5	5 211	26 055
170	237	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	7	7 596	53 172
171	238	247-102-3011РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов SPO-7-72-4K-P (4)/SPO-7-72-6K-P (4), мощность 72Вт, IP40, 1200x180x19, призма с проводом	шт.	8	12 474	99 792
172	239	247-102-1801РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для чистых помещений типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	28	73 266	2 051 448
173	240	247-104-2815СпрСЦ 02.2024	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65	шт.	9	50 503	454 527
174	241	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	23	7 891	181 493
175	242	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	6	3 769	22 614
176	243	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300x90мм.	шт.	6	33 508	201 048
177	244	247-104-2502СпрСЦ 02.2024	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31 124
178	245	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	27	7 864	212 328
179	246	247-102-2902СпрСЦ 02.2024	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	192 127	192 127
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**5 769 135**
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
180	247	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	35	1 389	48 615

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
181	248	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	11	1 192	13 112
182	249	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	28	478	13 384
183	250	247-212-0205РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	11	1 229	13 519
184	251	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	583	2 332
185	252	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	613	613
186	253	247-214-0103РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	512	1 024
187	254	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	33	35	1 155
188	255	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	145	928	134 560
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**228 314**
			Итого по отделу: Блок И.К				**6 177 778**
			Отдел: Блок "Л"				
			Подраздел: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
189	266	6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	220	6 780	1 491 600
190	267	6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	66	2 673	176 418
191	268	247-102-3838СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный офисный-2 INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм	шт.	220	18 984	4 176 480
192	269	247-102-3025СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	шт.	28	34 392	962 976
193	270	247-102-0193РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2x20), мощность 18 Вт, IP20	шт.	8	5 211	41 688
194	271	247-102-0307РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	3	7 596	22 788
195	272	247-102-0312РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	28	7 891	220 948
196	273	6119-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	4	3 769	15 076
197	274	247-102-2518СпрСЦ 02.2024	Светильник светодиодный для аварийного освещения EXIT 297 3W, встраиваемый, односторонний, мощность 3Вт, 220В, IP65, 300x90мм.	шт.	4	33 508	134 032
198	275	247-102-2906РСНБ РК 2022	Блок аварийного питания LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40	шт.	16	7 864	125 824

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по подразделу: СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				**7 367 830**
			Подраздел: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
199	276	6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	117	1 389	162 513
200	277	6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	2	1 192	2 384
201	278	247-212-0101РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	64	478	30 592
202	279	247-212-0104РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	536	4 288
203	280	247-212-0103РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	583	1 166
204	281	247-214-0116РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	45	613	27 585
205	282	247-202-0606РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	шт.	117	35	4 095
206	283	247-202-0701РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212	шт.	140	928	129 920
			Итого по подразделу: ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				**362 543**
			Итого по отделу: Блок "Л"				**7 730 373**
			Итого по локальной смете: Электроосвещение				**52 678 328**
			ИТОГО по акту:				**52 678 328**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)	52678328.000 x 6.20%	3 266 056
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	52678328.000 + 3266056.236	55 944 384
	Сметная прибыль, 5.00%	55944384.236 x 5.00%	2 797 219
	Непредвиденные расходы, 5.000%	55944384.236 x 5.000%	2 797 219
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		61 538 822
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557	61538822.659 x 1.0557	64 966 535
	НДС (12%)	64966535.081 x 12%	7 795 984
	Итого с НДС	64966535.081 + 7795984.210	72 762 519

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	18.02.2025 05:40
Представители технического надзора		
880112400989 - СЕЙТОВА АИДА ЖАРЛХАПОВНА	технадзор по электрике	18.02.2025 12:23
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	18.02.2025 06:18
Представители заказчика		
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 06:26 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:31
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 13:19
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:19 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:40

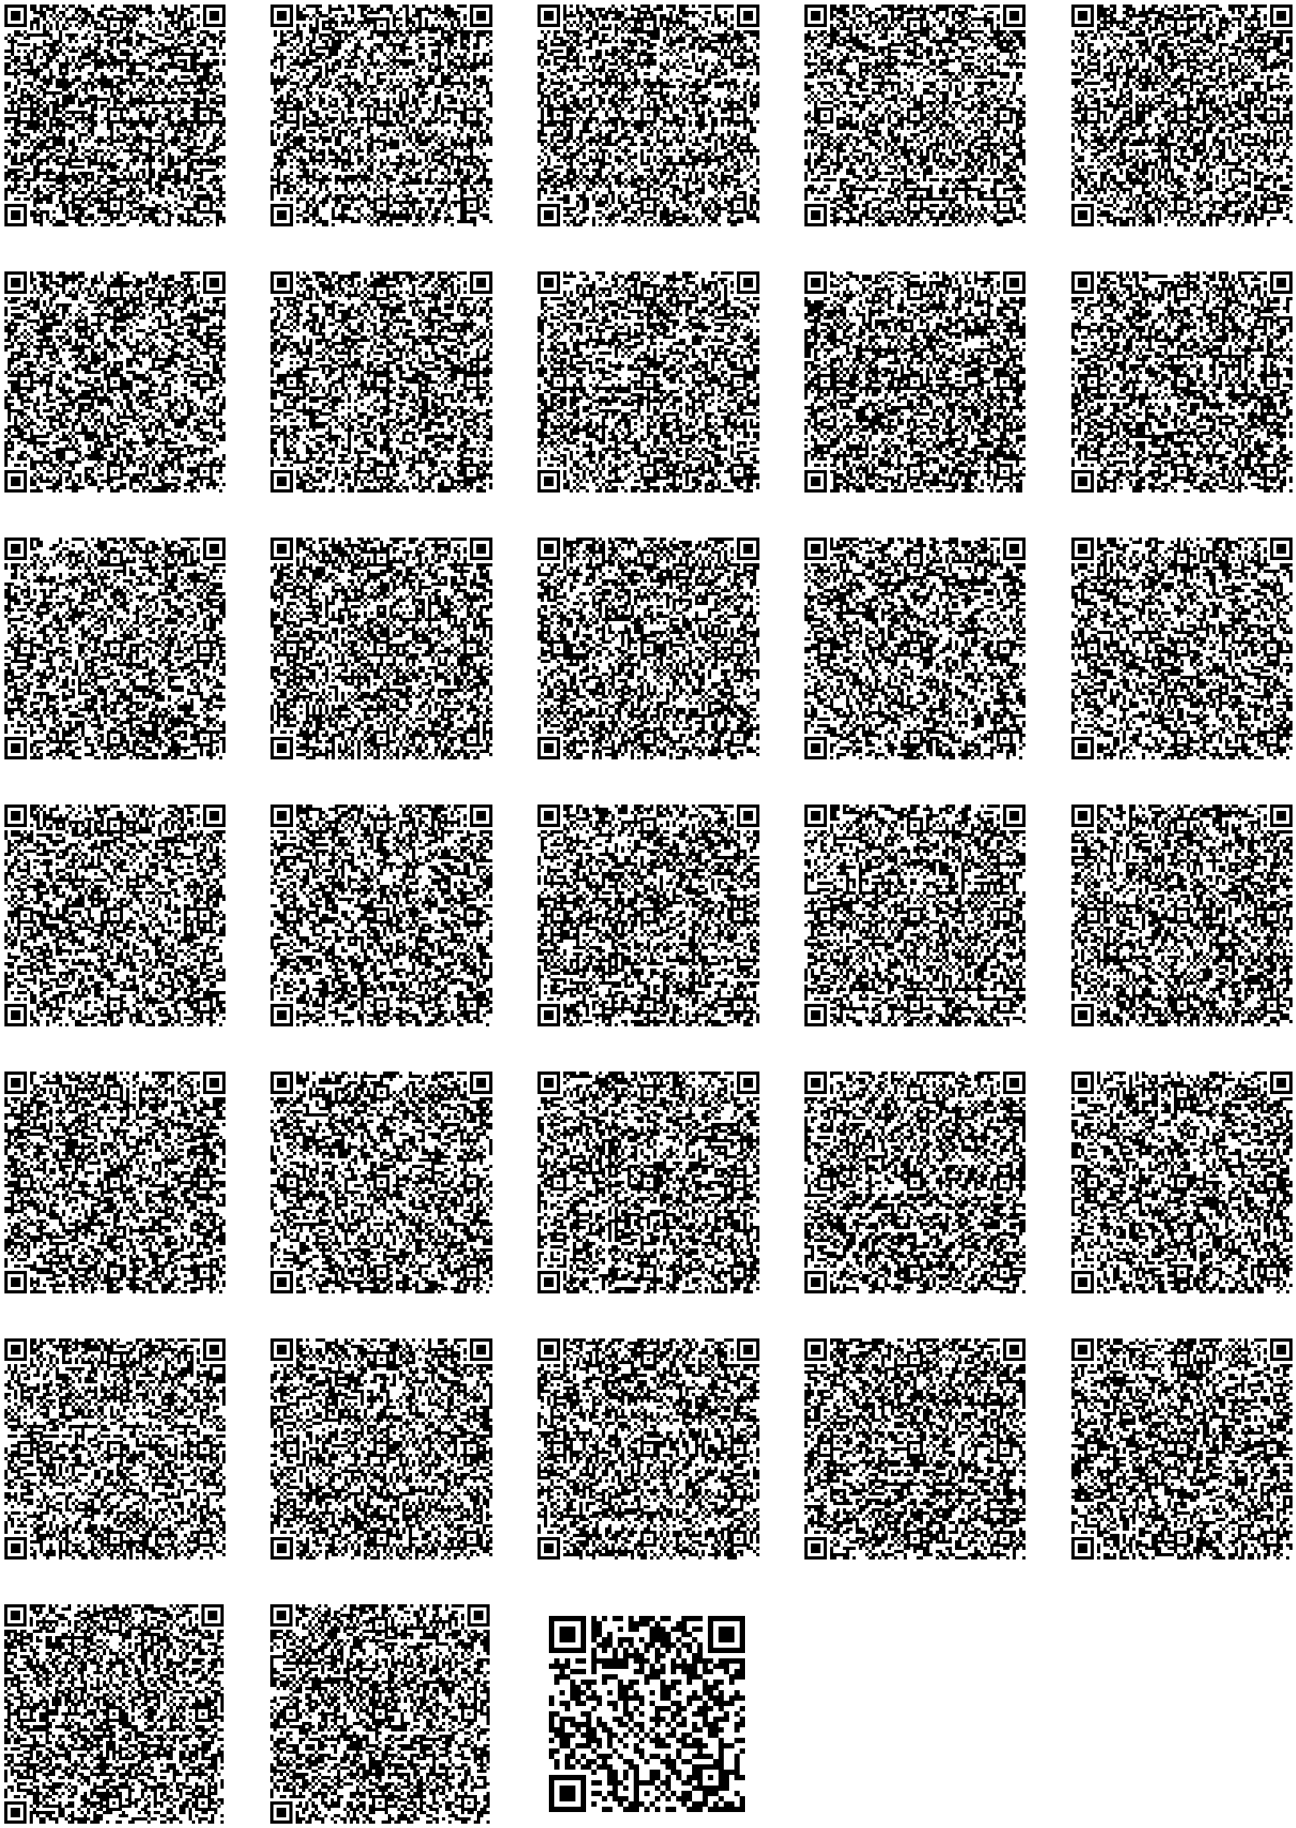

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				
			Раздел: Кровля				
			Подраздел: Тип1				
1	23	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	715.44	365	261 136
2	24	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	715.44	1 546	1 106 070
3	25	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	10.946232	21 513	235 486
4	26	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	715.44	283	202 470
5	27	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	25.541208	21 513	549 468
6	28	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.71544	75 517	54 028
7	29	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.71544	391 444	280 055
8	30	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	715.44	1 099	786 269
9	31	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	715.44	865	618 856
10	32	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	2468.268	1 636	4 038 086

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	33	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	822.756	1 791	1 473 556
			Итого по подразделу: Тип1				**9 605 480**
			Подраздел: Кровля Тип2				
12	39	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	715.44	365	261 136
13	40	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	129.36	1 546	199 991
14	41	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1.979208	21 513	42 579
15	42	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	129.36	283	36 609
16	43	212-401-0106РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4.618152	21 513	99 350
17	44	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.12936	75 517	9 769
18	45	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.12936	391 444	50 637
19	46	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м2	129.36	1 099	142 167
20	47	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	129.36	865	111 896
21	48	235-103-0417РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0	м2	446.292	1 636	730 134
22	49	235-103-0416РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,2	м2	148.764	1 791	266 436
			Итого по подразделу: Кровля Тип2				**1 950 704**
			Подраздел: Кровля Тип3				
23	50	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	715.44	365	261 136
24	51	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	715.44	2 087	1 493 123
25	52	234-101-0207РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	73.69032	63 122	4 651 480
26	53	234-101-0207РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	73.69032	63 122	4 651 480

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	54	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	715.44	365	261 136
28	55	235-103-0603РСНБ РК 2022	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок	м2	786.984	529	416 315
29	56	6110-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель плоских из мембраны из ПВХ-мембраны	м2	715.44	1 356	970 137
30	57	235-104-0209СпрСЦ 02.2024	Мембрана кровельная гибкая из термопластичного полиолефина, гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,1 мм, армированная сеткой из полиэстера типа UltraPly TPO Elevate	м2	786.984	5 987	4 711 673
			Итого по подразделу: Кровля Тип3				**17 416 480**
			Подраздел: примечание п.6				
31	58	6111-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) легким (ячеистым) бетоном	м3	1.3	61 373	79 785
			Итого по подразделу: примечание п.6				**79 785**
			Подраздел: Примыкания				
32	59	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	379.47	4 541	1 723 173
33	60	235-103-0113РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	246.6555	1 139	280 941
34	61	235-103-0116РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	322.5495	867	279 650
			Итого по подразделу: Примыкания				**2 283 764**
			Подраздел: Накрывочные элементы парапета				
35	62	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	177.6475	8 990	1 597 051
36	63	6110-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство желобов настенных	м	15	15 675	235 125
			Итого по подразделу: Накрывочные элементы парапета				**1 832 176**
			Подраздел: Деформационной шов				
37	64	6110-0101-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	18.43	8 354	153 964
38	65	235-103-0113РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м2	27.4607	1 139	31 278
39	66	235-103-0116РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м2	36.1228	867	31 318
			Итого по подразделу: Деформационной шов				**216 560**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел: примечание п.8				
40	67	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.00208	75 517	157
41	68	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00208	391 444	814
42	69	6110-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство аэраторов	шт.	9	3 663	32 967
43	70	246-301-0601РСНБ РК 2022	/аэратор/Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 100 мм	шт.	9	9 113	82 017
			Итого по подразделу: примечание п.8				**115 955**
			Итого по разделу: Кровля				**33 500 904**
			Раздел: Крепления наружных стен и перегородок АР-12				
44	71	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0	342 835	0
45	72	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0	325 873	0
			Итого по разделу: Крепления наружных стен и перегородок АР-12				**0**
			Раздел: Наружная отделка фасадов /АР-14/				
46	88	6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	126.57945	11 166	1 413 386
47	90	217-109-0102РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	497.38278	27	13 429
48	91	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1250.9028	54	67 548
49	92	261-105-0703РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1533.8451	120	184 061
50	93	231-305-0501СпрСЦ 01.2024	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 340х2000х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	1638.087	12 212	20 004 318
51	94	6112-0401-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада гранитными плитами, с теплоизоляционным слоем	м2	84.58	22 280	1 884 442
52	95	217-109-0108РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	710.472	67	47 602
53	96	217-109-0106РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	431.358	54	23 293
54	97	231-102-0401СпрСЦ 02.2024	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием тип облицовки: фасадные кассеты и панели	м2	84.58	6 249	528 540
55	98	231-201-0107РСНБ РК 2022	Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, термообработанная, толщина 20 мм	м2	86.2716	15 753	1 359 037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Наружная отделка фасадов /АР-14/				**25 525 657**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Г,Ж				**59 026 561**
			ИТОГО по акту:				**59 026 561**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				59026561.220 x 6.20%	3 659 646
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				59026561.220 + 3659646.683	62 686 207
		Сметная прибыль, 5.00%				62686207.903 x 5.00%	3 134 310
		Непредвиденные расходы, 5.000%				62686207.903 x 5.000%	3 134 310
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					68 954 828
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				68954828.693 x 1.0557	72 795 612
		НДС (12%)				72795612.652 x 12%	8 735 473
		Итого с НДС				72795612.652 + 8735473.518	81 531 086

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	02.02.2025 08:46
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	03.02.2025 12:14
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	03.02.2025 04:30
Представители заказчика		
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:17 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 13:01
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 03:36
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:42
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	19.02.2025 15:43 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете

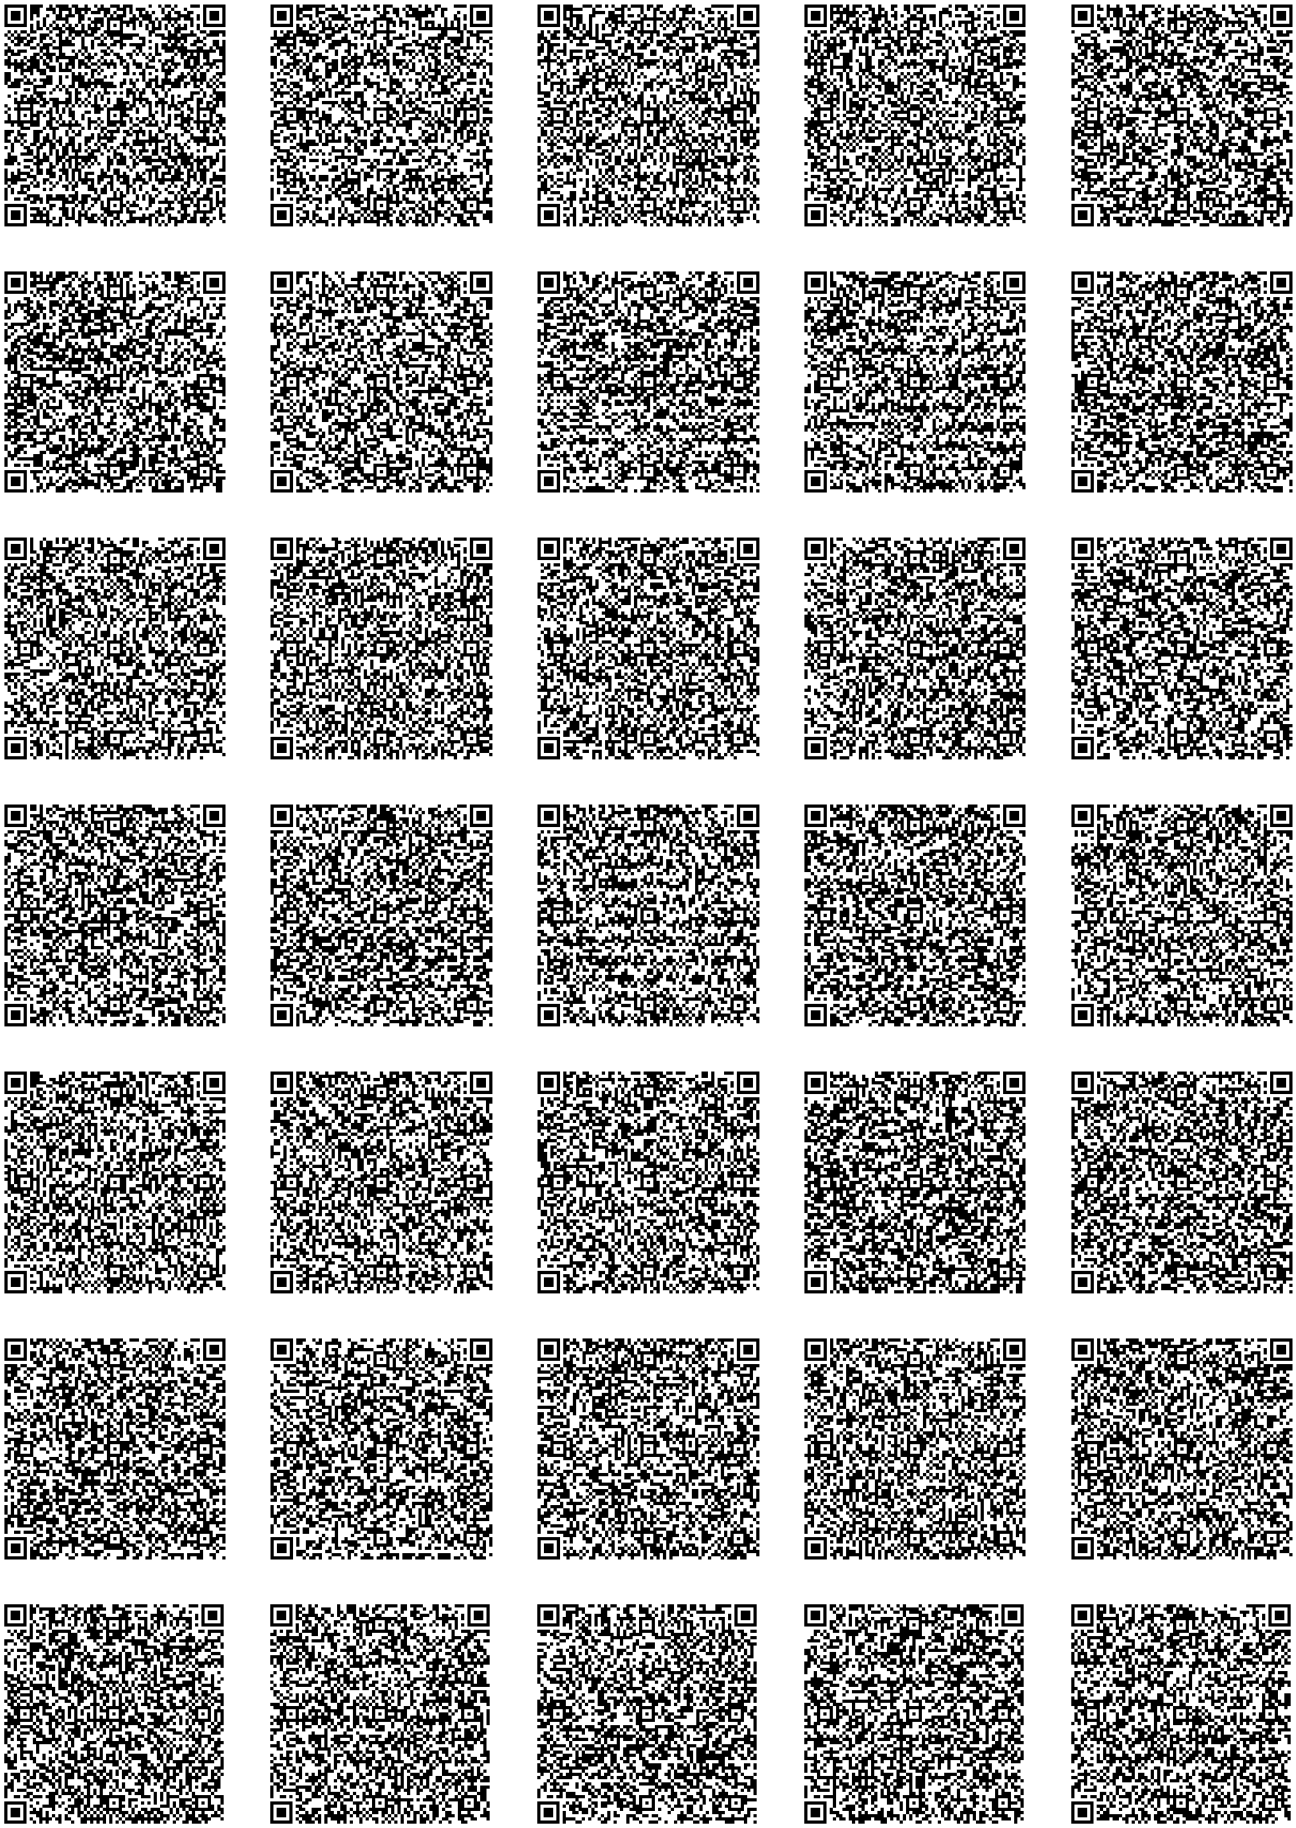

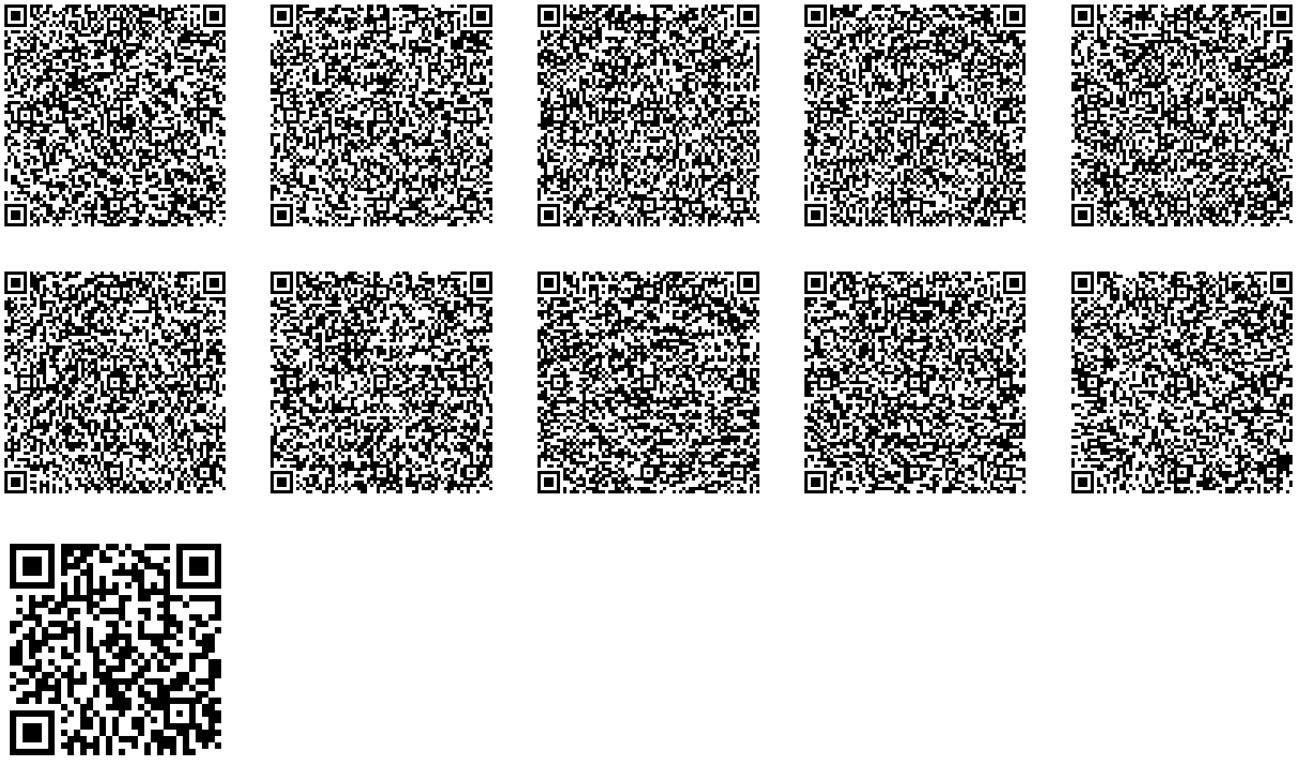

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **060440002060 - ТОО "АС Құрылыс"**

Стройка: **Строительство школы в 19-м микрорайоне города Актау Мангистауской области на 1200 мест**

Договор подряда (контракт) №: **117 от 29.06.2023 года**

Акт выполненных работ
за Февраль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Архитектурные решения. Блок Л				
			Раздел: Козырек АР-4				
			Подраздел: К-1. Л.4				
1	1	6112-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж планарного (безрамного) остекления при помощи кронштейнов-спайдеров с лесов	м2	8.175	10 110	82 649
2	2	217-401-0406РСНБ РК 2022	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 16 мм	м2	8.175	28 623	233 993
3	3	246-301-0501РСНБ РК 2022	Кронштейны из сортовой стали	кг	205.38	775	159 170
4	4	217-101-0303РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	28	104	2 912
			Итого по подразделу: К-1. Л.4				**478 724**
			Итого по разделу: Козырек АР-4				**478 724**
			Раздел: Ведомость отделки потолков АР-18				
			Подраздел: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				
5	365	232-501-0301РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19.17195	76	1 457
6	366	217-202-0501РСНБ РК 2022	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50	м2	4.65	145	674
			Итого по подразделу: Улучшенная штукатурка гипсовыми смесями по полимерной сетке -3-5ммм				**2 131**
			Итого по разделу: Ведомость отделки потолков АР-18				**2 131**
			Итого по локальной смете: Архитектурные решения. Блок Л				**480 855**
			ИТОГО по акту:				**480 855**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				480855.000 х 6.20%	29 813

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				480855.000 + 29813.009	510 668
		Сметная прибыль, 5.00%				510668.009 x 5.00%	25 533
		Непредвиденные расходы, 5.000%				510668.009 x 5.000%	25 533
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					561 734
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				561734.810 x 1.0557	593 023
		НДС (12%)				593023.439 x 12%	71 162
		Итого с НДС				593023.439 + 71162.813	664 186

Лист согласования
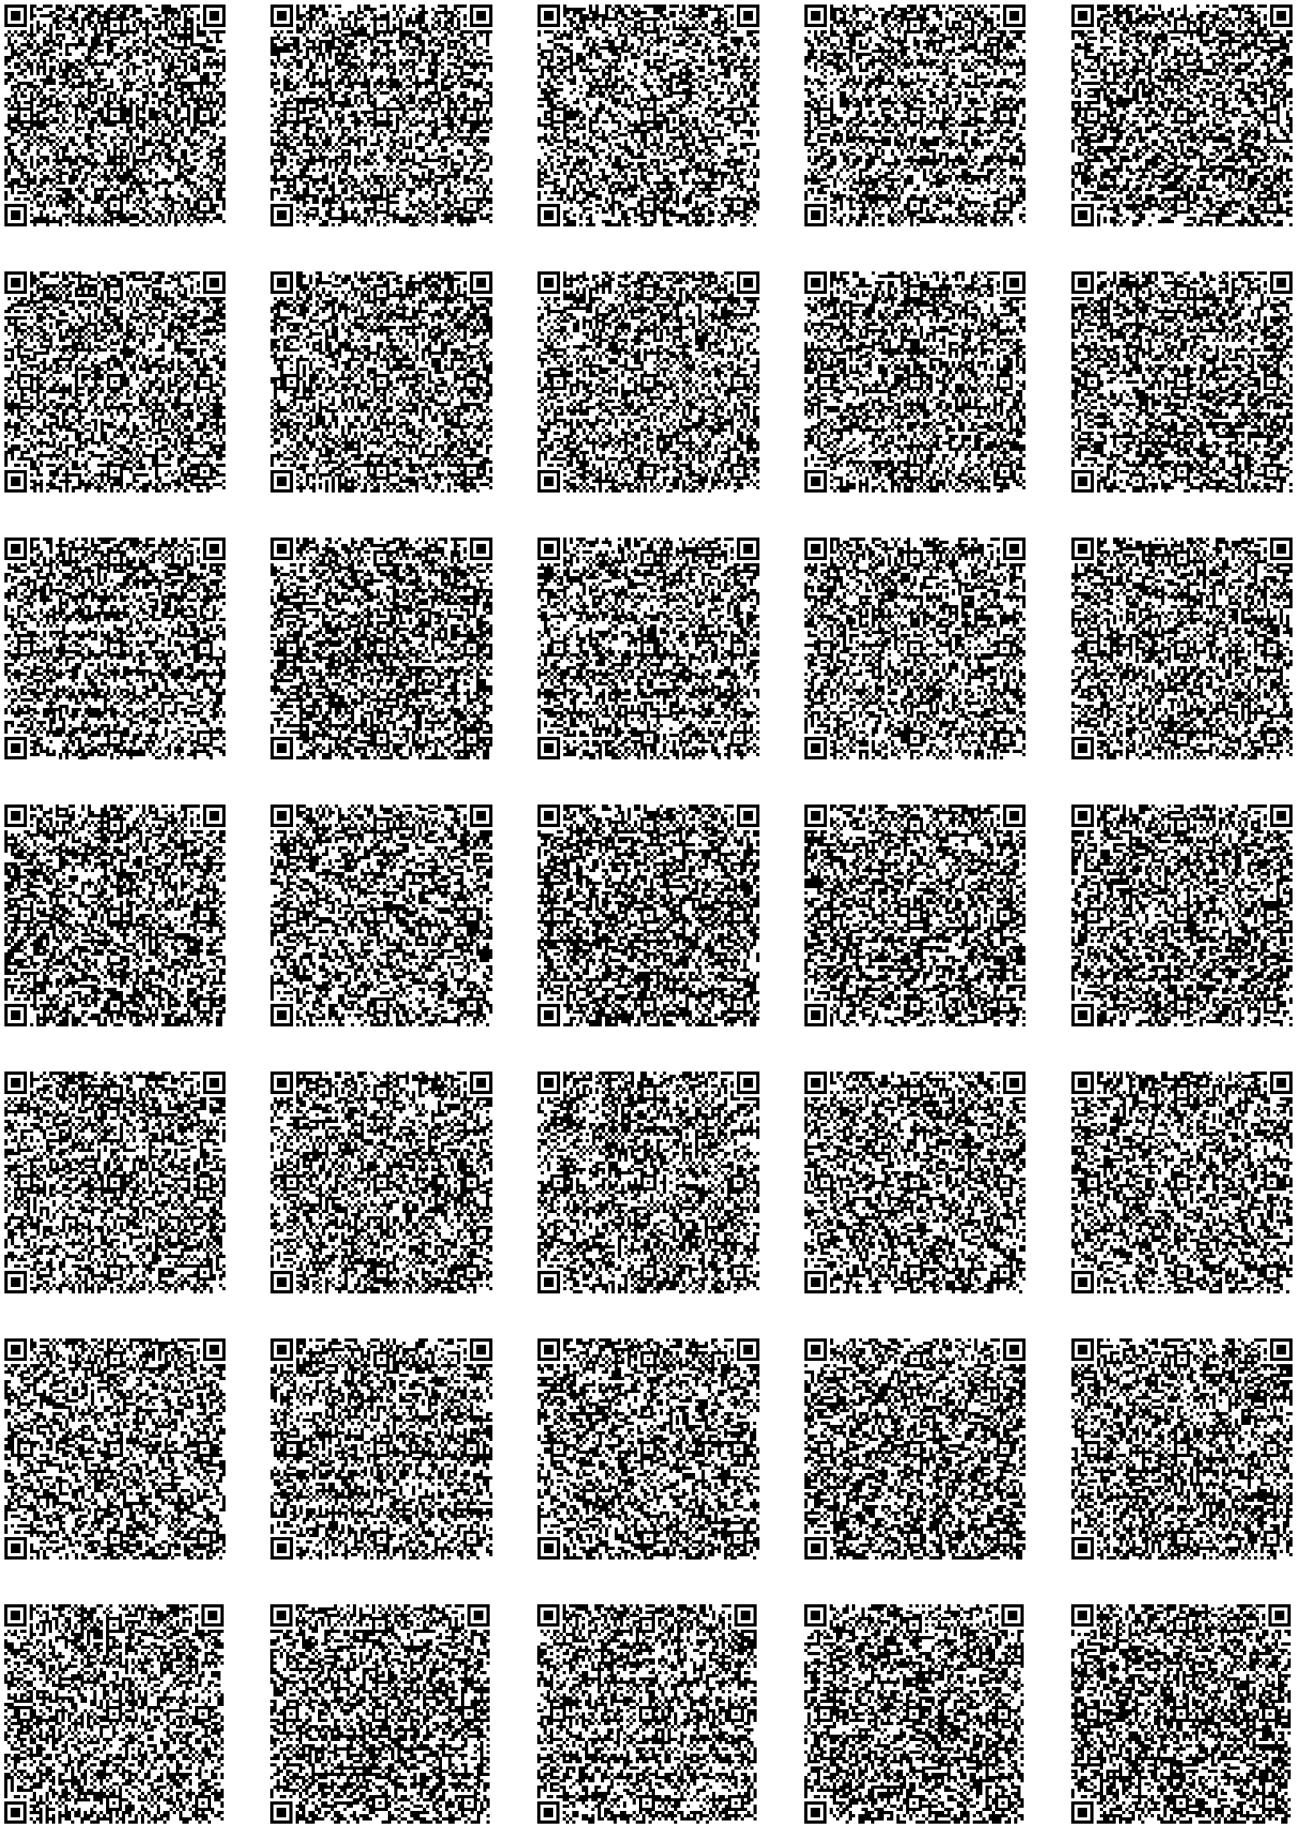
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
650812300475 - АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ	Директор	11.02.2025 10:58
Представители технического надзора		
601023301834 - УМБЕТОВ БИРЖАН БАХИТЖАНОВИЧ	Технический надзор	12.02.2025 05:25
Представители авторского надзора		
930727300214 - АРЫҚБАН ЕРБОЛАТ АСАБАЙҰЛЫ	Авторский надзор	11.02.2025 12:53
Представители заказчика		
600720301315 - ХАМИЕВ ТАНГАЛИ СМИТОВИЧ	Региональный руководитель по Мангистауской области	18.02.2025 13:41
621110303282 - ЖОЛБАЕВ НУРЛЫБЕК БЕРГЕНГУЛОВИЧ	Ведущий специалист	18.02.2025 12:33
810327450298 - КАМЕЛЕВА АЙНУР ЕСЕНОВНА	Ведущий специалист сметчик отдела смет и ценообразования	20.02.2025 05:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
680529400032 - ДАУРЕНБЕКОВА САЛТАНАТ САЛИМОВНА	Ведущий специалист сметчик	18.02.2025 13:12 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
790105301547 - УТЕГЕНОВ КАЙРАТ УАЛИЕВИЧ	Заместитель Директора департамента строительства по реализации национального проекта	20.02.2025 07:27
