Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **081040005136 - ТОО Каратас Майнинг**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «Жана кала» города Туркестан Туркестанской области на 2000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **№83 от 24.05.2023 года**

Акт выполненных работ
за Январь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Наружое элетроснабжение				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	158.75	411	65 246
2	2	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.	м3	4.1	10 220	41 902
3	3	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	7.5	14 876	111 570
4	4	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	14	736	10 304
5	5	211-401-0101РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	52.651	4 008	211 025
6	6	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	76.37	88	6 720
7	9	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2.6	3 299	8 577
8	10	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	78.97	575	45 407
9	11	6101-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	39.58	442	17 494

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	12	6101-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2.	м3	1.22	10 220	12 468
11	13	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	21.6	88	1 900
12	16	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0.8	3 299	2 639
13	17	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	22.4	575	12 880
			Итого по разделу: Земляные работы				**548 134**
			Раздел: Кабельная продукция				
14	18	6124-0201-0704 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	2740	1 988	5 447 120
15	19	243-113-0951РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (мс)-1	км	2.74	8 391 039	22 991 447
16	20	6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	23	966	22 218
17	21	6124-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	66	1 878	123 948
18	22	243-113-0805РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0.066	921 186	60 798
19	23	243-113-0801РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66	км	0.023	395 642	9 100
			Итого по разделу: Кабельная продукция				**28 654 631**
			Раздел: Типовые строительные конструкции				
20	26	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	19.25	34 013	654 750
21	27	225-203-0103РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	10.77	63 932	688 548
22	28	225-202-1104РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8.48	76 111	645 421
23	29	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.523	14 876	37 532
24	30	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки /бетон тяжелый класса С8/10, W8, F100/	м3	2.19	26 243	57 472

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	31	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской /бетон тяжелый класса С16/20, W8, F100/	м3	3.18	32 346	102 860
26	32	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.05325	312 833	16 658
27	33	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.667	306 311	204 309
28	34	6121-0701-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	10.047	86 524	869 307
29	35	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.03717	312 833	11 628
30	36	214-210-0201РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.747	306 311	228 814
31	37	225-101-0101РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5 806	17 418
32	38	225-101-0201РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5 952	17 856
33	39	244-202-0108РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	71 199	213 597
34	41	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	52.44	4 674	245 105
			Итого по разделу: Типовые строительные конструкции				**4 011 275**
			Раздел: Кабельльные конструкции				
35	53	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	96.8	1 346	130 292
36	54	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	16	6 872	109 952
37	57	6124-0201-2505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	4	68 417	273 668
38	58	243-903-4906РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150-240	шт.	4	38 476	153 904
			Итого по разделу: Кабельльные конструкции				**667 816**
			Раздел: Трубная продукция				
39	59	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	28	507	14 196
40	60	241-207-0605РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	28	4 289	120 092

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	61	241-211-1005РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей диаметром 110 мм, на защелке IP 54	шт.	5	784	3 920
			Итого по разделу: Трубная продукция				**138 208**
			Итого по локальной смете: Наружое элетроснабжение				**34 020 066**
			ИТОГО по акту:				**34 020 066**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%)				34020066.540 x 6.20%	2 109 244
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				34020066.540 + 2109244.061	36 129 310
		Сметная прибыль, 5.00%				36129310.600 x 5.00%	1 806 465
		Непредвиденные расходы, 5.000%				36129310.600 x 5.000%	1 806 465
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					39 742 241
		коэффициент 2024 года, к = 1.0750				39742241.660 x 1.0750	42 722 909
		НДС (12%)				42722909.785 x 12%	5 126 749
		Итого с НДС				42722909.785 + 5126749.174	47 849 658

Лист согласования
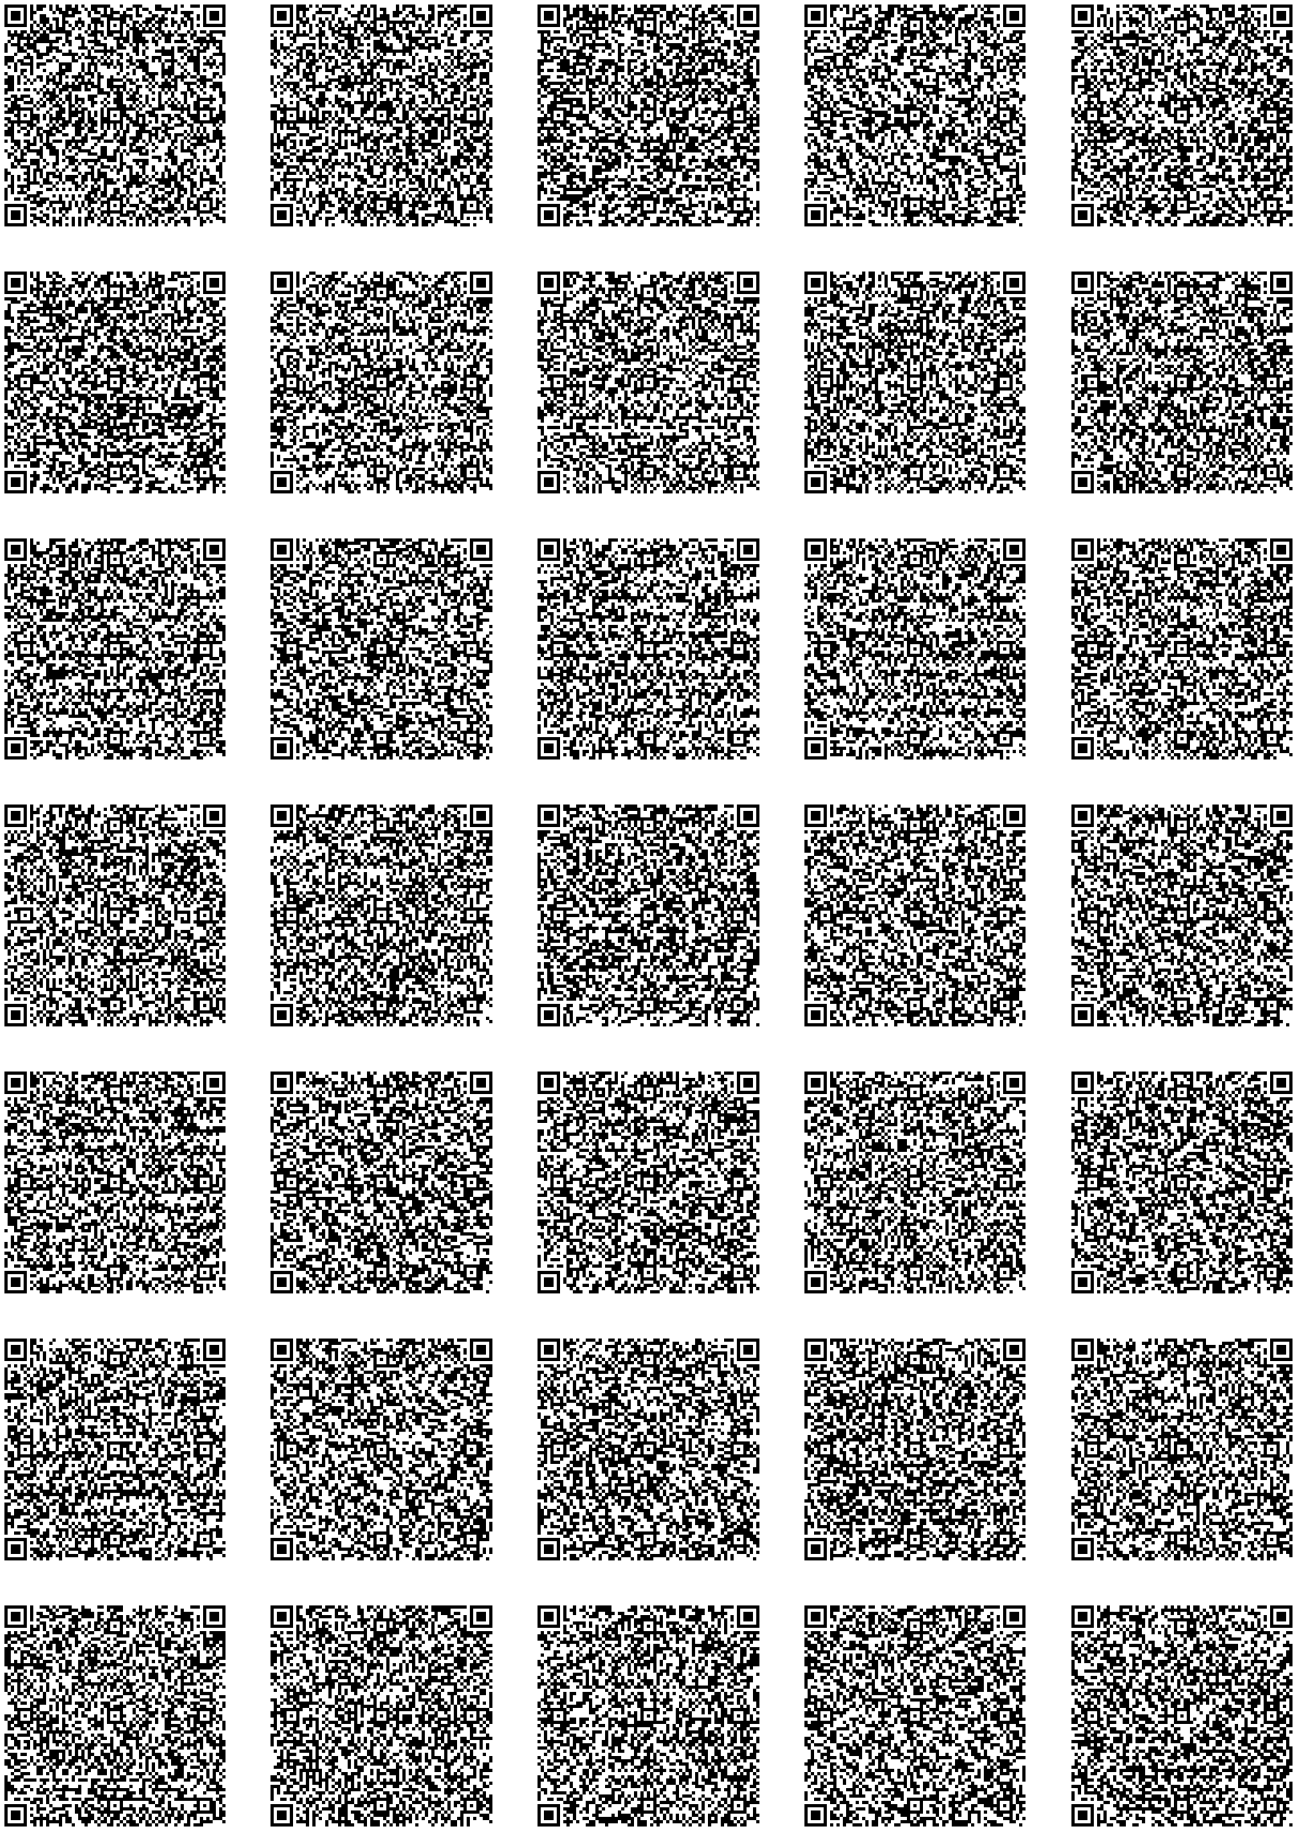
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
860429350700 - СЕРИК САЯТ null	Директор	17.01.2025 05:30
Представители технического надзора		
640515300568 - ҚАСЫМБЕК ЕРДЕНБЕК АСАНБЕКҰЛЫ	Технадзор	17.01.2025 14:08
Представители авторского надзора		
550525301819 - САРБАС ҒАБИТ НҰРТАЙҰЛЫ	Инженер авторского надзора	18.01.2025 03:15
Представители заказчика		
860506401925 - ТУРГУНБЕКОВА АКБОБЕК НУРЛИХОНОВНА	Ведущий специалист (сметчик)	20.01.2025 07:08 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ	Директор регионального подразделения по городам Астана, Шымкент и по Туркестанской, Кызылординской областям	21.01.2025 09:50
601229300458 - АШИРБАЕВ САКЕН ДАУТБЕКОВИЧ	Региональный руководитель	20.01.2025 12:12
890513351047 - ЖОЛДАСБАЕВ АЛЕН АСҚАРҰЛЫ	Ведущий специалист (ПТО)	20.01.2025 10:35
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	21.01.2025 07:30 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
