*Форма по приложению 3-1*
*Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития*
*Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189*

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **081040005136 - ТОО Каратас Майнинг**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне «Жана кала» города Туркестан Туркестанской области на 2000 мест**

Договор подряда (контракт) №: **№83 от 24.05.2023 года**

# Акт выполненных работ
# за Январь 2025 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Локальная смета: Систему контроля и управления доступом** | | | | |
| 1 | 1 | 6125-1101-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж на столе аппаратуры настольной масса до 0,015 т | шт. | 1 | 5 356 | 5 356 |
| 2 | 2 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Автоматизированное рабочее место СКУД (в комплекте с операционной системой Windows) WS-i117-16-05-GTX1650-W1S | шт | 1 | 3 147 500 | 3 147 500 |
| 3 | 3 | 521-101-0411002<br>СпрСЦ 11.2023 | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м2,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | шт. | 1 | 160 625 | 160 625 |
| 4 | 4 | 6125-0801-0507<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами | шт. | 3 | 3 671 | 11 013 |
| 5 | 5 | 248-405-0380СпрСЦ 11.2023 | Считыватель ST-CE011MF | шт. | 3 | 2 603 | 7 809 |
| 6 | 6 | 6125-0801-0507<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами | шт. | 7 | 3 671 | 25 697 |
| 7 | 7 | 248-405-0136СпрСЦ 11.2023 | ST-NC 441, сетевой контроллер на 4 двери, ST-NC 441, подключение до 15 модулей расширения | шт. | 7 | 166 989 | 1 168 923 |
| 8 | 8 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 7 | 4 211 | 29 477 |
| 9 | 9 | 248-405-0519РСНБ РК 2022 | ST-AC 485, модуль расширения контроллера ST-NC 441 | шт. | 7 | 35 422 | 247 954 |
| 10 | 10 | 6125-0202-0206<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | шт. | 54 | 59 566 | 3 216 564 |
| 11 | 11 | 248-405-0143СпрСЦ 11.2023 | ST-NC441D, дверной модуль на 4 двери (4 считывателя) без бокса для работы с контроллером ST-NC441 (требуется ST-AC485 на контроллер), RS-485, 9-14 В DC, не более 300мА | шт. | 54 | 27 434 | 1 481 436 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 12 | 6125-1101-0701<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг | шт. | 32 | 4 211 | 134 752 |
| 13 | 13 | 248-405-0535СпрСЦ 11.2023 | ST-AC001BX, металлический бокс, установка контроллеров и модулей, 396x309x81 мм | шт. | 32 | 5 863 | 187 616 |
| 14 | 14 | 6125-0202-0206<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | шт. | 7 | 59 566 | 416 962 |
| 15 | 15 | 248-405-0518РСНБ РК 2022 | ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140x80x45 мм | шт. | 7 | 32 389 | 226 723 |
| 16 | 16 | 6125-0202-0206<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания | шт. | 39 | 59 566 | 2 323 074 |
| 17 | 17 | 248-306-0352СпрСЦ 11.2023 | Источник электропитания РИП-12, исполнение 116 (РИП-12-10/17М7-V16) 13,6В 10А, 16 выходных канала с максимальным током до 1А (но - не более 10А) | шт. | 39 | 66 935 | 2 610 465 |
| 18 | 18 | 6124-0105-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1 /аккумуляторная батарея/ | шт. | 46 | 11 327 | 521 042 |
| 19 | 19 | 248-306-0379СпрСЦ 11.2023 | Аккумулятор 12 В, 9 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1209К | шт. | 39 | 19 323 | 753 597 |
| 20 | 20 | 248-306-0376СпрСЦ 11.2023 | Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К | шт. | 7 | 15 941 | 111 587 |
| 21 | 21 | 6124-0103-2101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 | шт. | 146 | 6 389 | 932 794 |
| 22 | 22 | 248-405-0607РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг | шт. | 63 | 46 568 | 2 933 784 |
| 23 | 23 | 248-405-0534СпрСЦ 11.2023 | ST-EX142L, накладная кнопка выхода с индикацией | шт. | 20 | 1 222 | 24 440 |
| 24 | 24 | 248-405-0148СпрСЦ 11.2023 | Smartec ST-ER114D-GN, устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой | шт. | 63 | 4 793 | 301 959 |
| 25 | 25 | 6125-0801-0507<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами | шт. | 140 | 3 671 | 513 940 |
| 26 | 26 | 248-405-0381СпрСЦ 11.2023 | Считыватель ST-CR210S-BK | шт. | 140 | 1 851 | 259 140 |
| 27 | 27 | 6108-0204-0301<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка дверных доводчиков | шт. | 63 | 5 129 | 323 127 |
| 28 | 28 | 248-401-0749РСНБ РК 2022 | VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной | шт. | 63 | 15 815 | 996 345 |
| 29 | 29 | 248-405-0517РСНБ РК 2022 | ST-BR350L, L-образное крепление с возможностью регулировки для замка | шт. | 63 | 9 307 | 586 341 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | Выполнено работ, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | 30 | 6125-0801-0503<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж турникета -трипода напольного | шт. | 14 | 15 096 | 211 344 |
| 31 | 31 | 248-405-0839РСНБ РК 2022 | Турникет-трипод PERCo-TB01.9A | шт. | 14 | 1 729 158 | 24 208 212 |
| 32 | 32 | 6125-0801-0506<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Монтаж турникета -калитки электромеханической | шт. | 3 | 10 192 | 30 576 |
| 33 | 33 | ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Калитка полуавтоматическая WHD-05 со створкой ASG-900 для помещений | шт | 3 | 557 557 | 1 672 671 |
| 34 | 34 | 248-405-0409РСНБ РК 2022 | MIFARE CLASSIC 4K 7B UID, смарт карта | шт. | 250 | 2 072 | 518 000 |
| 35 | 35 | 6119-0101-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | м | 3937 | 352 | 1 385 824 |
| 36 | 36 | 6119-0102-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 3290 | 755 | 2 483 950 |
| 37 | 37 | 243-304-0137СпрСЦ 11.2023 | Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4x2x24AWG LSZH | км | 4.337 | 484 673 | 2 102 027 |
| 38 | 38 | СпрСЦ 11.2023 | Низкотоксичный огнестойкий кабель для интерфейса RS-485 КИС-РВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.5 | м | 1190 | 1 030 | 1 226 854 |
| 39 | 39 | 243-305-0602СпрСЦ 11.2023 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75 | км | 1.7 | 210 654 | 358 112 |
| 40 | 41 | 241-207-1701СпрСЦ 11.2023 | Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм | м | 4740 | 118 | 559 320 |
| | | | **Итого по локальной смете: Систему контроля и управления доступом** | | | | **58 416 932** |
| | | | **ИТОГО по акту:** | | | | **58 416 932** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (6.200%) | 53436136.169 x 6.20% | 3 313 040 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 58416932.169 + 3313040.341 | 61 729 972 |
| | Сметная прибыль, 5.00% | 56749176.510 x 5.00% | 2 837 458 |
| | Непредвиденные расходы, 5.000% | 61729972.510 x 5.000% | 3 086 498 |
| | **Итого с непредвидемыми работами и затратами** | | 67 653 929 |
| | **коэффициент 2024 года, к = 1.0750** | 67653929.961 x 1.0750 | 72 727 974 |
| | НДС (12%) | 72727974.708 x 12% | 8 727 356 |
| | **Итого с НДС** | 72727974.708 + 8727356.965 | 81 455 331 |

Лист согласования
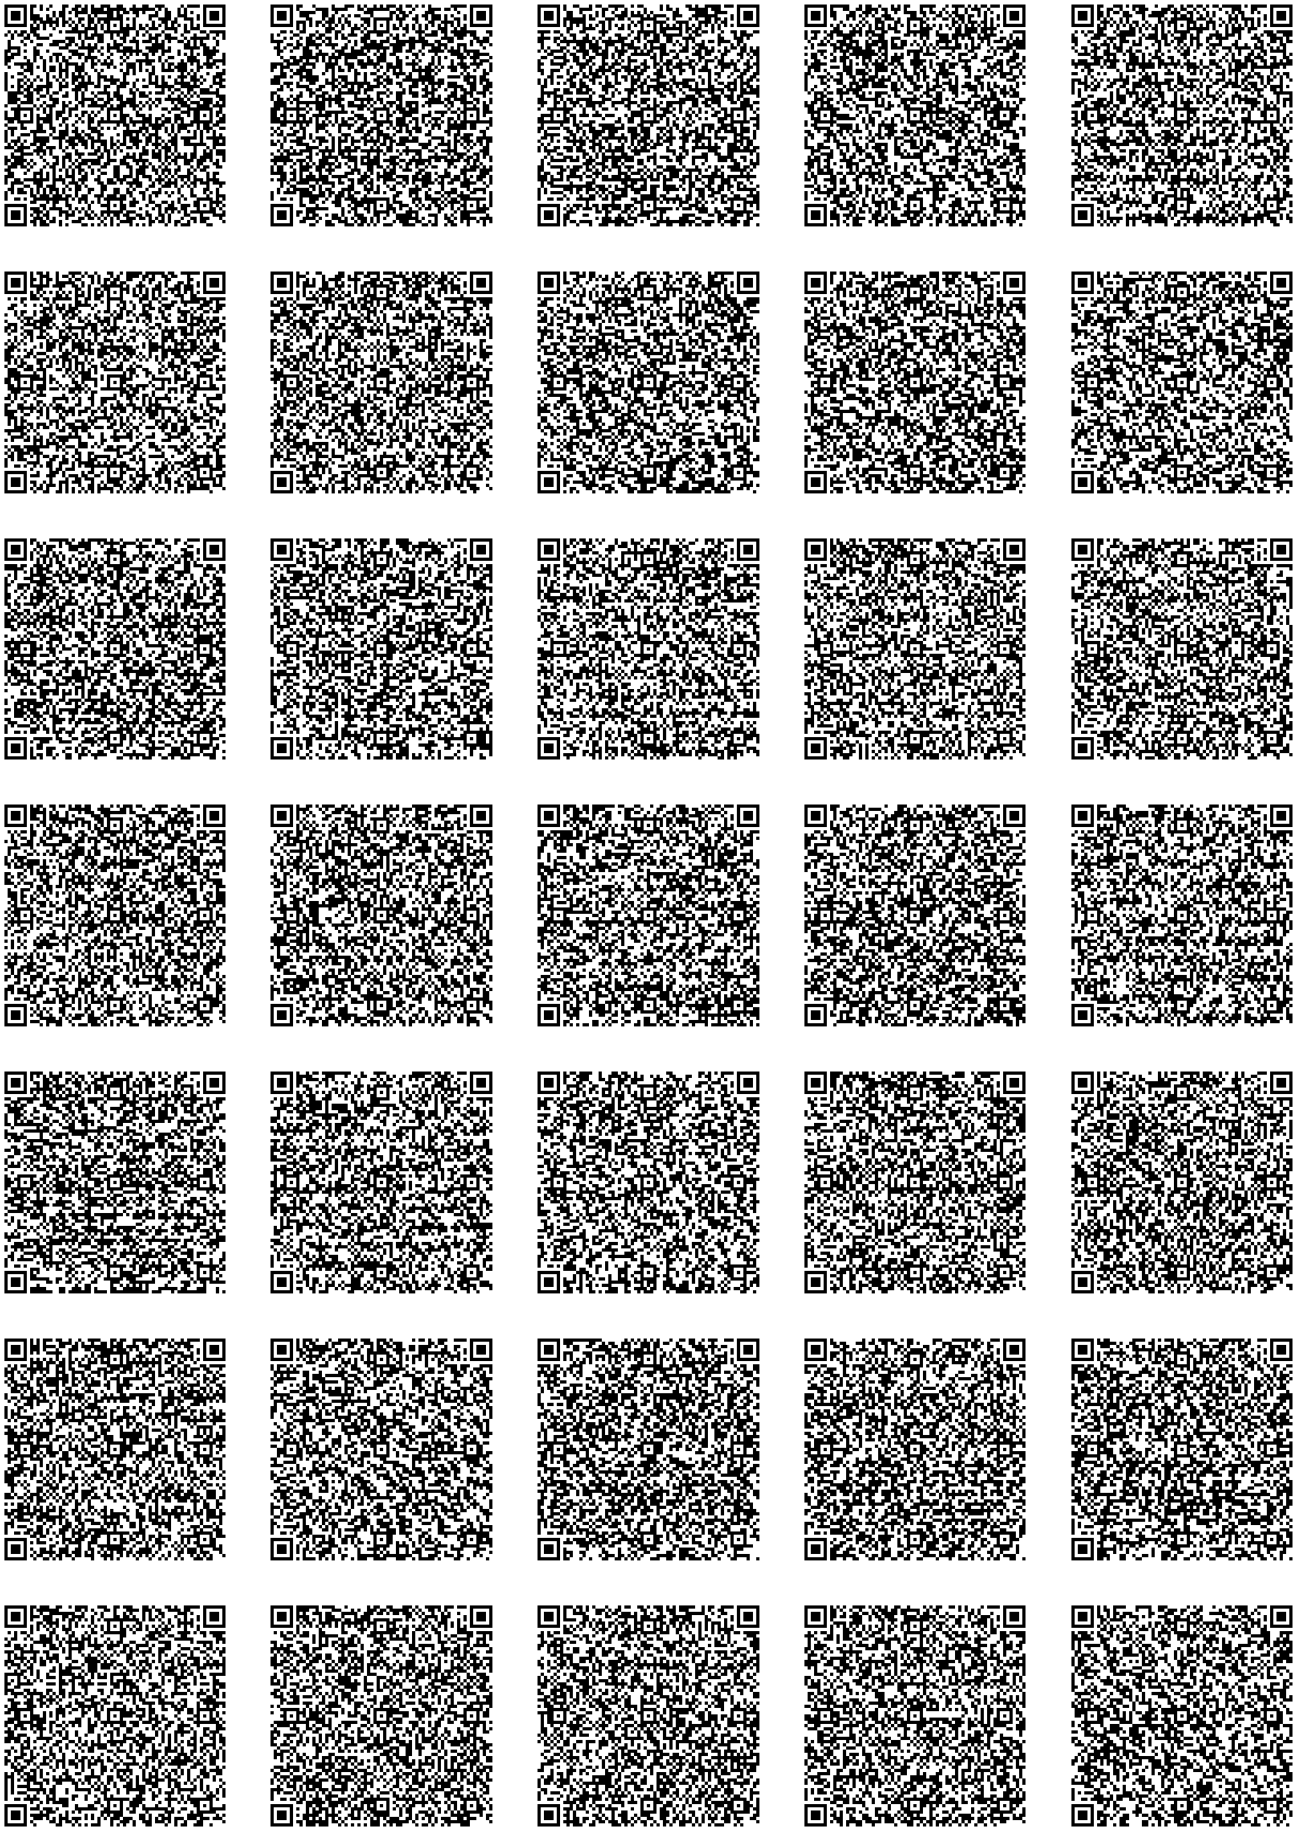
| ФИО | Должность | Дата постановки ЭЦП |
|---|---|---|
| **Представители подрядчика** | | |
| 860429350700 - СЕРИК САЯТ null | Директор | 17.01.2025 04:09 |
| **Представители технического надзора** | | |
| 640515300568 - ҚАСЫМБЕК ЕРДЕНБЕК АСАНБЕКҰЛЫ | Технадзор | 17.01.2025 14:20 |
| **Представители авторского надзора** | | |
| 550525301819 - САРБАС ҒАБИТ НҰРТАЙҰЛЫ | Инженер авторского надзора | 18.01.2025 03:25 |
| **Представители заказчика** | | |
| 601229300458 - АШИРБАЕВ САКЕН ДАУТБЕКОВИЧ | Региональный руководитель | 20.01.2025 13:01 |
| 860506401925 - ТУРГУНБЕКОВА АКБОБЕК НУРЛИХОНОВНА | Ведущий специалист (сметчик) | 20.01.2025 06:59<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
| 890513351047 - ЖОЛДАСБАЕВ АЛЕН АСҚАРҰЛЫ | Ведущий специалист (ПТО) | 20.01.2025 10:30 |
| 770611300645 - БИТЖАНОВ ЕРГЕН СЕРИКОВИЧ | Директор регионального подразделения по городам Астана, Шымкент и по Туркестанской, Кызылординской областям | 21.01.2025 09:54 |
| 801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА | Начальник отдела смет и ценообразования | 21.01.2025 07:17<br>Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете |
