Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Подземная строительная часть здания				
			Раздел: Земляные работы (ГП-6.1)				
			Подраздел: Снятие плодородного слоя грунта учтено в смете "Вертикальная планировка"				
1	1	6101-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	660.5506	546	360 661
2	2	6101-0203-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 3.	м3	20.4294	20 916	427 300
3	3	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5319.62	525	2 792 800
			Итого по подразделу: Снятие плодородного слоя грунта учтено в смете "Вертикальная планировка"				**3 580 762**
			Итого по разделу: Земляные работы (ГП-6.1)				**3 580 762**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Сваи (КЖ-2)				
4	8	6102-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2	м3	1851.52	33 345	61 738 934
5	9	6102-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	2893	13 570	39 258 010
6	10	221-101-0111РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 1-3	м	20251	7 035	142 465 785
7	11	РСНБ РК 2022	Надбавка при изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	1851.52	284	525 832
			Итого по подразделу: Сваи (КЖ-2)				**243 988 561**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по разделу: Фундаменты				**243 988 561**
			Итого по локальной смете: Подземная строительная часть здания				**247 569 323**
			ИТОГО по акту:				**247 569 323**
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)			247569323.000 x 7.30%	18 072 561
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			247569323.000 + 18072561.051	265 641 884
			Сметная прибыль, 5.00%			265641884.051 x 5.00%	13 282 094
			Непредвиденные расходы, 5.000%			265641884.051 x 5.000%	13 282 094
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				292 206 072
			НДС (12%)			292206072.456 x 12%	35 064 728
			Итого с НДС			292206072.456 + 35064728.695	327 270 801

Лист согласования
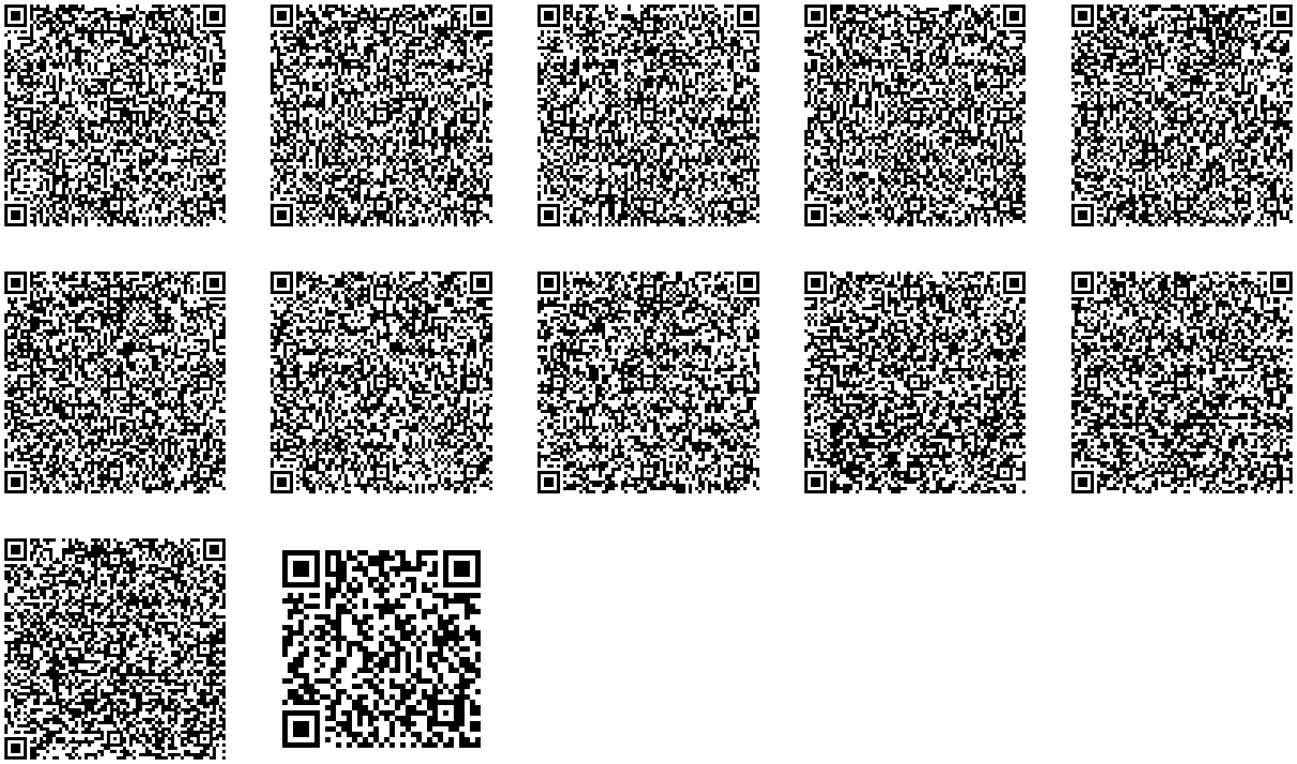
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	25.07.2024 09:00:14
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	25.07.2024 09:51:59
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	25.07.2024 09:25:10
Представители заказчика		
630828300151 - ЖАСАҒАНБЕРГЕН СӘРСЕНБАЙ ӘЛІМҰЛЫ	Региональный руководитель	26.07.2024 10:15:24
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Ведущий специалист	26.07.2024 10:01:40
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	25.07.2024 10:32:45
801029400768 - МУКАШЕВА АНАР УЗБЕКОВНА	Начальник отдела смет и ценообразования	26.07.2024 11:10:57
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	26.07.2024 11:49:46
