Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **090340012961 - АО "SAMRUK-KAZYNA CONSTRUCTION"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство школы в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области на 1500 мест (ранее школа №10)**

Договор подряда (контракт) №: **138 от 11.08.2023 года**

Акт выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Надземная строительная часть здания				
			Раздел: Стены выше нуля				
			Подраздел: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм.	м3	1182.9	44 723	52 902 836
2	2	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	244.8603	22 148	5 423 165
3	3	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	280.5365688	115 660	32 446 859
4	4	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	67.4016424	102 922	6 937 111
5	5	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 /+ ППЖ-160/	м3	188.62	63 122	11 906 071
6	6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7.76273	509 920	3 958 371
7	7	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1965	372	730 980
8	8	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2023.862	120	242 863
			Итого по подразделу: Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (АР-59)				**114 548 260**
			Подраздел: Стены внутренние толщ.380 мм (АР-59)				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	237.5	35 879	8 521 262
10	10	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	51.3	22 148	1 136 192
11	11	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	42.7927532	115 660	4 949 409
			Итого по подразделу: Стены внутренние толщ.380 мм (АР-59)				**14 606 864**
			Подраздел: Стены внутренние (по дефформационным швам) (АР-59)				
12	12	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены внутренней.	м3	163.13	35 879	5 852 941
13	13	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	35.23608	22 148	780 408
14	14	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	29.39277	115 660	3 399 567
			Итого по подразделу: Стены внутренние (по дефформационным швам) (АР-59)				**10 032 917**
			Подраздел: Армирование кладки (АР-59)				
15	15	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	5.42588	316 026	1 714 719
16	16	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	5.42591	382 476	2 075 280
			Итого по подразделу: Армирование кладки (АР-59)				**3 789 999**
			Подраздел: Кирпичная кладка - вентшахты на кровле (АР-59)				
17	20	6105-0201-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной и внутренней кирпичной с воздушной прослойкой.	м3	86.52	36 413	3 150 453
18	21	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	16.35228	22 148	362 170
19	22	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	24.649548	115 660	2 850 967
			Итого по подразделу: Кирпичная кладка - вентшахты на кровле (АР-59)				**6 363 590**
			Подраздел: Парапет, выходы на кровлю (АР-59)				
20	23	6105-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 510 мм.	м3	480.17	35 087	16 847 725
21	24	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	99.39726	22 148	2 201 451

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	25	РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	92.43465	115 660	10 690 992
23	26	213-101-0703 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	48.066018	102 922	4 947 051
			Итого по подразделу: Парапет, выходы на кровлю (АР-59)				**34 687 219**
			Подраздел: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				
24	27	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича.	м2	474.33	8 799	4 173 629
25	28	212-401-0204 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	9.818631	24 628	241 813
26	29	213-101-0603 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	18.408	86 808	1 597 961
			Итого по подразделу: Р Перегородки кирпичные (АР-59)				**6 013 404**
			Итого по разделу: Стены выше нуля				**190 042 255**
			Раздел: Кровля (АР19-21)				
			Подраздел: Р Кровля (тип К1)				
27	62	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	4380.11	523	2 290 798
28	63	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	4818.121	120	578 175
29	64	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	4380.11	1 924	8 427 332
30	65	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	676.726995	63 122	42 716 361
31	66	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	4380.11	2 165	9 482 938
32	67	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	5037.1265	7 123	35 879 452
33	68	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	201.48506	16 475	3 319 466
34	69	211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	207.5296118	29 905	6 206 173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	70	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	1116.92805	16 475	18 401 390
36	71	211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1150.4358915	29 905	34 403 785
37	72	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	4380.11	170	744 619
38	73	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	1.434574	521 019	747 440
39	74	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	4380.11	1 477	6 469 422
40	75	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	67.015683	22 148	1 484 263
41	76	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 / t±50мм/	м2	4380.11	289	1 265 852
42	77	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	156.369927	22 148	3 463 281
43	78	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	8.8434421	68 239	603 468
44	79	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	8.8434421	382 476	3 382 404
45	80	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	4380.11	1 025	4 489 613
46	81	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	5037.1265	1 657	8 346 519
47	82	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	5037.1265	2 858	14 396 108
			Итого по подразделу: Р Кровля (тип К1)				**207 098 859**
			Подраздел: Р Кровля (тип К2)				
48	83	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	330.59	523	172 899

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	84	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	363.649	120	43 638
50	85	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	330.59	1 924	636 055
51	86	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	54.481232	63 122	3 438 964
52	87	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	330.59	2 165	715 727
53	88	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	380.1785	7 123	2 708 011
54	89	6109-0307-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых и древесностружечных древесностружечных /+ в 2 слоя/	м2	330.59	7 519	2 485 706
55	90	232-104-0103 РСНБ РК 2022	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм	м2	679.03186	2 561	1 739 000
56	91	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	330.59	1 477	488 281
57	92	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5.058027	22 148	112 025
58	93	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 / t±50мм/	м2	330.59	289	95 541
59	94	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	11.802063	22 148	261 392
60	95	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.6674612	68 239	45 547
61	96	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.6674612	382 476	255 287
62	97	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	330.59	1 025	338 855
63	98	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	760.357	1 657	1 259 912

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	99	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	330.59	399	131 905
65	100	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	380.1785	2 858	1 086 550
			Итого по подразделу: Р Кровля (тип К2)				**16 015 297**
			Подраздел: Кровля (тип К3)				
66	101	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	51.58	523	26 976
67	102	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	56.738	120	6 809
68	103	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	51.58	1 924	99 240
69	104	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	7.96911	63 122	503 026
70	105	6106-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м2	51.58	2 165	111 671
71	106	224-102-1204 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	59.317	7 123	422 515
72	107	6111-0402-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	м3	13.1529	16 475	216 694
73	108	211-302-0302 РСНБ РК 2022	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	13.547487	29 905	405 138
74	109	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	51.58	170	8 769
75	110	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0168935	521 019	8 802
76	111	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	51.58	1 477	76 184
77	112	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.789174	22 148	17 479

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	113	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 / t±50мм/	м2	51.58	289	14 907
79	114	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1.841406	22 148	40 783
80	115	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0.10414	68 239	7 106
81	116	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.10414	382 476	39 831
82	117	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	51.58	1 025	52 870
83	118	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	118.634	1 657	196 577
84	119	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	51.58	399	20 580
85	120	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	59.317	2 858	169 528
			Итого по подразделу: Кровля (тип К3)				**2 445 485**
			Подраздел: Кровля (тип К4)				
86	121	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2	16	523	8 368
87	122	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	17.6	120	2 112
88	123	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2	16	1 924	30 784
89	124	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	3.296	63 122	208 050
90	125	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	16	170	2 720
91	126	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0.0052403	521 019	2 730

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
92	127	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	16	1 477	23 632
93	128	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0.2448	22 148	5 422
94	129	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 / t±50мм/	м2	16	791	12 656
95	130	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1.56672	22 148	34 700
96	131	6110-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	16	1 025	16 400
97	132	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	36.8	1 657	60 978
98	133	6110-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	16	399	6 384
99	134	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	18.4	2 858	52 587
			Итого по подразделу: Кровля (тип К4)				**467 523**
			Подраздел: (АР-125)				
100	135	1109-0401-0205 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	1278.5672	4 562	5 832 824
101	136	222-502-0309 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм	м2	1278.5672	24 720	31 606 181
			Итого по подразделу: (АР-125)				**37 439 005**
			Подраздел: Р Примыкания к стенам и парапетам (по узлу Г дл.713,3 м, по узлу Д дл.93,05х2=186,1 м) (АР-89)				
102	139	6110-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	899.4	4 034	3 628 180
103	140	235-103-0401 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	764.49	1 657	1 266 760
104	141	235-103-0404 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	м2	584.61	2 858	1 670 815
			Итого по подразделу: Р Примыкания к стенам и парапетам (по узлу Г дл.713,3 м, по узлу Д дл.93,05х2=186,1 м) (АР-89)				**6 565 755**
			Итого по разделу: Кровля (АР19-21)				**270 031 924**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого по локальной смете: Надземная строительная часть здания				**460 074 179**
			ИТОГО по акту:				**460 074 179**
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)				460074179.557 x 7.30%	33 585 415
		Итого с затратами на организацию и управление СМР				460074179.557 + 33585415.985	493 659 595
		Сметная прибыль, 5.00%				493659595.542 x 5.00%	24 682 979
		Непредвиденные расходы, 5.000%				493659595.542 x 5.000%	24 682 979
		Итого с непредвидемыми работами и затратами					543 025 555
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2024 год 3 квартал, к = 1.0557				543025555.096 x 1.0557	573 272 078
		НДС (12%)				573272078.515 x 12%	68 792 649
		Итого с НДС				573272078.515 + 68792649.422	642 064 727

Лист согласования
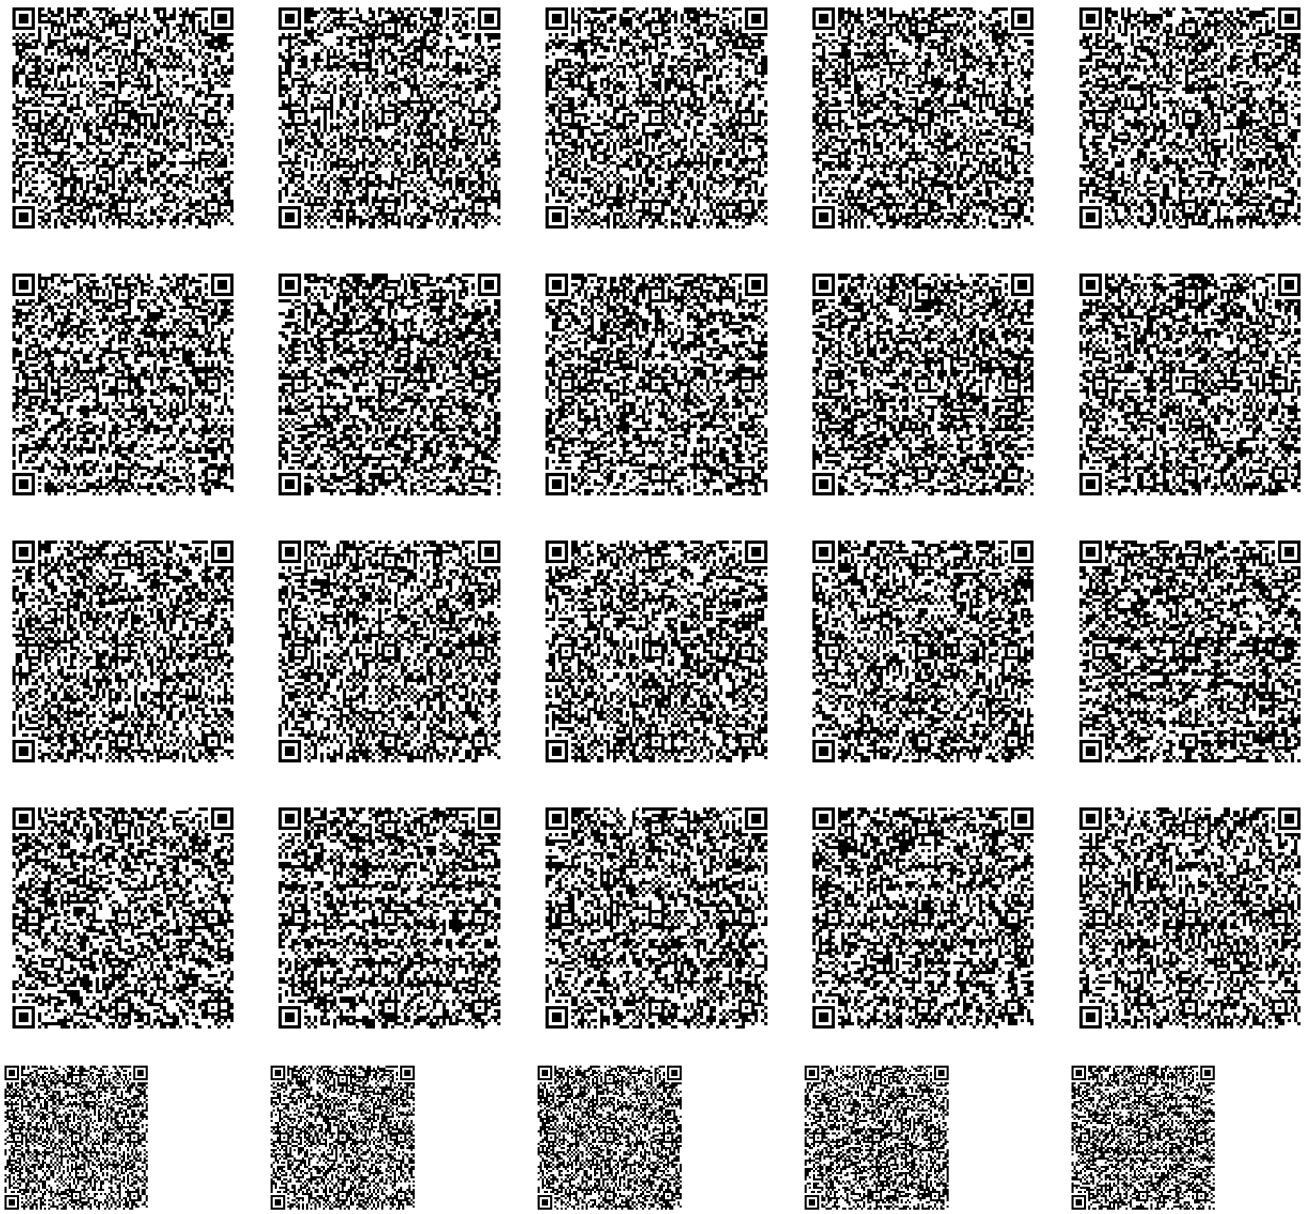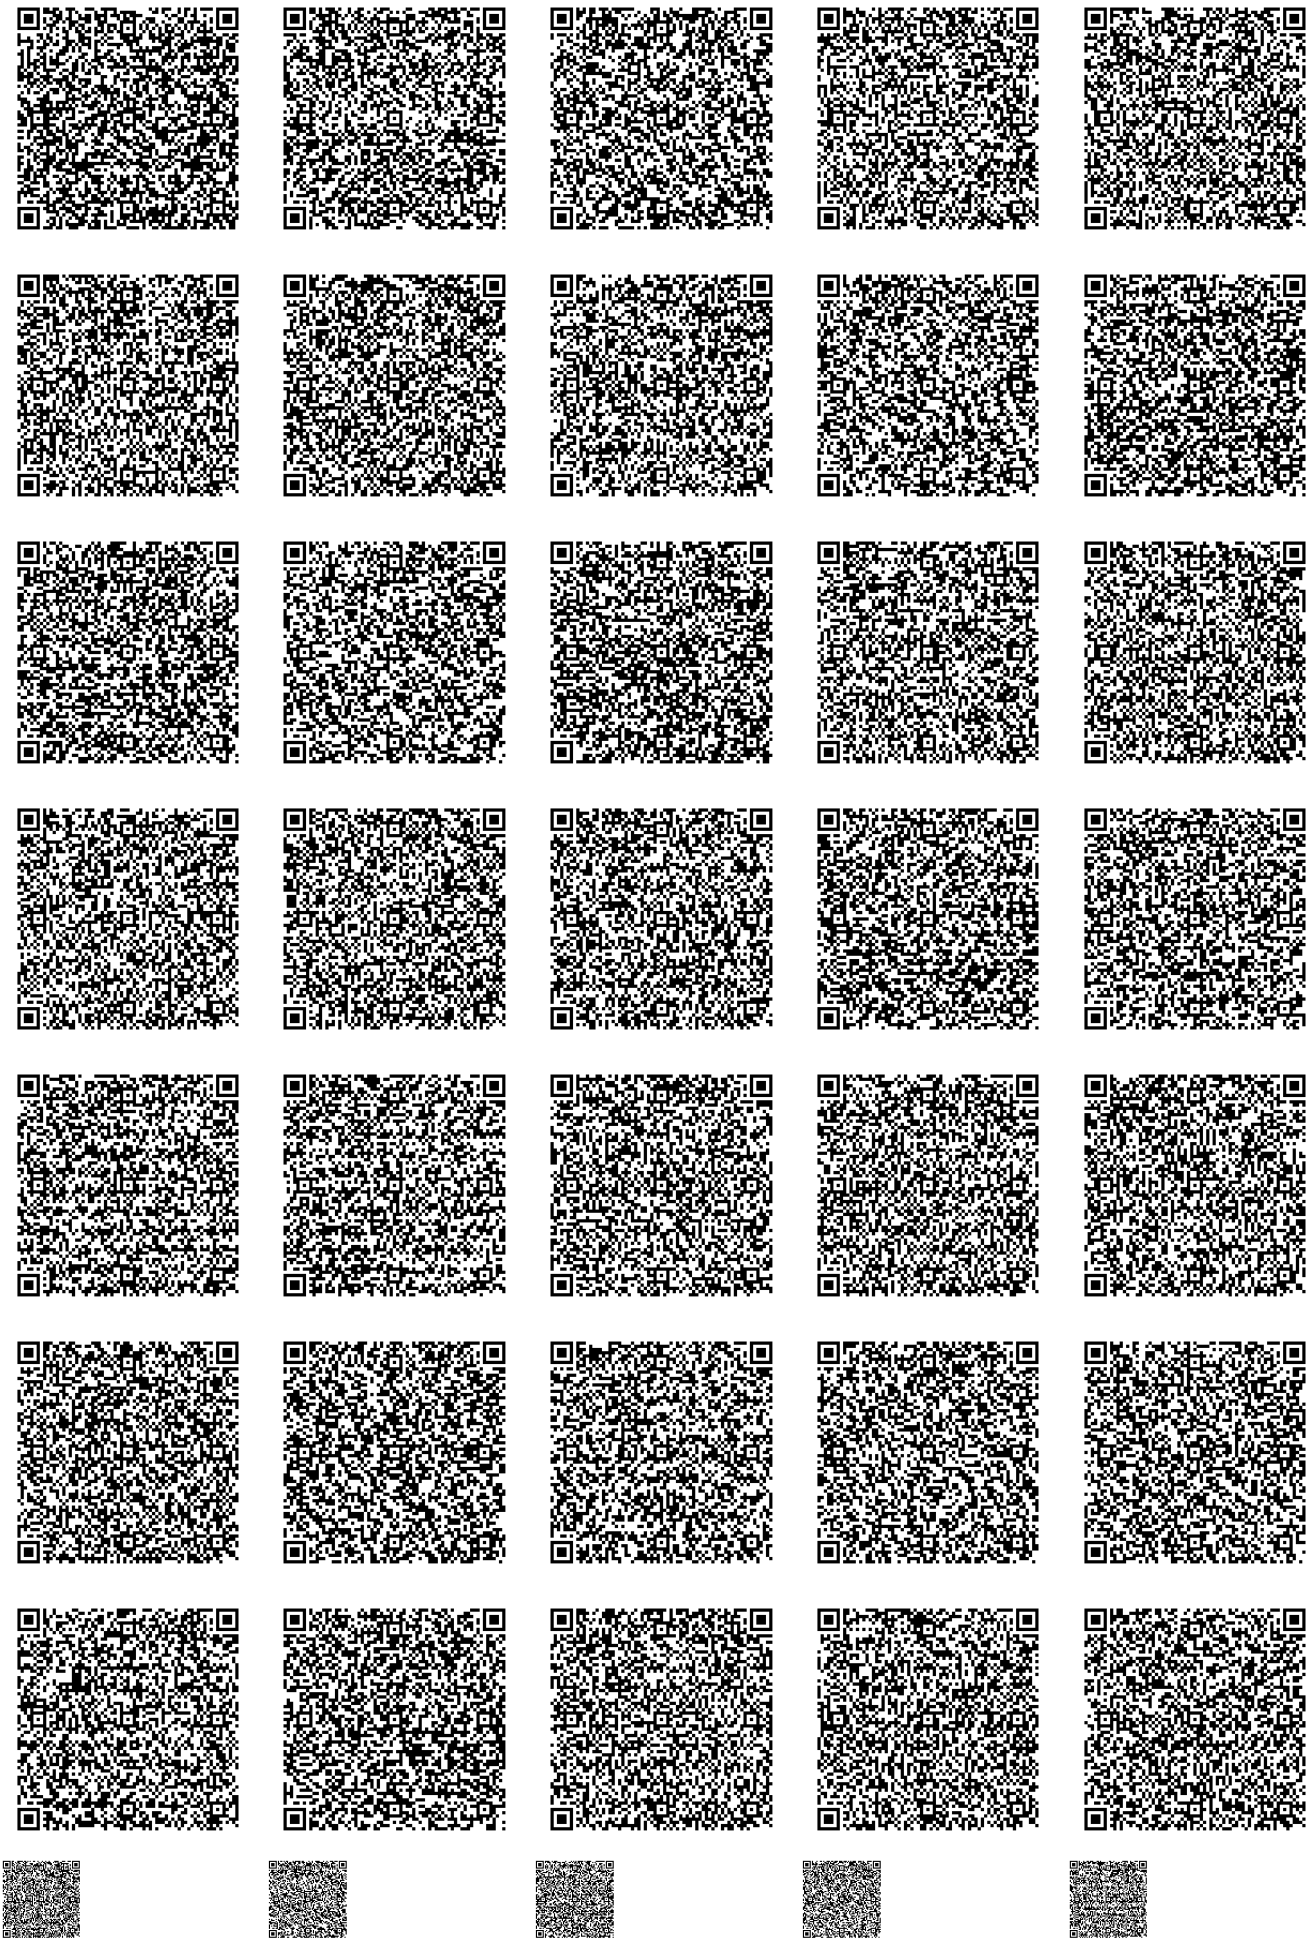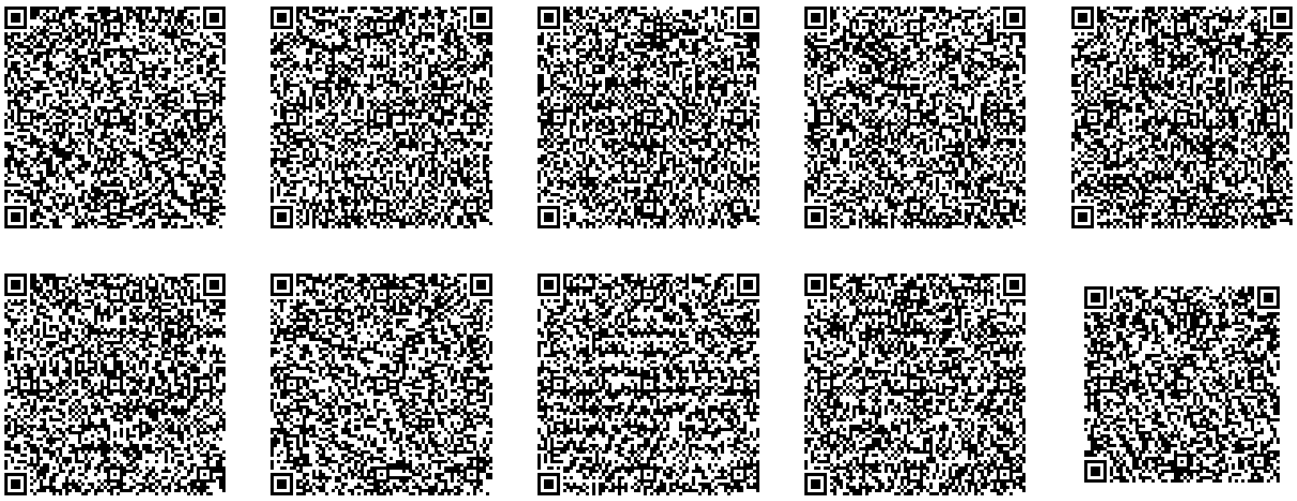
ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
870517350384 - МУСИН МАНАТ АЙТБАЕВИЧ	Директор	19.12.2024 13:01
Представители технического надзора		
880629350810 - АБИШЕВ БОЛАТ ИБРАХИМОВИЧ	технический надзор	20.12.2024 10:16
Представители авторского надзора		
530101304061 - БАЙЖАНОВ АМАНЖОЛ ЕСКЕНДИРОВИЧ	Авторский надзор	19.12.2024 14:39
Представители заказчика		
561226450298 - СЕИТОВА САУЛЕ КАИРБАЕВНА	сметчик	22.12.2024 11:49 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
950610350051 - ӘУЕЗХАН ӘМІРЖАН ӘУЕЗХАНҰЛЫ	Региональный руководитель	24.12.2024 13:53
770511350390 - МУНБАЕВ НУРЛАН САДВАКАСОВИЧ	Региональный руководитель	24.12.2024 13:55
720816350499 - МАДИЯРОВ НУРЛАН АБДИЛРАХМАНОВИЧ	Директор регионального подразделения	25.12.2024 05:01
850203450365 - ШЕПЕЛЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА	Ведущий специалист (сметчик) отдела смет и ценообразования	25.12.2024 04:31 Комментарий: Расценки соответствуют локальной смете
